

USNESENÍ

Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl soudkyní Mgr. Evou Přívrackou ve věci

žalobci:

a)GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,

zast.: [REDACTED]

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

b)VISTORIA CZ a.s., IČO 25110977,

Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

zast.: [REDACTED]

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

proti

žalované:

Městská část Praha 10, IČO 00063941,

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice

o změnu závazku

takto :

Soud ukládá žalované dle § 114a odst. 2 písm. a) zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), aby se ve lhůtě **20 dnů** ode dne doručení tohoto usnesení písemně vyjádřila ve věci samé k žalobě, která je připojena.

Ve vyjádření je žalovaná povinna zejména:

vylicít rozhodné skutečnosti ve věci (zejména uvést, která z tvrzení žalobce považuje za nesporná, tj. odpovídající skutečnosti, dále které skutečnosti činí předmětem sporu a proč, co v tomto směru tvrdí sám)

označit důkazy k prokázání tvrzených skutečností, a to tak, aby bylo zřejmé k prokázání, které konkrétní právně významné skutečnosti má být ten který důkaz proveden. Listinné důkazy, na něž se ve vyjádření odvolává, je třeba zaslat (založit do spisu) zároveň s vyjádřením. Důkazy musí být označeny tak, aby soud mohl zajistit tyto důkazy k jednání, které bude ve věci nařízeno (tj. například u svědků uvést jméno, příjmení, bydliště a také upřesnit, kterou z tvrzených skutečností může svědek svou výpověď doložit a z jakého důvodu tomu tak je)

Soud připomíná, že účastníci řízení jsou povinni tvrdit rozhodné skutečnosti a označit důkazy k prokázání svých tvrzení (§101 odst. 1 o.s.ř.). Neoznačí-li účastníci důkazy potřebné k prokázání svých tvrzení, vychází soud při zjišťování skutkového stavu z důkazů, které byly provedeny (§ 120 odst. 2, věta druhá o.s.ř.).

Vyjádření je třeba zaslat soudu k výše uvedené spisové značce ve **2** vyhotoveních.

P o u č e n í :

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Praha 08. dubna 2024

Mgr. Eva Přívracká, v.r.
soudkyně

Obvodní soud pro Prahu 10

28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10 - Vršovice

Žalobce 1: **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Žalobce 2: **VISTORIA CZ a. s.**, IČO: 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

oba právně zastoupeni  advokátem, se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsaným v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č. 12327

Žalovaná: **Městská část Praha 10**, IČO: 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Žaloba na změnu závazku

Soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč bude uhrazen na výzvu soudu po sdělení bankovního spojení a variabilního symbolu

D v a k r á t (podáno do datové schránky Obvodního soudu pro Prahu 10, ID DS 8aiabyn)




Přílohy:

1. smlouva o dílo č. 2021/OMP/0933 ze dne 17. 6. 2021
2. dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2021
3. dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 1. 2022
4. dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2022
5. dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2022
6. dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2022
7. dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2023
8. dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2023
9. dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2023
10. dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2023
11. společenská smlouva ze dne 5. 10. 2020
12. dopis žalobce 1 ze dne 15. 2. 2022
13. dopis žalobce 1 ze dne 28. 2. 2022
14. dopis žalobce 1 ze dne 30. 8. 2022
15. dopis žalobce 1 ze dne 13. 9. 2022
16. email žalobce 1 ze dne 22. 9. 2022
17. email žalované ze dne 10. 10. 2022 a žalobce 1 ze dne 12. 10. 2022
18. email žalované ze dne 14. 10. 2022
19. email žalobce 1 ze dne 20. 10. 2022
20. email žalované ze dne 21. 10. 2022
21. email žalobce 1 ze dne 26. 10. 2022
22. návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo
23. návrh usnesení Rady MČ Praha 10 č. 0806/RMČ/2022
24. vyčíslení podstatné změny okolností – část 1
25. vyčíslení podstatné změny okolností – část 2
26. plná moc pro právního zástupce žalobce 1
27. plná moc pro právního zástupce žalobce 2
28. rozhodnutí o registraci plátce daně z přidané hodnoty
29. písemná zpráva žalované ze dne 7. 7. 2021

I.

Úvodní informace

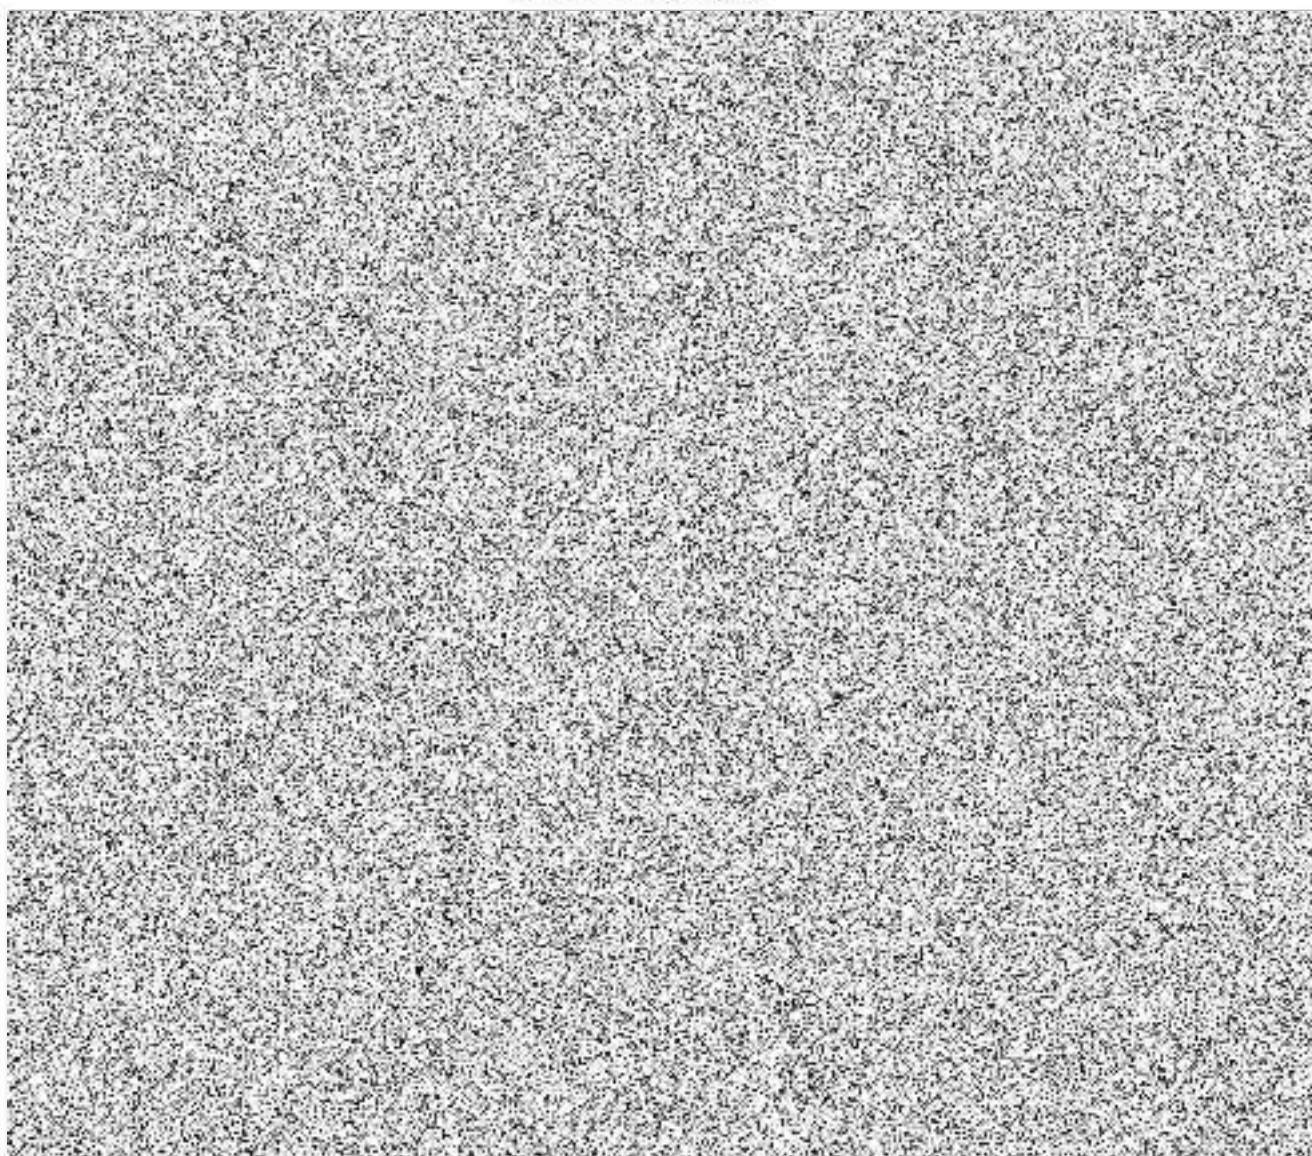

Důkazy: 3
společenská smlouva ze dne 5. 10. 2020 (příloha č. 11)
smlouva o dílo č. 2021/OMP/0933 ze dne 17. 6. 2021 (příloha č. 1)
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2021 (příloha č. 2)
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 1. 2022 (příloha č. 3)
dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2022 (příloha č. 4)
dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 7. 2022 (příloha č. 5)
dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 10. 2022 (příloha č. 6)
dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo ze dne 2. 5. 2023 (příloha č. 7)
dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2023 (příloha č. 8)
dodatek č. 9 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 7. 2023 (příloha č. 9)
dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 8. 2023 (příloha č. 10)
návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (příloha č. 22)

dopis žalobce 1 ze dne 15. 2. 2022 (příloha č. 12)

dopis žalobce 1 ze dne 28. 2. 2022 (příloha č. 13)

email žalované ze dne 10. 10. 2022 a žalobce 1 ze dne 12. 10. 2022 (příloha č. 17)

email žalované ze dne 14. 10. 2022 (příloha č. 18)


email žalované ze dne 21. 10. 2022 (příloha č. 20)

II. Obsah

(7) Žalobci touto žalobou:

- popisují vývoj vztahu mezi žalobci a žalovanou (část III. této žaloby);
- uvádí důvody podání této žaloby a zdůvodňují výši požadovaného plnění (část IV. a V. této žaloby).


III. Smlouva o dílo

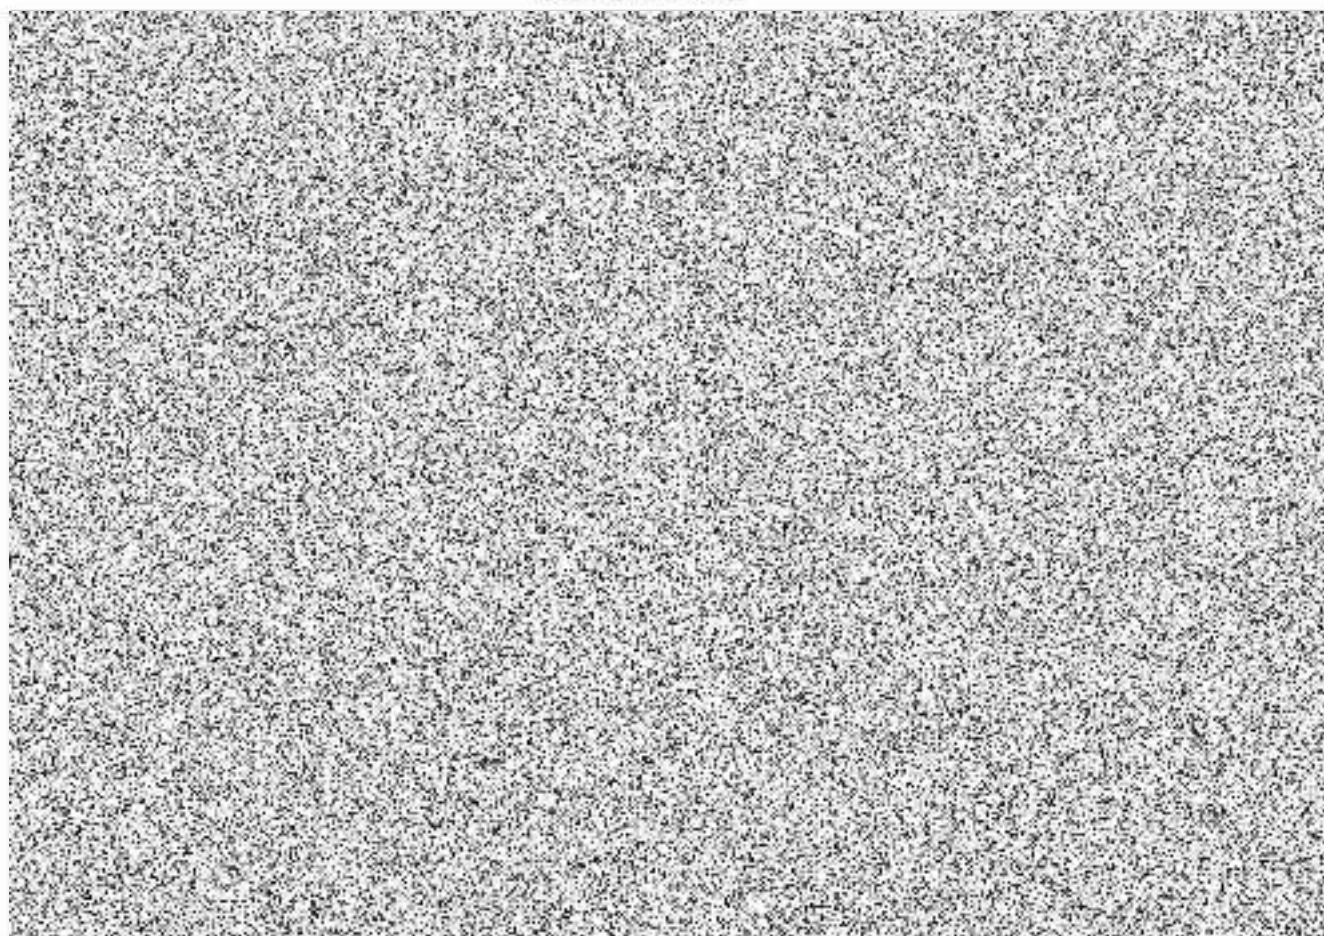

Důkazy: smlouva o dílo č. 2021/OMP/0933 ze dne 17. 6. 2021 (příloha č. 1)
dopis žalobce 1 ze dne 30. 8. 2022 (příloha č. 14)
dopis žalobce 1 ze dne 13. 9. 2022 (příloha č. 15)
email žalobce 1 ze dne 22. 9. 2022 (příloha č. 16)


IV.

Mimořádné situace vzniklé v průběhu provádění Díla

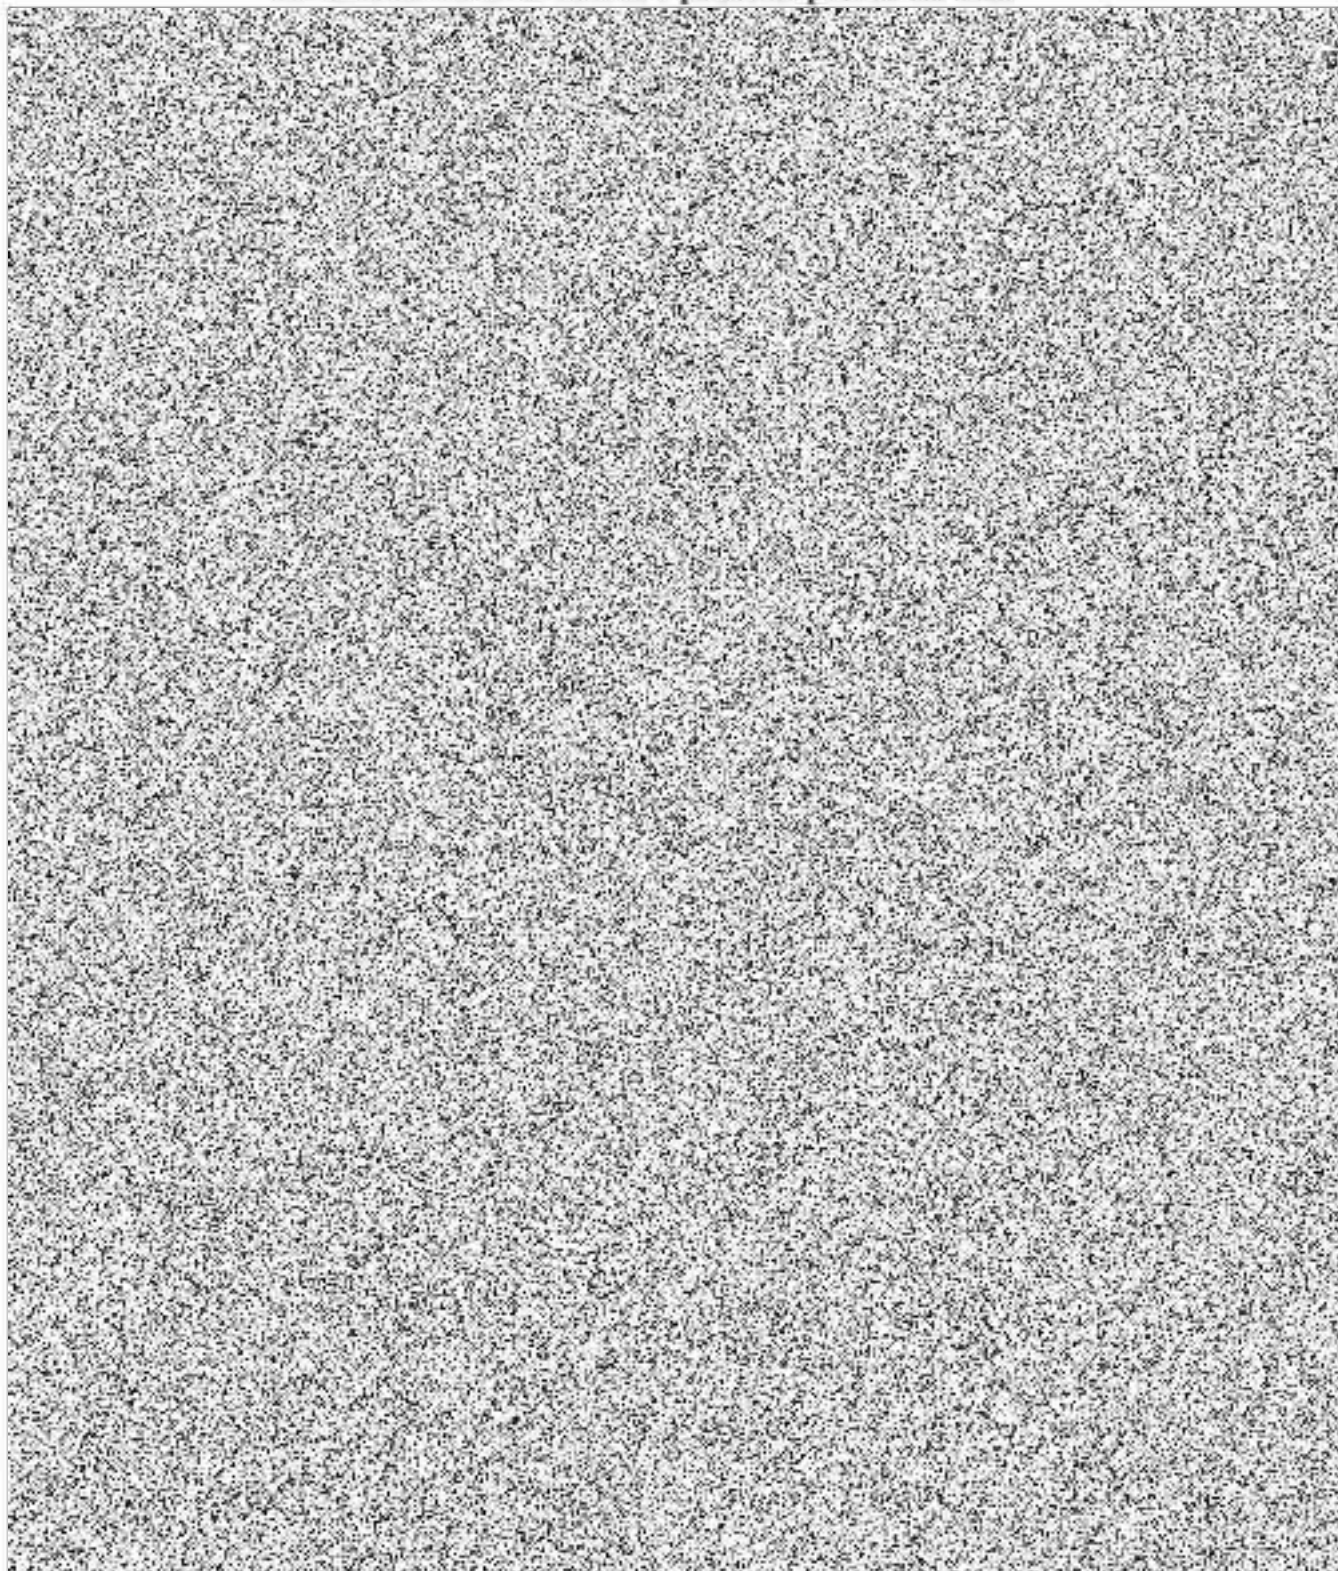


¹ Dostupné z: <https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/prognoza-cnb-archiv/Prognoza-CNB-jaro-2021-00001/>.

² Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny.

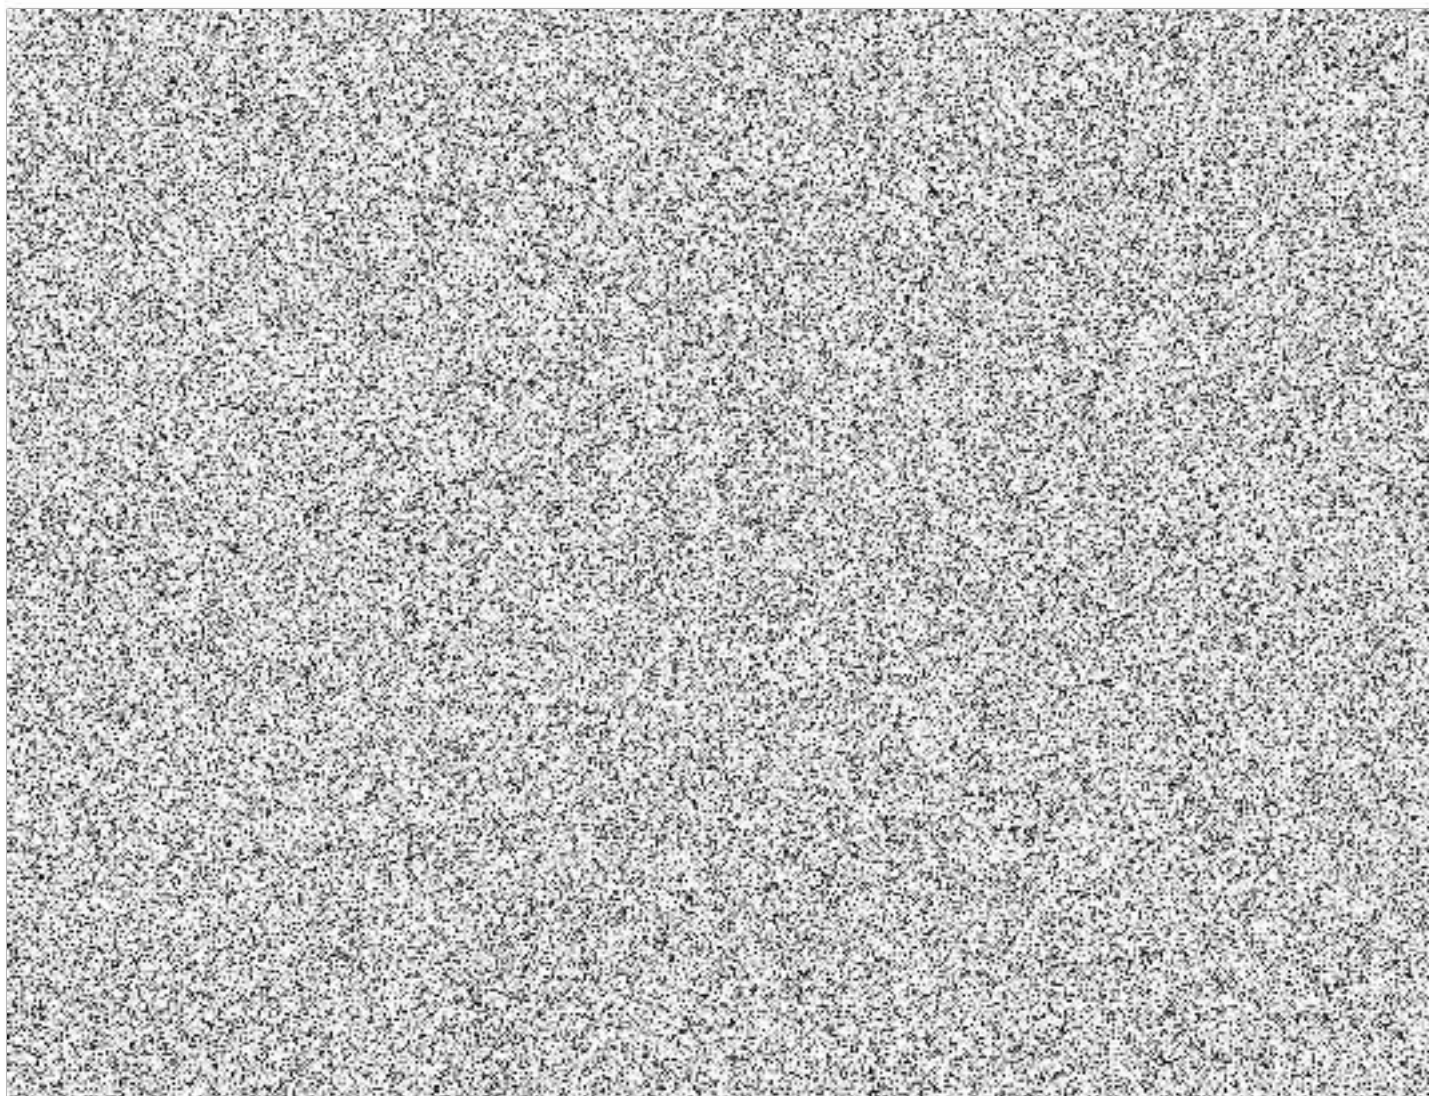

V.

Zákonné podmínky pro změnu závazku ze smlouvy

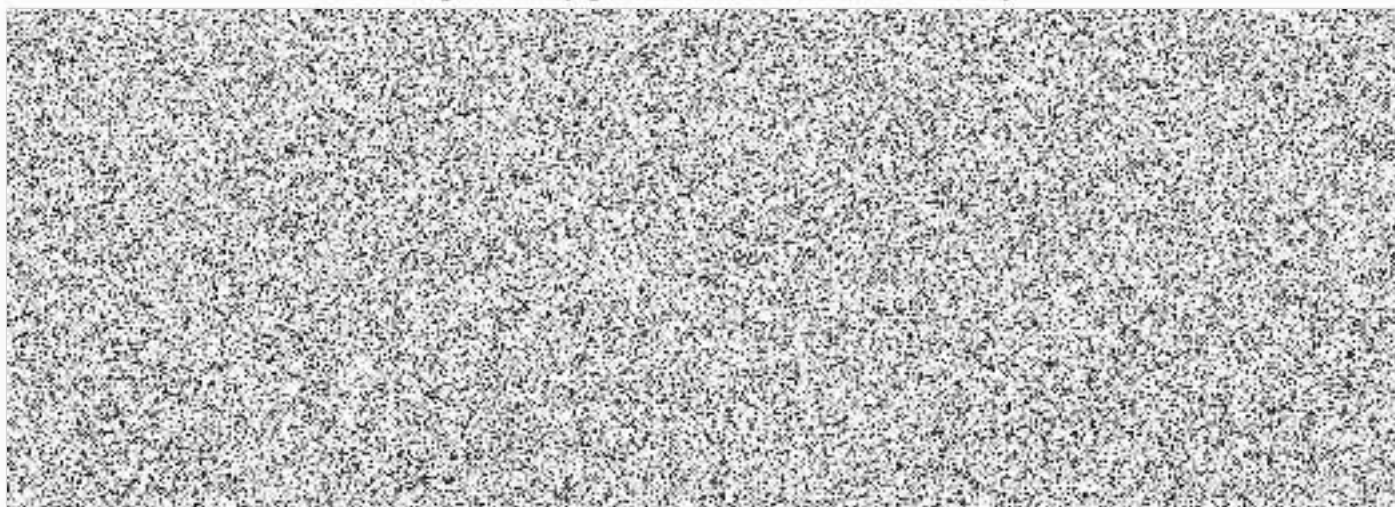


³ Jedním z největších dodavatelů oceli do EU byly ocelárny společnosti Azovstal v Mariupolu, které byly téměř zcela zničeny při obléhání a dobytí Mariupolu vojsky Ruské federace v období od 2. 3. 2023 do 20. 5. 2023.

⁴ Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace_spotrebitelske_ceny.

⁵ Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/xj/ceny-pohonných-hmot-v-1-pololetí-2022-skokově-vzrostly-v-březnu>.

⁶ FRIEDRICH, Milan. *Lze smlouvy na veřejné zakázky považovat za smlouvy uzavřené adhezním způsobem?* In: www.epravo.cz. 24. 1. 2020. [cit. 30. 7. 2023].

⁷ PELIKÁNOVÁ, Irena; PELIKÁN, Robert. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. *Občanský zákoník: komentář k § 1798*. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 12. 2023]. Dostupné z: www.aspi.cz.

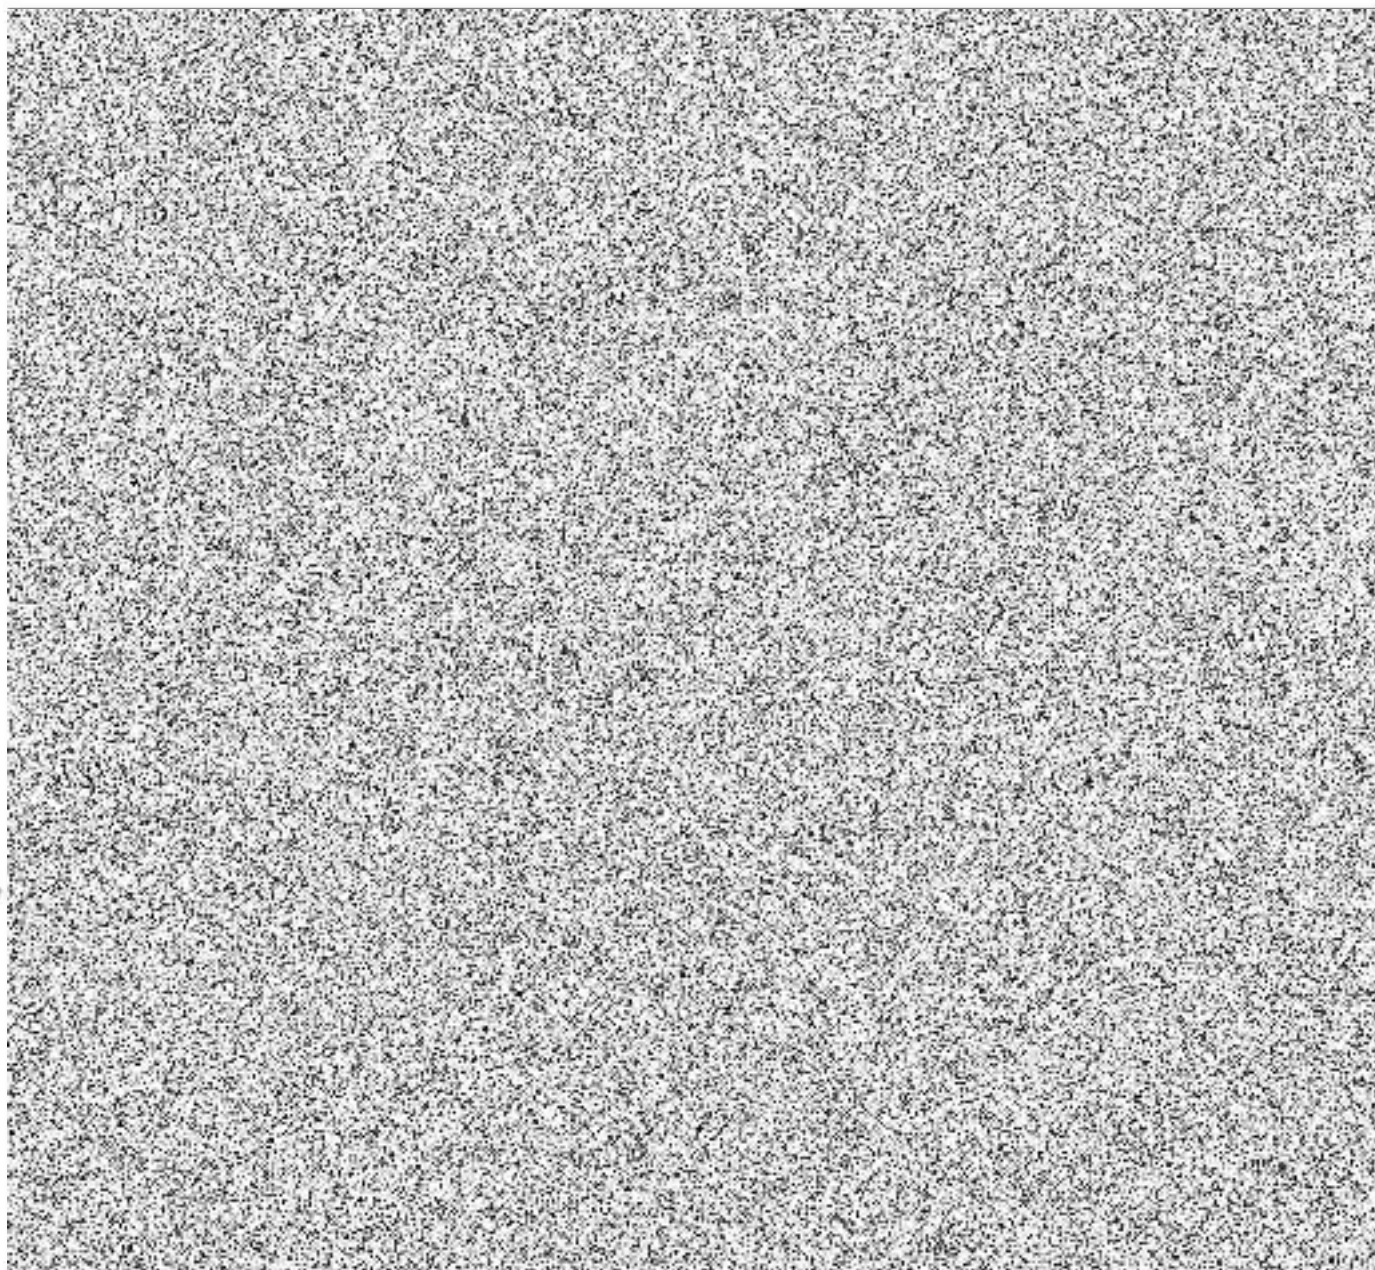

⁸ GRULICH, Tomáš. *Zadávání veřejných zakázek jako forma adhezní kontraktace*. Právní rozhledy. 2016, č. 7, s. 249-255 [cit. 13. 12. 2023]. Dostupné z www.beck-online.cz.

⁹ LAVRUSHIN, Konstantin. *Změny obchodních smluvních závazkových vztahů v důsledku vnějších okolností* [online]. Brno, 2017, s. 154 a násl. [cit. 13. 12. 2023]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/uhaoz/>. Disertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Vedoucí práce ŠILHÁN, Josef.


¹⁰ TALEB, Nassim, Nicholas. *Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí*. Praha: Paseka, 2011, s. 8 [cit. 14. 12. 2023].

¹¹ LAVRUSHIN, Konstantin. Op. cit., s. 49


¹² JAMPÍLEK, František. *Clausula rebus sic stantibus v závazkovém právu*. [online]. Praha, 2022, s. 106 [cit. 13. 12. 2023]. Dostupné z: <https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/171724>. Rigorózní práce. Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra občanského práva. Vedoucí práce ELISCHER, David.

¹³ LAVRUSHIN, Konstantin. Op. cit., s. 49

¹⁴ „Správně uvedeno jest již v žalobě a správně usuzovaly oba nižší soudy, že smluvní strany tehdy, roku 1912, ani při největší bedlivosti a při nejbystřejší předvídavosti nemohly se nadíti, že dojde k válce, jaké úžasné převraty válka do hospodářských poměrů přivede a jaké stoupnutí cen všech životních potřeb, zejména i zemědělských plodin za následek mítí bude. O tom netřeba šířiti slov.“ Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 14. 11. 1923, sp. zn. Rv I 1178/23.

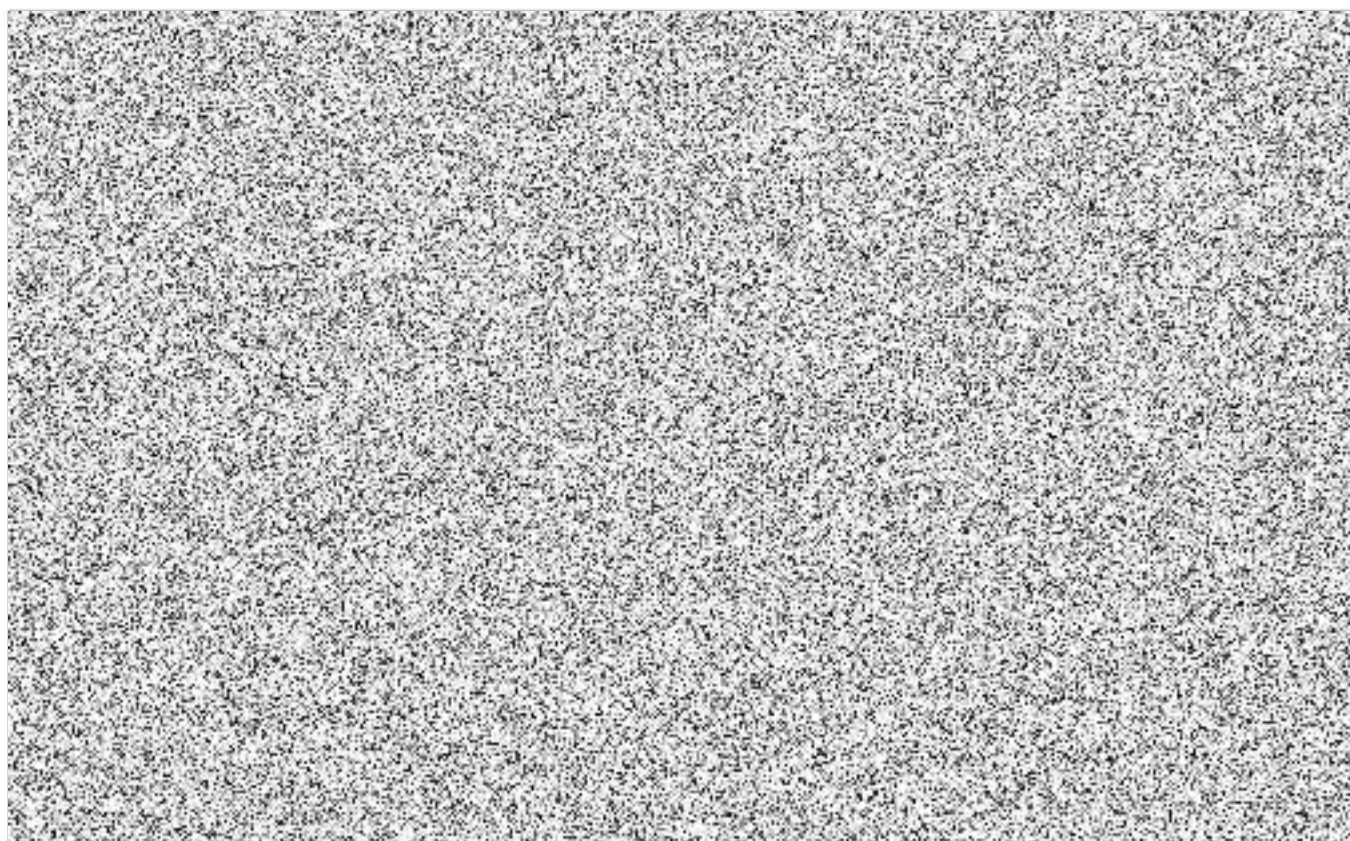


Důkaz: návrh dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo (příloha č. 22)

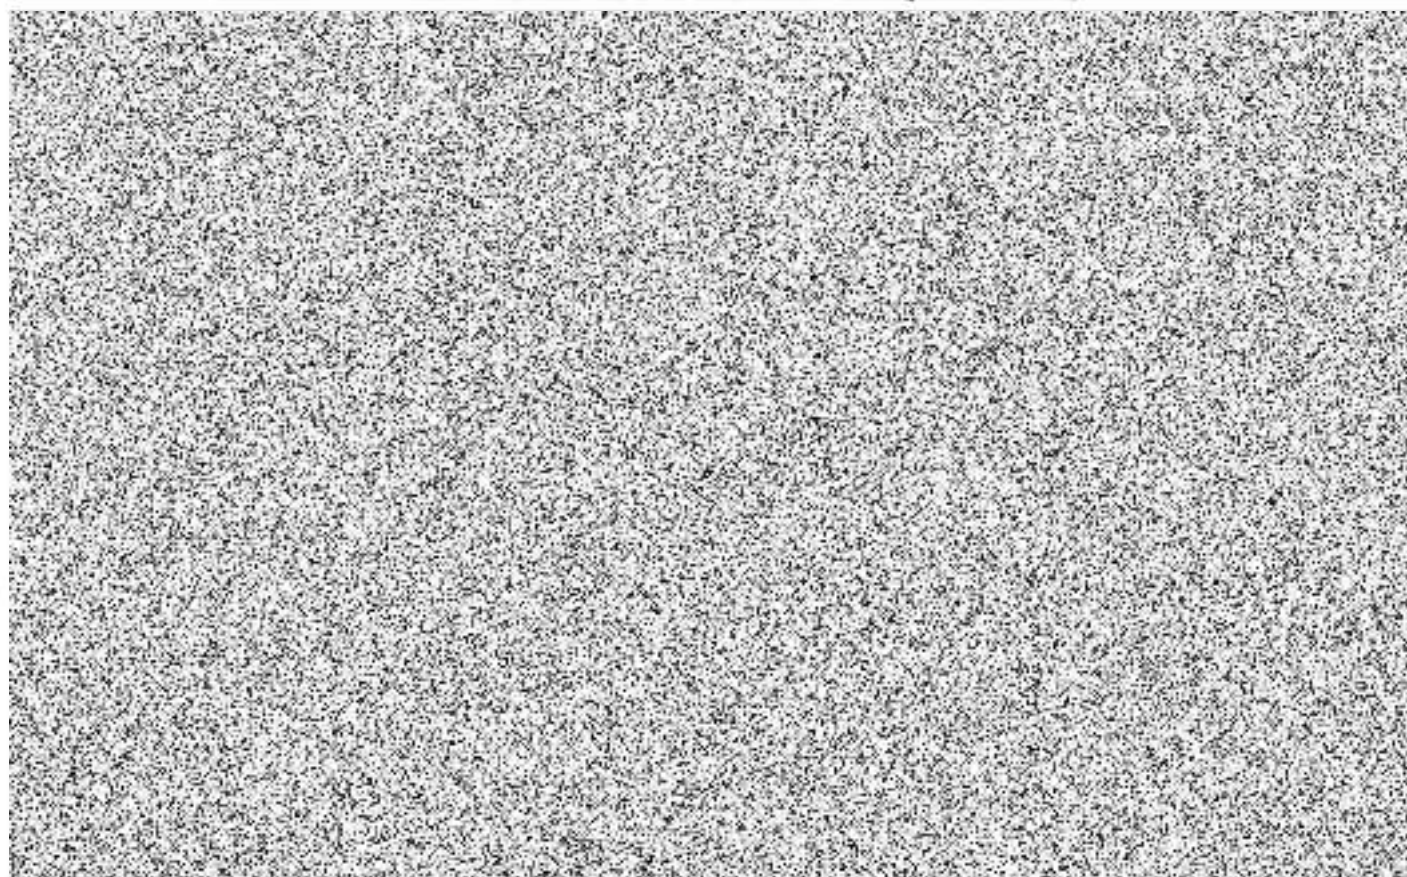

¹⁵ LAVRUSHIN, Konstantin. Op. cit., s. 158-159.

¹⁶ ŠILHÁN, Josef. § 1765 [Podstatná změna okolností a obnovení jednání o smlouvě]. In: HULMÁK, Milan a kol. Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 223.

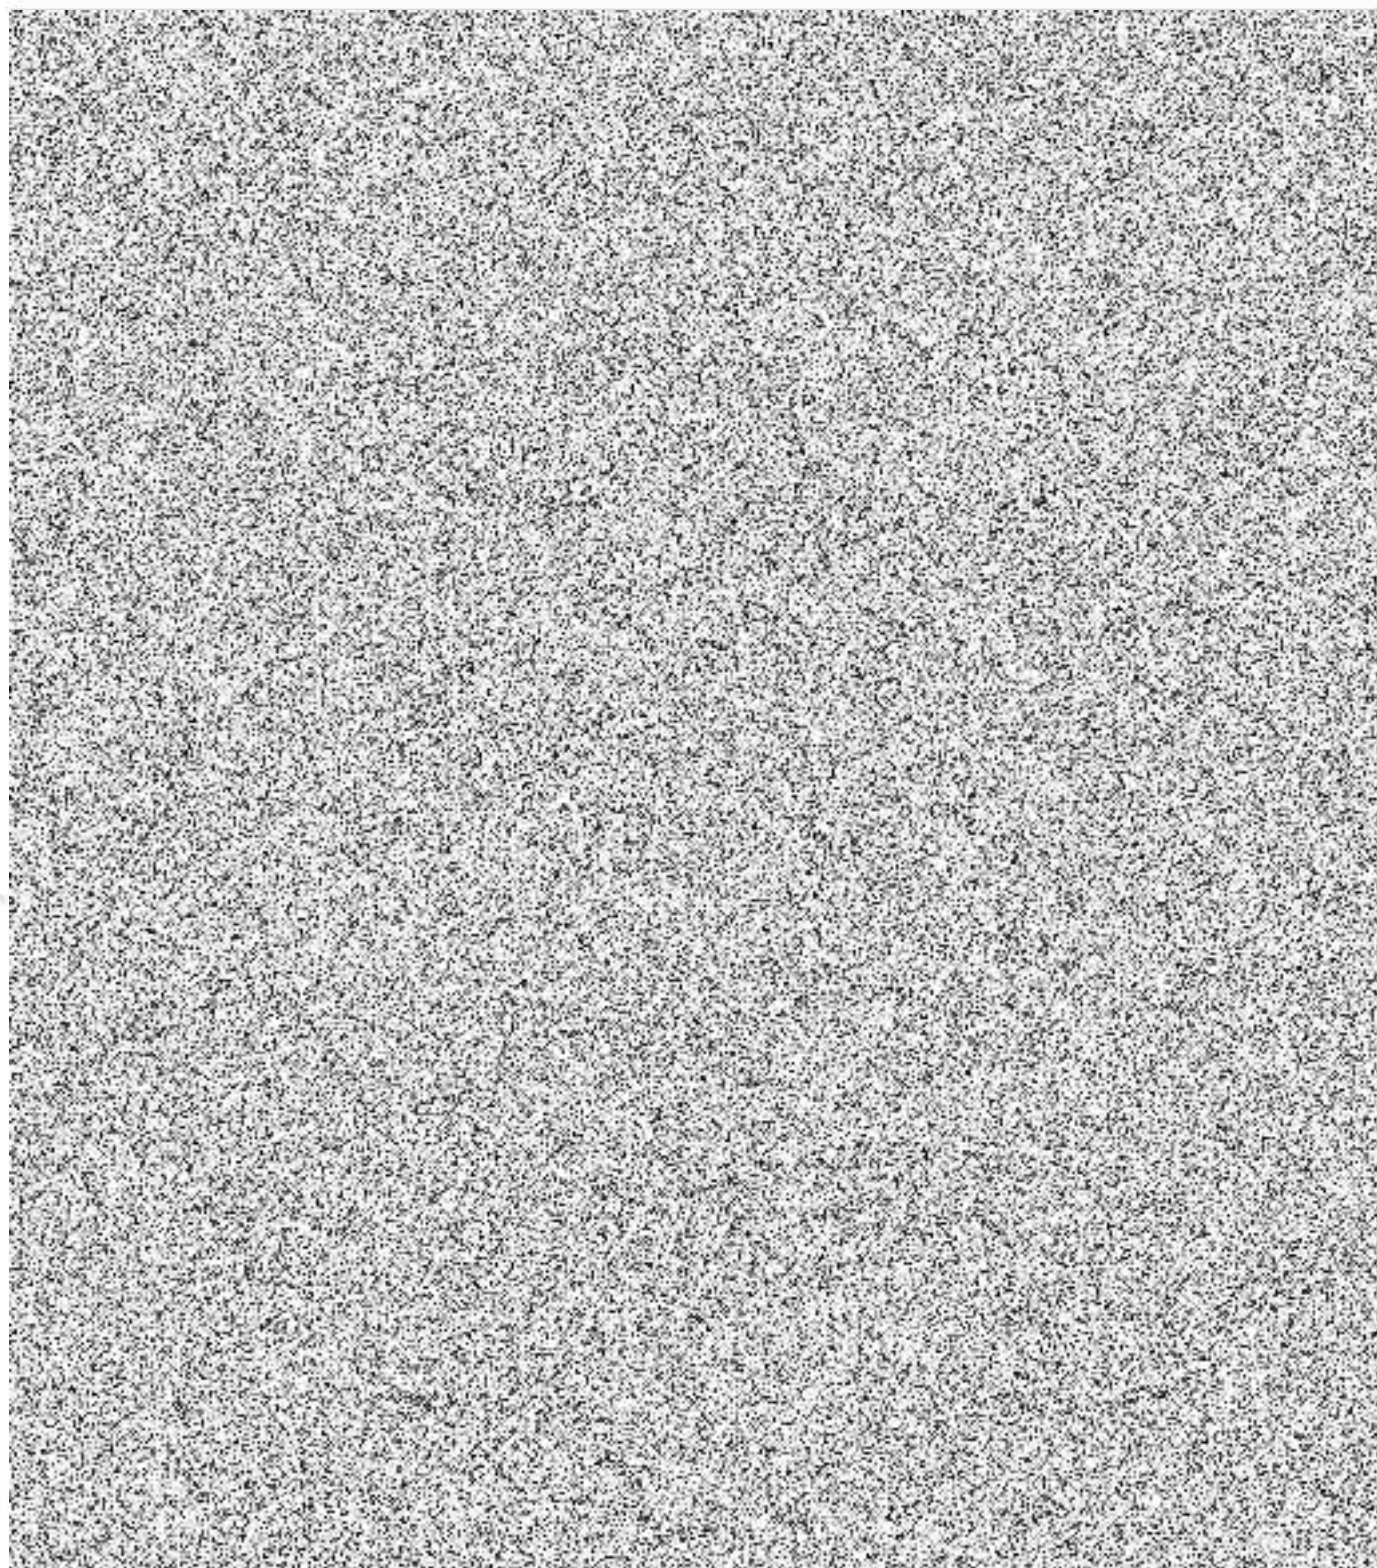


¹⁷ Viz Materiál společnosti ÚRS CZ a.s. „Vývoj cen“ za dobu od září 2021 do července 2022 (dostupný na <https://www.cs-urs.cz/tag/vyvoj-cen/>)

¹⁸ Viz článek „Ceny železa a oceli 2022: proč pořád rostou a kdy dojde ke kulminaci?“ zveřejněný dne 8. 4. 2022. Dostupný z: <https://ferrum-mb.cz/ceny-zeleza-a-oceli-2022-proc-porad-rostou-a-kdy-dojde-ke-kulminaci/>.

¹⁹ HÁVA, Karel. Analýza vývoje cen stavebních materiálů. tzb-info.cz. [Online] 13. 6. 2022 [cit. 13. 12. 2023]. Dostupné z: <https://stavba.tzb-info.cz/23967-analyza-vyvoje-cen-stavebnich-materialu>.

²⁰ K jednotlivým indexům nákladů stavební výroby srov.: <https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-cen-stavebnich-praci-indexy-cen-stavebnich-del-a-indexy-nakladu-stavebni-vyroby-ctvrtletni-casove-rady-1-ctvrtleti-2022>.

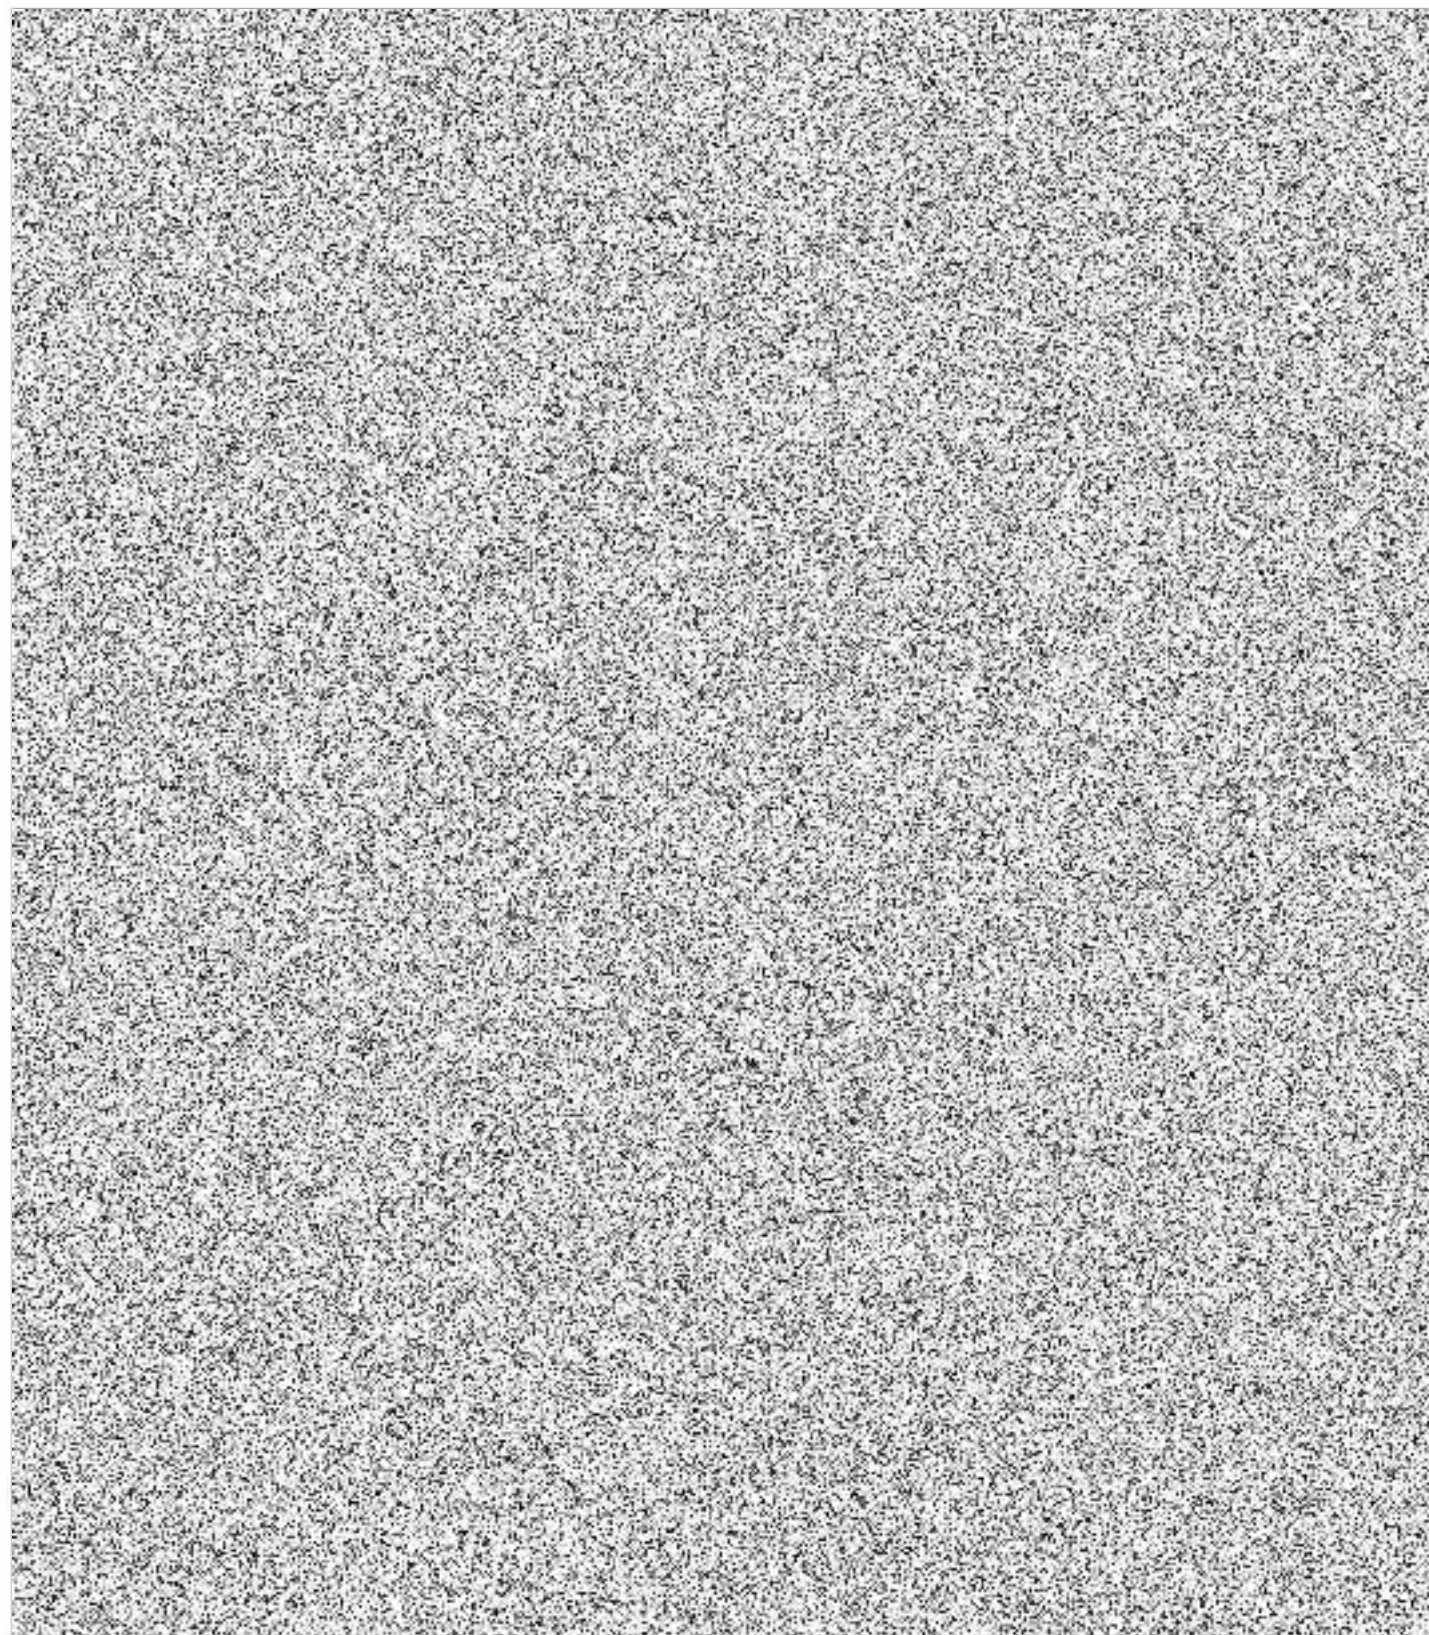


²¹ KUBÁT, Ondřej. § 2620. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023.

²² Dostupné z: <https://www.asociace-sos.cz/pro-spotrebitele/poradenstvi/smlouva-o-dilo/zmena-ceny-dila/>.

²³ Dostupné z: https://www.tzb-info.cz/docu/clanky/0041/004124_vseobecne_obchodni_podminky.pdf.


²⁴ PAVLÍČEK, Libor. Inflace a změna ceny. Soukromé právo [online]. 13. 5. 2022 [cit. 14. 12. 2023]. Dostupné z: www.aspi.cz.

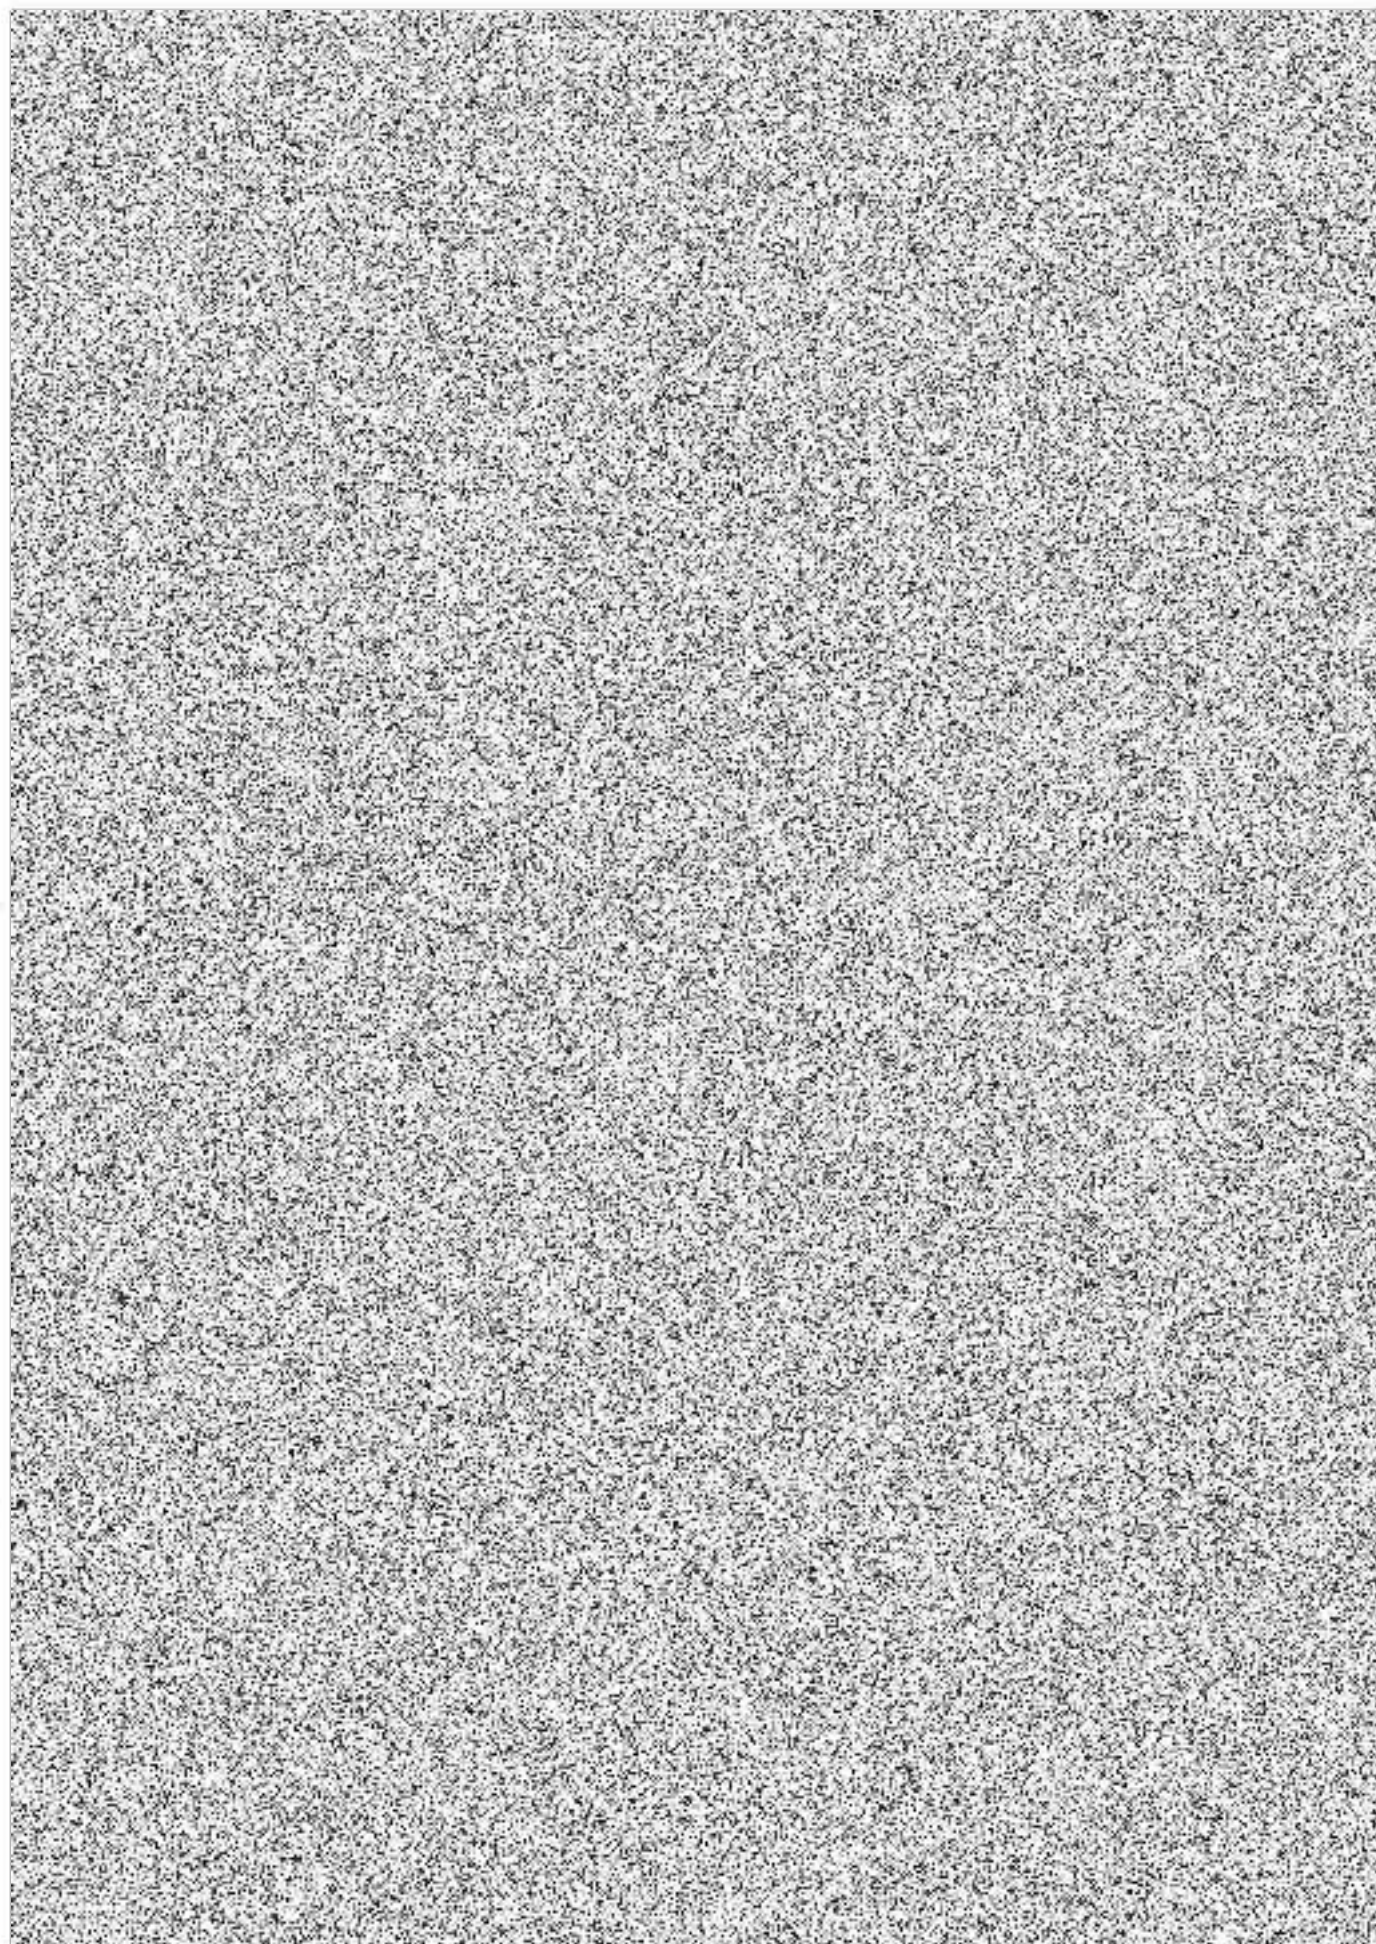


Důkazy: písemná zpráva žalované ze dne 7. 7. 2021 (příloha č. 29)
vyčíslení podstatné změny okolností – část 1 (příloha č. 24)
vyčíslení podstatné změny okolností – část 2 (příloha č. 25)

VI. Shrnutí


²⁵ KUBÁT, Ondřej. § 2620. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023.



rozsudek:

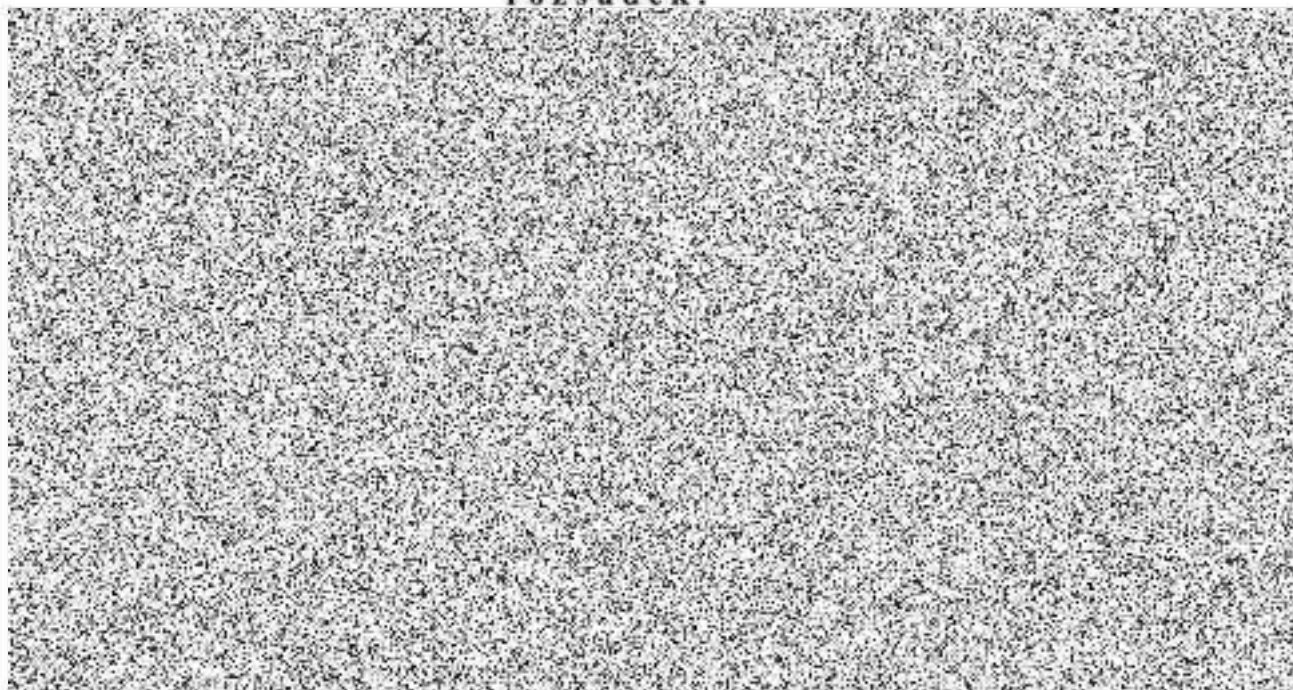

V Praze dne 22. 1. 2024



v plné moci za žalobce

Obvodnímu soudu pro Prahu 10

28. pluku 1553/29b

100 83 Praha 10

Ke sp. zn.:

V Praze dne 30. dubna 2024

Žalobce a): **GEOSAN GROUP a.s.**, IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III**Žalobce b):** **VISTORIA CZ a.s.**, IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Městooba právně zastoupeni  advokátem, ev. č. ČAK 
 společníkem TFP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7**Žalovaná:** **městská část Praha 10**, IČO 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašniceprávně zastoupena  advokátem, ev. č. ČAK 
společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1*o změnu závazku***Oznámení žalované o převzetí právního zastoupení
Žádost žalované o prodloužení lhůty k vyjádření k žalobě***Datovou schránkou**Přílohy: Plná moc pro  advokáta**Autorizovaná konverze pověření starosty Městské části Praha 10*

1. Městské části Praha 10 jako žalované bylo dne **10. 4. 2024** doručeno usnesení ze dne 8. 4. 2024, č.j. [REDACTED] kterým jí soud uložil, aby se do 20 dnů ode dne doručení usnesení písemně vyjádřila k žalobě.
2. Žalovaná soudu sděluje, že její zastoupení převzal Mgr. Marek Vojáček, advokát. Kopie plné moci a autorizovaná konverze pověření starosty Městské části Praha 10 jsou přiloženy k tomuto podání.
3. Vedle toho, žalovaná **zdvořile žádá o prodloužení lhůty** k vyjádření k žalobě, a to **do pátku 31. 5. 2024**, a to z následujících důvodů:
 - Právní zástupce žalované od žalované obdržel sadu podkladové dokumentace, kterou je třeba náležitě zanalyzovat.
 - Nelze přitom vyloučit, že bude třeba zajistit její doplnění.
 - Již nyní je přitom zřejmé, že některá skutková tvrzení žalobců jsou přinejmenším zavádějící či přímo nepravdivá. Náležité prověření skutkového stavu je proto zcela namístě.
 - Vedle toho bude nezbytné nahlédnout do soudního spisu.
 - Povaha žalované jakožto veřejnoprávní korporace vyžaduje adekvátní prostor pro interní projednání návrhu vyjádření k žalobě.

Děkuji.

Za městskou část Praha 10
[REDACTED] advokát
na základě plné moci

PLNÁ MOC

Městská část Praha 10, IČO: 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 (dále jen „Klient“), tímto zmocňuje



advokáta

zapsaného v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. [redacted] spolčovníka HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, IČO 26454807 (dále jen „Zástupce“).

aby Klienta zastupoval v řízení vedeném k datu této plné moci u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. [redacted] kde Klient vystupuje jako žalovaný a kde jako žalobci vystupují společnost **GEOSAN GROUP a.s.**, sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín, IČO: 28169522, a společnost **VISTORIA CZ a.s.**, sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, IČO: 25110977.

Zástupce je zejména oprávněn za Klienta jednat, přijímat doručované písemnosti, podávat návrhy, žaloby a žádosti, uzavírat smíry a narovnání, podávat řádné a mimořádné opravné prostředky a vzdávat se jich, zastupovat Klienta v řízeních o řádných a mimořádných opravných prostředcích a činit jakékoliv další úkony, které v souvislosti se shora uvedeným bude považovat za potřebné.

Zástupce je oprávněn ustanovit si za sebe dalšího zástupce, a pokud jich ustanoví více, je každý z nich oprávněn jednat samostatně.

Za Městskou část Praha 10

Podpis:



Jméno: Bc. Jakub Brzoň

Funkce: vedoucí odboru majetkoprávního

Datum: 24. 4. 2024

Podle ověřovací knihy ÚMČ Praha 10
poř.č. legalizace 1A/0474/2024
vlastnoručně podepsal/a

Jakub Brzoň, [redacted]

jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele

[redacted]

adresa místa trvalého pobytu


Občanský průkaz [redacted]

druh a číslo dokladu

Osvobozeno od poplatku dle §8 zák. 634/2004 Sb., o úř. [redacted]

V Praze 10 dne 25. 4. 2024

Legalizaci provedl/a
Markéta Eckhardtová



Zmocnění přijímám.



Podpis:

Jméno:

Datum: 26. 4. 2024



USNESENÍ

Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl soudkyní Mgr. Evou Přívrackou ve věci

žalobci:

a)GEOSAN GROUP a.s., IČO 28169522,

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,

zast.:



U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

b)VISTORIA CZ a.s., IČO 25110977,

Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město,

zast.:



U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

proti

žalované:

Městská část Praha 10, IČO 00063941,

Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice

o změnu závazku

takto:

Soud ukládá žalované: **Městská část Praha 10, IČO 00063941**, aby se ve lhůtě **30 dnů** ode dne doručení tohoto usnesení písemně vyjádřila ve věci samé k žalobě, která je připojena.

Ve vyjádření je žalovaná povinna uvést, zda nárok uplatněný v žalobě uznává, popřípadě zda nárok uznává jen zčásti nebo co do základu. Uzná-li nárok, rozhodne soud na tomto základě o věci samé (o její části nebo o jejím základu) rozsudkem pro uznání (§ 153a odst.1 o.s.ř.).

Jestliže žalovaná nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, je povina ve vyjádření vylicit rozhodující skutečnosti o věci samé, na nichž staví svoji obranu proti žalobě, a označit důkazy k prokázání svých tvrzení. K vyjádření musí připojit listiny, na něž se ve svém vyjádření odvolává.

Vyjádření je třeba předložit soudu ve **2** vyhotoveních.

Nemůže-li žalovaná podat ve stanovené lhůtě písemné vyjádření ve věci samé, je povinna před uplynutím stanovené lhůty sdělit soudu, jaký vážný důvod jí v tom brání. Na výzvu soudu je povinna tvrzený vážný důvod prokázat.

Jestliže se žalovaná bez vážného důvodu ve věci samé včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod jí v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti ní žalobou uplatňován, uznává. Soud proto ve věci samé rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst.3 o.s.ř.). Jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání (§ 153a odst. 4 o.s.ř.).

Nesplní-li povinná dobrovolně rozsudkem pro uznání uložené povinnosti, včetně povinnosti k náhradě nákladů řízení, může se oprávněný domáhat nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Praha 29. dubna 2024

Mgr. Eva Přívracká, v.r.
soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Aneta Hlaváčová

(O.s.ř. č. 077 - usnesení o uložení povinnosti žalovanému podat písemné vyjádření ve věci-114b)

Č.j.

USNESENÍ

Obvodní soud pro Prahu 10 rozhodl soudkyně Mgr. Evou Přívrackou ve věci

žalobce: **A/ GEOSAN GROUP a.s.**, IČO 28169522, U Nemocnice 430, 280
02 Kolín III

zast.: [redacted] U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

B/ VISTORIA CZ a.s., IČO 25110977, Revoluční 767/25, 110 00
Praha 1

zast.: [redacted] U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

proti

žalované: **Městská část Praha 10**, IČO 00063941, Vinohradská 3218/169, 100
00 Praha 10

zast.: [redacted] Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

změnu závazku,

takto:

Lhůta k vyjádření žalované k žalobě, s uvedením stanoviska ke každé sdělené skutečnosti a s doložením svých tvrzení, se prodlužuje k žádosti žalované podle § 55 o.s.ř. do 31. 5. 2024.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Praha 09. května 2024

Mgr. Eva Přívracká, v.r.
soudkyně

Doručenka datové zprávy

Předmět: [redacted] Usnesení čl.28, lh.31/5
ID zprávy: 1356844423
Datum a čas dodání: 10.05.2024 v 09:58:44
Datum a čas doručení: 10.05.2024 v 10:06:26

Adresát: [redacted] advokát, Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 11000 Praha 1, CZ
ID schránky: [redacted]

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: [redacted]
Naše spisová značka: [redacted]
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

10.05.2024 v 09:58:44 EV0: Datová zpráva byla podána.
10.05.2024 v 09:58:44 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
10.05.2024 v 10:06:26 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: [redacted] Usnesení čl.28, lh.31/5
ID zprávy: 1356844423
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 10.5.2024 v 9:58:44
Datum a čas doručení: 10.5.2024 v 10:06:26

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, CZ
ID schránky: 8aiabyn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: [redacted]
Naše spisová značka: [redacted]
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

V198006.PDF (164,87 kB)

Florentinum, recepce A
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika
Tel.: +420 255 000 111

Titanium Business Complex
Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 545 423 420

Centrum Zuckermandel
Žitkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900

Obvodnímu soudu pro Prahu 10

28. pluku 1553/29b

100 83 Praha 10

Ke sp. zn.:



V Praze dne 30. května 2024

Žalobce a): **GEOSAN GROUP a.s.**, IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Žalobce b): **VISTORIA CZ a.s.**, IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město

oba právně zastoupeni [redacted] advokátem, ev. č. ČAK [redacted]
společníkem TFP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Průhonu 1516/32,
170 00 Praha 7

Žalovaná: **Městská část Praha 10**, IČO 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice

právně zastoupena [redacted] advokátem, ev. č. ČAK [redacted]
společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

o změnu závazku


Vyjádření žalované k žalobě

Doručeno prostřednictvím datové schránky

Plná moc ve spise, přílohy dle textu a seznamu na poslední straně vyjádření

I. ÚVOD

1. Žalovaná byla soudem vyzvána, aby předložila vyjádření k žalobě. Žalovaná tak činí tímto podáním, a to ve lhůtě podle usnesení soudu ze dne 9. 5. 2024, č.j. [REDACTED]




II. SKUTKOVÉ OKOLNOSTI PŘÍPADU



Důkaz:

- *Smlouvou o dílo, vč. dodatků č. 1 až 5 a č. 7 až 10 (příloha č. 1)*

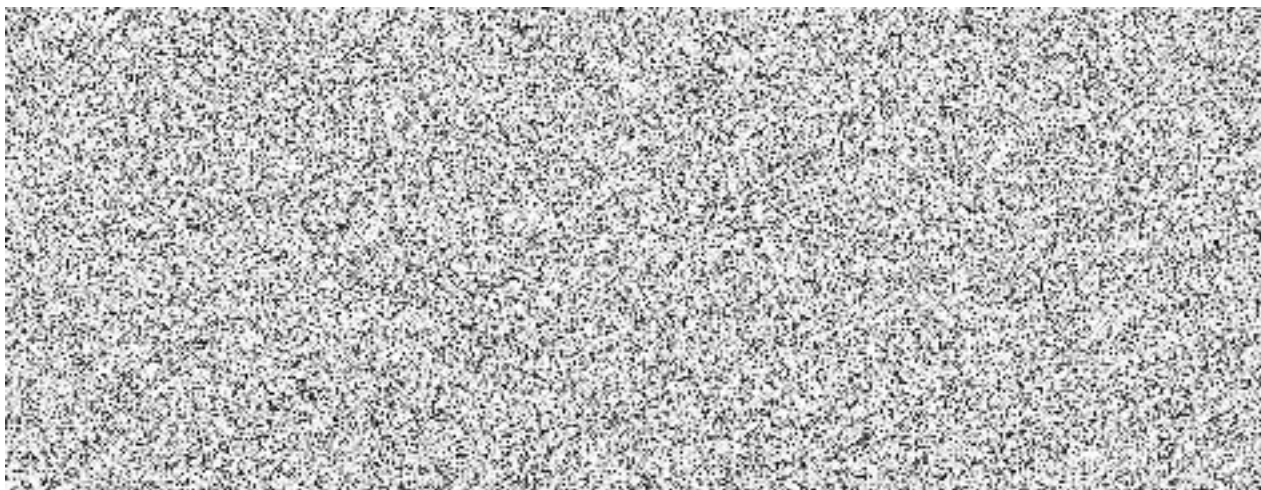


Důkaz:

- *Zápis z 11. schůze Rady městské části Praha 10 konané dne 13. 4. 2023 (příloha č. 2)*

¹ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.


² Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

III.

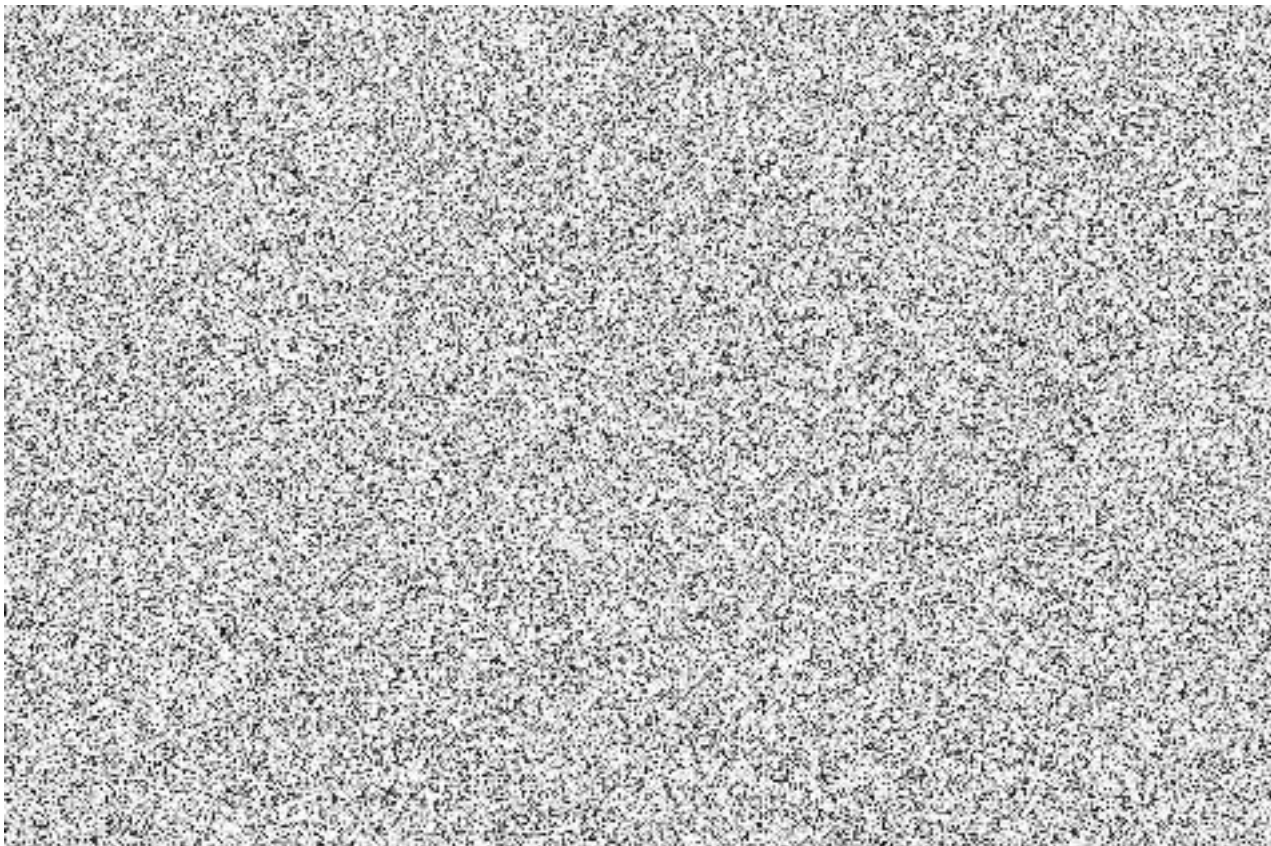

Důkaz:


- Smlouvou o dílo, vč. dodatků č. 1 až 5 a č. 7 až 10

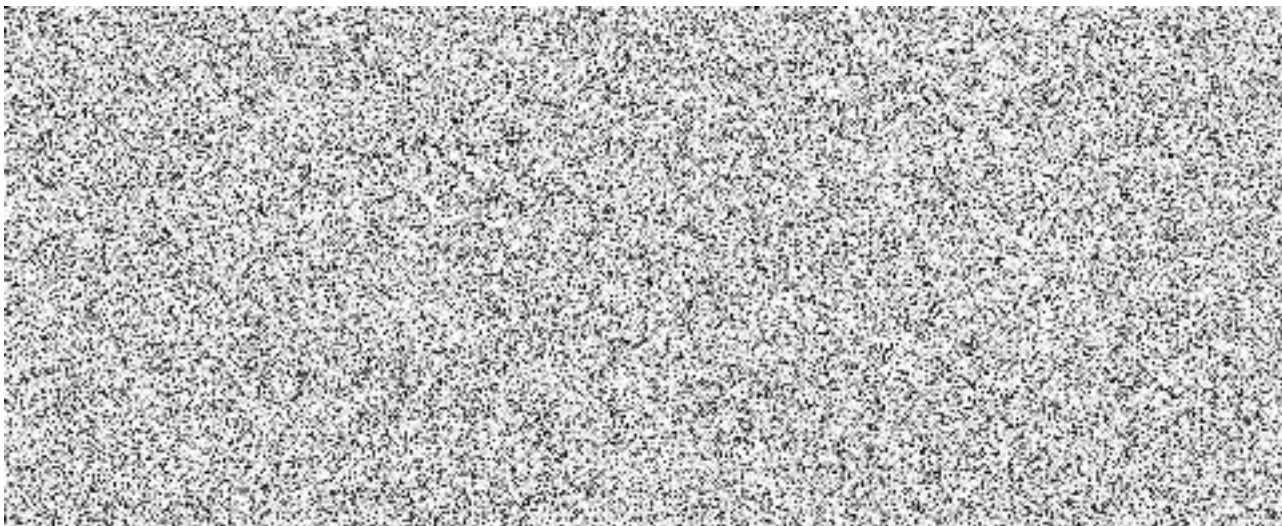


³ Viz např. odst. 23 žaloby.

⁴ Švestka, J., Dvořák, J., Fiala, J. a kol. Občanský zákoník: Komentář, Svazek VI, (§ 2521-3081). [Systém ASPI]. Wolters Kluwer [cit. 2024-5-22]. ASPI_ID KO89_f2012CZ. Dostupné z: www.aspi.cz. ISSN 2336-517X.


⁵ KUBÁT, Ondřej. § 2620 [Úprava ceny]. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023, marg. č. 9.

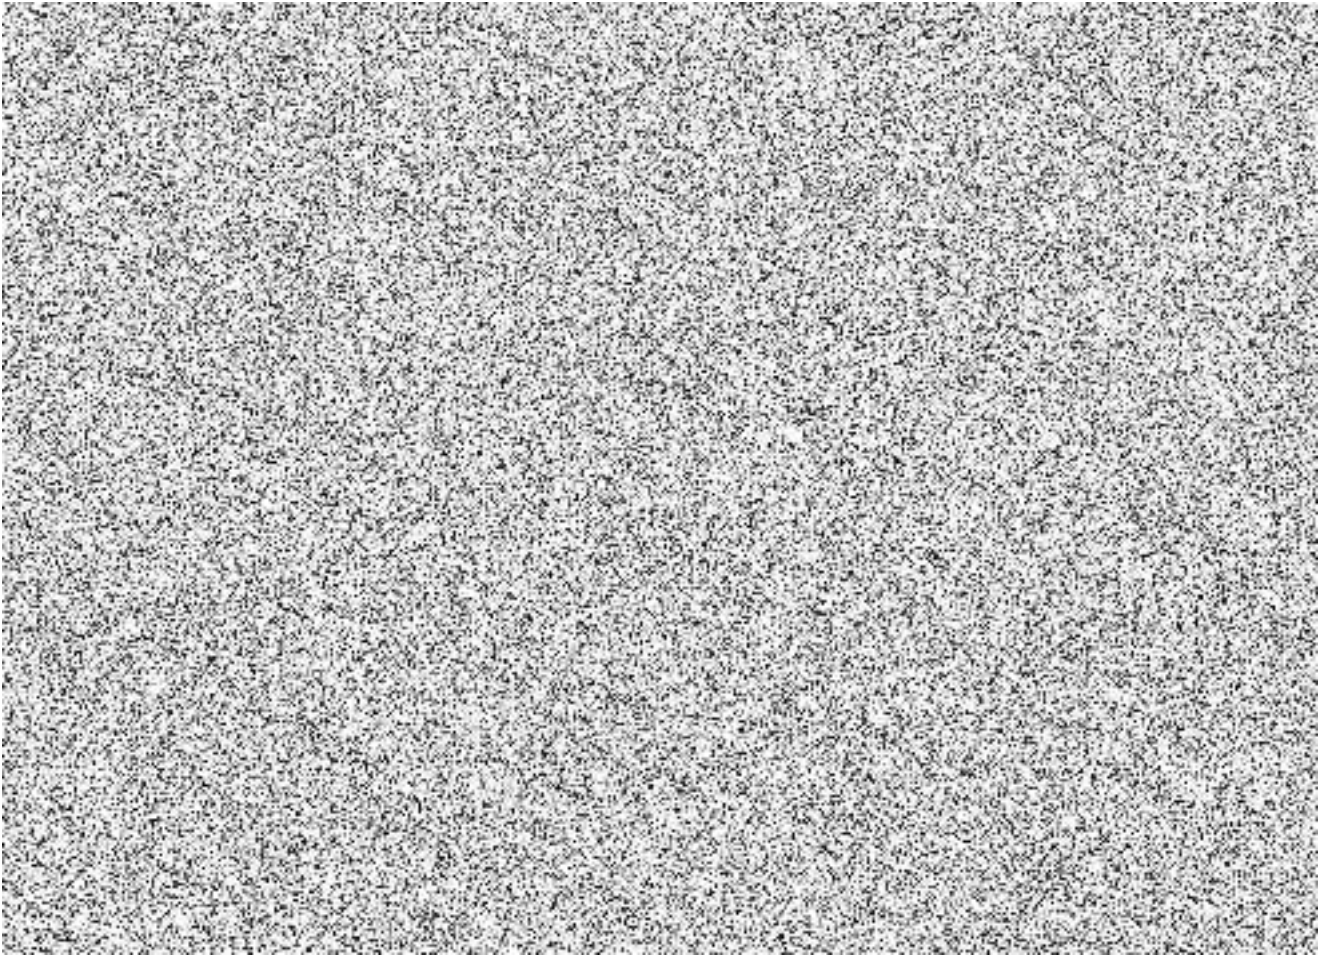


IV.

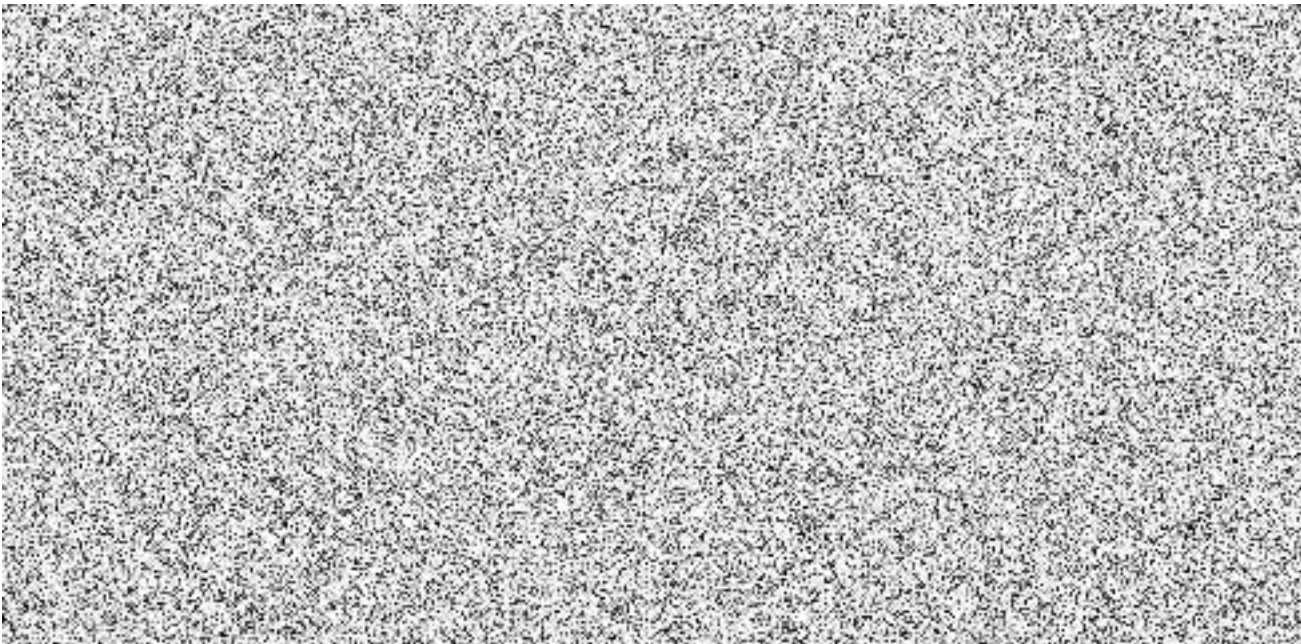

IV.1




IV.2

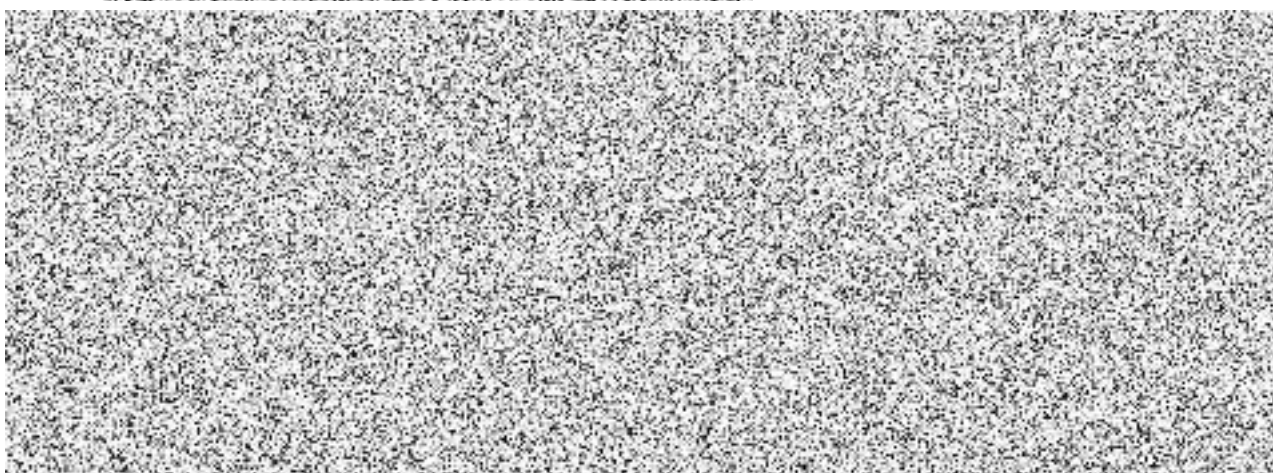

Důkaz:

- Výpisem z obchodního rejstříku žalobce a) (příloha č. 3)
- Výpisem z obchodního rejstříku žalobce b) (příloha č.4)

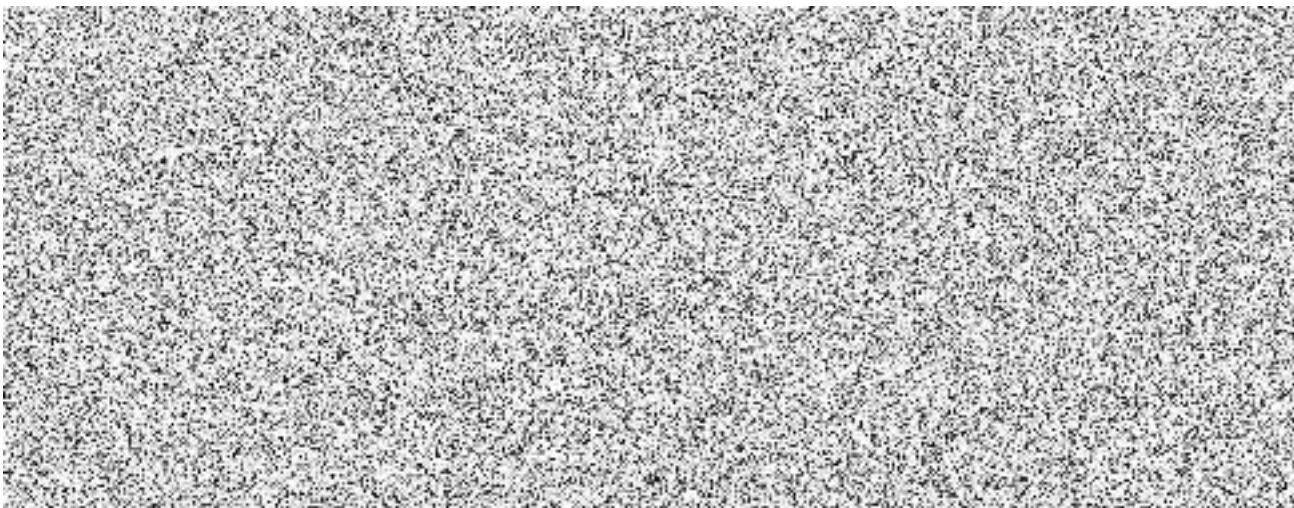


⁶ BEJČEK, Josef. Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, 2015, č. 7-8, str. 24-36.

⁷ Tamtéž.

IV.3


⁸ Tamtéž.

⁹ LASÁK, Jan. § 433 [Ochrana slabší strany]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 1653, marg. č. 3.: „*Posouzení, zda je v konkrétním případě určitá osoba slabší (smluvní) stranou, se bude vždy odvíjet od konkrétních skutkových okolností. Příliš široké vymezování slabší strany může podnikatelskou praxi nicméně zcela ochromovat. Pokud se například budeme pohybovat na terénu veřejných zakázek, je s veřejnými zakázkami zásadně spojeno to, že uchazeči o veřejnou zakázku jsou slabší stranou, protože se musí podvolit podmínkám veřejné zakázky, aby se jí mohli účastnit? Soudím, že pokud je veřejná zakázka zadávána postupem podle zákona o veřejných zakázkách, který je postaven na principech zásadní otevřenosti, transparentnosti a nediskriminace, pak je fakticky téměř vyloučeno, aby se na zakázku mohl aplikovat § 433 odst. 1.*“

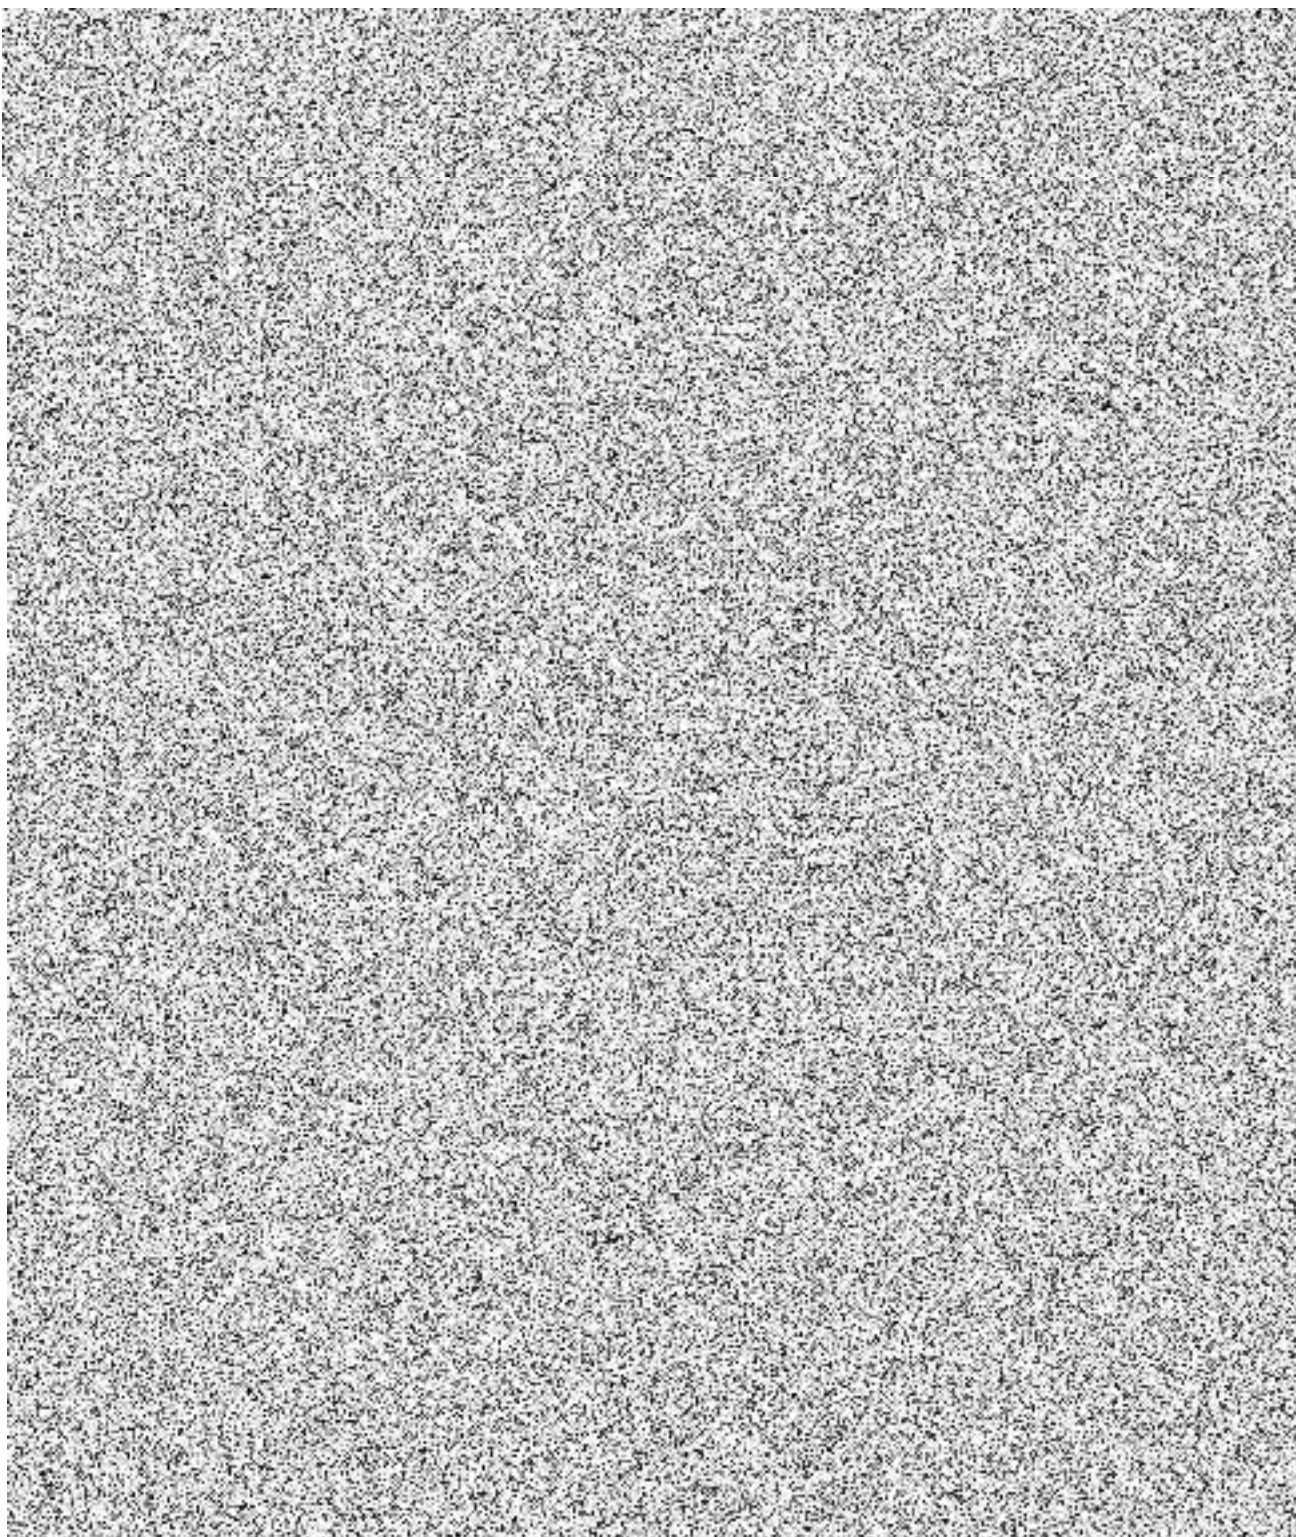

-
- ¹⁰ JANOUŠEK, Michal. § 1800 [Nečitelné, nesrozumitelné a nepřiměřené doložky]. In: PETROV, Jan, VÝTISK, Michal, BERAN, Vladimír a kol. Občanský zákoník. 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023, marg. č. 31–36.
- ¹¹ BEJČEK, Josef. Soukromoprávní ochrana slabšího obchodního partnera. Bulletin advokacie, 2015, č. 7-8, str. 24-36.

V.

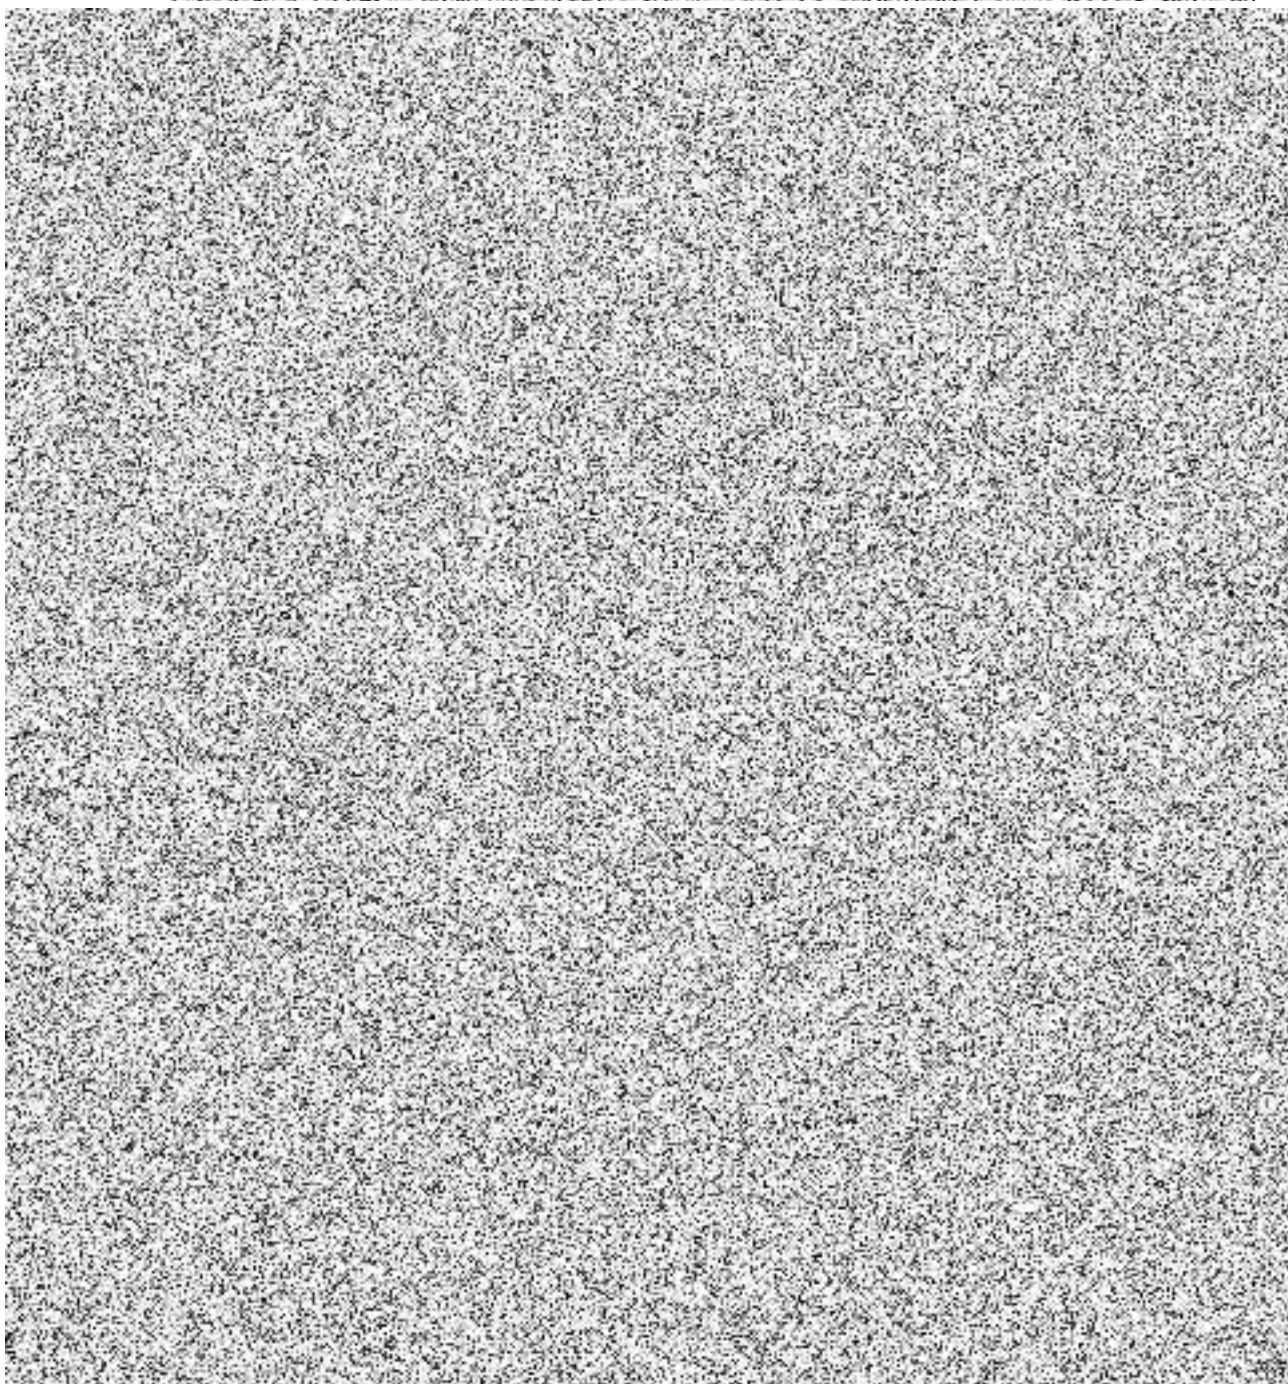


¹²

Dostupné zde: <https://www.epravo.cz/top/clanky/moznosti-zmeny-zavazku-ze-smlouvy-na-verejnou-zakazku-v-dusledku-objektivniho-navysemi-cen-na-trhu-113922.html>

VI. ZÁVĚREČNÝ NÁVRH ŽALOVANÉ

42. Ze shora uvedených důvodů proto žalovaná navrhuje, aby soud vydal následující

r o z s u d e k :



Za Městskou část Praha 10



advokát

na základě plné moci

Seznam příloh

1. *Smlouva o dílo č. 2021/OMP/0933 ze dne 17. 6. 2021 vč. dodatků č. 1 až 5 a č. 7 až 10*
2. *Zápis z 11. schůze Rady městské části Praha 10 konané dne 13. 4. 2023*
3. *Výpis žalobce a) z obchodního rejstříku*
4. *Výpis žalobce b) z obchodního rejstříku*

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 1365884692	
Odesílatel			
Název	advokát, Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1, CZ		
ID schránky		Typ schránky	
Příjemce			
Název	Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 1533/29b, 10000 Praha 10, CZ		
ID schránky	8aiabyn	Dodáno	30.5.2024 16:14:54
		Doručeno	
Obecné informace			
Věc	Vyjádření žalované k žalobě / Městská část Praha 10		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.			
Naše sp.zn.			
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	☐	Zakázat doruč.fikcí	☐
Stav zprávy	zpráva byla podána		
Přílohy			
20240526_MČPha10_Geosan_Vyjádření_k_žalobě.pdf		318 kb	
1._Smlouva_o_dílo_č._2021OMP0933_ze_dne_17._6._2021.pdf		10304 kb	
1a._Dodatek_č._1_ke_Smlouvě_o_dílo.pdf		495 kb	
1b._Dodatek_č._2_ke_Smlouvě_o_dílo.pdf		3593 kb	
1c._Dodatek_č._3_ke_Smlouvě_o_dílo.pdf		2491 kb	
1d._Dodatek_č._4_ke_Smlouvě_o_dílo.pdf		2268 kb	
1e._Dodatek_č._5_ke_Smlouvě_o_dílo.pdf		4591 kb	
1f._Dodatek_č._7_ke_Smlouvě_o_dílo.pdf		1750 kb	
1g._Dodatek_č._8_ke_Smlouvě_o_dílo.pdf		4620 kb	
1h._Dodatek_č._9_ke_Smlouvě_o_dílo.pdf		375 kb	
1i._Dodatek_č._10_ke_Smlouvě_o_dílo.pdf		352 kb	
2._Zápis_z_11._schůze_Rady_městské_části_Praha_10_konané_dne_13._4._2023.pdf		170 kb	
3._Výpis_žalobce_a)_z_obchodního_rejstříku.pdf		64 kb	
4._Výpis_žalobce_b)_z_obchodního_rejstříku.pdf		68 kb	

SMLOUVA O DÍLO
č. 2021/OMP/0933 (dále jen „smlouva“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10
zastoupený: Renatou Chmelovou, starostkou
IČO: 000 63 941
DIČ: CZ000 63 941
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-2000733369/0800
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí odboru majetkoprávního

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská
zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské smlouvy

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Společník: VISTORIA CZ a.s.
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČO: 251 10 977
DIČ: CZ25110977

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s.
č. účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800
(dále jen „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky užšího řízení na zadání veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu s názvem „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“, realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve kterém byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvýhodnější (dále jen „zadávací řízení“).
- 2.2. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě.

- 2.3. Účelem této smlouvy je výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská tak, aby byly zajištěny výchovně vzdělávací cíle dle školského zákona a další hygienické technologické a technické požadavky na prostory pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a další činnosti uvedené v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré stavební práce, dodávky a služby související se stavbou „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“, a to v souladu s projektovou dokumentací pro provedení stavby, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „**PD**“), položkovým rozpočtem, jenž tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „**položkový rozpočet**“), stavebním povolením, a dalšími pokyny objednatele (definované stavební práce, dodávky a služby dále také jen „**dílo**“).
- 3.3. Zhotovitel prověřil PD a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zhotovitel nejpozději do dne zahájení stavebních prací oznámí objednateli písemně veškeré zjištěné vady, nejasnosti a nesrovnalosti PD a dalších předaných podkladů, které zhotovitel mohl zjistit v rámci prověření PD před zahájením stavebních prací ve smyslu § 2594 OZ.
- 3.4. Zhotovitel je vázán pokyny objednatele k provádění díla. Za správnost a úplnost předané dokumentace má odpovědnost objednatel. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnost PD, pokynů a rozpor pokynů s PD a položkovým rozpočtem. V takovém případě je zhotovitel povinen současně navrhnout variantní způsob řešení provádění díla, či změnu díla s hodnocením dopadů navrhovaných změn díla (zejména na rozsah, kvalitu, termíny a cenu). Pokud má navrhovaná změna díla zahrnovat „vícepráce“, či „méněpráce“ dodá zhotovitel objednateli soupis těchto prací, dodávek a služeb.
- 3.5. Jakékoliv změny díla, či termíny provádění díla musí být schváleny objednatelům. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou rozumně očekávatelnou součinnost za účelem dodržení kontraktace změn této smlouvy dle ZZVZ.
- 3.6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci plnění této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle této smlouvy a bude zahrnovat mimo jiné i všechny nutné související stavební práce, zajištění nezbytných povolení, provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen „**BOZP**“) a požární ochrany (dále jen „**PO**“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9. Zhotovitel se zavazuje splnit veškeré podmínky stanovené stavebním povolením pro provedení stavby i podmínky dotčených správních úřadů. Zhotovitel zajistí vydání kolaudačního souhlasu za účelem užívání díla.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění je objekt v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4, 1537/7, 1538/1, 1538/4, 1538/8, Praha 10.

- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

- 5.1.1. Převzetí staveniště – nejpozději do 14 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo; objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně objednatele posunout termín převzetí staveniště písemným dokumentem doručeným zhotoviteli, pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např., pokud u objednatele nastaly jiné nepředvídané okolnosti, pro které není schopen včas uvolnit staveniště díla k realizaci díla; v takových případech je Objednatel povinen písemně oznámit Zhotoviteli, v jakém termínu bude provádění díla zahájeno (nový termín zahájení provádění díla); tento termín může být prodloužen maximálně o 6měsíců.

Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla v den, na nějž je stanoveno datum převzetí staveniště, a poté s prováděním díla postupovat v souladu se zavedenou odbornou praxí a dle Harmonogramu prací;

- 5.1.2. Provedení díla – nejpozději do 20 měsíců ode dne převzetí staveniště;
- 5.1.3. Likvidace staveniště – nejpozději do 15 kalendářních dnů po provedení díla dle čl. 5.1.2. této smlouvy;
- 5.1.4. Podání návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí – nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla dle čl. 5.1.2. této smlouvy;
- 5.1.5. Zajištění kolaudačního rozhodnutí – nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne provedení díla dle čl. 5.1.2. této smlouvy;

- 5.2. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

- 5.3. Přílohou č. 3 této smlouvy je Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem, který obsahuje časový plán provádění díla a jsou v něm vyznačeny všechny termíny dle čl. 5.1 této smlouvy a postupy s nimi související. Součástí harmonogramu je také předpokládané měsíční plnění. Zhotovitel se zavazuje tento harmonogram dodržovat.

- 5.4. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zprávy o průběžném stavu provádění díla.

- 5.5. Doba plnění se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou:

- 5.5.1. trvá překážka spočívající v klimatických podmínkách, které objektivně znemožňují zhotoviteli provádění stavebních prací; za nepříznivé klimatické podmínky se zejména považuje situace, kdy alespoň tři po sobě následující dny průměrná denní teplota v Praze je nižší než minus 5 stupňů Celsia;
- 5.5.2. bylo provádění stavebních prací objektivně zdrženo v důsledku nepředvídatelných legislativních změn nebo živelní události;
- 5.5.3. bylo provádění stavebních prací objektivně zdrženo v důsledku porušení povinností objednatele obsažených v této smlouvě;
- 5.5.4. bylo provádění stavebních prací objektivně zdrženo v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.

- 5.6. V případě, kdy zhotovitel nebude moci získat příslušné rozhodnutí ve lhůtě dle čl. 5.1.5 navzdory tomu, že řádně, v souladu s právními předpisy a s odbornou péčí připravil a podal žádost o vydání takového rozhodnutí a řádně a s odbornou péčí postupoval v řízení o získání rozhodnutí prodlouží se termín plnění dotčený takovou objektivní překážkou získání rozhodnutí o dobu jejího trvání.

- 5.7. O vzniku a ukončení okolností uvedených v čl. 5.5 smlouvy musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin od okamžiku, kdy se o nich dozvěděl, nebo dozvědět měl a mohl.

6. Cena a platební podmínky

- 6.1. Cena za provedení činností zhotovitele dle této smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta v celkové výši 128 926 466,58 Kč bez DPH (dále jen „**cena**“).
- 6.2. Cena zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla a splnění dalších povinností zhotovitele dle této smlouvy. Cena je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 6.3. Cenu díla je možné změnit pouze v případech, kdy se při realizaci díla zjistí:
- 6.3.1. skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, a které mají na cenu díla vliv, nebo
 - 6.3.2. skutečnosti odlišné od projektové dokumentace tvořící Přílohu č. 1 této smlouvy (např. neodpovídající geologické údaje).
- 6.4. V případě změny ceny díla podle článku 6.3 této smlouvy se její výše stanoví dle uvedené ceny konkrétní práce či materiálu uvedeného v položkovém rozpočtu tvořící Přílohu č. 2 této smlouvy. V případě že v položkovém rozpočtu nebudou předmětné práce, dodávky, či služby obsaženy, nacení smluvní strany změnu díla podle cen uvedených v aktuální cenové soustavě ÚRS.
- 6.5. Na sjednanou cenu nemá vliv změna kurzu české měny vůči jiným měnám, ani případné zvýšení cen materiálů a dalších prostředků (včetně pracovních sil) potřebných k provedení díla v průběhu plnění této Smlouvy. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 OZ.
- 6.6. Podrobnější specifikace ceny je obsažena v položkovém rozpočtu. V případě rozporu stanovené ceny dle tohoto článku smlouvy a položkového rozpočtu má přednost cena dle tohoto článku smlouvy.
- 6.7. Objednatel bude zhotoviteli hradit sjednanou cenu na základě měsíčních faktur. Zhotoviteli každý měsíc vznikne právo na zaplacení části ceny, která odpovídá ceně stavebních prací, dodávek a služeb provedených v uplynulém kalendářním měsíci, zaznamenaných v měsíčním soupisu provedených prací a odsouhlasených pověřenou osobou na straně objednatele. Zhotovitel nejpozději k 5. dni každého kalendářního měsíce předloží objednateli ke schválení měsíční soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k měsíčnímu soupisu provedených prací vyjádřit do 3 pracovních dní s tím, že buď odsouhlasí jeho správnost, nebo uvede, které položky v soupisu nebyly řádně provedeny (v takovém případě v daném rozsahu souhlas odepře). Dílčí faktury budou vystavovány do celkové výše 90 % ceny a jejich přílohou bude vždy odsouhlasený soupis měsíčních prací. Na zbývající část ceny (10 %) (dále jen „**zbývající část ceny**“) vystaví zhotovitel fakturu ke dni předání díla. Splatnost zbývající části ceny nastane nejdříve 30 dnů po předání podepsaného předávacího protokolu, z něhož bude vyplývat, že byly odstraněny všechny vady a nedodělky zjištěné při převzetí díla, protokolu o vyklizení a předání staveniště dle čl. 9.10 této smlouvy, dokladu o úhradě spotřebovaných médií dle čl. 9.10 této smlouvy a dokladu o předání kolaudačního rozhodnutí.
- 6.8. Právo na zaplacení zbývající části ceny vznikne také v případě, pokud zhotovitel předá objednateli bezpodmínečnou a neodvolatelnou finanční zárukou znějící na částku ve výši 10 % z ceny bez DPH, ve prospěch objednatele, která bude vystavena bankou, schválenou předem Objednatelem (dále jen „**Finanční záruka**“). Finanční záruka musí mít platnost stanovenou nejméně 3 měsíce po datu předpokládaného předání díla podle časového harmonogramu tvořícího Přílohu č. 3 této smlouvy (případně může být vystavena na dobu kratší a zhotovitel má pak povinnost vždy nejméně 30 dnů před skončením její platnosti zajistit její prodloužení a toto prokázat objednateli, a neučiní-li tak, má objednatel právo požadovat zaplacení celé částky Finanční záruky). Finanční záruka bude vrácena zhotoviteli do 30 dnů ode dne uplynutí její platnosti.
- 6.9. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH“. Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Sazba DPH bude účtována dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Dodavatel je povinen vystavit, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

- 6.10. Vyúčtování ceny, resp. její dílčí části, provede zhotovitel na základě vystavení faktury – daňového dokladu, splňujícího veškeré podstatné náležitosti dle zvláštních právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Kontaktní osoba pro fakturaci na straně objednatele je vedoucí referátu ekonomiky OMP Ing. Jan Jirásek, jan.jirasek@praha10.cz, tel. 267 093 593.
- 6.11. Pokud není uvedeno ve Smlouvě jinak, je splatnost faktur do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.12. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené článku 6.7, 6.9, 6.10 této smlouvy, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.

7. Prohlášení zhotovitele

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že:
- 7.1.1. je řádně založenou a existující společností v souladu s právními předpisy [České republiky]¹ a získal všechny potřebné souhlasy a povolení (včetně interních), které mu umožní plnit tuto smlouvu;
- 7.1.2. závazky, které vyplývají z této smlouvy, představují platný a vynutitelný závazek zhotovitele;
- 7.1.3. výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy nepředstavuje porušení:
- 7.1.3.1. žádných závazných právních předpisů;
- 7.1.3.2. zakladatelských ani jiných interních dokumentů zhotovitele; ani
- 7.1.3.3. žádné povinnosti, které zavazují zhotovitele nebo které se vážou k jeho majetku nebo příjmům;
- 7.1.4. veškeré informace, které poskytl objednateli v rámci zadávacího řízení, jsou pravdivé a nikoli zavádějící;
- 7.1.5. ke dni uzavření této smlouvy nebyl vznesen žádný nárok proti zhotoviteli, neprobíhá žádné soudní, rozhodčí ani správní řízení ani spor řešený jiným způsobem, jež by se mohly nepříznivě dotknout schopnosti zhotovitele plnit jeho povinnosti vyplývající ze smlouvy;
- 7.1.6. ke dni uzavření této smlouvy nemá žádné závazky, jejichž splnění by mělo nepříznivý vliv na jeho schopnost plnit povinnosti vyplývající ze smlouvy;
- 7.1.7. předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným;
- 7.1.8. se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, a potvrzuje, že je po odborné stránce schopen dílo realizovat způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou, je seznámen s účelem této smlouvy a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu smlouvy a naplnění účelu této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro provedení díla za dohodnutou cenu.

¹ V případě, že dodavatel nebude společností (právníckou osobou) založenou a existující podle práva České republiky, bude oprávněn text odpovídajícím způsobem upravit tak, aby reflektoval jeho právní formu a právní řád, podle kterého byl založen a kterým se řídí.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1 nebo 9.12 této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dle bodu 10.4.6 této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.1. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.2. Pokud je objednatel v prodlení se zaplacením řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednadvacátým dnem požadovat úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.4. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.5. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
- 8.6. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 11.1 nebo 11.2. této smlouvy je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 8.7. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 12.1 nebo 12.2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 8.8. Objednatel je oprávněn jednostranně započítat své splatné pohledávky vůči pohledávkám zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem.

9. Realizace díla, práva a povinnosti

- 9.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích či na pozemcích sousedících.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 9.2.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v této smlouvě, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních

a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel, zhotovitel bude při realizaci díla pořizovat fotodokumentaci provádění stavebních prací;

- 9.2.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR;
- 9.2.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti;
- 9.2.4. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín;
- 9.2.5. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele;
- 9.2.6. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele, zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- 9.2.7. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
- 9.2.8. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele (stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla;
- 9.2.9. vyzve objednatel k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem do stavebního deníku s alespoň třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel;
- 9.2.10. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště;
- 9.2.11. doloží ke kontrole k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací;
- 9.2.12. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.3. Objednatel se zavazuje:
 - 9.3.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 14 dní od účinnosti této smlouvy. O předání staveniště bude stranami sepsán zápis, který podepíší zástupce objednatele a zástupce zhotovitele. Staveniště zřizuje zhotovitel, a to v souladu s dokumentací předanou Objednatelům;

- 9.3.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá;
- 9.3.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací;
- 9.3.4. v případech kdy to bude pro plnění povinností zhotovitele potřeba, vystavit pro konkrétní právní jednání jménem objednatele plnou moc a poskytnout jinou nezbytnou součinnost;
- 9.3.5. na základě výzvy zhotovitele převzít kolaudační rozhodnutí.
- 9.4. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny, a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Na každém kontrolním dnu podá Zhotovitel Objednateli zprávu o postupu provádění díla, včetně posouzení, jestli provádění díla probíhá v souladu s harmonogramem prací. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku).
- 9.5. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 9.6. Mimo zástupce objednatele dle této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 9.7. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
- 9.8. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby dodržovat předpisy týkající se BOZP, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 9.9. Zhotovitel zajistí připojení k inženýrským sítím veřejných služeb mimo staveniště a bude nést veškeré náklady, které v této souvislosti vzniknou a veškeré náklady odběru elektrické energie, plynu a vody a vypouštění odpadní vody vzniklé v souvislosti s prováděním stavby. V případě potřeby je zhotovitel povinen zajistit potřebné uzavírky nebo objízďky na pozemních komunikacích a zábory veřejného prostranství podle DIR a zajistí si k tomu potřebná povolení.
- 9.10. Zhotovitel je povinen v termínu uvedeném v této smlouvě v čl. 5.1.3 zlikvidovat staveniště, odstranit jeho vybavení, veškeré odpady a uvést prostory staveniště do původního stavu. O vyklizení a předání staveniště zpět objednateli sepiší smluvní strany protokol.
- 9.11. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě pokrývající veškeré činnosti Zhotovitele podle této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 100 % ceny dle čl. 6 této smlouvy.
- 9.12. Zhotovitel se dále zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu plnění závazků ze smlouvy pojištění předmětu plnění smlouvy tzv. all risk pojištění (stavebně montážní pojištění), přičemž limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy nesmí být nižší než 100 % ceny dle čl. 6 této smlouvy. Na požádání objednatele je

zhotovitel povinen kdykoli do sedmi dnů předložit písemné doklady (zejm. pojistné smlouvy nebo pojistné certifikáty) prokazující, že Zhotovitel plní povinnost dle tohoto odstavce.

- 9.12.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději do 30 dnů po uzavření této smlouvy jako jistotu na řádné plnění svých povinností dle této smlouvy při realizaci díla bankovní záruku ve výši 5% z ceny díla v Kč bez DPH sjednané smluvními stranami v 6.1 této smlouvy. Bankovní záruka bude vydána bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při neplnění jednoho či více závazků zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností vyplývajících z této bankovní záruky. Platnost bankovní záruky bude do 15. dne po sjednaném termínu odstranění veškerých vad a nedodělků. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna jednorázově po uplynutí této lhůty. V případě, že je bankovní záruka vystavena na období kratší, než je doba plnění, dle čl. 5.1.2 této smlouvy, nejméně však na dobu jednoho roku, je Zhotovitel povinen nejpozději třicet dnů před ukončením její účinnosti doložit Objednateli prodloužení její účinnosti nejméně o další rok či vystavení nové bankovní záruky nejméně na další rok, a to za stejných podmínek.
- 9.13. Objednatel je dále oprávněn pověřit jakoukoli třetí osobu výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla, která bude oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí obecně závaznými právními předpisy a případně touto smlouvou. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla jmenuje Objednatel Jmenování či odvolávání koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla nepodléhá souhlasu Zhotovitele.

10. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 10.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 10.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech;
- 10.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
- 10.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla;
- 10.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele;
- 10.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 10.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 10.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
- 10.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- 10.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 10.4. Dílo, je v celém rozsahu provedeno dokončením a protokolárním předáním. Dokončením díla se rozumí předvedení realizovaných stavebních prací, dodávek a služeb v souladu s touto smlouvou a předvedení, že

slouží požadovanému účelu. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán předávací protokol, který bude obsahovat zejména:

- 10.4.1. údaje o smluvních stranách a osobách podílejících se na převzetí díla;
- 10.4.2. popis díla a jeho lokaci;
- 10.4.3. dohodu o způsobu vyklizení staveniště a termín vyklizení staveniště;
- 10.4.4. seznam předaných dokladů;
- 10.4.5. prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- 10.4.6. seznam vad a nedodělků, způsob a termín jejich odstranění;
- 10.4.7. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů, fotodokumentace díla;
- 10.4.8. podpisy zástupců smluvních stran;

Podpisem předávacího protokolu, ze kterého vyplývá, že objednatel dílo přejímá, je dílo provedeno.

- 10.5. Součástí závazku provést dílo dle této smlouvy je dále zkompleťované předání:

- 10.5.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DPS) ve 3 vyhotoveních (paré) v tištěné formě, v DPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné);
- 10.5.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny;
- 10.5.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě;
- 10.5.4. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění;
- 10.5.5. kopie platných záručních listů;
- 10.5.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy, podmínky údržby;
- 10.5.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- 10.5.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU;
- 10.5.9. další doklady obsažené ve správních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy;
- 10.5.10. doklady o uložení sutě, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů;
- 10.5.11. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.

- 10.6. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným zástupcem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělkami, o převzetí opravených vad a odstraněných nedodělků bude sepsán předávací protokol analogicky k dílu jako k celku. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

- 10.7. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců pro veškeré stavební práce, a to ode dne předání bezvadného díla objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a

doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. Pokud je součástí díla dodávka věcí, zařízení či samostatných technologií, které mají výrobcem stanovenou záruku kratší než 60 měsíců, poskytuje zhotovitel objednateli záruku na tyto výrobky po dobu 24 měsíců (pro spotřební zboží platí ustanovení OZ o záruční době).

- 10.8. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 10.9. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 20 dnů od doručení reklamace. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 20 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 10.10. V případě, že se jedná o vady neodstranitelné, pak má objednatel nárok požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu z ceny díla.
- 10.11. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.
- 10.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 10.13. Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku.
- 10.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 10.9 tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.
- 10.15. Ostatní práva z vadného plnění objednatele nejsou tímto článkem dotčena.
- 10.16. O předání kolaudačního rozhodnutí vyhotoví smluvní strany zápis.

11. Poddodavatelé

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 4 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 4 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 11.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.

- 11.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy.

12. Realizační tým

- 12.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 5 smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „**Realizační tým**“).
- 12.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 5 smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
- 12.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy.

13. Zástupci smluvních stran a důvěrné informace

- 13.1. Veškeré písemnosti doručované podle této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, jedné ze stran druhé straně, budou doručovány některým z následujících způsobů:
- 13.1.1. osobním předáním písemnosti;
- 13.1.2. e-mailem;
- 13.1.3. doručením prostřednictvím pošty či kurýra.
- 13.2. Kontaktní osoby a adresy pro doručování:
- 13.2.1. Ve věcech objednatele:
- a) Ve věcech smluvních:
Email: tomas.urbanek@praha10.cz
K rukám: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP
- b) Ve věcech ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo:
Jméno a příjmení: Ing. Jan Jirásek
Email: jan.jirasek@praha10.cz
- 13.2.2. Ve věcech zhotovitele:
- a) Ve věcech smluvních, stavebních a technických
Jméno a příjmení: Ing. Kamil Vykydal

Tel. kontakt: [REDACTED]

Adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

Email: kamil.vykydal@ggcz.eu

b) Ve věcech vadného plnění a způsobené škody

Jméno a příjmení: Ing. Kamil Vykydal

Tel. kontakt: [REDACTED]

Adresa: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

Email: kamil.vykydal@ggcz.eu

13.3. Jakákoliv písemnost bude považována za doručenou:

- 13.3.1. je-li doručováno osobním předáním písemnosti, v okamžiku, kdy zástupce adresáta (druhé strany) potvrdí převzetí písemnosti, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít;
 - 13.3.2. je-li doručováno e-mailem, v okamžiku potvrzení o doručení daného e-mailu;
 - 13.3.3. je-li doručováno prostřednictvím pošty či kurýrní služby, v okamžiku, kdy zástupce druhé strany převzal zásilku, popřípadě v okamžiku, kdy zástupce adresáta odmítl zásilku převzít.
- 13.4. Obě strany jsou oprávněny měnit své adresy (e-mail) pro doručování; v takovém případě je druhá strana povinna doručovat na nově uvedenou adresu (e-mail), a to od prvního následujícího pracovního dne po dni, kdy této straně byla změna prokazatelně oznámena. Změna kontaktní adresy nevyžaduje uzavření dodatku, ale pouze jednostranné oznámení druhé smluvní straně.
- 13.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl nebo které objednatel označil za důvěrné (dále jen „**Důvěrné informace**“).
- 13.6. Zhotovitel je povinen přijmout opatření k ochraně Důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být Zhotovitelem použity výhradně k plnění smlouvy. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z Důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze Smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.
- 13.7. Zhotovitel je rovněž povinen chránit osobní údaje. Pro případ, že se v rámci plnění předmětu smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, bude je zhotovitel ochraňovat a nakládat s nimi plně v souladu s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. Strany se v případě kontaktu s osobními údaji ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů zavazují uzavřít dodatek ke smlouvě spočívající v dohodě o zpracování osobních údajů. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění smlouvy dostane do kontaktu s údaji objednatele vyplývajících z jeho provozní činnosti, tyto údaje v žádném případě nezneužít, nezměnit ani jinak nepoškodit ztratit či znehodnotit.

14. Ukončení smlouvy

14.1. Objednatel je oprávněn od smlouvy (nebo její dílčí části) odstoupit:

- 14.1.1. v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem, přičemž za podstatné porušení smlouvy se bude považovat zejména, nikoliv však výlučně:
 - 14.1.1.1. prodlení zhotovitele s převzetím stanoviště nebo zahájení stavebních prací delší než 15 dnů;
 - 14.1.1.2. prodlení zhotovitele se splněním povinnosti podle článku 9.10, nebo 9.11, nebo 9.12 této Smlouvy po dobu delší než 15 dní;

- 14.1.1.3. bylo-li zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, pokud zhotovitel nepředloží objednateli dostatečné záruky, že není v úpadku, nebo hrozícím úpadku;
- 14.1.1.4. uvedl-li zhotovitel v zadávacím řízení nepravdivé údaje, které měly, nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele;
- 14.1.2. zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, a to za předpokladu, že objednatel vyzve zhotovitele k sjednání nápravy a zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené době, pokud takové porušení povinností zhotovitele povede k podstatnému porušení smlouvy nebo k ohrožení řádného provádění díla jako celku.
- 14.1.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 60 dnů.
- 14.1.4. Ustanoveními této smlouvy není dotčeno právo smluvních stran ukončit trvání smluvního vztahu rovněž na základě příslušných ustanovení závazných předpisů z důvodu porušení povinností některou ze smluvních stran.
- 14.1.5. V případě předčasného ukončení smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli maximální nezbytnou součinnost tak, aby objednateli nevznikla škoda.
- 14.2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.3. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 15.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 15.3. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů.
- 15.4. Smlouva je se vyhotovuje a podepisuje elektronicky.
- 15.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.6. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty 10 let od ukončení plnění. Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.
- 15.7. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha

10, a to usnesením Rady městské části Praha 10 č. 321 ze dne 4. 5. 2021 a usnesením Rady městské části Praha 10 č. 380 ze dne 18. 5. 2021

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet
Příloha č. 3: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 5: Realizační tým

Místo: Praha

Za objednatele:

**Tomáš
Urbánek**

Digitálně podepsal
Tomáš Urbánek
Datum: 2021.06.17
14:42:16 +02'00'

Jméno: Mgr. Tomáš Urbánek
Funkce: vedoucí odboru majetkoprávního

Místo: Praha

Za zhotovitele:



Jméno: 
Funkce: pověřená osoba
na základě pověření a společenské smlouvy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08_2020_n

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

70 857 819,34

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	70 857 819,34	14 880 142,06
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

85 737 961,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08_2020_n

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Místo: Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		70 857 819,34	85 737 961,40
SO 01	Příprava území	510 466,71	617 664,72
SO 02	Pavilon A	22 464 216,26	27 181 701,67
SO 02.1	ASŘ	17 112 272,61	20 705 849,86
SO 02.2	ZTI	1 569 131,13	1 898 648,67
SO 02.2.1	ZTI - pavilon A - zemní práce	387 509,05	468 885,95
SO 02.3	UT	828 281,01	1 002 220,02
SO 02.4	VZT	683 215,06	826 690,22
SO 02.5	Slaboproud	328 692,22	397 717,59
SO 02.6	Silnoproud	1 039 183,02	1 257 411,45
SO 02.7	MaR	205 819,44	249 041,52
SO 02.8	Gastro	310 112,72	375 236,39
SO 03	Hospodářský pavilon	23 600 550,25	28 556 665,80
SO 03.1	ASŘ	12 810 908,88	15 501 199,74
SO 03.2	ZTI	1 360 762,71	1 646 522,88
SO 03.2.1	ZTI - zemní práce	788 871,96	954 535,07
SO 03.3	UT	1 607 933,11	1 945 599,06
SO 03.4	VZT	2 166 812,13	2 621 842,68

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 03.5	Slaboproud	557 736,13	674 860,72
SO 03.6	Silnoproud	1 234 638,78	1 493 912,92
SO 03.7	MaR	295 028,74	356 984,78
SO 03.8	Gastro	2 777 857,81	3 361 207,95
SO 04	Komunikace a zpevněné plochy	2 356 411,34	2 851 257,72
SO 05	Venkovní kanalizace - přípojka	576 237,86	697 247,81
SO 05	Venkovní kanalizace - přípojka	289 569,00	350 378,49
SO 05.1	Venkovní kanalizace - přípojka - zemní práce	286 668,86	346 869,32
SO 06	Venkovní kanalizace - areálový rozvod	3 092 773,25	3 742 255,63
SO 06	Venkovní kanalizace - areálový rozvod	929 605,83	1 124 823,05
SO 06.1	Venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce	2 163 167,42	2 617 432,58
SO 07	Venkovní vodovodní přípojka	777 583,12	940 875,58
SO 07.1	Vodoměrná šachta	360 314,24	435 980,23
SO 07.2	Venkovní vodovod - přípojka - zemní práce	170 248,99	206 001,28
SO 07.3	Venkovní vodovod - přípojka	247 019,89	298 894,07
SO 08	Venkovní vodovod - areálový rozvod	837 182,18	1 012 990,44
SO 08	Venkovní vodovod - areálový rozvod	402 868,24	487 470,57
SO 08.1	Venkovní vodovod - areálový rozvod - zemní práce	434 313,94	525 519,87
SO 11	Silnoproud areálové rozvody	416 717,91	504 228,67
SO 13	Veřejné osvětlení	245 479,94	297 030,73
SO 14	Sadovnické úpravy	1 146 028,90	1 386 694,97
SO 14.1	Sadovnické úpravy - ošetření ponechaných dřevin	34 405,49	41 630,64
SO 14.2	Výsadba a rozvojová péče	1 111 623,41	1 345 064,33
SO 15	Oplocení a terenní úpravy	1 918 194,91	2 321 015,84
SO 16	Retenční nádrž	2 065 863,27	2 499 694,56
SO 16	Retenční nádrž	1 884 738,47	2 280 533,55
SO 16.2	ZTI zemní práce	27 967,97	33 841,24
SO 16.3	ZTI	153 156,83	185 319,76

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 17	Lapák tuku	308 603,16	373 409,82
SO 17.1	ZTI - zemní práce	75 939,64	91 886,96
SO 17.2	ZTI - lapák tuků	232 663,52	281 522,86
SO 18	Opěrná zeď 1	996 451,92	1 205 706,82
SO 19	Altán	1 139 782,08	1 379 136,32
SO 20	Slaboproudé areálové rozvody	210 276,28	254 434,30
VRN	VRN	6 050 000,00	7 320 500,00
ON	ON	2 145 000,00	2 595 450,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 01 - Příprava území

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

510 466,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	510 466,71	21,00%	107 198,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

617 664,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 01 - Příprava území

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

510 466,71

HSV - Práce a dodávky HSV

510 466,71

1 - Zemní práce

467 457,67

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 804,52

997 - Přesun sutě

11 204,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 01 - Příprava území

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

510 466,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

510 466,71

D 1

Zemní práce

467 457,67

1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	455,000	52,10	23 705,50	CS ÚRS 2020 02
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	9,000	177,11	1 593,99	CS ÚRS 2020 02
3	K	112101102	Odstranění stromů listnatých s odřezáním kmene a s odvětvěním, průměru kmene přes 300 do 500 mm se složením na hromady do 50 m nebo s naložením	ks	2,000	318,57	637,14	CS ÚRS 2020 02
4	K	112101103	Odstranění stromů listnatých s odřezáním kmene a s odvětvěním, průměru kmene přes 500 do 700 mm se složením na hromady do 50 m nebo s naložením	ks	2,000	514,09	1 028,18	CS ÚRS 2020 02
5	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých s odřezáním kmene a s odvětvěním, průměru kmene přes 100 do 300 mm se složením na hromady do 50 m nebo s naložením	ks	8,000	101,44	811,52	CS ÚRS 2020 02
6	K	112201111	Odstranění pařezů průměru do 200 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	9,000	563,54	5 071,86	CS ÚRS 2020 02
7	K	112201112	Odstranění pařezů průměru do 300 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	9,000	1 114,43	10 029,87	CS ÚRS 2020 02
8	K	112201113	Odstranění pařezů průměru do 400 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	3,000	2 921,21	8 763,63	CS ÚRS 2020 02
9	K	112201114	Odstranění pařezů průměru do 500 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	1,000	4 347,31	4 347,31	CS ÚRS 2020 02
10	K	112201115	Odstranění pařezů průměru do 600 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	2,000	5 198,37	10 396,74	CS ÚRS 2020 02
11	K	112201120	Odstranění pařezů průměru do 1100 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	1,000	17 136,20	17 136,20	CS ÚRS 2020 02
12	K	112201123	Odstranění pařezů průměru do 1400 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	1,000	20 126,41	20 126,41	CS ÚRS 2020 02
13	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	335,200	272,57	91 365,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.21.01					
	VV		1676,0*0,20		335,200			
	VV		Součet		335,200			
14	K	162201405	Vodorovné přemístění větví smýcených stromů jehličnatých o prům. pařezu od 100 do 300mm na vzdálenost do 5000m s naložením, složením a dopravou	ks	8,000	173,66	1 389,28	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů o prům. pařezu od 300 do 500mm na vzdálenost do 5000m s naložením, složením a dopravou	ks	4,000	685,45	2 741,80	CS ÚRS 2020 02
16	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů o prům. pařezu od 500 do 700mm na vzdálenost do 5000m s naložením, složením a dopravou	ks	2,000	851,06	1 702,12	CS ÚRS 2020 02
17	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	9,000	36,80	331,20	CS ÚRS 2020 02
18	K	162201402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	190,91	381,82	CS ÚRS 2020 02
19	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	2,000	515,24	1 030,48	CS ÚRS 2020 02
20	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	18,000	111,33	2 003,94	CS ÚRS 2020 02
21	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	455,000	69,46	31 604,30	CS ÚRS 2020 02
43	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	36,000	92,01	3 312,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		9*4		36,000			
44	K	162301932	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus	8,000	92,01	736,08	CS ÚRS 2020 02
	VV		2*4		8,000			
45	K	162301933	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 700 mm ZKD 1 km	kus	8,000	92,01	736,08	CS ÚRS 2020 02
	VV		2*4		8,000			
46	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	72,000	115,01	8 280,72	CS ÚRS 2020 02
	VV		18*4		72,000			
22	K	171201201	Uložení sypaniny (ornice) na meziskládku	m3	335,200	19,78	6 630,26	CS ÚRS 2020 02
23	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm	m	206,000	228,87	47 147,22	CS ÚRS 2020 02
24	K	184813252	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm	m	206,000	66,93	13 787,58	CS ÚRS 2020 02
25	K	R-položka	Vodorovné přemístění pařezů o prům. pařezu větší než 900 mm na vzdálenost do 5000m s naložením, složením a dopravou	ks	2,000	1 122,48	2 244,96	
26	K	R-položka.1	Vyvázání spodních větví, bandážování a řez stromů pro vytvoření průjezdního profilu nebo směrem k překážce, dle aktuálního stavu stromu a možností - stromy č. 56, 78, 106 včetně případného naložení, odvozu, složení a skládkovného do vzdálenosti do 5 km	ks	3,000	1 934,44	5 803,32	
27	K	R-položka.2	Ochrana kořenové zóny stromů v místě pojezdu techniky - geotextílie, vrstva 150mm hrubého písku, dřevěné fošny nebo betonové panely	m2	177,000	477,28	84 478,56	
28	K	R-položka.3	Odstranění vyvázání spodních větví a bandážování včetně případného naložení, odvozu, složení a skládkovného do vzdálenosti do 5 km	ks	3,000	1 114,43	3 343,29	
29	K	R-položka.4	Odstranění ochrany kořenové zóny stromů v místě pojezdu techniky	m2	177,000	309,37	54 758,49	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 804,52	
30	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,720	3 127,92	2 252,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		základ pod elektroměr					
	VV		1,50*0,60*0,80		0,720			
	VV		Součet		0,720			
31	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,295	719,76	932,09	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		sloupek elektroměru					
	VV		1,40*0,50*1,85		1,295			
	VV		Součet		1,295			
32	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0,861	4 652,01	4 005,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		podezdívka plotu					
	VV		0,375*0,45*5,10		0,861			
	VV		Součet		0,861			
33	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	49,000	324,02	15 876,98	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,0+46,0		49,000			
	VV		Součet		49,000			
34	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	113,000	63,84	7 213,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		113,0		113,000			
	VV		Součet		113,000			
35	K	966072811	Rozebrání rámového oplocení na ocelové sloupky výšky do 2m	m	5,100	87,25	444,98	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		5,10		5,100			
	VV		Součet		5,100			
36	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	2,000	183,01	366,02	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
37	K	966073812	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	713,05	713,05	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
D	997		Přesun sutě				11 204,52	
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	9,881	506,47	5 004,43	CS ÚRS 2020 02
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,881	242,60	2 397,13	CS ÚRS 2020 02
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	138,334	10,61	1 467,72	CS ÚRS 2020 02
	VV		9,881*14 "Přepočtené koeficientem množství		138,334			
41	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,553	218,52	1 431,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,44+1,894+3,219		6,553			
	VV		Součet		6,553			
42	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	2,310	391,03	903,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,31		2,310			
	VV		Součet		2,310			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.1 - ASŘ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 112 272,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 112 272,61	21,00%	3 593 577,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

20 705 849,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.1 - ASŘ

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

17 112 272,61

HSV - Práce a dodávky HSV

8 587 752,11

1 - Zemní práce	82 703,48
2 - Zakládání	620 064,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 678 190,36
4 - Vodorovné konstrukce	1 633 118,07
5 - Komunikace pozemní	6 432,65
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 709 676,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	486 808,45
997 - Přesun sutě	17 640,77
998 - Přesun hmot	353 118,12

PSV - Práce a dodávky PSV

7 954 080,41

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	362 917,56
712 - Powlakové krytiny	148 730,03
713 - Izolace tepelné	456 729,22
714 - Akustická a protiotřesová opatření	28 089,09
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	91 389,10
762 - Konstrukce tesařské	43 308,36

763 - Konstrukce suché výstavby	638 983,87
764 - Konstrukce klempířské	240 610,26
766 - Konstrukce truhlářské	3 393 760,36
767 - Konstrukce zámečnické	1 109 416,57
771 - Podlahy z dlaždic	453 358,70
776 - Podlahy povlakové	295 063,97
781 - Dokončovací práce - obklady	375 524,70
783 - Dokončovací práce - nátěry	44 598,92
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	72 512,44
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	199 087,26
M - Práce a dodávky M	570 440,09
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	570 440,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.1 - ASŘ

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

17 112 272,61

D HSV Práce a dodávky HSV

8 587 752,11

D 1 Zemní práce

82 703,48

1	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	47,441	578,01	27 421,37	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		(21,70+3,38+4,83*2)*0,60*0,55		11,464			
	VV		6,425*0,55*0,55		1,944			
	VV		16,60*0,75*0,55		6,848			
	VV		(21,70-0,75)*1,0*0,55		11,523			
	VV		(18,255-0,60-0,55)*0,75*0,55		7,056			
	VV		5,83*0,55*0,55		1,764			
	VV		12,925*0,75*0,55-0,175*2,09*0,55		5,130			
	VV		1,60*1,10*0,55		0,968			
	VV		1,69*0,80*0,55		0,744			
	VV		Součet		47,441			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	47,441	375,39	17 808,88	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina na skládku					
	VV		47,441		47,441			
	VV		Součet		47,441			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	237,205	27,37	6 492,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		47,441*5 "Přepočtené koeficientem množství		237,205			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	75,906	394,13	29 916,83	CS ÚRS 2020 02
	VV		47,441*1,60		75,906			
	VV		Součet		75,906			
366	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	47,441	22,43	1 064,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina na skládku					
	VV		47,441		47,441			
D 2			Zakládání				620 064,11	
6	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	42,629	1 380,10	58 832,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		podšyp tl. 150 mm					
	VV		(21,025+0,10+0,175)*(3,73+0,30+0,10)*0,15		13,195			
	VV		(4,83+0,10+0,30)*(2,255+0,10+0,075)*0,15		1,906			
	VV		(16,05+0,075+0,175)*(6,425+0,30+0,175)*0,15		16,871			
	VV		(5,83+0,175*2)*(12,35+0,30+0,075)*0,15		11,796			
	VV		odečet					
	VV		-2,09*2,22*0,15		-0,696			
	VV		-(1,60*1,0+1,69*0,80)*0,15		-0,443			
	VV		Součet		42,629			
7	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,138	37 377,63	5 158,11	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		1,064*0,130		0,138			
	VV		Součet		0,138			
8	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,064	5 175,36	5 506,58	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		výtahová šachta					
	VV		2,545*2,09*0,20		1,064			
	VV		Součet		1,064			
9	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	36,992	3 438,74	127 205,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		(21,70+3,38+4,83*2)*0,60*0,40		8,338			
	VV		6,425*0,55*0,40		1,414			
	VV		16,60*0,75*0,40		4,980			
	VV		(21,70-0,75)*1,0*0,40		8,380			
	VV		(18,255-0,60-0,55)*0,75*0,40		5,132			
	VV		5,83*0,55*0,40		1,283			
	VV		12,925*0,75*0,40-0,175*2,09*0,40		3,731			
	VV		1,60*1,10*1,20		2,112			
	VV		1,69*0,80*1,20		1,622			
	VV		Součet		36,992			
10	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	107,176	690,05	73 956,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		deska					
	VV		(2,09+2,545*2)*0,20		1,436			
	VV		pasy					
	VV		(21,70+1,10+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+6,425+0,75*2+16,05+5,85+7,33+18,255)*0,40		35,708			
	VV		(21,70+3,73)*2*0,40+(4,83+2,255)*2*0,40+(16,05+6,425)*2*0,40+(5,83+12,35)*2*0,40		58,536			
	VV		(1,60+1,10)*2*1,20		6,480			
	VV		(1,69*2+0,80)*1,20		5,016			
	VV		Součet		107,176			
11	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	107,176	207,01	22 186,50	CS ÚRS 2020 02
12	K	279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	104,064	2 139,15	222 608,51	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		((21,025+0,175+0,10+(2,255+0,50+0,475+4,83+0,50+0,70)*2+21,025+0,10+0,175))*0,80		48,896			
	VV		((6,425+0,30+0,175)*2+16,05+0,075+0,175)*0,80		24,080			
	VV		(5,83+0,175*5+12,35+0,30+0,075)*2*0,80		31,088			
	VV		Součet		104,064			
13	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	1,615	5 175,36	8 358,21	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(1,65+2,22*2)*0,80*0,22+2,09*0,325*0,80		1,615			
	VV		Součet		1,615			
14	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	11,796	690,05	8 139,83	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		stěny výtahové šachty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (2,09+2,545)*2*0,80+(1,65+2,0)*2*0,60		11,796			
			VV Součet		11,796			
15	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	11,796	207,01	2 441,89	CS ÚRS 2020 02
16	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,292	37 377,63	85 669,53	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.02.1.03					
			VV množství výztuže 20kg/m3					
			VV ((21,025+0,175+0,10+(2,255+0,50+0,475+4,83+0,50+0,70)*2+21,025+0,10+0,175))*0,80*0,02		0,978			
			VV ((6,425+0,30+0,175)*2+16,05+0,075+0,175)*0,80*0,02		0,482			
			VV (5,83+0,175*5+12,35+0,30+0,075)*2*0,80*0,02		0,622			
			VV stěny výtahové šachty - množství výztuže 130kg/m3					
			VV 1,615*0,130		0,210			
			VV Součet		2,292			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 678 190,36	
17	K	311113141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	7,072	1 033,92	7 311,88	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.02.1.4.5					
			VV spojovací lávka "A" - atika					
			VV 8,84*0,40*2		7,072			
			VV Součet		7,072			
18	K	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	83,000	1 242,09	103 093,47	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.02.1.4.5					
			VV výtahová šachta					
			VV (2,40+1,65)*2*7,34-1,18*2,22*2		54,215			
			VV spojovací lávka "A"					
			VV 8,84*1,90*2-0,80*0,80*4-1,06*1,06*2		28,785			
			VV Součet		83,000			
19	K	311113144	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,859	1 713,62	6 612,86	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.02.1.04					
			VV 1.NP - u schodiště mč. 1.02					
			VV 0,30*3,15		0,945			
			VV 0,925*3,15		2,914			
			VV Součet		3,859			
20	K	311234011	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 175 mm	m2	118,967	954,57	113 562,33	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.03.1.4					
			VV 1.NP					
			VV (4,20+2,85)*3,45 "1,11/12		24,323			
			VV (2,445*2+0,25+2,12+1,10)*3,45 "1.02,05,04,03		28,842			
			VV (0,96+0,95+0,175)*3,45 "1.10		7,193			
			VV 2.NP					
			VV (4,20+2,85)*3,35 "2.11/12		23,618			
			VV (2,445*2+0,25+2,12+1,10)*3,35 "2.02,05,04,03		28,006			
			VV (0,96+0,95+0,175)*3,35 "2.10		6,985			
			VV Součet		118,967			
21	K	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm	m2	82,479	1 081,08	89 166,40	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.02.1.6					
			VV atika					
			VV (21,70+3,58+5,63+1,25+7,30+16,50+5,85+6,98+18,03)*0,95		82,479			
			VV Součet		82,479			
22	K	311234061	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 300 mm	m2	172,171	1 437,60	247 513,03	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.02.1.4.5					
			VV 1.NP					
			VV (22,95+7,0+4,20)*3,20		109,280			
			VV odečet					
			VV -(1,25*2,15*7+1,10*2,15*2)		-23,543			
			VV 2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (22,95+7,0+4,20)*3,20		109,280			
			VV 0,60*3,20		1,920			
			VV odečet					
			VV -(1,25*2,15*6+1,10*2,15*3+0,84*1,84)		-24,766			
			VV Součet		172,171			
23	K	31123409R	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 365 mm	m2	417,111	1 587,11	662 001,04	
			VV příloha D.1.03.1.4					
			VV (21,70-0,175*2+5,30+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+18,080-0,365*2)*(3,20+3,10)		517,104			
			VV odečet otvorů					
			VV -(0,75*2,10*2+2,25*0,75*3+1,50*0,75*3+0,75*2,10+2,25*1,50+1,55*2,40+2,25*2,50*4+0,75*2,50*2+1,10*2,40)		-49,148			
			VV -(0,75*2,10*4+2,25*0,75*3+1,50*0,75*3+0,75*2,10+1,55*2,15+2,25*1,50+2,25*2,50*4+0,75*2,50*2+0,75*2,10)		-50,845			
			VV Součet		417,111			
24	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,878	37 377,63	70 195,19	CS ÚRS 2020 02
			VV množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice výtahová šachta					
			VV 54,215*0,02		1,084			
			VV množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice u schodiště					
			VV 3,859*0,02		0,077			
			VV množství výztuže 20kg/m2 - spojovací lávka "A"					
			VV 7,072*0,02		0,141			
			VV 28,785*0,02		0,576			
			VV Součet		1,878			
25	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	40,000	483,03	19 321,20	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D1.02.1.37					
			VV 2,0*4 "P3		8,000			
			VV 8,0*4 "P6		32,000			
			VV Součet		40,000			
26	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	76,000	506,04	38 459,04	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D1.02.1.37					
			VV 2,0*4 "P2		8,000			
			VV 15,0*4 "P5		60,000			
			VV 1,0*4 "P9		4,000			
			VV 1,0*4 "P11		4,000			
			VV Součet		76,000			
27	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	76,000	529,04	40 207,04	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D1.02.1.37					
			VV 18,0*4 "P1		72,000			
			VV 1,0*4 "P14		4,000			
			VV Součet		76,000			
28	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	12,000	862,56	10 350,72	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D1.02.1.37					
			VV 3,0*4 "P7		12,000			
			VV Součet		12,000			
29	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	24,000	1 265,09	30 362,16	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D1.02.1.37					
			VV 6,0*4 "P8		24,000			
			VV Součet		24,000			
30	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3000 mm	kus	4,000	1 265,09	5 060,36	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D1.02.1.37					
			VV 1,0*4 "P10		4,000			
			VV Součet		4,000			
31	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,132	17 251,21	2 277,16	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D1.02.1.37					
			VV 66,0*2/1000 "P12 - 4x100 dl. 1800 mm		0,132			
			VV Součet		0,132			
32	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,132	48 303,39	6 376,05	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,103	17 251,21	1 776,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.02.1.37					
	VV		74,0/1000 "P13- 1xU140 dl. 4200 mm		0,074			
	VV		výtahová šachta - montážní nosník I140					
	VV		2,050*14,30/1000		0,029			
	VV		Součet		0,103			
34	M	13010914	ocel profilová UE 140 jakost 11 375	t	0,074	48 303,39	3 574,45	CS ÚRS 2020 02
35	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,029	48 303,39	1 400,80	CS ÚRS 2020 02
36	K	3399411R1	Montáž sloupu ze zdvojených válcovaných nosníků HEB 300 dl 3,15m	kus	1,000	7 477,89	7 477,89	
	VV		příloha D.1.02.1.04					
	VV		1.NP - u schodiště					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
37	M	13010990	ocel profilová HE-B 300 jakost 11 375	t	0,735	48 303,39	35 502,99	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,14*117,0/1000*2		0,735			
	VV		Součet		0,735			
38	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	214,754	730,30	156 834,85	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.4					
	VV		1.NP					
	VV		0,16*2*3,45 "u výtahu		1,104			
	VV		(1,50+4,45)*3,45 "1.02		20,528			
	VV		(1,80+1,0+2,90)*3,45-0,90*2,0*2-0,80*2,0 "1.02/03,04,05		14,465			
	VV		0,70*2*3,45 "1.06		4,830			
	VV		4,20*4*3,45-0,80*2,0*2 "1.08,09,10,11		54,760			
	VV		(2,85+1,35)*3,45-0,70*2,0*2 "1.12		11,690			
	VV		2.NP					
	VV		0,16*2*3,45 "u výtahu		1,104			
	VV		(1,50+4,45)*3,45 "2.02		20,528			
	VV		(1,80+1,0+2,90)*3,45-0,90*2,0*2-0,80*2,0 "2.02/03,04,05		14,465			
	VV		0,70*2*3,45 "2.06		4,830			
	VV		4,20*4*3,45-0,80*2,0*2 "2.08,09,10,11		54,760			
	VV		(2,85+1,35)*3,45-0,70*2,0*2 "2.12		11,690			
	VV		Součet		214,754			
39	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	7,806	920,06	7 181,99	CS ÚRS 2020 02
	VV		"překlad P12" 1,80*0,10*2		0,360			
	VV		"překlad P13" 4,20*0,14*2		1,176			
	VV		"HEB 300" 3,15*0,30*2		1,890			
	VV		"Heb 320" 7,30*0,30*2		4,380			
	VV		Součet		7,806			
40	K	346271113	Přizdívky z cihel betonových tl 65 mm	m2	7,011	460,03	3 225,27	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,09+2,645*2)*0,95		7,011			
	VV		Součet		7,011			
41	K	346271129	Příplatek k přizdívkám za ochranu izolace zaléváním maltou	m2	6,821	195,51	1 333,57	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,09+2,545*2)*0,95		6,821			
	VV		Součet		6,821			
42	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	12,666	632,54	8 011,75	CS ÚRS 2020 02
	VV		"překlad P12" 1,80*(0,10*2+0,20)		0,720			
	VV		"překlad P13" 4,20*(0,14*2+0,10)		1,596			
	VV		"HEB 300" 3,15*0,30*4		3,780			
	VV		"Heb 320" 7,30*0,30*3		6,570			
	VV		Součet		12,666			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce	1 633 118,07				
43	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 3 t budova v do 18 m včetně zalití spár betonem C25/30 XC1	kus	94,000	1 322,59	124 323,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		12+2+16+3+2+1+6+1+2		45,000			
	VV		2.NP					
	VV		12+2+16+3+8+1+2+1+2+1+1		49,000			
	VV		Součet		94,000			
44	M	593468R1	panel stropní předpjatý Spirrol HCE 250-0/6	m	121,000	1 322,59	160 033,39	
	VV		7,25*12 "panel S1 - 1200x7250x2500		87,000			
	VV		7,25*2 "panel S2 - 1010x7250x250		14,500			
	VV		6,50*2 "panel S5 - 1200x6500x250		13,000			
	VV		6,50*1 "panel S6 - 340x6500x250		6,500			
	VV		Součet		121,000			
45	M	593468R2	panel stropní předpjatý Spirrol HCE 250-0/8	m	399,785	1 414,60	565 535,86	
	VV		4,45*16 "panel S3 - 1200x4450x250		71,200			
	VV		4,45*3 "panel S4 - 785x4450x250		13,350			
	VV		4,875*6 "panel S7 - 1200x4875x250		29,250			
	VV		4,875*1 "panel S8 - 1010x4875x250		4,875			
	VV		3,915*2 "panel S9 - 1010x3915x250		7,830			
	VV		7,25*12 "panel S1 - 1200x7250x250		87,000			
	VV		7,25*2 "panel S2 - 1010x7250x250		14,500			
	VV		4,450*16 "panel S3 - 1200x4450x250		71,200			
	VV		4,45*3 "panel S4 - 785x4450x250		13,350			
	VV		6,50*8 "panel S5 - 1200x6500x250		52,000			
	VV		6,50*1 "panel S6 - 340x6500x250		6,500			
	VV		3,915*2 "panel S9 - 1010x3915x250		7,830			
	VV		6,50*1 "panel S10 - 1010x6500x250		6,500			
	VV		5,55*2 "panel S11 - 785*5550*250		11,100			
	VV		2,70*1 "panel S12 - 1010x2700x250		2,700			
	VV		0,60*1 "panel S13 - 1010x600x250		0,600			
	VV		Součet		399,785			
46	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	0,787	4 600,32	3 620,45	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.2.03					
	VV		dobetonávka stropní konstrukce					
	VV		2.NP					
	VV		2,56*2,05*0,15		0,787			
	VV		Součet		0,787			
47	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	4,274	5 175,36	22 119,49	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.11					
	VV		spojovací lávka "A"					
	VV		8,84*2,0*0,20		3,536			
	VV		S4					
	VV		2,05*2,40*0,15		0,738			
	VV		Součet		4,274			
48	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	33,411	747,55	24 976,39	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.11					
	VV		spojovací lávka "A"					
	VV		8,84*2,0+8,84*0,20*2		21,216			
	VV		S4					
	VV		2,05*2,40+(2,05+2,40)*2*0,15		6,255			
	VV		dobetonávka stropní konstrukce					
	VV		2.NP					
	VV		2,56*2,05+(2,56+2,05)*0,15		5,940			
	VV		Součet		33,411			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	33,411	230,02	7 685,20	CS ÚRS 2020 02
50	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	15,028	791,26	11 891,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		spojovací krček "A"					
	VV		8,84*1,70		15,028			
	VV		Součet		15,028			
51	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	22,928	224,27	5 142,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.11					
	VV		spojovací lávka "A"					
	VV		8,84*2,0		17,680			
	VV		dobetonávka stropní konstrukce					
	VV		2.NP					
	VV		2,56*2,05		5,248			
	VV		Součet		22,928			
52	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	22,928	138,01	3 164,29	CS ÚRS 2020 02
53	K	411354331	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm	m2	4,920	258,77	1 273,15	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.12					
	VV		S4					
	VV		2,05*2,40		4,920			
	VV		Součet		4,920			
54	K	411354332	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm	m2	4,920	149,51	735,59	CS ÚRS 2020 02
55	K	4113543R1	Příplatek k podpěrné konstrukce stropů za výšku podepření nad 8 m	m2	4,920	115,01	565,85	
56	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,658	37 377,63	24 594,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		příloha D.1.02.1.11					
	VV		spojovací lávka "B"					
	VV		8,84*2,0*0,20*0,130		0,460			
	VV		S4					
	VV		2,05*2,40*0,15*0,130		0,096			
	VV		příloha D.1.02.2.03					
	VV		dobetonávka stropní konstrukce					
	VV		2.NP					
	VV		2,56*2,05*0,15*0,130		0,102			
	VV		Součet		0,658			
57	K	41394112R	Osazování ocelových válcovaných zdvojených průvlaků HEB 320	t	1,854	17 251,21	31 983,74	
	VV		příloha D.1.02.1.04					
	VV		1.NP - u schodiště					
	VV		7,30*127,0/1000*2		1,854			
	VV		Součet		1,854			
58	M	13011008	ocel profilová HE-B 320 jakost 11 375	t	1,854	48 303,39	89 554,49	CS ÚRS 2020 02
59	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	30,517	4 151,79	126 700,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.4,5					
	VV		1.NP					
	VV		(22,95+7,0+4,20)*0,25*0,30		2,561			
	VV		(21,70-0,175*2+5,30+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+18,080-0,365*2)*0,50*0,365		14,980			
	VV		-(2,50+1,10+21,70+18,08-0,365*2+6,25+5,85+16,335+6,935+1,25+5,30)*0,25*0,12		-2,537			
	VV		2.NP					
	VV		(22,95+7,0+4,20)*0,25*0,30		2,561			
	VV		(21,70-0,175*2+5,30+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+18,080-0,365*2)*0,50*0,365		14,980			
	VV		-(2,50+1,10+21,70+18,08-0,365*2+6,25+5,85+16,335+6,935+1,25+5,30)*0,25*0,12		-2,537			
	VV		spojovací krček A					
	VV		8,49*0,40*0,20*2-8,49*0,10*0,50*2		0,509			
	VV		Součet		30,517			
60	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	198,310	690,05	136 843,82	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.4,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1.NP					
	VV		(22,95+7,0+4,20)*0,25*2		17,075			
	VV		(21,70-0,175*2+5,30+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+18,080-0,365*2)*0,50*2		82,080			
	VV		2.NP					
	VV		(22,95+7,0+4,20)*0,25*2		17,075			
	VV		(21,70-0,175*2+5,30+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+18,080-0,365*2)*0,50*2		82,080			
	VV		Součet		198,310			
61	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	198,310	172,51	34 210,46	CS ÚRS 2020 02
62	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	3,967	37 377,63	148 277,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		30,512*0,130		3,967			
	VV		Součet		3,967			
63	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	6,820	4 577,32	31 217,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.23.1.4,5					
	VV		schodiště 1.07/2.07					
	VV		3,0*1,20*0,20*2 "podstupňová deska		1,440			
	VV		0,30*0,20*1,20 "základ schodiště		0,072			
	VV		0,29*0,18/2*1,20*20 "schody		0,626			
	VV		3,23*1,565*0,20 "podesta		1,011			
	VV		schodiště 1.02/2.02					
	VV		(3,25+3,70)*1,50*0,20 "podstupňová deska		2,085			
	VV		0,40*0,20*1,50 "základ schodiště		0,120			
	VV		0,285*0,15/2*24*1,50 "schody		0,770			
	VV		1,865*1,865*0,20 "podesta		0,696			
	VV		Součet		6,820			
64	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,887	37 377,63	33 153,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		6,82*0,130		0,887			
	VV		Součet		0,887			
65	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	26,145	1 092,58	28 565,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.23.1.4,5					
	VV		schodiště 1.07/2.07					
	VV		3,0*(1,20+0,20)*2 "podstupňová deska		8,400			
	VV		0,30*0,20+0,20*1,20 "základ schodiště		0,300			
	VV		2,50*1,20		3,000			
	VV		schodiště 1.02/2.02					
	VV		(3,25+3,70)*(1,50+0,20) "podstupňová deska		11,815			
	VV		0,40*0,20+1,50*0,20 "základ schodiště		0,380			
	VV		1,50*1,50		2,250			
	VV		Součet		26,145			
66	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	26,145	287,52	7 517,21	CS ÚRS 2020 02
67	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	8,820	862,56	7 607,78	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.23.1.4,5					
	VV		schodiště 1.07/2.07					
	VV		0,18*1,20*20 "schody		4,320			
	VV		schodiště 1.02/2.02					
	VV		0,15*1,50*20 "schody		4,500			
	VV		Součet		8,820			
68	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	8,820	207,01	1 825,83	CS ÚRS 2020 02
D 5			Komunikace pozemní				6 432,65	
69	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm 0/63	m2	46,610	138,01	6 432,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		okapový chodník					
	VV		(18,43+7,33+1,0+5,85+16,70+7,30+1,25+6,38+6,18+1,10+21,70)*0,50		46,610			
	VV		Součet		46,610			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				3 709 676,10	
70	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	7,900	322,02	2 543,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.13,14					
	VV		7,90 "C6			7,900		
	VV		Součet			7,900		
71	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	295,760	253,02	74 833,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		omítka pod obklad					
	VV		295,76			295,760		
	VV		Součet			295,760		
72	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	986,782	299,02	295 067,55	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.04					
	VV		1.NP					
	VV		(6,25+2,635)*2*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30+(2,40+1,50*2)*0,265+(0,75+2,10*2)*0,30-2,25*1,50-0,75*2,10-1,25*2,0-3,69*2,60					
	VV		"mč. 1.01			34,538		
	VV		(3,69+10,415*2+0,30*2+1,50+6,25+2,12+1,10-0,78+0,34)*2,925+(2,65+2,925*2)*0,30+(0,75+2,10*2)*0,30+(2,15*2+1,20)*0,20			109,411		
	VV		-2,10*0,75-0,90*2,0*5-0,80*2,0-1,18*2,22 "mč. 1.02			-14,795		
	VV		(2,56+1,80)*2*2,65-0,90*2,0 "mč. 1.03			21,308		
	VV		(2,56+1,0)*2*2,65-0,80*2,0 "mč. 1.04			17,268		
	VV		(2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30-0,90*2,0*2-0,84*1,84 "mč. 1.05			29,455		
	VV		(16,40+7,0)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*4+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2			162,690		
	VV		-(2,25*2,50*4+0,75*2,50*2+0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+0,84*1,84) "mč. 1.06			-39,996		
	VV		(5,30+2,50)*2*3,20+(1,25+2,40*2)*0,265-0,90*2,35-0,90*2,0 "mč. 1.07			47,608		
	VV		(4,20+2,295)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 1.08			39,029		
	VV		(4,20+2,175)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 1.09			31,898		
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,80*2,0 "mč. 1.10a			39,178		
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,80*2,0*3 "mč. 1.10			35,978		
	VV		(6,245+4,20)*2*3,0+(1,50+0,75*2)*0,30*2-1,50*0,75*2-0,80*2,0*2-0,90*2,0 "mč. 1.11			57,220		
	VV		(2,85+1,61)*2*3,15+(1,50+0,75*2)*0,30-0,90*2,0-0,70*2,0-1,50*0,75 "mč. 1.12			24,673		
	VV		(1,785+1,35+0,95+1,35)*2*2,55-0,70*2,0*3 "mč. 1.12a			23,519		
	VV		(2,85+0,95)*2*3,15+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,70*2,0 "mč. 1.12b			21,978		
	VV		příloha D.1.02.1.05					
	VV		2.NP					
	VV		(3,69+12,85*2+6,25+1,04-0,78+0,34+0,25)*2,925+(1,55+2,15*2)*0,265+(1,50+0,75*2)*0,30-1,25*2,0-1,50*0,75-0,90*2,0*5-0,80*2,0*2-1,18*2,22 "mč. 2.01,2			90,739		
	VV		(2,56+1,80)*2*2,65-0,90*2,0 "mč. 2.03			21,308		
	VV		(2,56+1,0)*2*2,65-0,80*2,0 "mč. 2.04			17,268		
	VV		(2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30-0,90*2,0*2-0,84*1,84 "mč. 2.05			29,455		
	VV		(16,40+7,0)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*4+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2			162,690		
	VV		-(2,25*2,50*4+0,75*2,50*2+0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+0,84*1,84) "mč. 2.06			-39,996		
	VV		(5,30+2,50)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,265*3-0,75*2,10*3-0,90*2,0 "mč. 2.07			47,330		
	VV		(4,20+2,295)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 2.08			39,029		
	VV		(4,20+2,175)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 2.09			31,898		
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,80*2,0 "mč. 2.10a			39,178		
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,80*2,0*3 "mč. 2.10			35,978		
	VV		(6,245+4,20)*2*3,0+(1,50+0,75*2)*0,30*2-1,50*0,75*2-0,80*2,0*2-0,90*2,0 "mč. 2.11			57,220		
	VV		(2,85+1,61)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,70*2,0-0,75*2,10 "mč. 1.12			24,808		
	VV		(1,785+1,35+0,95+1,35)*2*2,55-0,70*2,0*3 "mč. 2.12a			23,519		
	VV		(2,85+0,95)*2*3,15+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,70*2,0 "mč. 2.12b			21,978		
	VV		spojovací lávka- krček					
	VV		8,459*2*2,60-1,06*1,06*2-0,80*0,80*4			39,180		
	VV		odečet obkladů					
	VV		-295,76			-295,760		
	VV		Součet			986,782		
73	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	20,155	1 349,04	27 189,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		spojovací lávka "A"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,84*2,28		20,155			
	VV		Součet		20,155			
74	M	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	20,558	434,73	8 937,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		20,155*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		20,558			
75	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	304,275	102,36	31 145,59	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		(0,75+2,10)*2*4		22,800			
	VV		(2,25+0,75)*2*3		18,000			
	VV		(1,50+0,75)*2*3		13,500			
	VV		(2,25+1,50)*2		7,500			
	VV		(2,25+2,50)*2*4		38,000			
	VV		(0,75+2,50)*2*2		13,000			
	VV		2.NP					
	VV		(0,75+2,10)*2*6		34,200			
	VV		(2,25*0,75)*2*3		10,125			
	VV		(1,50+0,75)*2*3		13,500			
	VV		(2,25+1,50)*2		7,500			
	VV		(0,75+1,50)*2*2		9,000			
	VV		(2,25+2,50)*2*4		38,000			
	VV		(0,75+2,50)*2*2		13,000			
	VV		7,0*7,70		53,900			
	VV		(1,10+2,4*2)		5,900			
	VV		(1,55+2,40*2)		6,350			
	VV		Součet		304,275			
76	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	319,489	38,30	12 236,43	CS ÚRS 2020 02
	VV		304,275*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		319,489			
77	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začíšťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	238,125	104,66	24 922,16	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		(0,75+2,10)*2*4		22,800			
	VV		(2,25+0,75)*2*3		18,000			
	VV		(1,50+0,75)*2*3		13,500			
	VV		(2,25+1,50)*2		7,500			
	VV		(2,25+2,50)*2*4		38,000			
	VV		(0,75+2,50)*2*2		13,000			
	VV		2.NP					
	VV		(0,75+2,10)*2*6		34,200			
	VV		(2,25*0,75)*2*3		10,125			
	VV		(1,50+0,75)*2*3		13,500			
	VV		(2,25+1,50)*2		7,500			
	VV		(0,75+1,50)*2*2		9,000			
	VV		(2,25+2,50)*2*4		38,000			
	VV		(0,75+2,50)*2*2		13,000			
	VV		Součet		238,125			
78	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	250,031	56,70	14 176,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		238,125*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		250,031			
79	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	133,905	1 159,28	155 233,39	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		zateplení základů					
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		(21,70+1,10+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+6,425+0,75*2+16,05+5,85+7,33+18,255)*1,50		133,905			
	VV		Součet		133,905			
80	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$	m3	19,122	3 217,93	61 533,26	CS ÚRS 2020 02
	VV		18,7471479270766*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		19,122			
81	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	129,425	1 059,22	137 089,55	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	atiky zevnitř					
		VV	(21,70+1,10+2,83+5,63+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+17,68)*0,95		82,669			
		VV	(21,70+3,23+5,0+1,25+7,30+16,70+5,85+6,98+17,00)*0,55		46,756			
		VV	Součet		129,425			
82	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	132,014	266,82	35 223,98	CS ÚRS 2020 02
		VV	129,425*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		132,014			
83	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	605,031	1 206,43	729 927,55	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.03.1.4,5,6					
		VV	(21,70+1,10+3,58+6,03+7,30+16,70+5,85+6,98+18,08-0,28)*8,10		705,024			
		VV	odečet otvorů					
		VV	-(0,75*2,10*2+2,25*0,75*3+1,50*0,75*3+0,75*2,10+2,25*1,50+1,55*2,40+2,25*2,50*4+0,75*2,50*2+1,10*2,40)		-49,148			
		VV	-(0,75*2,10*4+2,25*0,75*3+1,50*0,75*3+0,75*2,10+1,55*2,15+2,25*1,50+2,25*2,50*4+0,75*2,50*2+0,75*2,10)		-50,845			
		VV	Součet		605,031			
84	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 160mm	m2	617,132	373,78	230 671,60	CS ÚRS 2020 02
		VV	605,031*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		617,132			
85	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	55,397	1 349,04	74 732,77	CS ÚRS 2020 02
		VV	spojovací lávka "A"					
		VV	8,84*3,55*2-0,80*0,80*4*2-1,06*1,06*2		55,397			
		VV	Součet		55,397			
86	M	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	56,505	434,73	24 564,42	CS ÚRS 2020 02
		VV	55,397*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		56,505			
87	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	89,300	242,67	21 670,43	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.02.1.04					
		VV	3,58+1,10+21,70+18,43-0,32+7,33+5,85+16,70+7,30+1,25+6,38		89,300			
		VV	Součet		89,300			
88	M	59051653	lišta soklová Al s okapničkou základací U 16cm 0,95/200cm	m	93,765	128,81	12 077,87	CS ÚRS 2020 02
		VV	89,3*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		93,765			
89	K	6222730R1	D+M opláštění obou stěn a spodního líce pod podlahou spojovací lávky A z fasádních desek cementovláknitých nehořlavých (ref. výrobek Cembrit řady PLANK) - 25/T	m2	114,500	6 109,32	699 517,14	
		VV	příloha D1.02.1.11					
		VV	spojovací krček "A"					
		VV	obkladové lamely s dekorem dřeva š. 180 mm, tl. 8mm, osazený svisle na Al obousměrném roštu zvýšeném o tloušťku tepelné izolace minerální 180 mm					
		VV	hliníkový rošt bude tvořen profily T a rozpěrnými kotvami a s distančními profily na vzdálenost 180 mm od betonové nosné konstrukce					
		VV	horní i spodní líc opláštění tvoří vlnovky – je nutno počítat s vyššími prořezy a složitější montáží					
		VV	opláštění bude ve třech barevných odstínech - např. CP 080c Basalt grey, CP370 Oxide red a CP 999 Přírodní šedá v poměru cca 20:20:60					
		VV	cena opláštění včetně spojovacího materiálu, trhacích nýtů a nátěru na řezné hrany, EPDM pásky, balného a dopravy					
		VV	114,50		114,500			
		VV	Součet		114,500			
90	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	57,213	659,00	37 703,37	CS ÚRS 2020 02
		VV	sokl objektu					
		VV	(21,70+1,10+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+6,425+0,75*2+16,05+5,85+7,33)*0,60+18,255*0,80		57,213			
		VV	Součet		57,213			
91	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	644,769	430,13	277 334,49	CS ÚRS 2020 02
		VV	fasády					
		VV	605,031		605,031			
		VV	ostění, nadpraží					
		VV	"1.NP"					
		VV	0,18*2,5*2*6+(0,18+0,2)*2,4*2+0,18*1,6+0,18*(1,5*2+2,3)+0,18*(2,1*2+0,8)*4+0,18*(0,8*2+1,5)*3+0,18*(0,75*2+2,3)*3+(0,18+0,2)*2,4*2+0,18*1,1		17,814			
		VV	"2.NP" 0,18*2,5*2*6+0,18*(1,5*2+0,75)*2+0,18*(1,5*2+2,3)+0,18*(0,8*2+1,5)*3+0,18*(2,1*2+0,8)*6+0,18*(0,8*2+2,3)*3		16,884			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"pouzdra žaluzií" 5,04		5,040			
	VV		Součet		644,769			
92	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	132,600	196,66	26 077,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.10					
	VV		0,90*4*18		64,800			
	VV		(1,60+0,80)*2+(1,40+0,60)*2*7+(2,8+0,70)*2*5		67,800			
	VV		Součet		132,600			
93	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,404	6 887,83	44 109,66	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.30					
	VV		skladba P2					
	VV		(4,40+2,45+9,9+15,1+14,9+3,90+2,70)*0,075		4,001			
	VV		skladba P9					
	VV		4,40*0,045		0,198			
	VV		skladba P11					
	VV		(2,50+9,90+15,10+14,90+3,90+2,70)*0,045		2,205			
	VV		Součet		6,404			
94	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,606	5 607,79	3 398,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		výtahová šachta - podkladní beton					
	VV		2,645*2,29*0,10		0,606			
	VV		Součet		0,606			
95	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	42,629	3 507,75	149 531,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		podkladní mazanina tl. 150 mm					
	VV		(21,025+0,10+0,175)*(3,73+0,30+0,10)*0,15		13,195			
	VV		(4,83+0,10+0,30)*(2,255+0,10+0,075)*0,15		1,906			
	VV		(16,05+0,075+0,175)*(6,425+0,30+0,175)*0,15		16,871			
	VV		(5,83+0,175*2)*(12,35+0,30+0,075)*0,15		11,796			
	VV		odečet					
	VV		-2,09*2,22*0,15		-0,696			
	VV		-(1,60*1,0+1,69*0,80)*0,15		-0,443			
	VV		Součet		42,629			
96	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	0,606	103,51	62,73	CS ÚRS 2020 02
97	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	6,404	103,51	662,88	CS ÚRS 2020 02
98	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	99,469	103,51	10 296,04	CS ÚRS 2020 02
99	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	4,065	36 802,59	149 602,53	CS ÚRS 2020 02
	VV		síť KARI 8/150 + 10% ztratiné					
	VV		podkladní betan základové šachty					
	VV		2,29*4,645*0,005267*1,10		0,062			
	VV		podkladní beton					
	VV		42,629/0,15*0,005267*1,10		1,647			
	VV		podklad pod nášlapnou vrstvou					
	VV		284,2*0,005267*1,10		1,647			
	VV		síť KARI 6/150 + 10% ztratiné					
	VV		skladba P2					
	VV		(4,40+2,45+9,9+15,1+14,9+3,90+2,70)*0,003033*1,10		0,178			
	VV		skladba P9					
	VV		4,40*0,045*0,003033*1,10		0,001			
	VV		skladba P11					
	VV		(2,50+9,90+125,10+14,90+3,90+2,70)*0,003033*1,10		0,530			
	VV		Součet		4,065			
100	K	632451234.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 50 mm	m2	43,440	369,18	16 037,18	
	VV		příloha D.1.23.1.30					
	VV		skladba P10					
	VV		39,90+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)		43,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		43,440			
101	K	63245124R.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 60 mm	m2	153,600	409,43	62 888,45	
	VV		příloha D.1.02.1.30					
	VV		skladba P7,8					
	VV		115,90+26,5+4,8+6,4		153,600			
	VV		Součet		153,600			
102	K	63245125R.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 80 mm	m2	278,790	488,78	136 266,98	
	VV		příloha D.1.02.1.30					
	VV		skladba P1					
	VV		16,5+39,60+13,50+9,65+9,15-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)		78,440			
	VV		skladba P2					
	VV		4,40+2,45+9,9+15,1+14,9+3,90+2,70		53,350			
	VV		skladba P3, P4					
	VV		115,70+26,50+4,80		147,000			
	VV		Součet		278,790			
103	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	529,230	16,10	8 520,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.30					
	VV		skladba P1					
	VV		16,5+39,60+13,50+9,65+9,15-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)		78,440			
	VV		skladba P2					
	VV		4,40+2,45+9,9+15,1+14,9+3,90+2,70		53,350			
	VV		skladba P3, P4					
	VV		115,70+26,50+4,80		147,000			
	VV		skladba P7,8					
	VV		115,90+26,5+4,8+6,4		153,600			
	VV		skladba P9					
	VV		4,40		4,400			
	VV		skladba P10					
	VV		39,90+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)		43,440			
	VV		skladba P11					
	VV		2,50+9,90+15,10+14,90+3,90+2,70		49,000			
	VV		Součet		529,230			
104	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	476,485	20,70	9 863,24	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.04					
	VV		1.NP					
	VV		(6,25+2,635)*2 "mč. 1.01		17,770			
	VV		3,69+10,415*2+0,30*2+1,50+6,25+2,12+1,10-0,78+0,34 "mč. 1.02		35,650			
	VV		(2,56+1,80)*2 "mč. 1.03		8,720			
	VV		(2,56+1,0)*2 "mč. 1.04		7,120			
	VV		2,785+3,64+2,12+1,10+2,90 "mč. 1.05		12,545			
	VV		(16,40+7,0)*2 "mč. 1.06		46,800			
	VV		(5,30+2,50)*2 "mč. 1.07		15,600			
	VV		(4,20+2,295)*2 "mč. 1.08		12,990			
	VV		(4,20+2,175)*2 "mč. 1.09		12,750			
	VV		(3,60+4,20)*2 "mč. 1.10a		15,600			
	VV		(3,60+4,20)*2 "mč. 1.10		15,600			
	VV		(6,245+4,20)*2 "mč. 1.11		20,890			
	VV		(2,85+1,61)*2 "mč. 1.12		8,920			
	VV		1,785+1,35+0,95+1,35 "mč. 1.12a		5,435			
	VV		(2,85+0,95)*2 "mč. 1.12b		7,600			
	VV		příloha D.1.02.1.05					
	VV		2.NP					
	VV		3,69+12,85*2+6,25+1,04-0,78+0,34+0,25 "mč. 2.01,2		36,490			
	VV		(2,56+1,80)*2 "mč. 2.03		8,720			
	VV		(2,56+1,0)*2 "mč. 2.04		7,120			
	VV		2,785+3,64+2,12+1,10+2,90 "mč. 2.05		12,545			
	VV		(16,40+7,0)*2 "mč. 2.06		46,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,30+2,50)*2 "mč. 2.07		15,600			
	VV		(4,20+2,295)*2 "mč. 2.08		12,990			
	VV		(4,20+2,175)*2 "mč. 2.09		12,750			
	VV		(3,60+4,20)*2 "mč. 2.10a		15,600			
	VV		(3,60+4,20)*2 "mč. 2.10		15,600			
	VV		(6,245+4,20)*2 "mč. 2.11		20,890			
	VV		(2,85+1,61)*2 "mč. 1.12		8,920			
	VV		(1,785+1,35+0,95+1,35)*2 "mč. 2.12a		10,870			
	VV		(2,85+0,95)*2 "mč. 2.12b		7,600			
	VV		Součet		476,485			
105	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	46,610	736,05	34 307,29	CS ÚRS 2020 02
	VV		vymývaná dlažba 500x500x50mm					
	VV		(18,43+7,33+1,0+5,85+16,70+7,30+1,25+6,38+6,18+1,10+21,70)*0,50		46,610			
	VV		Součet		46,610			
106	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton C16/20	m	94,720	736,05	69 718,66	CS ÚRS 2020 02
	VV		betonový obrubník 50/200/1000 mm					
	VV		18,93+7,33+1,0+5,85+0,50+16,70+7,30+1,25+6,38+6,18+1,10+21,70+0,50		94,720			
	VV		Součet		94,720			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				486 808,45	
107	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	841,420	48,30	40 640,59	CS ÚRS 2020 02
	VV		fasádní lešení					
	VV		(21,70+3,58+0,90*2+18,08)*2*8,0		722,560			
	VV		spojovací krček					
	VV		8,49*6,0*2+8,49*2,0		118,860			
	VV		Součet		841,420			
108	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	75 727,800	0,92	69 669,58	CS ÚRS 2020 02
	VV		841,42*90 "Přepočtené koeficientem množství		75 727,800			
109	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	841,420	36,80	30 964,26	CS ÚRS 2020 02
110	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	592,800	57,50	34 086,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		288,95		288,950			
	VV		2.NP					
	VV		303,85		303,850			
	VV		Součet		592,800			
111	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	8,240	1 092,58	9 002,86	CS ÚRS 2020 02
112	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	247,200	63,25	15 635,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		8,24*30 "Přepočtené koeficientem množství		247,200			
113	K	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	8,240	862,56	7 107,49	CS ÚRS 2020 02
114	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	746,312	138,01	102 998,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.+2.NP					
	VV		(6,98*18,08+16,70*7,30+4,865*21,70+3,23*6,03)*2		746,312			
	VV		Součet		746,312			
115	K	953332114	Vložky do svislých dilatačních spár z pryže tl 10 mm kladené volně - 29/O	m2	0,768	1 279,08	982,33	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.35 - výpis ostatních výrobků					
	VV		mezi pavilonem A, hosp. pavilonem a spojovacím krčkm					
	VV		0,24*1,60*2		0,768			
	VV		Součet		0,768			
116	K	953611125	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 - 23/O	kus	4,000	5 175,36	20 701,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.36					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
117	K	953611126	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 6 x D6 - 23/O	kus	4,000	5 750,40	23 001,60	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv příloha D.1.02.1.36					
			vv 4,0		4,000			
			vv Součet		4,000			
118	K	9539414R1	D+M hasicí přístroj práškový 6kg 34A 183B včetně kovového držáku a pomocného materiálu - 25/O	kus	8,000	1 725,12	13 800,96	
			vv příloha D.1.02.1.35 - výpis ostatních výrobků					
			vv 8,0		8,000			
			vv Součet		8,000			
119	K	9539415R1	D+M zápusťná krabice do zdi s rámečkem pro 1 modul tabla komunikátoru 125x235x46 mm - 26/O	kus	1,000	3 588,25	3 588,25	
			vv příloha D.1.02.1.35 - výpis ostatních výrobků					
			vv 1,0		1,000			
			vv Součet		1,000			
120	K	9539416R1	D+M dilatační lišta podlahová hliníková dl. 1600 mm - 27/O	kus	2,000	690,05	1 380,10	
			vv příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků					
			vv mezi povilonem A, hosp. pavilonem a spojovacím krčkem					
			vv 2,0		2,000			
			vv Součet		2,000			
121	K	9539417R1	D+M dilatační lišta stěnová hliníková dl. 2500 mm - 28/O	kus	4,000	2 300,16	9 200,64	
			vv příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků					
			vv mezi povilonem A, hosp. pavilonem a spojovacím krčkem					
			vv 4,0		4,000			
			vv Součet		4,000			
122	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	68,69	206,07	CS ÚRS 2020 02
			vv legenda prostupů					
			vv 1.NP					
			vv 2,0 "VZT20,23		2,000			
			vv 2.NP					
			vv 1,0 "VZT24		1,000			
			vv Součet		3,000			
123	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	272,82	272,82	CS ÚRS 2020 02
			vv legenda prostupů					
			vv 2.NP					
			vv 1,0 "ZT117		1,000			
			vv Součet		1,000			
124	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	68,69	68,69	CS ÚRS 2020 02
			vv legenda prostupů					
			vv 2.NP					
			vv 1,0 "VZT29		1,000			
			vv Součet		1,000			
125	K	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000	262,18	1 573,08	CS ÚRS 2020 02
			vv legenda prostupů					
			vv 1.NP					
			vv 2,0 "VZT25,26		2,000			
			vv 1,0 "VZT27		1,000			
			vv 2.NP					
			vv 2,0 "VZT26,27		2,000			
			vv 1,0 "VZT28		1,000			
			vv Součet		6,000			
126	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	2,400	254,76	611,42	CS ÚRS 2020 02
			vv legenda prostupů					
			vv 1.NP					
			vv 0,70*0,40 "VZT6		0,280			
			vv 0,70*0,40*2 "VZT11		0,560			
			vv 0,90*0,40 "VZT15		0,360			
			vv 2.NP					
			vv 0,70*0,40 "VZT6		0,280			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 0,70*0,40*2 "VZT12		0,560			
			VV 0,90*0,40 "VZT15		0,360			
			VV Součet		2,400			
127	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,194	1 869,12	362,61	CS ÚRS 2020 02
			VV legenda prostupů					
			VV 2.NP					
			VV 0,60*0,60*0,54 "VZT18		0,194			
			VV Součet		0,194			
128	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	49,800	136,09	6 777,28	CS ÚRS 2020 02
			VV legenda prostupů					
			VV 2.NP					
			VV 0,30 "UT6		0,300			
			VV 25,0 "UT10		25,000			
			VV 7,7 "UT11		7,700			
			VV 16,80 "UT12		16,800			
			VV Součet		49,800			
129	K	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	0,515	191,88	98,82	CS ÚRS 2020 02
			VV legenda prostupů					
			VV 2.NP					
			VV 0,115 "UT7,8		0,115			
			VV 0,10*4 "UT1,3,4,5		0,400			
			VV Součet		0,515			
130	K	974031157	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 300 mm	m	0,465	215,42	100,17	CS ÚRS 2020 02
			VV legenda prostupů					
			VV 2.NP					
			VV 0,365 "UT9		0,365			
			VV 0,10*1 "UT2		0,100			
			VV Součet		0,465			
131	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	60,000	235,10	14 106,00	CS ÚRS 2020 02
			VV legenda prostupů					
			VV 1.NP					
			VV 3,25+3,35*7 "ZTI1-8		26,700			
			VV 3,25*2 "UT1		6,500			
			VV 2.NP					
			VV 3,35*8 "ZTI1-8		26,800			
			VV Součet		60,000			
132	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	20,000	261,85	5 237,00	CS ÚRS 2020 02
			VV legenda prostupů					
			VV 1.NP					
			VV 3,35*2 "ZTI10,12		6,700			
			VV 3,25 "UT2		3,250			
			VV 2.NP					
			VV 3,35*3 "ZTI14-16		10,050			
			VV Součet		20,000			
133	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,500	2 472,67	1 236,34	CS ÚRS 2020 02
			VV legenda prostupů - ZTI					
			VV 2.NP					
			VV 0,25*2		0,500			
			VV Součet		0,500			
134	K	977151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	4,500	3 047,71	13 714,70	CS ÚRS 2020 02
			VV legenda prostupů - ZTI					
			VV 1.NP					
			VV 0,25*8		2,000			
			VV 2.NP					
			VV 0,25*10		2,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,500			
135	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,175	3 047,71	533,35	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,175 "VZT17		0,175			
	VV		0,115*2 "VZT30,32		0,230			
	VV		2.NP					
	VV		0,115 "VZT31		0,115			
	VV		0,175 "VZT33		0,175			
136	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	3,280	4 312,80	14 145,98	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,30 "VZT1		0,300			
	VV		0,30 "VZT2		0,300			
	VV		0,115 "VZT3		0,115			
	VV		0,115 "VZT7		0,115			
	VV		0,175 "VZT9		0,175			
	VV		0,175 "VZT10		0,175			
	VV		0,115 "VZT29		0,115			
	VV		0,25 "VZT31		0,250			
	VV		2.NP					
	VV		0,30*2 "VZT1,2		0,600			
	VV		0,115*3 "VZT3,4,5		0,345			
	VV		0,25*2 "VZT7,9		0,500			
	VV		0,175 "VZT10		0,175			
	VV		0,115 "VZT30		0,115			
	VV		Součet		3,280			
137	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	2,575	5 462,88	14 066,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,115*2 "VZT4,5		0,230			
	VV		0,30 "VZT12		0,300			
	VV		0,175*3 "VZT13,14,16		0,525			
	VV		2.NP					
	VV		0,115*3 "VZT4,5,11		0,345			
	VV		0,30 "VZT13		0,300			
	VV		0,175*3 "VZT14,16,17		0,525			
	VV		0,175*2 "VZT21,25		0,350			
	VV		Součet		2,575			
138	K	977151213	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	0,250	1 897,63	474,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		0,25 "SLB1		0,250			
	VV		Součet		0,250			
139	K	977151214	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 60 mm do stavebních materiálů	m	4,500	2 242,66	10 091,97	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,25*6 "ZTI10,12		1,500			
	VV		2.NP					
	VV		0,25*12 "ZTI14-16		3,000			
	VV		Součet		4,500			
140	K	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	2,250	2 242,66	5 045,99	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,25*2 "ZTI11,13		0,500			
	VV		0,25*5 "UT1,2 EL1		1,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2.NP					
			0,25 "ZTI13		0,250			
			0,25 "EL1		0,250			
			Součet		2,250			
141	K	977151224	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	1,750	3 047,71	5 333,49	CS ÚRS 2020 02
			legenda prostupů					
			střecha - ZTI1-7					
			0,25*7		1,750			
			Součet		1,750			
142	K	977151228	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	2,000	4 312,80	8 625,60	CS ÚRS 2020 02
			legenda prostupů					
			1.NP					
			0,25 "VZT8		0,250			
			0,25 "VZT31		0,250			
			2.NP					
			0,25 "VZT7		0,250			
			0,25 "VZT32		0,250			
			střecha - VZT1-3					
			0,25*3		0,750			
			0,25 "VZT4		0,250			
			Součet		2,000			
143	K	977151229	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,250	5 462,88	1 365,72	CS ÚRS 2020 02
			legenda prostupů					
			střecha - VZT5					
			0,25*1		0,250			
			Součet		0,250			
D 997 Přesun sutě							17 640,77	
144	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	11,681	728,04	8 504,24	CS ÚRS 2020 02
145	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,681	242,60	2 833,81	CS ÚRS 2020 02
146	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	163,534	10,61	1 735,10	CS ÚRS 2020 02
			11,681*14 "Přepočtené koeficientem množství		163,534			
147	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	11,681	391,03	4 567,62	CS ÚRS 2020 02
D 998 Přesun hmot							353 118,12	
148	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1 187,231	297,43	353 118,12	CS ÚRS 2020 02
D PSV Práce a dodávky PSV							7 954 080,41	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							362 917,56	
149	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	287,530	18,40	5 290,55	CS ÚRS 2020 02
			izolace základů					
			2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85		276,893			
			skladba P5					
			výtahová šachta - podkladní beton					
			2,29*4,645		10,637			
			Součet		287,530			
150	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,086	56 123,94	4 826,66	CS ÚRS 2020 02
			287,53*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,086			
151	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	54,161	27,60	1 494,84	CS ÚRS 2020 02
			izolace základů					
			(21,70+3,38+6,43+1,25+16,60+7,33+5,75+18,255)*0,60		48,417			
			příloha D.1.03.1.3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	výtahová šachta					
		VV	(2,09+2,545*2)*0,80		5,744			
		VV	Součet		54,161			
152	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,019	56 123,94	1 066,35	CS ÚRS 2020 02
		VV	54,161*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,019			
153	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	565,900	123,06	69 639,65	CS ÚRS 2020 02
		VV	izolace základů - 2x pás SBS					
		VV	(2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85)*2		553,786			
		VV	skladba P5					
		VV	výtahová šachta - podkladní beton					
		VV	2,29*2,645*2		12,114			
		VV	Součet		565,900			
154	M	628361R1	pás asfaltový natavitelný pro střední radonový index	m2	13,931	177,11	2 467,32	
		VV	12,114*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		13,931			
155	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index	m2	564,862	203,56	114 983,31	
		VV	izolace základů - 2x pás SBS					
		VV	(2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85)*2		553,786			
		VV	Součet		553,786			
		VV	553,786*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		564,862			
156	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	108,274	134,56	14 569,35	CS ÚRS 2020 02
		VV	izolace základů - 2x pás SBS					
		VV	(21,70+3,38+6,43+1,25+16,60+7,33+5,75+18,255)*0,60*2		96,834			
		VV	příloha D.1.03.1.3					
		VV	výtahová šachta					
		VV	(2,06+2,545*2)*0,80*2		11,440			
		VV	Součet		108,274			
157	M	628361R1	pás asfaltový natavitelný pro střední radonový index	m2	13,728	177,11	2 431,37	
		VV	11,44*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		13,728			
158	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index	m2	98,771	203,56	20 105,82	
		VV	izolace základů - 2x pás SBS					
		VV	(21,70+3,38+6,43+1,25+16,60+7,33+5,75+18,255)*0,60*2		96,834			
		VV	Součet		96,834			
		VV	96,834*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		98,771			
159	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva	m2	110,050	138,01	15 188,00	CS ÚRS 2020 02
		VV	skladba P2					
		VV	4,40+2,45+9,9+15,1+14,9+3,90+2,70		53,350			
		VV	skladba P5					
		VV	výtahová šachta - podkladní beton					
		VV	1,65*2,0		3,300			
		VV	skladba P9					
		VV	4,40		4,400			
		VV	skladba P11					
		VV	2,50+9,90+15,10+14,90+3,90+2,70		49,000			
		VV	Součet		110,050			
160	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	1 001,455	65,55	65 645,38	CS ÚRS 2020 02
		VV	110,05*9,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 001,455			
161	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva	m2	47,158	138,01	6 508,28	CS ÚRS 2020 02
		VV	skladba P2					
		VV	(2,56+1,80)*2*0,30-0,90*0,30 "mč. 1.03		2,346			
		VV	(2,56+1,0)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 1.04		1,896			
		VV	(2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*0,30-0,84*0,30-0,90*0,30*2 "mč. 1.05		2,972			
		VV	(3,60+4,20)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 1.10a		4,440			
		VV	(3,60+4,20)*2*0,30-0,80*0,30*3 "mč. 1.10		3,960			
		VV	(1,785+1,35+0,95+1,35)*2*0,30-0,70*0,320*3 "mč. 1.12a		2,589			
		VV	(2,85+0,95)*2*0,30-0,70*0,30 "mč. 1.12b		2,070			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		skladba P9					
	VV		(2,56+1,80)*2*0,30-0,90*0,30 "mč. 2.03		2,346			
	VV		skladba P11					
	VV		(2,56+1,0)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 2.04		1,896			
	VV		(2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*0,30-0,90*0,30*2-0,84*0,30 "mč. 2.05		2,972			
	VV		(3,60+4,20)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 2.10a		4,440			
	VV		(3,60+4,20)*2*0,30-0,80*0,30*3 "mč. 2.10		3,960			
	VV		(1,785+1,35+0,95+1,35)*2*0,30-0,70*0,30*3 "mč. 2.12a		2,631			
	VV		(2,85+0,95)*2*0,30-0,70*0,30 "mč. 2.12b		2,070			
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(1,65+2,0)*2*0,90		6,570			
	VV		Součet		47,158			
162	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	429,138	65,55	28 130,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		47,158*9,1 "Přepočtené koeficientem množství		429,138			
163	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,000	3 523,56	10 570,68	CS ÚRS 2020 02
D 712			Povlakové krytiny				148 730,03	
164	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	291,921	92,01	26 859,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba Sstřechy S1+S4					
	VV		2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85		276,893			
	VV		skladba S2					
	VV		8,84*1,70		15,028			
	VV		Součet		291,921			
165	M	2832201R	fólie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	335,709	303,12	101 760,11	
	VV		291,921*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		335,709			
166	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	291,921	27,60	8 057,02	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba Sstřechy S1+S4					
	VV		2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85		276,893			
	VV		skladba S2					
	VV		8,84*1,70		15,028			
	VV		Součet		291,921			
167	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 (r.f. Filtek 300)	m2	335,709	23,00	7 721,31	CS ÚRS 2020 02
	VV		291,921*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		335,709			
168	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,000	1 443,98	4 331,94	CS ÚRS 2020 02
D 713			Izolace tepelné				456 729,22	
169	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	875,763	113,86	99 714,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba střechy S1+S4					
	VV		(2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85)*2 "EPS 100S ve dvou vrstvách		553,786			
	VV		2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85 "EPS spádové klíny		276,893			
	VV		spojovací krček "A"					
	VV		8,84*1,70*2 "minerální vata ve dvou vrstvách		30,056			
	VV		8,84*1,70 "minerální spádové klíny		15,028			
	VV		Součet		875,763			
170	M	63152102	pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,033-0,035 tl 140mm	m2	30,657	895,70	27 459,47	CS ÚRS 2020 02
	VV		spojovací krček "A"					
	VV		8,84*1,70*2 "minerální vata ve dvou vrstvách		30,056			
	VV		Součet		30,056			
	VV		30,056*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		30,657			
171	M	6314044R	deska tepelně izolační minerální plochých střech λ=0,038 bodového zatížení Fp=400 N, m3 - spádové klíny	m3	1,457	2 508,31	3 654,61	
	VV		spojovací krček "A"					
	VV		8,84*1,70*(0,02+0,17)/2 "minerální spádové klíny		1,428			
	VV		Součet		1,428			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,428*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,457			
172	M	28372312	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm	m2	554,825	192,77	106 953,62	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách					
	VV		(2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85-2,05*2,40)*2		543,946			
	VV		Součet		543,946			
	VV		543,946*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		554,825			
173	M	2837230R	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 90mm	m2	10,037	141,46	1 419,83	
	VV		skladba S4 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách					
	VV		2,05*2,40*2		9,840			
	VV		Součet		9,840			
	VV		9,84*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,037			
174	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	25,119	1 422,63	35 735,04	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S1 - spádové klíny					
	VV		(2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85-2,05*2,40)*(0,02+0,16)/2		24,478			
	VV		skladba S4 - spádové klíny					
	VV		2,05*2,40*(0,02+0,04)/2		0,148			
	VV		Součet		24,626			
	VV		24,626*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		25,119			
175	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	278,790	51,75	14 427,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.30					
	VV		skladba P1					
	VV		16,5+39,60+13,50+9,65+9,15-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)		78,440			
	VV		skladba P2					
	VV		4,40+2,45+9,9+15,1+14,9+3,90+2,70		53,350			
	VV		skladba P3, P4					
	VV		115,70+26,50+4,80		147,000			
	VV		Součet		278,790			
176	M	28372309	deska EPS 100S pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	284,366	189,76	53 961,29	CS ÚRS 2020 02
	VV		278,79*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		284,366			
177	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,040	195,51	985,37	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.07					
	VV		izolace nadpraží oken s žaluziemi					
	VV		0,24*(2,25*8+0,75*4)		5,040			
	VV		Součet		5,040			
178	M	63152104	pás tepelně izolační univerzální $\lambda=0,033-0,033-0,035$ tl 160mm	m2	5,292	188,61	998,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		5,04*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		5,292			
179	K	7131311R1	D+M podkladní izolační profil z PUR pěny a PIR izolace pod vstupní dveře a prosklené stěny - 24/O	m	2,600	1 322,59	3 438,73	
	VV		příloha D.1.02.1.36					
	VV		ref. výrobek Purenit 550MD					
	VV		průřez 80x200 mm					
	VV		2,60		2,600			
	VV		Součet		2,600			
180	M	713291122	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	276,893	123,06	34 074,45	CS ÚRS 2020 02
181	M	6285300R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou parotěsnicí	m2	318,427	150,61	47 958,29	
	VV		276,893*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		318,427			
182	K	713291132	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií	m2	15,028	44,85	674,01	CS ÚRS 2020 02
	VV		spojovací krček "A"					
	VV		8,84*1,70		15,028			
	VV		Součet		15,028			
183	M	28329011	fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	16,531	180,04	2 976,24	CS ÚRS 2020 02
	VV		15,028*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		16,531			
184	K	713291142	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr	m2	276,893	18,40	5 094,83	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba Sstřechy S1+S4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85		276,893			
		VV	Součet		276,893			
185	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	69,223	56,35	3 900,72	CS ÚRS 2020 02
		VV	276,893*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		69,223			
186	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3,000	4 434,28	13 302,84	CS ÚRS 2020 02
D 714			Akustická a protiotřesová opatření				28 089,09	
187	K	714183002	Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů	m2	250,440	57,37	14 367,74	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.23.1.30					
		VV	kročejová izolace					
		VV	skladba P7,8					
		VV	115,90+26,5+4,8+6,4		153,600			
		VV	skladba P9					
		VV	4,40		4,400			
		VV	skladba P10					
		VV	39,9+13,50-0,29*1,20*20-2,50*1,20		43,440			
		VV	skladba P11					
		VV	2,50+9,90+15,10+14,90+3,90+2,70		49,000			
		VV	Součet		250,440			
188	M	28376643	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2)	m3	10,218	1 262,79	12 903,19	CS ÚRS 2020 02
		VV	10,0177993591912*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		10,218			
189	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	3,000	272,72	818,16	CS ÚRS 2020 02
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty				91 389,10	
190	K	725244R3O	D+M zalamovací sprchové dveře pro montáž do výklenku 950x1900 mm, bezpečnostní sklo matné - 8/O	soubor	4,000	12 650,89	50 603,56	
		VV	příloha D.1.02.1.35					
		VV	4,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
191	K	72529141R	M+D sklopné v úhlu 10° koupelnové zrcadlo invalidní 400x600 mm v bílém kovovém rámu - 4/O	kus	1,000	3 786,64	3 786,64	
		VV	příloha D.1.02.1.35					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
192	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů - 11/O	soubor	5,000	1 485,47	7 427,35	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.02.1.35					
		VV	5,0		5,000			
		VV	Součet		5,000			
193	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků obdélníkový - 13/O	soubor	4,000	1 640,73	6 562,92	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.02.1.35					
		VV	4,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
194	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 800 mm - 1/O	soubor	1,000	2 727,55	2 727,55	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.02.1.35					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
195	K	725291R2O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo v rámu závěsné 300x500 mm - 9/O	soubor	2,000	1 233,46	2 466,92	
		VV	příloha D.1.02.1.35					
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
196	K	725291R4O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš odpadkový objem 3L, nášlapný otevírací mechanismus, vyjímatelný plastový košík s uchem uvnitř - 14/O	soubor	4,000	709,16	2 836,64	
		VV	příloha D.1.02.1.35					
		VV	4,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
197	K	725291R7O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC štětka - 12/O	soubor	5,000	1 149,07	5 745,35	
	VV		přílha D.1.02.1.35					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
198	K	725291R8O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové háček na oděvy - 15/O	soubor	5,000	476,27	2 381,35	
	VV		přílha D.1.02.1.35					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
199	K	72529R02O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů vodorovné nastenné madlo se svislou částí dl. 600 mm, v. 740 mm - 2/O	soubor	1,000	2 365,28	2 365,28	
	VV		přílha D.1.02.1.35					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
200	K	72529R03O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo svislé dl 500 mm - 3/O	soubor	1,000	1 114,57	1 114,57	
	VV		přílha D.1.02.1.35					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
201	K	72529R10O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš odpadkový objem 3L, samozavírací mechanismus, vyjímatelný plastový košík s uchem uvnitř - 10/O	soubor	1,000	709,16	709,16	
	VV		přílha D.1.02.1.35					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
202	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	3,000	887,27	2 661,81	CS ÚRS 2020 02
D		762	Konstrukce tesařské				43 308,36	
203	K	7629910R1	D+M dřevěný kmen stromu pr. 300 mm včetně napuštění olejovým nátěrem, dole upevněn na zemním vrtu s horní plotnou, nahoře L profil uchycen k betonové konstrukci - 24/T	kpl	1,000	42 046,95	42 046,95	
	VV		dřevěné kmeny tvoří "nohy" stonožky, kterou vytvářejí spojovací lávky, proto jsou osazeny šikmo					
	VV		- borovice nebo jiná dřevina vhodná do venkovního prostředí					
	VV		- odkorněný povrch					
	VV		- dl. 3800 mm - 1ks, 3600 mm -1 ks, 3580 mm					
	VV		- vrt ref.v. Screw HEX-120 M12 76x800 mm					
	VV		- L profil 50/50/5 mm					
	VV		- včetně upevňovacího a kotvícího materiálu					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
204	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3,000	420,47	1 261,41	CS ÚRS 2020 02
D		763	Konstrukce suché výstavby				638 983,87	
205	K	76311334R	SDK příčka instalační tl 400 mm zdvojený profil UA 100/40/2 desky 2xH2 12,5 EI 60 55 dB - W1	m2	9,920	2 110,40	20 935,17	
	VV		přílha D.1.02.1.4,5					
	VV		3,10*1,60*2		9,920			
	VV		Součet		9,920			
206	K	76312144R	SDK stěna přesazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 bez TI 50 kg/m3 EI 30 - W2	m2	3,120	990,22	3 089,49	
	VV		přílha D.1.02.1.30					
	VV		zákryt ZTI a VZT					
	VV		(0,30+0,30)*2,60*2		3,120			
	VV		Součet		3,120			
207	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	13,040	29,90	389,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		9,92+3,12		13,040			
	VV		Součet		13,040			
208	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C3	m2	116,500	715,35	83 338,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.02.1.13,14					
	VV		66,50+50,0		116,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		116,500			
209	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD PO REI 30 RED - C5	m2	14,900	726,85	10 830,07	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.13,14					
	VV		14,90		14,900			
	VV		Součet		14,900			
210	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C4	m2	102,400	797,01	81 613,82	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.13,14					
	VV		53,40+49,0		102,400			
	VV		Součet		102,400			
211	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	233,800	29,90	6 990,62	CS ÚRS 2020 02
	VV		116,50+14,90+102,40		233,800			
	VV		Součet		233,800			
212	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	12,490	730,30	9 121,45	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.04					
	VV		6,245 "mč. 1.11		6,245			
	VV		příloha D.1.02.1.05					
	VV		6,245 "mč. 2.11		6,245			
	VV		Součet		12,490			
213	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	4,590	741,80	3 404,86	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.04					
	VV		2,295 "mč. 1.08		2,295			
	VV		příloha D.1.02.1.05					
	VV		2,295 "mč. 2.08		2,295			
	VV		Součet		4,590			
214	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	2,000	518,69	1 037,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.13,14					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
215	M	59030711	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	2,000	713,05	1 426,10	CS ÚRS 2020 02
216	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	4,000	531,34	2 125,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.13,14					
	VV		2,0*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
217	M	59030714	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus	4,000	897,06	3 588,24	CS ÚRS 2020 02
218	K	7634112R1	Dělicí zástěny k WC 600x1200, desky s HPL MAX - laminátem tl 10 mm včetně 1 nerezové nohy, povrchová úprava melanin - 22/T	kpl	16,000	4 734,50	75 752,00	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		16,0		16,000			
	VV		Součet		16,000			
219	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	113,250	414,03	46 888,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.13,14					
	VV		53,10+60,15		113,250			
	VV		Součet		113,250			
220	M	590360R2	<i>panel minerální 600x600 mm s polozapuštěným roštem - C2</i>	m2	118,913	460,03	54 703,55	
	VV		113,25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		118,913			
221	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	231,800	360,55	83 575,49	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.13,14					
	VV		115,90*2		231,800			
	VV		Součet		231,800			
222	M	590360R1	<i>panel akustický 600x1200 mm - C1</i>	m2	243,390	540,54	131 562,03	
	VV		231,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		243,390			
223	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,000	6 203,72	18 611,16	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 764			Konstrukce klempířské	240 610,26				
224	K	764214R3K	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou oplastováním mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	104,996	1 725,12	181 130,70	
	VV		příloha D.1.02.1.36					
	VV		1,0*89,0 "6/k		89,000			
	VV		0,93*17,20 "7/K		15,996			
	VV		Součet		104,996			
225	K	764216R1K	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL koncovky rš 285 mm	m	55,100	511,79	28 199,63	
	VV		příloha D.1.02.1.36					
	VV		2,20*16 "1/K		35,200			
	VV		0,70*16 "2/K		11,200			
	VV		1,45*6 "3/K		8,700			
	VV		Součet		55,100			
226	K	764216R2K	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL koncovky rš 390 mm	m	8,300	707,30	5 870,59	
	VV		příloha D.1.02.1.36					
	VV		1,65*2 "4/K		3,300			
	VV		1,25*4 "5/K		5,000			
	VV		Součet		8,300			
227	K	76460R08K	D+M kulaty chránící integrovanou PVC manžetu DN 100, dl. 600 mm včetně vyjímání ochranné mřížky - 8/K	kus	2,000	3 220,23	6 440,46	
	VV		příloha D.1.02.1.36					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
228	K	76460R09K	D+M těsnící manžeta, tvarovka pro prostup hydroizolací z PVC fólie DN 110 - 9/K	kus	3,000	920,06	2 760,18	
	VV		příloha D.1.02.1.36					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
229	K	76460R10K	D+M prostup pro kabely DN 50, integrovaná manžeta výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm - 10/K	kus	4,000	2 300,16	9 200,64	
	VV		příloha D.1.02.1.36					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
230	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	2 336,02	7 008,06	CS ÚRS 2020 02
D 766			Konstrukce truhlářské	3 393 760,36				
231	K	7661212R1	D+M dělicí mobilní příčky 7000x3050 mm - 23/T	kpl	2,000	420 009,52	840 019,04	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
232	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	25,875	947,57	24 518,37	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.31					
	VV		2,25*1,50*2 "O03		6,750			
	VV		1,50*0,75*6 "O06		6,750			
	VV		2,25*0,75*6 "O07		10,125			
	VV		0,75*1,50*2 "O08		2,250			
	VV		Součet		25,875			
233	M	6111R006	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklpné trojkřílové 2250x750 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O07	kus	6,000	25 647,66	153 885,96	
	VV		- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
	VV		- integrované speciální reflexní izolační můstky					
	VV		- stavební hl. křídla 78 mm					
	VV		- celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - minimálně 2 bezpečnostní body VV - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem VV - standardní závěsy VV - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS VV - barva bílá RAL 9016 VV - členění dvěma sloupky na tři části VV - součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 3 kusy VV - z vnitřní strany opatřit matnou fólií VV 6,0 VV Součet		6,000 6,000			
234	M	6111RO07	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné dvojkrídlové 1500x750 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O06	kus	6,000	13 784,56	82 707,36	
			VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce VV - integrované speciální reflexní izolační můstky VV - stavební hl. křídla 78 mm VV - celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování VV - minimálně 2 bezpečnostní body VV - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem VV - standardní závěsy VV - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS VV - barva bílá RAL 9016 VV - členění středním poutcem VV - součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 1 kusy VV - z vnitřní strany opatřit matnou fólií VV 6 VV Součet		6,000 6,000			
235	M	6111RO08	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné dvojkrídlové 750x1500 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K,- O08	kus	2,000	12 889,63	25 779,26	
			VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce VV - integrované speciální reflexní izolační můstky VV - stavební hl. křídla 78 mm VV - celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování VV - minimálně 2 bezpečnostní body VV - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem VV - standardní závěsy VV - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS VV - barva bílá RAL 9016 VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 1 kusy VV 2,0 VV Součet		2,000 2,000			
236	M	6111RO12	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné izolační trojkrídlové 2250x1500 mm, trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O03	kus	2,000	30 226,28	60 452,56	
			VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce VV - integrované speciální reflexní izolační můstky VV - stavební hl. křídla 78 mm VV - celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování VV - minimálně 2 bezpečnostní body VV - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem VV - standardní závěsy VV - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS VV - barva bílá RAL 9016 VV - otevíravé sklopné a pevné, trojkrídlové se sklopem a poutcem vlevo uprostřed, vrchní a pravá část otevíravá VV - spodní levá část pevná					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			- dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
			2,0		2,000			
			Součet		2,000			
237	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	71,341	996,82	71 114,14	CS ÚRS 2020 02
			příloha D.1.03.1.31					
			2,25*2,50*4 "O01		22,500			
			0,75*2,50*4 "O02		7,500			
			0,75*2,10*4 "O04		6,300			
			0,75*2,10*6 "O05		9,450			
			2,25*2,50*4 "O11		22,500			
			0,84*1,84*2 "O17		3,091			
			Součet		71,341			
238	M	6111RO04	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 750x2100 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O05	kus	6,000	14 424,18	86 545,08	
			- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
			- integrované speciální reflexní izolační můstky					
			- stavební hl. křídla 78 mm					
			- celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			- minimálně 2 bezpečnostní body					
			- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			- standartní závěsy					
			- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			- barva bílá RAL 9016					
			- členění dvěma poutci					
			- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			6,0		6,000			
			Součet		6,000			
239	M	6111RO05	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 750x2100 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O04	kus	4,000	14 655,80	58 623,20	
			- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
			- integrované speciální reflexní izolační můstky					
			- stavební hl. křídla 78 mm					
			- celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			- minimálně 2 bezpečnostní body					
			- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			- standartní závěsy					
			- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			- barva bílá RAL 9016					
			- čís potcem dole vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní část pevná					
			- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			- dvoupákový ovladač sklopného křídla 1 kus					
			- spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
			4,0		4,000			
			Součet		4,000			
240	M	6111RO03	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 750x2500 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O02	kus	4,000	16 158,76	64 635,04	
			- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
			- integrované speciální reflexní izolační můstky					
			- stavební hl. křídla 78 mm					
			- celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			- minimálně 2 bezpečnostní body					
			- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			- standartní závěsy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
	VV		- barva bílá RAL 9016					
	VV		- s potcem dole vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní část pevná					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
	VV		- dvoupákový ovladač sklopného křídla 3 kusy					
	VV		- spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
241	M	6111RO01	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné čtyřkřířlové 2250x2500 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O01	kus	4,000	34 861,50	139 446,00	
	VV		- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přidavné těsnění v zasklívací drážce					
	VV		- integrované speciální reflexní izolační můstky					
	VV		- stavební hl. křídla 78 mm					
	VV		- celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
	VV		- minimálně 2 bezpečnostní body					
	VV		- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
	VV		- standartní závěsy					
	VV		- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
	VV		- barva bílá RAL 9016					
	VV		- se sloupkem a poutcem dole, vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní část pevná					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
	VV		- dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
	VV		- spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
242	M	6111RO02	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné čtyřkřířlové 2250x2500 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O11	kus	4,000	34 861,50	139 446,00	
	VV		- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přidavné těsnění v zasklívací drážce					
	VV		- integrované speciální reflexní izolační můstky					
	VV		- stavební hl. křídla 78 mm					
	VV		- celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
	VV		- minimálně 2 bezpečnostní body					
	VV		- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
	VV		- standartní závěsy					
	VV		- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
	VV		- barva bílá RAL 9016					
	VV		- se sloupkem a poutcem dole, vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní část pevná					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
	VV		- dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
	VV		- spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
243	M	6111RO017	okno dřevěné vnitřní podávací 840x1840 mm zaskleno dvojsklem bez požadavku na tepelnou izolci,- O17	kus	2,000	45 892,83	91 785,66	
	VV		- standartní závěsy					
	VV		- barva bílá RAL 9016					
	VV		-dolní křídlo manuálně výsuvné nahoru se zajištěním v horní poloze, horní křídlo pevné zasklení					
	VV		- součástí dodávky kování pro udržení výsuvného křídla v horní poloze					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
244	K	76662RO14	D+M dřevěné okno kruhové, bílé RAL 9016, pevné pr. 800 mm - O09	kus	4,000	19 606,88	78 427,52	
	VV		- zasklení bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
	VV		4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
245	K	76662RO15	D+M dřevěné okno kruhové, bílé RAL 9016, pevné pr. 1060 mm - O10	kus	2,000	14 824,26	29 648,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- zasklení bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
246	K	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	15,000	474,98	7 124,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		6,0 "8		6,000			
	VV		9,0 "9		9,000			
	VV		Součet		15,000			
247	M	61162R07	dveře vnitřní dřevěné plné 1křídle 700x1970mm, otočné - 8	kus	6,000	3 951,68	23 710,08	
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
248	M	61162R08	dveře vnitřní dřevěné plné 1křídle 800x1970mm, otočné - 9	kus	9,000	3 951,68	35 565,12	
	VV		- ZV WC typ 9, SG					
	VV		- KL/KL WC typ 9					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
249	K	766660172	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	6,000	474,98	2 849,88	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		6,0 "3		6,000			
	VV		Součet		6,000			
250	M	61162R03	dveře vnitřní dřevěné plné 1křídle 900x1970mm, otočné - 3	kus	6,000	3 795,84	22 775,04	
	VV		- ZV typ5, SG					
	VV		- KL/KL typ 5 SD					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
251	K	766660181	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	3,000	1 052,32	3 156,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		3,0 "4		3,000			
	VV		Součet		3,000			
252	M	61162R04	dveře vnitřní dřevěné plné 1křídle 800x1970mm, PO EW15DP3-C3 - 4	kus	3,000	11 920,59	35 761,77	
	VV		- ocelová zárubeň na celou šířku zdíva					
	VV		- samozavírač C3					
	VV		- ZV typ 7, SG					
	VV		- KL/KL typ 7 SD					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
253	K	766660182	Montáž dveřních křidel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	11,000	1 089,13	11 980,43	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		9,0 "5		9,000			
	VV		2,0 "6		2,000			
	VV		Součet		11,000			
254	M	61162R05	dveře vnitřní dřevěné plné 1křídle 900x1970mm, PO EW15DP3-C3 - 5	kus	9,000	12 383,94	111 455,46	
	VV		- samozavírač C3					
	VV		- ZV typ 7, SG					
	VV		- KL/KL typ 7 SD					
	VV		9,0		9,000			
	VV		Součet		9,000			
255	M	61162R11	dveře vnitřní dřevěné plné 1křídle 900x1970mm, PO EI15DP3-C3 - 6	kus	2,000	14 005,68	28 011,36	
	VV		- samozavírač C3					
	VV		- ZV typ 7, SG					
	VV		- KL/KL typ 7 SD					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 2,0		2,000			
			VV Součet		2,000			
256	K	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	2 125,35	2 125,35	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.02.1.33					
			VV 1,0 "10		1,000			
			VV Součet		1,000			
257	M	61161R12	dveře dřevěné 1250x1970 prosklené, dvojkřídlov, PO EI15DP3-C3, dvoukřídlové otočné - 10	kus	1,000	44 816,35	44 816,35	
			VV - dveřní křídla š. 900 a 350 mm					
			VV - vodorovné madlo v. 800 mm					
			VV - prosklení drátosklo s PO					
			VV - samozavírač, koordinátor postupného zavírání					
			VV - kování klika-klika, stavěč dveřního křídla na obě křídla KL/KL typ 5 MA, 2xSD					
			VV - ZV typ 5, SG					
			VV 1,0		1,000			
			VV Součet		1,000			
258	K	7666607R1	D+M systém generální klíče - vložka a zámek FAB 300/FAB 300 HD + 2x klíč	kus	39,000	460,68	17 966,52	
			VV • vhodné pro projekty středního rozsahu					
			VV • zabezpečení splňující požadavky					
			VV pro RC3 podle ENV 1627 nebo NBÚ SS4=2					
			VV • systémy chráněné patentem					
			VV • vysoká úroveň zabezpečení					
			VV • rozsáhlá rozměrová řada					
			VV • široká nabídka kompatibilních zámků					
			VV • výroba klíče ve výrobním závodě pouze se					
			VV souhlasem majitele					
			VV POPIS VÝROBKU					
			VV • 5ti stavítkový uzamykací systém					
			VV • přidavné kódování na hřbetu klíče-HD					
			VV • mosazné těleso i bubínek					
			VV • spojka úplná nesymetrická					
			VV PROVEDENÍ VÝROBKU					
			VV • standardní povrchová úprava:					
			VV – leštěná mosaz					
			VV – saténový nikl, označení „Ns“					
			VV • oboustranná cylindrická vložka:					
			VV – označení „FAB 300 nebo FAB 300HD“					
			VV – rozměr od 30+30 mm					
			VV – další rozměry odstupňované po 5mm					
			VV • knoflíková cylindrická vložka:					
			VV – označení „FAB 302 nebo FAB 302HD“					
			VV – rozměr od 30+30mm					
			VV – standardně osazen černý plastový					
			VV knoflík 22mm					
			VV – další rozměry odstupňované po 5 mm					
			VV • jednostranná cylindrická vložka:					
			VV – označení „FAB 301 nebo FAB 301HD“					
			VV – standardně nastavitelný zub „Z“					
			VV – rozměr od 30+10mm					
			VV – další rozměry odstupňované po 5mm					
			VV RC3, dle ČSN EN 1627:2012 Uzamykací systém typ 2. Dle požadavku NBÚ					
			VV v souladu se zákonem č. 412/205 sb.					
			VV Systémy generálního klíče FAB 300/ FAB 300 HD					
			VV Klíč FAB 300HD					
			VV DOPLŇKY					
			VV • zvýšená ochrana proti odvrtání,					
			VV označení „B“					
			VV • prostupová spojka, označení „P“					
			VV • ozubené kolo, 10 zubů („K10“)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nebo 12 zubů („K12“)					
	VV		• malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“					
	VV		nebo velký kovový knoflík 30 mm,					
	VV		označení „VK“					
	VV		KLÍČE					
	VV		• polotovary klíče FAB 300HD					
	VV		• patentově chráněná technologie					
	VV		39,0		39,000			
	VV		Součet		39,000			
259	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	21,000	759,05	15 940,05	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		6,0 "3		6,000			
	VV		6,0 "8		6,000			
	VV		9,0 "9		9,000			
	VV		Součet		21,000			
260	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídle 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	21,000	2 820,00	59 220,00	CS ÚRS 2020 02
261	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	14,000	759,05	10 626,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		3,0 "4		3,000			
	VV		9,0 "5		9,000			
	VV		2,0 "6		2,000			
	VV		Součet		14,000			
262	M	SPL.0011665.UR S	zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk, mahagon	kus	14,000	4 517,52	63 245,28	
263	K	766682222	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	1 062,67	1 062,67	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		1,0 "10		1,000			
	VV		Součet		1,000			
264	M	61182281	zárubeň obložková protipožární pro dveře 2křídle 1250,1450x1970mm tl 180-250mm dub,buk	kus	1,000	5 360,53	5 360,53	CS ÚRS 2020 02
265	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	16,000	242,58	3 881,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		16 "2/T		16,000			
	VV		Součet		16,000			
266	M	607941R2	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 2/T	m	12,000	384,71	4 616,52	
	VV		0,75*16		12,000			
	VV		Součet		12,000			
267	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	16,000	26,53	424,48	CS ÚRS 2020 02
268	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	242,58	1 455,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		6,0 "3/T		6,000			
	VV		Součet		6,000			
269	M	607941R3	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 3/T	m	9,000	384,71	3 462,39	
	VV		1,50*6		9,000			
	VV		Součet		9,000			
270	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	6,000	26,53	159,18	CS ÚRS 2020 02
271	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	8,000	242,58	1 940,64	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		8,0 "1/T		8,000			
	VV		Součet		8,000			
272	M	607941R1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 1/T	m	18,000	384,71	6 924,78	
	VV		2,25*8		18,000			
	VV		Součet		18,000			
273	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	8,000	26,53	212,24	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
274	K	76669R6T	D+M koupelnové věšáky dl. 1680 mm pro 14 dětí v barevném provedení s dřevěnou plastikou vč. plastových rámečků pro zasunutí značek - 4/T	kus	4,000	29 268,41	117 073,64	
275	K	766821R11T	D+M šatní skříňky půlené do zaměstnanecké šatny 400x600x1900 mm s klasickými šatními zámky, materiál laminová dřevotříska s povrchem melanin, s ABS plastovými hranami - 8/T	kus	8,000	7 235,16	57 881,28	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		8,0 "8/T		8,000			
	VV		Součet		8,000			
276	K	76682R07T	D+M skříňě vestavěné s nosnou hliníkovou konstrukcí na lůžkoviny 4200x650x2000 mm, materiál laminovaná dřevotříska - 5/T	kus	2,000	41 879,04	83 758,08	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
277	K	76682R08T	D+M skříňě vestavěné s nosnou hliníkovou konstrukcí na skladování lehátek 4200x650x2000 mm, materiál laminovaná dřevotříska - 6/T	kus	2,000	37 402,93	74 805,86	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
278	K	76682R10T	D+M šatní skříň dětská 250x500x1300 mm dřevotřísková s lavičkou a policí na obuv - 7/T	kus	56,000	4 796,99	268 631,44	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		56		56,000			
	VV		Součet		56,000			
279	K	76689R09T	D+M kryt tělesa UT 1250x200x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 9/T	kus	1,000	5 741,20	5 741,20	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
280	K	76689R10T	D+M kryt tělesa UT 1250x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 10/T	kus	1,000	5 812,51	5 812,51	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
281	K	76689R11T	D+M kryt tělesa UT 5600x300x520mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 11/T	kus	4,000	21 897,54	87 590,16	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
282	K	76689R12T	D+M kryt tělesa UT 1100x200x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 12/T	kus	3,000	5 051,15	15 153,45	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
283	K	76689R13T	D+M kryt tělesa UT 1100x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 13/T	kus	2,000	5 115,56	10 231,12	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
284	K	76689R14T	D+M kryt tělesa UT 1200x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 14/T	kus	2,000	5 580,19	11 160,38	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
285	K	76689R15T	D+M kryt tělesa UT 1200x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 15/T	kus	2,000	5 580,19	11 160,38	
	VV		příloha D.1.02.1.33					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
286	K	76689R16T	D+M kryt tělesa UT 2390x300x820mm, laminovaná dřevotříška, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 16/T	kus	2,000	11 114,38	22 228,76	
		VV	příloha D.1.02.1.33					
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
287	K	76689R17T	D+M kryt tělesa UT 300x1120x800mm, laminovaná dřevotříška, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 17/T	kus	2,000	3 720,51	7 441,02	
		VV	příloha D.1.02.1.33					
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
288	K	76689R18T	D+M kryt tělesa UT 300x1120x800mm, laminovaná dřevotříška, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 18/T	kus	2,000	4 185,14	8 370,28	
		VV	příloha D.1.02.1.33					
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
289	K	76689R19T	D+M kryt tělesa UT 300x820x2300mm, laminovaná dřevotříška, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 19/T	kus	2,000	10 695,75	21 391,50	
		VV	příloha D.1.02.1.33					
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
290	K	76689R20T	D+M kryt tělesa UT 300x820x1350mm, laminovaná dřevotříška, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 20/T	kus	1,000	6 277,14	6 277,14	
		VV	příloha D.1.02.1.33					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
291	K	76689R21T	D+M kryt tělesa UT 200x820x1600mm, laminovaná dřevotříška, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 21/T	kus	1,000	7 339,82	7 339,82	
		VV	příloha D.1.02.1.33					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
292	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3,000	32 949,13	98 847,39	CS ÚRS 2020 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				1 109 416,57	
293	K	76710R01Z	D+M ocelové zábradlí schodiště včetně povrchové úpravy světle šedou barvou RAL 7035 - 1/Z	kpl	1,000	57 504,04	57 504,04	
		VV	příloha D.1.02.1.35					
		VV	celk. hmotnost 149,54kg					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
294	K	76710R02Z	D+M stěnový hliníkový žebřík dl. 3,64 m k výlezu na střechu včetně závěsných háků a ok na stěnu a do stropní konstrukce, eloxovaný hliník - 2/Z	kpl	1,000	14 376,01	14 376,01	
		VV	příloha D.1.02.1.35					
		VV	šířka 500 mm, dl. 3640 mm					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
295	K	76710R03Z	D+M ocelové zábradlí schodiště včetně dřevěných madel a povrchové úpravy světle šedou barvou RAL 7035 - 3/Z	kpl	1,000	147 210,35	147 210,35	
		VV	příloha D.1.02.1.35					
		VV	celk. hmotnost 294,92kg					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
296	K	76710R04Z	D+M nástěnný držák , tvar U nastavitelný, pozinkovaná ocel - 5/Z	kpl	3,000	1 725,12	5 175,36	
		VV	příloha D.1.02.1.35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		vnější zozměr 532 mm					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
297	K	76710R06Z	D+M ocelová nosná příčka WC - 6/Z	kpl	2,000	28 752,02	57 504,04	
	VV		příloha D.1.02.1.34					
	VV		celková hm. 116,86 kg					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
298	K	76710R07Z	D+M pomocná madla pro výstup na střechu dl. 1770 mm, užitná 1200 mm, profil 60x25 mm včetně kotevní patky 120x1200 mm a kotevních prvků a povrchové úpravy - 7/Z	kpl	2,000	4 600,32	9 200,64	
	VV		příloha D.1.02.1.34					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
299	K	76710R08Z	D+M oboustranný ocelový žebřík s madly a plošinou 1200x520x800/1500 mm, žárově pozinkováno včetně kotevních prvků - 8/Z	kpl	2,000	28 752,02	57 504,04	
	VV		příloha D.1.02.1.34					
	VV		celk. hm. 65kg					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
300	K	76716R08Z	D+M oboustranný ocelový žebřík s madly a plošinou 1200x520x800/1500 mm, žárově pozinkováno včetně kotevních prvků - 8/Z	kpl	2,000	28 752,02	57 504,04	
	VV		příloha D.1.02.1.34					
	VV		celk. hm. 65kg					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
301	K	7673RO016	D+M střešní světlík 1000x2200 mm do CHÚC typu včetně kolmé Fe/Zn světlíkové manžety v. 500 mm, peo větrání a výstup na střechu - O16	kpl	1,000	91 373,92	91 373,92	
	VV		příloha D1.23.1.31					
	VV		horní vrstva dvouvrstvá PET-G kopule, spodní vrstva PC deska tl. 25 mm čirá					
	VV		hliníkový rám AAG					
	VV		součástí dodávky					
	VV		AAG požární světlíková manžeta s izolací, lakovaná ocel v. 500 mm					
	VV		otevřač světlíku BF mechanismus, konzole 2.2, motor SG8OT, úhel otevření 105°, doba otevření 60s, ovládací centrála RWZ4d					
	VV		optické kouřové čidlo, tlačítko k otevření větrání a nouzové požární tlačítkos indikací					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
302	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón a	m2	11,942	511,79	6 111,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.35					
	VV		1,85*0,9 "5/O		1,665			
	VV		2,035*5,05 "6/O		10,277			
	VV		Součet		11,942			
303	M	697520R1	čistící zóna na hrubé nečistoty z Al profilů s gumovým páskem ve tvaru pilky - 5/O	m2	1,665	5 418,19	9 021,29	
	VV		příloha D.1.23.1.35					
	VV		1,85*0,90		1,665			
	VV		Součet		1,665			
304	M	697520R2	čistící zóna na jemné nečistoty z Al profilů s textilní rohože Shatwell, hliníkové profily jsou spojeny pružným ohebným profilem - 6/O	m2	10,277	4 547,18	46 731,37	
	VV		příloha D.1.02.1.35					
	VV		2,035*5,05		10,277			
	VV		Součet		10,277			
305	K	76764RD01	D+M vnější vstupní dveře dvojkřídlové prosklené s pevným nadsvětlíkem 1390x2400 mm, otočné, aktivní křídlo levé, nadsvětlík prosklený - D1	kpl	1,000	89 217,71	89 217,71	
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		- bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické zavrtané čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5 m					
	VV		- hliníkový práh					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		kování:					
	VV		elektromagnetický samozavírací zámek					
	VV		bezpečnostní kování s možností změny rozteče kl/kl rozteč 92 mm tl dv. 55-60 mm, bez.tř RC-3					
	VV		samozavírač s vačkovou technologií, kluzným ramínkem, kluzné ramínko					
	VV		oboustranně cylindrická vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3					
	VV		rozpojitelná kabelová průchodka					
	VV		kabel k elektromechanickému zámku 6 m					
	VV		protiplech k el. zámkům					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
306	K	76764RD02	D+M vnitřní dveře s prosklenou stěnou 690+1390+1610x2600 mm, dvojkřídlové dveře s pevným nadsvětlíkem - D2	kpl	1,000	132 513,65	132 513,65	
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		- bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916					
	VV		- zasklení čiré izolační dvojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické zavrtané čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5 m					
	VV		- bez práhu					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		kování:					
	VV		elektromagnetický samozavírací zámek					
	VV		bezpečnostní kování s možností změny rozteče kl/kl rozteč 92 mm tl dv. 55-60 mm, bez.tř RC-3					
	VV		samozavírač s vačkovou technologií, kluzným ramínkem, kluzné ramínko					
	VV		oboustranně cylindrická vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3					
	VV		rozpojitelná kabelová průchodka					
	VV		kabel k elektromechanickému zámku 6 m					
	VV		protiplech k el. zámkům					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
307	K	76764RD03	D+M vnější vstupní dveře jednokřídlové 1100x2400 mm, otočné, křídlo levé, prosklené - D3	kpl	1,000	168 365,12	168 365,12	
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		- bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 9016					
	VV		- zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické zavrtané čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5 mmechanická zástrč km pas					
	VV		- hliníkový práh					
	VV		- elektro zámek, pohon dveří ovládaný čidlem - otevření pro přívod vduchu do CHÚC při požáru					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		kování:					
	VV		protipožární mechanický zadlabávací zámek panikový úzký a elektromagnetický pohon ovládaný PO čidlem					
	VV		otevření pro přívod vzduchu do CHÚC při požáru					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
308	K	7678101R1	D+M dvířka z ocelového plechu komaxit v ocelovém rámu 300x300 mm - 21/O	kus	8,000	805,06	6 440,48	
	VV		příloha D.1.23.1.35					
	VV		8,0 "čistící kusy ZTI		8,000			
	VV		Součet		8,000			
309	K	7678811R1	D+M certifikovaný záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky, lano+kotevní prvky, revize	kpl	1,000	59 590,29	59 590,29	
310	K	767893115	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná šířky do 1,50 m	kus	1,000	4 600,32	4 600,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.35					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
311	M	28315R9O	prosklená stříška nad vstupem na kovové konstrukci 1500x1200 mm - 19/O	kus	1,000	19 666,38	19 666,38	
312	K	76789R18O	D+M prosklená stříška 2400x1200 mm nad hlavním vstupem na kovové konstrukci - 18/O	kpl	1,000	37 492,63	37 492,63	
	VV		příloha D.1.02.1.35					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
313	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,000	10 771,03	32 313,09	CS ÚRS 2020 02
D 771			Podlahy z dlaždic				453 358,70	
314	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	260,820	17,25	4 499,15	CS ÚRS 2020 02
315	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	260,820	57,50	14 997,15	CS ÚRS 2020 02
316	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	260,820	368,03	95 989,58	CS ÚRS 2020 02
317	K	77115101R	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 30 mm (ref.v. Poriment)	m2	20,220	414,03	8 371,69	
	VV		skladba P12					
	VV		0,29*1,20*20+1,20*2,50+0,285*1,50*24		20,220			
	VV		Součet		20,220			
318	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	60,000	402,53	24 151,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.04,05					
	VV		1,20*20		24,000			
	VV		1,50*24		36,000			
	VV		Součet		60,000			
319	M	597614R1	dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	18,942	154,44	2 925,40	
	VV		příloha D.1.02.1.04,05					
	VV		1,20*0,29*20		6,960			
	VV		1,50*0,285*24		10,260			
	VV		Součet		17,220			
	VV		17,22*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		18,942			
320	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	36,000	345,02	12 420,72	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.04,05					
	VV		1,50*24		36,000			
	VV		Součet		36,000			
321	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	24,000	368,03	8 832,72	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.04,05					
	VV		1,20*20		24,000			
	VV		Součet		24,000			
322	M	597614R1	dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,692	154,44	1 651,27	
	VV		příloha D.1.02.1.04,05					
	VV		1,20*0,18*20		4,320			
	VV		1,50*0,15*24		5,400			
	VV		Součet		9,720			
	VV		9,72*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		10,692			
323	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	109,980	172,51	18 972,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.04					
	VV		1.NP - skladba P1					
	VV		(6,25+2,635)*2-3,69 "mč. 1.01		14,080			
	VV		(3,69+10,415*2+0,30*2+1,50+6,25+2,12+1,10-0,78+0,34)		35,650			
	VV		-0,90*2,0*5-0,80*2,0-1,18*2,22 "mč. 1.02		-13,220			
	VV		(4,20+2,295)*2-0,90*2,0 "mč. 1.08		11,190			
	VV		(4,20+2,175)*2-0,90*2,0 "mč. 1.09		10,950			
	VV		2.NP - skladba P10					
	VV		(3,69+12,85*2+6,25+1,04-0,78+0,34+0,25)-0,90*2,0*5-0,80*2,0*2 "mč. 2.01,2		24,290			
	VV		(4,20+2,295)*2-0,90*2,0 "mč. 2.08		11,190			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(4,20+2,175)*2-0,90*2,0 "mč. 2.09		10,950			
	VV		skladba P12					
	VV		1,20*2+2,50		4,900			
	VV		Součet		109,980			
324	M	597612R1	sokl keramický v. 80 mm	kus	366,600	33,19	12 167,45	
	VV		109,980/0,33		333,273			
	VV		Součet		333,273			
	VV		333,273*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		366,600			
325	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	12,640	172,51	2 180,53	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba P12					
	VV		0,290*20+0,285*24		12,640			
	VV		Součet		12,640			
326	M	597612R1	sokl keramický v. 80 mm	kus	42,133	33,19	1 398,39	
	VV		12,64/0,33		38,303			
	VV		Součet		38,303			
	VV		38,303*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		42,133			
327	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	173,880	713,05	123 985,13	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.+2.NP					
	VV		skladba P1					
	VV		16,5+39,60+13,50+9,65+9,15-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)		78,440			
	VV		skladba P2					
	VV		4,40+2,45+9,9+3,90+2,70		23,350			
	VV		skladba P9					
	VV		4,40		4,400			
	VV		skladba P10					
	VV		39,90+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)		43,440			
	VV		skladba P11					
	VV		2,50+9,90+3,90+2,70		19,000			
	VV		skladba P12					
	VV		2,50*1,20+1,50*1,50 "podesta		5,250			
	VV		Součet		173,880			
328	M	597614R1	dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	139,843	154,44	21 597,35	
	VV		skladba P1					
	VV		16,5+39,60+13,50+9,65+9,15-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)		78,440			
	VV		skladba P10					
	VV		39,90+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)		43,440			
	VV		skladba P12					
	VV		2,50*1,20+1,50*1,50 "podesta		5,250			
	VV		Součet		127,130			
	VV		127,13*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		139,843			
329	M	597614R2	dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	46,750	262,18	12 256,92	
	VV		skladba P2					
	VV		4,40+2,45+9,9+3,90+2,70		23,350			
	VV		skladba P9					
	VV		4,40		4,400			
	VV		skladba P11					
	VV		2,50+9,90+3,90+2,70		19,000			
	VV		Součet		46,750			
330	K	771574273	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 100 ks/m2	m2	60,000	713,05	42 783,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.+2.NP					
	VV		skladba P2					
	VV		15,1+14,9		30,000			
	VV		skladba P11					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 15,10+14,90		30,000			
			VV Součet		60,000			
331	M	59761428	dlažba keramická hutná protiskluzná R10 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100 ks/m2	m2	66,000	424,40	28 010,40	CS ÚRS 2020 02
			VV 60*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		66,000			
332	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	32,200	92,01	2 962,72	CS ÚRS 2020 02
			VV skladba P2					
			VV 4,40+2,45+3,90+2,70		13,450			
			VV skladba P9					
			VV 4,40		4,400			
			VV skladba P11					
			VV 2,50+3,90+2,70		9,100			
			VV skladba P12					
			VV 2,50*1,20+1,50*1,50 "podesta		5,250			
			VV Součet		32,200			
333	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	3,000	4 401,56	13 204,68	CS ÚRS 2020 02
D 776			Podlahy povlakové		295 063,97			
334	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	315,700	9,20	2 904,44	CS ÚRS 2020 02
			VV 203,50 "vinyl		203,500			
			VV 112,20 "koberec		112,200			
			VV Součet		315,700			
335	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	301,200	71,77	21 617,12	CS ÚRS 2020 02
			VV 203,50-14,50 "vinyl		189,000			
			VV 112,20 "koberec		112,200			
			VV Součet		301,200			
336	K	77614111R	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 35 mm	m2	14,900	178,84	2 664,72	
			VV D.1.02.1.30					
			VV spojovací lávka					
			VV 14,90		14,900			
			VV Součet		14,900			
337	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	112,200	184,82	20 736,80	CS ÚRS 2020 02
			VV 112,20		112,200			
			VV Součet		112,200			
338	M	6975106R	koberec zátěžový	m2	123,420	355,60	43 888,15	
			VV 112,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		123,420			
339	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	203,500	192,98	39 271,43	CS ÚRS 2020 02
			VV 1. + 2. NP					
			VV 59,80+26,50+4,80+59,80+26,50+4,80+6,40+14,9		203,500			
			VV Součet		203,500			
340	M	2841211R	PVC vinylová akustická podlahovina s kročejovým útlumem 15dB tl. 34 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm	m2	223,850	570,21	127 641,51	
			VV 203,5*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		223,850			
341	K	7764211R1	D+M soklová lišta vinyl h=57mm	m	111,000	127,54	14 156,94	
			VV 1. + 2. NP					
			VV 21,0+18,30+5,5+21,0+18,30+9,30+17,60		111,000			
			VV Součet		111,000			
342	K	7764211R2	D+M soklová lišta koberec h=55mm	m	41,000	70,50	2 890,50	
			VV 1. + 2. NP					
			VV 20,50*2		41,000			
			VV Součet		41,000			
343	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	54,000	65,21	3 521,34	CS ÚRS 2020 02
			VV přílha D.1.02.1.35					
			VV 54,0		54,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV					Součet			
					54,000			
344	M	5905410R	profil přechodový Al š. 50mm - 20/O	m	55,080	130,30	7 176,92	
VV					54*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			
					55,080			
345	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	3,000	2 864,70	8 594,10	CS ÚRS 2020 02
D 781					Dokončovací práce - obklady			
					375 524,70			
346	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	295,760	17,25	5 101,86	CS ÚRS 2020 02
347	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	295,760	57,50	17 006,20	CS ÚRS 2020 02
348	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	295,760	770,55	227 897,87	CS ÚRS 2020 02
VV					1.+2.NP			
VV					295,76			
VV					Součet			
					295,760			
349	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	325,336	183,12	59 575,53	CS ÚRS 2020 02
VV					295,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			
					325,336			
350	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,160	370,84	801,01	CS ÚRS 2020 02
VV					příloha D.1.23.1.35			
VV					0,30*1,80*4			
VV					Součet			
					2,160			
351	M	6346512R	zrcadlo nástěnné číré obdélníkové 300x1800 mm rozdělené na 2-3 díly dle formátu ker. obkladů - 7/O	m2	2,376	1 714,23	4 073,01	
VV					2,16*1,1 "Přepočtené koeficientem množství			
					2,376			
352	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	150,900	172,51	26 031,76	CS ÚRS 2020 02
VV					1.NP			
VV					4,0*2,10 "mč. 1.03			
VV					5,0*2,10 "mč. 1.04			
VV					5,0*2,10 "mč. 1.05			
VV					4,0*2,10+2,0*1,20 "mč. 1.10a			
VV					5,0*2,10+1,20*4 "mč. 1.10			
VV					8*2,10 "mč. 1.12a			
VV					4*2,10 "mč. 1.12b			
VV					2.NP			
VV					4*2,10 "mč. 2.04			
VV					5*2,10 "mč. 2.05			
VV					4,0*2,10+2,0*1,20 "mč. 2.10a			
VV					5,0*2,10+1,20*4 "mč. 2.10			
VV					8*2,10 "mč. 2.12a			
VV					4*2,10 "mč. 2.12b			
VV					Součet			
					150,900			
353	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	130,970	184,01	24 099,79	CS ÚRS 2020 02
VV					1.NP			
VV					(2,56+1,80)*2-0,90 "mč. 1.03			
VV					(2,56+1,0)*2-0,80 "mč. 1.04			
VV					2,785+3,64+2,12+1,10+2,90+0,84-0,90*2 "mč. 1.05			
VV					(3,60+4,20)*2-0,80 "mč. 1.10a			
VV					(3,60+4,20)*2-0,80*3 "mč. 1.10			
VV					(1,785+1,35+0,95+1,35)*2-0,70*3 "mč. 1.12a			
VV					(2,85+0,95)*2-0,70 "mč. 1.12b			
VV					2.NP			
VV					(2,56+1,0)*2-0,80 "mč. 2.04			
VV					(2,785+3,64+2,12+1,10+2,90+0,84)-0,90*2 "mč. 2.05			
VV					(3,60+4,20)*2-0,80 "mč. 2.10a			
VV					(3,60+4,20)*2-0,80*3 "mč. 2.10			
VV					(1,785+1,35+0,95+1,35)*2-0,70*3 "mč. 2.12a			
VV					(2,85+0,95)*2-0,70 "mč. 2.12b			
VV					Součet			
					130,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
354	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,000	3 645,89	10 937,67	CS ÚRS 2020 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				44 598,92	
355	K	7838171R1	Nátěr omítek omyvatelný	m2	421,500	105,81	44 598,92	
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				72 512,44	
356	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	681,245	16,10	10 968,04	CS ÚRS 2020 02
VV			stropy					
VV			7,90				7,900	
VV			stěny					
VV			1.NP					
VV			(6,25+2,635)*2*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30+(2,40+1,50*2)*0,265+(0,75+2,10*2)*0,30-3,69*2,60+4,0 "mč. 1.01				45,988	
VV			(3,69+10,415*2+0,30*2+1,50+6,25+2,12+1,10-0,78+0,34)*2,925+(2,65+2,925*2)*0,30+(0,75+2,10*2)*0,30+(2,15*2+1,20)*0,20 "mč. 1.02				109,411	
VV			(2,56+1,80)*2*2,65 "mč. 1.03				23,108	
VV			(2,56+1,0)*2*2,65 "mč. 1.04				18,868	
VV			(2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30 "mč. 1.05				34,600	
VV			(16,40+7,0)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*4+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2				162,690	
VV			-2,25*2,50*4+4,0*4 "mč. 1.06				-6,500	
VV			(4,20+2,295)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 1.08				42,404	
VV			(4,20+2,175)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 1.09				35,273	
VV			(3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 1.10a				42,465	
VV			(3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 1.10				42,465	
VV			(6,245+4,20)*2*3,0+(1,50+0,75*2)*0,30*2 "mč. 1.11				64,470	
VV			(2,85+1,61)*2*3,15+(1,50+0,75*2)*0,30-0,90*2,0 "mč. 1.12				27,198	
VV			(1,785+1,35+0,95+1,35)*2*2,55 "mč. 1.12a				27,719	
VV			(2,85+0,95)*2*3,15+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 1.12b				25,065	
VV			příloha D.1.02.1.05					
VV			2.NP					
VV			(3,69+12,85*2+6,25+1,04-0,78+0,34+0,25)*2,925+(1,55+2,15*2)*0,265+(1,50+0,75*2)*0,30 "mč. 2.01,2				109,184	
VV			(2,56+1,80)*2*2,65 "mč. 2.03				23,108	
VV			(2,56+1,0)*2*2,65 "mč. 2.04				18,868	
VV			(2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30 "mč. 2.05				34,600	
VV			(16,40+7,0)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*4+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2				162,690	
VV			-2,25*2,50*4+4,0*4 "mč. 2.06				-6,500	
VV			(4,20+2,295)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 2.08				42,404	
VV			(4,20+2,175)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 2.09				35,273	
VV			(3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 2.10a				42,465	
VV			(3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 2.10				42,465	
VV			(6,245+4,20)*2*3,0+(1,50+0,75*2)*0,30*2 "mč. 2.11				64,470	
VV			(2,85+1,61)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 1.12				29,583	
VV			(1,785+1,35+0,95+1,35)*2*2,55 "mč. 2.12a				27,719	
VV			(2,85+0,95)*2*3,15+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 2.12b				25,065	
VV			spojovací lávka- krček					
VV			8,459*2*2,60				43,987	
VV			odečet obkladů					
VV			-295,76				-295,760	
VV			odečet nátěru					
VV			-421,50				-421,500	
VV			Součet				681,245	
357	K	784181117	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	105,378	16,10	1 696,59	CS ÚRS 2020 02
VV			(5,30+2,50)*2*3,20+(1,25+2,40*2)*0,265 "mč. 1.07				51,523	
VV			(5,30+2,50)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,265*3 "mč. 2.07				53,855	
VV			Součet				105,378	
358	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	915,045	35,65	32 621,35	CS ÚRS 2020 02
VV			stropy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7,90+233,80		241,700			
	VV		stěny					
	VV		1.NP					
	VV		(6,25+2,635)*2*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30+(2,40+1,50*2)*0,265+(0,75+2,10*2)*0,30-3,69*2,60+4,0 "mč. 1.01		45,988			
	VV		(3,69+10,415*2+0,30*2+1,50+6,25+2,12+1,10-0,78+0,34)*2,925+(2,65+2,925*2)*0,30+(0,75+2,10*2)*0,30+(2,15*2+1,20)*0,20 "mč. 1.02		109,411			
	VV		(2,56+1,80)*2*2,65 "mč. 1.03		23,108			
	VV		(2,56+1,0)*2*2,65 "mč. 1.04		18,868			
	VV		(2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30 "mč. 1.05		34,600			
	VV		(16,40+7,0)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*4+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2		162,690			
	VV		-2,25*2,50*4+4,0*4 "mč. 1.06		-6,500			
	VV		(4,20+2,295)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 1.08		42,404			
	VV		(4,20+2,175)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 1.09		35,273			
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 1.10a		42,465			
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 1.10		42,465			
	VV		(6,245+4,20)*2*3,0+(1,50+0,75*2)*0,30*2 "mč. 1.11		64,470			
	VV		(2,85+1,61)*2*3,15+(1,50+0,75*2)*0,30-0,90*2,0 "mč. 1.12		27,198			
	VV		(1,785+1,35+0,95+1,35)*2*2,55 "mč. 1.12a		27,719			
	VV		(2,85+0,95)*2*3,15+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 1.12b		25,065			
	VV		příloha D.1.02.1.05					
	VV		2.NP					
	VV		(3,69+12,85*2+6,25+1,04-0,78+0,34+0,25)*2,925+(1,55+2,15*2)*0,265+(1,50+0,75*2)*0,30 "mč. 2.01,2		109,184			
	VV		(2,56+1,80)*2*2,65 "mč. 2.03		23,108			
	VV		(2,56+1,0)*2*2,65 "mč. 2.04		18,868			
	VV		(2,785+3,64+2,12+1,10+2,90)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30 "mč. 2.05		34,600			
	VV		(16,40+7,0)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*4+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2		162,690			
	VV		-2,25*2,50*4+4,0*4 "mč. 2.06		-6,500			
	VV		(4,20+2,295)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 2.08		42,404			
	VV		(4,20+2,175)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 2.09		35,273			
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 2.10a		42,465			
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 2.10		42,465			
	VV		(6,245+4,20)*2*3,0+(1,50+0,75*2)*0,30*2 "mč. 2.11		64,470			
	VV		(2,85+1,61)*2*3,15+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 1.12		29,583			
	VV		(1,785+1,35+0,95+1,35)*2*2,55 "mč. 2.12a		27,719			
	VV		(2,85+0,95)*2*3,15+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 2.12b		25,065			
	VV		spojovací lávka- krček					
	VV		8,459*2*2,60		43,987			
	VV		odečet obkladů					
	VV		-295,76		-295,760			
	VV		odečet nátěru					
	VV		-421,50		-421,500			
	VV		Součet		915,045			
359	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrupzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	105,378	35,65	3 756,73	CS ÚRS 2020 02
	VV		(5,30+2,50)*2*3,20+(1,25+2,40*2)*0,265 "mč. 1.07		51,523			
	VV		(5,30+2,50)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,265*3 "mč. 2.07		53,855			
	VV		Součet		105,378			
360	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra ošetrupzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	1 020,423	23,00	23 469,73	CS ÚRS 2020 02
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy							199 087,26	
361	K	7866271R1	D+M předokenní žaluzie, stříbrná barva RAL 9006 s el. ovládáním 750x2500 mm - 16/O	kpl	4,000	11 631,70	46 526,80	
	VV		přílha D.1.02.1.35					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
362	K	7866271R2	D+M předokenní žaluzie, stříbrná barva RAL 9006 s el. ovládáním 2250x2500 mm - 17/O	kpl	8,000	16 408,05	131 264,40	
	VV		přílha D.1.02.1.35					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
363	K	7866271R3	D+M žaluzie hliníková vnitřní vodorovná se zesílenými profily, barva bílá, manuální ovládání, šířka lamely 25 mm - 22/O	m2	12,838	1 207,15	15 497,39	
		VV	přílha D.1.02.1.36					
		VV	0,60*0,61*18		6,588			
		VV	0,625*0,55*10		3,438			
		VV	0,61*1,36*3		2,489			
		VV	0,61*0,53*1		0,323			
		VV	Součet		12,838			
364	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	3,000	1 932,89	5 798,67	CS ÚRS 2020 02
D		M	Práce a dodávky M				570 440,09	
D		33-M	Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				570 440,09	
365	K	3300300R	D+M osobní výtah nosnost 630kg, bezpřevodový, počet stanic 2, bez strojovny pod stropem, 2 kusy panelových dveří, kabina 1100x1400x2100 mm - V2	kpl	1,000	570 440,09	570 440,09	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.2 - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 569 131,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 569 131,13	21,00%	329 517,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 898 648,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.2 - ZTI

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 569 131,13

HSV - Práce a dodávky HSV

29 293,34

8 - Trubní vedení

2 951,62

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 309,12

998 - Přesun hmot

32,60

PSV - Práce a dodávky PSV

1 533 075,31

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

211 566,84

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

399 929,87

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

29 823,48

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

573 432,18

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

265 064,88

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

16 331,14

741 - Elektroinstalace - silnoproud

20 195,40

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

4 180,91

767 - Konstrukce zámečnické

3 698,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

8 852,21

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 762,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.2 - ZTI

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 569 131,13

D HSV Práce a dodávky HSV

29 293,34

D 8 Trubní vedení

2 951,62

1	K	891162211	Montáž závitového vodoměru G 1	kus	1,000	402,53	402,53	CS ÚRS 2020 02
2	M	38821460	vodoměr domovní na studenou užitkovou vodu L165 G1 Q 2,5-BE PB	kus	1,000	2 549,09	2 549,09	CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

26 309,12

3	K	953945121	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	86,000	305,92	26 309,12	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot

32,60

4	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,027	966,07	26,08	CS ÚRS 2020 02
5	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,027	241,52	6,52	CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV

1 533 075,31

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

211 566,84

6	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 110	m	10,000	398,91	3 989,10	CS ÚRS 2020 02
7	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125	m	26,000	434,45	11 295,70	CS ÚRS 2020 02
8	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 150	m	48,000	584,01	28 032,48	
9	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	14,000	288,26	4 035,64	CS ÚRS 2020 02
10	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	20,000	309,74	6 194,80	CS ÚRS 2020 02
11	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	22,000	482,83	10 622,26	CS ÚRS 2020 02
12	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	10,000	482,83	4 828,30	CS ÚRS 2020 02
13	K	721175111	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučňené třívrstvé DN 75	m	24,000	784,88	18 837,12	CS ÚRS 2020 02
14	K	721175112	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučňené třívrstvé DN 110	m	18,000	1 172,07	21 097,26	CS ÚRS 2020 02
15	K	721175113	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučňené třívrstvé DN 125	m	16,000	1 676,15	26 818,40	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	721175121	Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučňené třívrstvé DN 75	m	17,000	784,88	13 342,96	CS ÚRS 2020 02
17	K	721175122	Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučňené třívrstvé DN 110	m	4,000	1 172,07	4 688,28	CS ÚRS 2020 02
18	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	18,000	125,36	2 256,48	CS ÚRS 2020 02
19	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	9,000	132,83	1 195,47	CS ÚRS 2020 02
20	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	156,41	312,82	CS ÚRS 2020 02
21	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	21,000	234,62	4 927,02	CS ÚRS 2020 02
22	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	4,000	805,06	3 220,24	CS ÚRS 2020 02
23	M	HLE.HL50F080	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 800mm	kus	4,000	2 659,06	10 636,24	
24	K	721233212	Střešní vtok DN70, svislý, el.ohřev,s izolační přírubou, tepelně izolovaný HL 62.1P/7	kus	2,000	5 167,40	10 334,80	CS ÚRS 2020 02
25	K	721233213R01	Střešní vtok DN125, svislý, svislý, el.ohřev,s izolační přírubou, tepelně izolovaný HL 62.1P/2	kus	2,000	5 167,40	10 334,80	
26	K	721259103	Montáž tvarovky DN 70	kus	3,000	161,01	483,03	CS ÚRS 2020 02
27	M	28611086	čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70	kus	3,000	366,72	1 100,16	CS ÚRS 2020 02
28	K	721259105	Montáž tvarovky DN 100	kus	3,000	193,21	579,63	CS ÚRS 2020 02
29	M	28611087	čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100	kus	3,000	382,00	1 146,00	CS ÚRS 2020 02
30	K	721259106	Montáž tvarovky DN 125	kus	2,000	241,52	483,04	CS ÚRS 2020 02
31	M	28611088	čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 125	kus	2,000	600,28	1 200,56	CS ÚRS 2020 02
32	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	2,000	710,38	1 420,76	CS ÚRS 2020 02
33	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	131,000	32,20	4 218,20	CS ÚRS 2020 02
34	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	84,000	40,25	3 381,00	CS ÚRS 2020 02
35	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,459	966,07	443,43	CS ÚRS 2020 02
36	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,459	241,52	110,86	CS ÚRS 2020 02

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	399 929,87				
37	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	5,000	509,47	2 547,35	CS ÚRS 2020 02
38	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	30,000	583,19	17 495,70	CS ÚRS 2020 02
39	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	2,000	397,58	795,16	CS ÚRS 2020 02
40	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	133,000	303,23	40 329,59	CS ÚRS 2020 02
41	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	270,000	324,35	87 574,50	CS ÚRS 2020 02
42	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	76,000	362,74	27 568,24	CS ÚRS 2020 02
43	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	56,000	415,33	23 258,48	CS ÚRS 2020 02
44	K	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2020 02
45	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	3,000	217,68	653,04	CS ÚRS 2020 02
46	K	722174075	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	kus	3,000	269,41	808,23	CS ÚRS 2020 02
47	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm	kus	201,500	90,51	18 237,77	CS ÚRS 2020 02
VV		(133+270)/2			201,500			
VV		Součet			201,500			
48	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm	kus	66,000	130,53	8 614,98	CS ÚRS 2020 02
VV		(70+44)/2+9			66,000			
VV		Součet			66,000			
49	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	51,000	34,51	1 760,01	CS ÚRS 2020 02
50	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	42,000	49,47	2 077,74	CS ÚRS 2020 02
51	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	35,000	95,26	3 334,10	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	22,000	59,01	1 298,22	CS ÚRS 2020 02
53	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	80,000	116,21	9 296,80	CS ÚRS 2020 02
54	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	60,000	143,35	8 601,00	CS ÚRS 2020 02
55	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	146,000	198,10	28 922,60	CS ÚRS 2020 02
56	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	31,000	65,89	2 042,59	CS ÚRS 2020 02
57	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	50,000	75,51	3 775,50	CS ÚRS 2020 02
58	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	62,000	79,70	4 941,40	CS ÚRS 2020 02
59	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	56,000	94,55	5 294,80	CS ÚRS 2020 02
60	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	86,000	150,09	12 907,74	CS ÚRS 2020 02
61	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	38,000	123,75	4 702,50	CS ÚRS 2020 02
62	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	21,000	329,21	6 913,41	CS ÚRS 2020 02
63	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	18,000	84,29	1 517,22	CS ÚRS 2020 02
64	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	44,000	110,99	4 883,56	CS ÚRS 2020 02
65	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	10,000	166,80	1 668,00	CS ÚRS 2020 02
66	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	3,000	270,70	812,10	CS ÚRS 2020 02
67	K	722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	2,000	390,69	781,38	CS ÚRS 2020 02
68	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	8,000	238,82	1 910,56	CS ÚRS 2020 02
69	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	13,000	332,97	4 328,61	CS ÚRS 2020 02
70	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	4,000	475,67	1 902,68	CS ÚRS 2020 02
71	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit	kus	2,000	241,52	483,04	CS ÚRS 2020 02
72	M	42210770R01	ventil s regulační přímý DN 15 termostatický (MTCV)	kus	2,000	2 658,57	5 317,14	
73	K	722239104	Montáž armatur vodovodních se dvěma závit	kus	1,000	241,52	241,52	CS ÚRS 2020 02
74	M	40564113	ventil elektromagnetický na neagresivní kapaliny a plyny bez napětí uzavřený PN 16 T 130°C G 1"	kus	1,000	3 809,14	3 809,14	CS ÚRS 2020 02
75	M	61140719	časový spínač 0-90min	kus	1,000	1 092,58	1 092,58	CS ÚRS 2020 02
76	K	722239104R01	Montáž armatur vodovodních se třemi závit	kus	2,000	289,82	579,64	
77	M	55145541R01	ventil termostatický DN20, průtok 47l/min, vestavěné zpětné klapky, Presto29007	kus	2,000	5 624,59	11 249,18	
78	K	722250133R01	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový, Q 1,1 l/s	kus	2,000	9 543,74	19 087,48	
79	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	422,000	16,10	6 794,20	CS ÚRS 2020 02
80	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	416,000	19,32	8 037,12	CS ÚRS 2020 02
81	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,119	966,07	1 081,03	CS ÚRS 2020 02
82	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	1,119	241,52	270,26	CS ÚRS 2020 02

D	724	Zdravotecnika - strojní vybavení					29 823,48	
83	K	724149102	Montáž čerpadla vodovodního ponorného o výkonu do 108 l/min bez potrubí a příslušenství	kus	1,000	2 415,17	2 415,17	CS ÚRS 2020 02
84	M	426119250	čerpadlo do vrtů 1 1/4" set TWI 5 - SE 306 EM P+P	kus	1,000	24 177,16	24 177,16	
85	K	724234109	Domovní vodárna nádoba tlaková objemu 33 l s pryžovým vakem vertikálním	soubor	1,000	3 181,64	3 181,64	CS ÚRS 2020 02
86	K	998724103	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m	t	0,041	966,07	39,61	CS ÚRS 2020 02
87	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,041	241,52	9,90	CS ÚRS 2020 02

D	725	Zdravotecnika - zařízení předměty					573 432,18	
88	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	19,000	805,06	15 296,14	CS ÚRS 2020 02
89	M	642360710	klozet keramický závěsný hluboké splachování dětský	kus	16,000	7 538,92	120 622,72	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	M	64236041	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování	kus	2,000	2 325,79	4 651,58	CS ÚRS 2020 02
91	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	5 625,51	5 625,51	CS ÚRS 2020 02
92	M	551673810R01	sedátko klozetové s poklopem duroplastové dětské	kus	16,000	3 069,75	49 116,00	
93	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	2,000	1 302,30	2 604,60	CS ÚRS 2020 02
94	M	551673810R02	sedátko klozetové s poklopem duroplastové pro handicapované	kus	1,000	606,04	606,04	
95	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	16,000	724,55	11 592,80	CS ÚRS 2020 02
96	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	12,000	1 027,44	12 329,28	CS ÚRS 2020 02
97	M	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm	kus	3,000	1 066,67	3 200,01	CS ÚRS 2020 02
98	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000	2 112,16	2 112,16	CS ÚRS 2020 02
99	M	64211034	kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý	kus	3,000	1 487,51	4 462,53	CS ÚRS 2020 02
100	K	725244505	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z čela na vaničku 1000x800 mm	kus	2,000	15 341,96	30 683,92	CS ÚRS 2020 02
101	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	16,000	1 023,53	16 376,48	CS ÚRS 2020 02
102	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	kus	5,000	2 178,88	10 894,40	CS ÚRS 2020 02
103	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	kus	8,000	2 268,59	18 148,72	CS ÚRS 2020 02
104	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	kus	2,000	5 032,28	10 064,56	CS ÚRS 2020 02
105	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	kus	2,000	3 856,19	7 712,38	CS ÚRS 2020 02
106	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	kus	1,000	6 187,93	6 187,93	CS ÚRS 2020 02
107	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	6 732,70	6 732,70	CS ÚRS 2020 02
108	K	725319111R01	Montáž dřezu nebo připojení výpustek DN 50 ostatních typů	kus	5,000	805,06	4 025,30	
109	K	725319111	Montáž dřezu nebo připojení výpustek DN 40 ostatních typů	kus	2,000	805,06	1 610,12	CS ÚRS 2020 02
110	M	551458210	fontánka pitná závěsná s automaticky ovládaným výtokem, zaoblené rohy, dětská	kus	2,000	14 092,70	28 185,40	
111	M	562414130	příslušenství sítko - vložka s menšími otvory	kus	2,000	454,28	908,56	
112	K	725339111	Montáž výlevky	kus	2,000	788,96	1 577,92	CS ÚRS 2020 02
113	M	642711010	výlevka keramická závěsná bílá	kus	2,000	5 053,51	10 107,02	
114	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	66,000	228,52	15 082,32	CS ÚRS 2020 02
115	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	kus	19,000	202,13	3 840,47	CS ÚRS 2020 02
116	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	2,000	389,12	778,24	CS ÚRS 2020 02
117	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	2,000	322,02	644,04	CS ÚRS 2020 02
118	M	55143976	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm	kus	2,000	2 015,75	4 031,50	CS ÚRS 2020 02
119	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	2,000	322,02	644,04	CS ÚRS 2020 02
120	M	55143181	baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm	kus	2,000	1 703,40	3 406,80	CS ÚRS 2020 02
121	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	4,000	402,53	1 610,12	CS ÚRS 2020 02
122	M	55144004	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním odpadu	kus	4,000	2 843,93	11 375,72	CS ÚRS 2020 02
123	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	12,000	483,03	5 796,36	CS ÚRS 2020 02
124	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	12,000	7 015,93	84 191,16	CS ÚRS 2020 02
125	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	4,000	1 207,58	4 830,32	CS ÚRS 2020 02
126	M	551456000	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	kus	2,000	5 519,15	11 038,30	CS ÚRS 2020 02
127	M	551455390	baterie sprchová zapuštěná s přepínačem	kus	2,000	3 827,54	7 655,08	CS ÚRS 2020 02
128	M	551455450	souprava sprchová komplet	kus	4,000	2 007,33	8 029,32	CS ÚRS 2020 02
129	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	3,000	435,48	1 306,44	CS ÚRS 2020 02
130	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	15,000	1 348,65	20 229,75	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
131	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	1 357,03	1 357,03	CS ÚRS 2020 02
132	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	2,000	513,06	1 026,12	CS ÚRS 2020 02
133	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,931	966,07	899,41	CS ÚRS 2020 02
134	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,931	241,52	224,86	CS ÚRS 2020 02

D		726	Zdravotecnika - předstěnové instalace	265 064,88				
135	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí	kus	12,000	4 431,24	53 174,88	CS ÚRS 2020 02
136	K	726131002	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí	kus	1,000	6 926,15	6 926,15	CS ÚRS 2020 02
137	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	kus	20,000	8 497,57	169 951,40	CS ÚRS 2020 02
138	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kčí	kus	1,000	10 524,29	10 524,29	CS ÚRS 2020 02
139	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	kus	21,000	357,10	7 499,10	CS ÚRS 2020 02
140	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	kus	34,000	479,54	16 304,36	CS ÚRS 2020 02
141	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,567	966,07	547,76	CS ÚRS 2020 02
142	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,567	241,52	136,94	CS ÚRS 2020 02

D		727	Zdravotecnika - požární ochrana	16 331,14				
143	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	3,000	1 725,12	5 175,36	CS ÚRS 2020 02
144	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	4,000	1 840,13	7 360,52	CS ÚRS 2020 02
145	K	727121108	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	1 897,63	3 795,26	CS ÚRS 2020 02

D		741	Elektroinstalace - silnoproud	20 195,40				
146	K	741330205	Montáž součástí stykačů se zapojením-skříňka	kus	4,000	621,04	2 484,16	CS ÚRS 2020 02
147	M	548230100R01	sonda na měření hladiny vody, spínač	kus	4,000	4 427,81	17 711,24	

D		744	Elektromontáže - montáž vodičů měděných	4 180,91				
148	K	744411120R01	Montáž bubnu s kabelem 50m	ks	1,000	69,00	69,00	
149	M	341095170R01	Prodlužovací kabel na bubnu 50m	ks	1,000	2 935,01	2 935,01	
150	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	30,000	19,32	579,60	
151	M	34111094	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 (CYKY)	m	30,000	19,91	597,30	CS ÚRS 2020 02

D		767	Konstrukce zámečnické	3 698,40				
152	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	48,000	32,20	1 545,60	CS ÚRS 2020 02
153	M	48455984R01	konzole stěnová nebo závěsná C-nosník, konzoly, spojovací materiál-sestavy	pár	48,000	44,85	2 152,80	

D		783	Dokončovací práce - nátěry	8 852,21				
154	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	21,500	34,50	741,75	CS ÚRS 2020 02
155	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	21,500	9,20	197,80	CS ÚRS 2020 02
156	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,500	138,01	2 967,22	CS ÚRS 2020 02
157	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	21,500	92,01	1 978,22	CS ÚRS 2020 02
158	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	21,500	138,01	2 967,22	CS ÚRS 2020 02

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	6 762,48				
159	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	6,000	1 127,08	6 762,48	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.2.1 - ZTI - pavilon A - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

387 509,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	387 509,05	21,00%	81 376,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

468 885,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.2.1 - ZTI - pavilon A - zemní práce

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

387 509,05

HSV - Práce a dodávky HSV

366 244,26

1 - Zemní práce

337 739,66

2 - Zakládání

3 222,85

998 - Přesun hmot

25 281,75

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

21 264,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.2.1 - ZTI - pavilon A - zemní práce

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

387 509,05

D HSV

Práce a dodávky HSV

366 244,26

D 1

Zemní práce

337 739,66

1	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	427,72	12 831,60	CS ÚRS 2020 02
2	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	60,000	34,62	2 077,20	CS ÚRS 2020 02
3	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	60,000	18,86	1 131,60	CS ÚRS 2020 02
4	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	80,620	1 841,97	148 499,62	CS ÚRS 2020 02
5	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	53,400	326,97	17 460,20	CS ÚRS 2020 02
6	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	53,400	172,86	9 230,72	CS ÚRS 2020 02
8	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	80,620	323,98	26 119,27	CS ÚRS 2020 02
9	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	80,620	288,56	23 263,71	CS ÚRS 2020 02
10	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	73,920	62,68	4 633,31	CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp					73,920			
VV 36,96*2					73,920			
23	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	43,660	375,39	16 389,53	CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku					43,660			
VV 80,62-36,96					43,660			
24	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	218,300	27,37	5 974,87	CS ÚRS 2020 02
VV 43,66*5 'Přepočtené koeficientem množství					218,300			
11	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	80,620	348,01	28 056,57	CS ÚRS 2020 02
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	80,620	22,43	1 808,31	CS ÚRS 2020 02
25	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	43,660	394,13	17 207,72	CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku					43,660			
VV 80,62-36,96					43,660			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,960	165,84	6 129,45	CS ÚRS 2020 02
14	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	7,390	767,91	5 674,85	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	14,780	761,24	11 251,13	CS ÚRS 2020 02
VV			7,39*2 "Přepočtené koeficientem množství		14,780			
D 2			Zakládání				3 222,85	
16	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	7,390	436,11	3 222,85	CS ÚRS 2020 02
D 998			Přesun hmot				25 281,75	
17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	29,491	617,71	18 216,89	CS ÚRS 2020 02
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	29,491	239,56	7 064,86	CS ÚRS 2020 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				21 264,79	
19	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	15,000	494,53	7 417,95	CS ÚRS 2020 02
20	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	8,000	494,53	3 956,24	CS ÚRS 2020 02
21	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	16,000	494,53	7 912,48	CS ÚRS 2020 02
22	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	4,000	494,53	1 978,12	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.3 - UT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

828 281,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	828 281,01	21,00%	173 939,01
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 002 220,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.3 - UT

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

828 281,01

1 - Otopná tělesa

125 271,23

2 - Příslušenství otopných těles

54 379,13

3 - Regulační vyvažovací ventily

3 709,62

4 - Kulové kohouty a uzavírací klapky

465,34

5 - Filtry

204,79

6 - Zpětné klapky a ventily

230,98

7 - Vypouštění a odvzdušnění

2 726,26

8 - Teploměry

1 293,00

9 - Potrubí

409 546,72

10 - Požární ucpávky

10 498,60

11 - Nátěry

4 968,54

12 - Izolace

104 663,43

13 - Společné položky

110 323,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt: SO 02 - Pavilon A

Soupis: SO 02.3 - UT

Místo: Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 828 281,01

D 1 Otopná tělesa 125 271,23

0	M	1.1	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 10VK/6040 výška: 600mm, délka: 400mm, hloubka: 47mm	ks	1,000	2 156,71	2 156,71	
0	M	1.2	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6040 výška: 600mm, délka: 400mm, hloubka: 66mm	ks	2,000	2 668,55	5 337,10	
0	M	1.3	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6050 výška: 600mm, délka: 500mm, hloubka: 66mm	ks	6,000	2 789,88	16 739,28	
0	M	1.4	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6060 výška: 600mm, délka: 600mm, hloubka: 66mm	ks	2,000	2 911,22	5 822,44	
0	M	1.5	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6080 výška: 600mm, délka: 800mm, hloubka: 66mm	ks	1,000	3 153,88	3 153,88	
0	M	1.6	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6090 výška: 600mm, délka: 900mm, hloubka: 66mm	ks	1,000	3 276,24	3 276,24	
0	M	1.7	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6100 výška: 600mm, délka: 1000mm, hloubka: 66mm	ks	1,000	3 397,06	3 397,06	
0	M	1.8	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6110 výška: 600mm, délka: 1100mm, hloubka: 66mm	ks	2,000	3 598,35	7 196,70	
0	M	1.9	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6160 výška: 600mm, délka: 1600mm, hloubka: 66mm	ks	1,000	4 363,41	4 363,41	
0	M	1.10	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/3230 výška: 300mm, délka: 2300mm, hloubka: 100mm	ks	8,000	4 889,16	39 113,28	
0	M	1.11	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/5080 výška: 500mm, délka: 800mm, hloubka: 100mm	ks	1,000	3 328,74	3 328,74	
0	M	1.12	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/6080 výška: 600mm, délka: 800mm, hloubka: 100mm	ks	1,000	3 397,06	3 397,06	
0	M	1.13	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/6100 výška: 600mm, délka: 1000mm, hloubka: 100mm	ks	1,000	3 692,74	3 692,74	
0	M	1.14	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/6140 výška: 600mm, délka: 1400mm, hloubka: 100mm	ks	1,000	4 441,49	4 441,49	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	1.15	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/9040 výška: 900mm, délka: 400mm, hloubka: 100mm	ks	4,000	3 326,71	13 306,84	
0	M	1.16	Otopné trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodávána se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. výška: 1500mm, délka: 450mm, hloubka: 30mm	ks	2,000	3 274,13	6 548,26	

D 2 Příslušenství otopných těles 54 379,13

0	M	2.1	Termostatická hlavice	ks	27,000	371,20	10 022,40	
0	M	2.2	Termoelektrická hlavice pro ventily OT, 24 V, (on/off), 50 Hz	ks	8,000	876,62	7 012,96	
0	M	2.3	Radiátorové šroubení tvaru H přímé je vhodné pro každý radiátor se spodním přívodem se vzdáleností přívodu a vývodu 50 mm. Šroubení umožňuje uzavřít okruh a vypustit topné těleso při jeho demontáži. Jako příslušenství se dodává kohout pro vypouštění a nap	ks	33,000	1 060,05	34 981,65	
0	M	2.4	Rohový regulační ventil DN15, vč.montáže	ks	2,000	649,68	1 299,36	
0	M	2.5	Rohové regulační šroubení DN15, vč.montáže	ks	2,000	531,38	1 062,76	

D 3 Regulační vyvažovací ventily 3 709,62

0	M	3.1	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 s vnitřním závitem, s měřicími koncovkami, vč. montáže	ks	2,000	1 854,81	3 709,62	
---	---	-----	---	----	-------	----------	----------	--

D 4 Kulové kohouty a uzavírací klapky 465,34

0	M	4.1	Závitový kulový kohout DN 15, PN 6, včetně montáže	ks	2,000	232,67	465,34	
---	---	-----	--	----	-------	--------	--------	--

D 5 Filtry 204,79

0	M	5.1	Filtr závitový DN 15, PN 6, vč. montáže	ks	1,000	204,79	204,79	
---	---	-----	---	----	-------	--------	--------	--

D 6 Zpětné klapky a ventily 230,98

0	M	6.1	Zpětný ventil, DN 15, PN 16, vč. montáže	ks	1,000	230,98	230,98	
---	---	-----	--	----	-------	--------	--------	--

D 7 Vypouštění a odvzdušnění 2 726,26

0	M	7.1	Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a zátkou, vč. montáže	ks	4,000	312,56	1 250,24	
0	M	7.2	Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 25, vč. montáže	ks	2,000	469,02	938,04	
0	M	7.3	Odvzdušňovací ventil, PN 6, DN 15, vč. montáže	ks	2,000	268,99	537,98	

D 8 Teploměry 1 293,00

0	M	8.1	Teploměr 0 - 120°C axiální, vč. návarku, jímky a montáže	ks	2,000	646,50	1 293,00	
---	---	-----	--	----	-------	--------	----------	--

D 9 Potrubí 409 546,72

0	M	9.1	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 15(21,4x2,65)	m	53,000	498,18	26 403,54	
0	M	9.2	Měděné potrubí 15x1	m	293,000	439,08	128 650,44	
0	M	9.3	Měděné potrubí 18x1	m	99,000	468,96	46 427,04	
0	M	9.4	Měděné potrubí 22x1	m	87,000	537,67	46 777,29	
0	M	9.5	Měděné potrubí 28x1,5	m	47,000	886,62	41 671,14	
0	M	9.6	Měděné potrubí 35x1,5	m	9,000	1 078,07	9 702,63	
0	M	9.7	Měděné potrubí 42x1,5	m	88,000	1 249,03	109 914,64	

D 10 Požární ucpávky 10 498,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	10.1	Protipožární tmel	kpl.	10,000	1 049,86	10 498,60	

D 11 Nátěry 4 968,54

0	K	11.1	Nátěr pro armatury, doplňkové konstrukce, uložení	kpl.	1,000	92,01	92,01	
0	K	11.2	základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně	m	53,000	92,01	4 876,53	

D 12 Izolace 104 663,43

0	M	12.1	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 15x1, tl. 30 mm	m	293,000	139,01	40 729,93	
0	M	12.2	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 18x1, tl. 30 mm	m	99,000	146,94	14 547,06	
0	M	12.3	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 22x1, tl. 30 mm	m	87,000	160,72	13 982,64	
0	M	12.4	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 28x1,5, tl. 30 mm	m	47,000	171,54	8 062,38	
0	M	12.5	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 35x1,5, tl. 30 mm	m	9,000	183,34	1 650,06	
0	M	12.6	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 42x1,5, tl. 30 mm	m	88,000	195,15	17 173,20	
0	M	12.7	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro ocelové potrubí DN15; tl.30 mm	m	53,000	160,72	8 518,16	

D 13 Společné položky 110 323,37

0	K	13.3	Doprava materiálů	kpl	1,000	8 158,67	8 158,67	
0	K	13.5	Pomocné ocelové konstrukce	kpl	1,000	9 846,50	9 846,50	
0	K	13.6	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle DN	kpl	1,000	14 769,75	14 769,75	
0	K	13.7	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky)	kpl	1,000	33 192,15	33 192,15	
0	K	13.8	Jemné zaregulování systému	kpl	1,000	9 333,33	9 333,33	
0	K	13.9	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu	kpl	1,000	3 921,57	3 921,57	
0	K	13.10	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou	kpl	1,000	12 724,71	12 724,71	
0	K	13.11	Štítky a popisy potrubí a zařízení	kpl	1,000	2 969,19	2 969,19	
0	K	13.12	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 352,94	2 352,94	
0	K	13.13	Kotevní materiál	kpl	1,000	4 895,89	4 895,89	
0	K	13.14	Montážní materiál	kpl	1,000	8 158,67	8 158,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.4 - VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

683 215,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	683 215,06	21,00%	143 475,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

826 690,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.4 - VZT

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

683 215,06

D1 - Vzduchotechnika

683 215,06

D2 - Zař.č.1 - Větrání tříd a přípraven

405 073,42

D3 - Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení

118 567,94

D4 - Ostatní

146 347,77

D6 - Měření hluku

13 225,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.4 - VZT

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

683 215,06

D D1 Vzduchotechnika

683 215,06

D D2 Zař.č.1 - Větrání tříd a připraven

405 073,42

0	M	1.1	Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka ve stojanovém provedení, se stěnovými panely o tloušťce 40mm, vyrobené z Alu-Zinc plechu s odolností C4 proti korozi. Panely jsou uvnitř vyplněné zvukovou a tepelnou izolací z nehořlavé minerální vlny s odol	ks	1,000	227 797,06	227 797,06	
0	M	1.1.1	Směšovací uzel, 0-10V, 24V	ks	1,000	17 498,43	17 498,43	
0	M	1.1.2	Klapka uzavírací, třída 3C, se servem 24V	ks	2,000	5 487,17	10 974,34	
0	M	1.1.3	Spona rychloupínací	ks	4,000	174,58	698,32	
0	M	1.1.4	Hlásič kouře včetně patice a adaptéru pro VZT potrubí	ks	1,000	8 169,39	8 169,39	
0	M	1.1.5	Sada pro VAV	ks	1,000	7 156,81	7 156,81	
0	M	1.2	Tlumič hluku pro kruhové potrubí ø250/900	ks	4,000	1 918,82	7 675,28	
0	M	1.3	Protidešťová žaluzie z pozink plechu 500x500, barva dle fasády RAL 1018 (žlutá)	ks	1,000	2 311,63	2 311,63	
0	M	1.4	Výfuková hlavice z pozink plechu ø250	ks	1,000	1 817,85	1 817,85	
0	M	1.5	Regulátor variabilního průtoku vzduchu VAV ø225, MP-Bus	ks	4,000	8 805,29	35 221,16	
0	M	1.5.1	Tlumič hluku pro kruhové potrubí ø225/600 atyp	ks	4,000	1 453,00	5 812,00	
0	M	1.5.2	Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACnet	ks	2,000	3 855,09	7 710,18	
0	M	1.5.3	Čidlo CO2 s displejem na stěnu, 0-10V	ks	2,000	7 960,16	15 920,32	
0	M	1.5.4	Prokabelování	kpl	2,000	1 150,08	2 300,16	
0	M	1.6	Dýza s dlouhým dosahem ø200, ručně nastavitelný směr proudu vzduchu	ks	4,000	1 580,23	6 320,92	
0	M	1.7	Vyúst' s vířivým výtokem vzduchu 600x600/48 s vodorovným připojením ø250 s regulační klapkou - odvodní	ks	2,000	1 994,64	3 989,28	
0	M	1.8	Ohebná Al laminátová hadice ø250 á10bm/bal	ks	1,000	1 015,75	1 015,75	
0	M	1.9	Stěnová Al mřížka SM12,5-800x300	ks	4,000	989,56	3 958,24	
0	M	1.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - ø250/60% tvarovek	bm	8,000	520,41	4 163,28	
0	M	1.10.1	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - ø225/20% tvarovek	bm	66,000	290,40	19 166,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	1.10.2	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o200/30% tvarovek	bm	8,000	316,27	2 530,16	
0	M	1.11	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu	m2	2,000	452,84	905,68	
0	M	1.12	Akustická izolace vzduchotechnického potrubí z minerální vlny tl. 60mm s Al polepem	m2	23,000	460,03	10 580,69	
0	M	1.13	Protipožární izolace vzduchotechnického potrubí z minerální vlny tl. 40mm s Al polepem	m2	3,000	460,03	1 380,09	

D		D3	Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení	118 567,94				
0	M	2.1	Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí o250mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.02.4.6.6 - Tabulka zařízení.	ks	2,000	15 022,80	30 045,60	
0	M	2.2	Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí o200mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.02.4.6.6 - Tabulka zařízení.	ks	1,000	8 983,84	8 983,84	
0	M	2.3	Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí o160mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.02.4.6.6 - Tabulka zařízení.	ks	1,000	7 487,99	7 487,99	
0	M	2.4	Talířový ventil odvodní o160mm	ks	18,000	84,71	1 524,78	
0	M	2.5	Talířový ventil odvodní o100mm	ks	9,000	43,05	387,45	
0	M	2.6	Protipožární větrací mřížka EI45 600x304	ks	4,000	7 891,91	31 567,64	
0	M	2.7	Protipožární větrací mřížka EI45 300x106	ks	2,000	4 532,53	9 065,06	
0	M	2.8	Stěnová Al mřížka SM12,5-600x300	ks	12,000	813,13	9 757,56	
0	M	2.9	Stěnová Al mřížka SM12,5-600x200	ks	8,000	659,71	5 277,68	
0	M	2.10	Stěnová Al mřížka SM12,5-300x100	ks	2,000	360,54	721,08	
0	M	2.11	Ohebná Al laminátová hadice o160 á10bm/bal	ks	4,000	611,04	2 444,16	
0	M	2.12	Ohebná Al laminátová hadice o100 á10bm/bal	ks	2,000	380,91	761,82	
0	M	2.13	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o250/100% tvarovek	bm	1,000	728,86	728,86	
0	M	2.13.1	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o200/20% tvarovek	bm	21,000	263,08	5 524,68	
0	M	2.13.2	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o160/30% tvarovek	bm	11,000	273,14	3 004,54	
0	M	2.13.3	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o100/30% tvarovek	bm	6,000	214,20	1 285,20	

D		D4	Ostatní	146 347,77				
0	K	Pol78	Montáž VZT	kpl	1,000	92 006,47	92 006,47	
0	K	Pol66	Zkoušky a protokoly	kpl	1,000	20 701,45	20 701,45	
0	K	Pol67	Naprogramování zařízení a uvedení do provozu	kpl	1,000	19 838,89	19 838,89	
0	K	Pol68	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 875,20	2 875,20	
0	K	Pol69	Měření průtokových množství	kpl	1,000	5 175,36	5 175,36	
0	K	Pol79	Doprava	kpl	1,000	5 750,40	5 750,40	

D		D6	Měření hluku	13 225,93				
0	K	Pol77	Měření hluku od vzduchotechniky	kpl	1,000	13 225,93	13 225,93	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.5 - Slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

328 692,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	328 692,22	21,00%	69 025,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

397 717,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.5 - Slaboproud

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

328 692,22

D1 - Telekomunikační a datové rozvody

80 276,25

D2 - Elektrická zabezpečovací signalizace

108 864,84

D3 - Společní televizní anténa

13 202,15

D4 - Společné kabelové trasy

120 598,58

D5 - Požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru

5 750,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.5 - Slaboproud

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

328 692,22

D		D1	Telekomunikační a datové rozvody	80 276,25				
1	K	Pol1	Zásuvka 1xRJ-45 nestíněná - Cat.5e, včetně rámečku, design dle standardu silnoproud	ks	3,000	261,21	783,63	
1	K	Pol2	Dvojzásuvka 2xRJ-45 nestíněná - Cat.5e, včetně rámečku, design dle standardu silnoproud	ks	13,000	357,47	4 647,11	
1	K	Pol3	IP dveřní komunikátor s klávesnicí ve verzi pro VoIP sítě, spínač na ovládání elektrického zámku	ks	1,000	23 546,65	23 546,65	
1	K	Pol4	VoIP telefonní přístroj s displejem (PoE)	ks	5,000	1 832,38	9 161,90	
2	K	Pol5	Instalační krabice KO68	ks	16,000	68,56	1 096,96	
2	K	Pol6	Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5e, b2ca s1 d0	m	1 600,000	6,33	10 128,00	
2	K	Pol7	Instalace kabelu UTP4x2x0,5 Cat.5e	m	1 600,000	19,32	30 912,00	

D		D2	Elektrická zabezpečovací signalizace	108 864,84				
2	K	Pol8	Expander (koncentrátor), tamper kontakt, plastový box na povrch	ks	6,000	3 075,32	18 451,92	
2	K	Pol9	Prostorový duální PIR+MW detektor	ks	7,000	1 075,38	7 527,66	
2	K	Pol10	Bezdotyková LED klávesnice pro ovládání a programování systému	ks	1,000	4 027,80	4 027,80	
2	K	Pol11	Vnitřní akustická a optická signalizace	ks	1,000	790,11	790,11	
2	K	Pol12	Požární hlásič opticko kouřový	ks	17,000	1 182,20	20 097,40	
3	K	Pol13	Dveřní a okenní magnetický kontakt (dodávka v rámci oken a dveří)	ks	33,000	165,61	5 465,13	
3	K	Pol14	Propojovací krabice s tamper kontaktem a krabicí KO68	ks	20,000	367,11	7 342,20	
3	K	Pol15	Systémový napájecí zdroj 14V/5A s akumulátorem	ks	2,000	5 611,31	11 222,62	
3	K	Pol16	Kabel J-H(St)-H 4x2x0,6mm s pláštěm LSOH	m	450,000	68,88	30 996,00	
2	K	Pol17	Kabel S/FUTP4x2x0,5 Cat.6, b2ca s1 d0 včetně instalace	m	100,000	29,44	2 944,00	

D		D3	Společní televizní anténa	13 202,15				
3	K	Pol18	Koaxiální kabel 75 ohmů, v dig. kvalitě	m	330,000	31,85	10 510,50	
3	K	Pol19	Účastnická zásuvka TV+R+SAT včetně přístrojové krabice a rámečku	ks	5,000	469,77	2 348,85	
3	K	Pol5	Instalační krabice KO68	ks	5,000	68,56	342,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D4			Společné kabelové trasy	120 598,58				
4	K	Pol20	Trubka instalační ohebná průměr 30 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu pro vysokou mechanickou zátěž, instalace do podlahy	m	50,000	51,05	2 552,50	
4	K	Pol21	Elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 30mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchýtkami	m	2 500,000	33,92	84 800,00	
4	K	Pol22	Elektroinstalační trubka pevná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 50mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vertikální SLB trasy mezi podlažími	m	20,000	88,06	1 761,20	
4	K	Pol23	Kabelový prostup v podlaze, stropu do průměru 100 mm pro vertikální trasy SLB systémů	kpl.	1,000	6 900,48	6 900,48	
4	K	Pol24	Kabelová příchytka nylonová pro hlavní horizontální trasy v mezistropním prostoru, včetně upevňovacího a vázacího materiálu (hmoždinky, šrouby, vázací pásy.	ks	800,000	18,75	15 000,00	
5	K	Pol25	Kabelový žlab drátěný 150x50 mm včetně upevňovacího materiálu pro hlavní horizontální trasy SLB v chodbách a spojovacích mostech nad SDK podhledy.	m	30,000	319,48	9 584,40	
D D5			Požární bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru	5 750,40				
5	K	Pol26	Certifikovaný systém požárních ucpávek splňující podmínky vyhlášky č.246/2001Sb.	kpl	1,000	5 750,40	5 750,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.6 - Silnoproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 039 183,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 039 183,02	21,00%	218 228,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 257 411,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.6 - Silnoprúd

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 039 183,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.6 - Silnoproud

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 039 183,02

0	M	001	SVÍTIDLO 1 - nástěnné přisazené kruhové LED svítidlo 32W přisazené kruhové svítidlo, těleso z ocelového profilu, opálový difzor PMMA, 410mm x 115 mm (pr. x v), 32W LED, 4000K, 2880lm, Ra>80, IP44, třída ochrany II, životnost>30000hod., vyzařovací úhel 120	ks	3,000	954,95	2 864,85	
0	M	002	SVÍTIDLO 2 - stropní LED vestavěné svítidlo downlight 25W vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z hliníkového profilu, opálový difuzor, 230 x 100 (pr. x v), montážní otvor 200mm (pr.), 25W LED, 4000K, 2350lm, Ra>80, IP44, životnost>30000hod., vyzařovací úh	ks	8,000	883,90	7 071,20	
0	M	003	SVÍTIDLO 3 - stropní LED panel vestavěný 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, mikroprismatický optický kryt pro nízké oslnění UGR<19, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 3800lm, Ra>80, IP20, třída ochrany II, životnost>40000hod.	ks	36,000	1 305,90	47 012,40	
0	M	004	SVÍTIDLO 4 - stropní LED panel vestavěný 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, mikroprismatický optický kryt, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 4230lm, Ra>80, IP20, třída ochrany II, životnost>40000hod., vyzařovací úhel 120°, n	ks	7,000	1 298,00	9 086,00	
0	M	005	SVÍTIDLO 4.1 - stropní LED panel přisazený na strop 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, mikroprismatický optický kryt, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 4230lm, Ra>80, IP20, třída ochrany II, životnost>40000hod., vyzařovací ú	ks	6,000	1 895,11	11 370,66	
0	M	006	SVÍTIDLO 5 - stropní LED vestavěné svítidlo downlight 21W vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z hliníkového profilu, opálový difuzor, 225 x 25 (pr. x v), montážní otvor 210mm (pr.), 21W LED, 4000K, 1600lm, Ra>80, IP20, životnost>50000hod., vyzařovací úhe	ks	114,000	837,25	95 446,50	
0	M	007	SVÍTIDLO 6 - stropní přisazené, zavěšené LED svítidlo 45W přisazené/zavěšené svítidlo, těleso ze světlešedého plastu, opálový difusor z optického polykarbonátu, 1238 x 63 x 75 (š x h x v), 45W LED, 5000lm, 4000K, Ra>80, IP66, třída ochrany I, životnost>5	ks	1,000	1 327,43	1 327,43	
0	M	008	N1 - nouzové svítidlo nástěnné, stropní LED nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na stěnu nebo strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso bílý polykarbonát v barvě RAL 9003, optika transparentní polykarbonátové čočky, optická část vyrobena z met	ks	20,000	2 278,87	45 577,40	
0	M	009	N2 - nouzové svítidlo stropní oboustranné LED nouzové LED svítidlo oboustranné přisazené na strop, vestavné do stropu, těleso polykarbonát v bílé barvě RAL 9003, vybaveno plastovou signalizační prosvětlenou tabulkou z opálového polykarbonátu a zajišťuje v	ks	5,000	3 520,46	17 602,30	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M		010	SVÍTIDLO NA - stropní vestavěné nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní vestavěné, svítí při výpadku napájení, 24W, 180 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003, optický kryt z vysoce průhledného PMMA, 90 x 40 (pr. X	ks	18,000	2 734,08	49 213,44	
0	M		011	SVÍTIDLO NB - stropní vestavěné nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní vestavěné, svítí při výpadku napájení, 24W, 180 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003, optický kryt z vysoce průhledného PMMA, 90 x 40 (pr. X	ks	8,000	2 734,08	21 872,64	
0	M		012	SVÍTIDLO NA.1 - stropní přisazené nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní přisazené, svítí při výpadku napájení, 24W, 250 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003,transparentní polykarbonátové čočky, 213 x 83 x 20 (š	ks	1,000	2 129,18	2 129,18	
0	M		013	SVÍTIDLO NB.1 - stropní přisazené nouzové LED svítidlo 36W nouzové svítidlo LED stropní přisazené, svítí při výpadku napájení, 36W, 450 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003,transparentní polykarbonátové čočky, 213 x 83 x 20 (š	ks	2,000	2 241,96	4 483,92	
0	M		014	Reflektorové LED svítidlo 20W s infrapasivním čidlem pohybu PIR nástěnné LED svítidlo reflektor 20W s infrapasivním čidlem pohybu PIR, hliníková slitina práškově lakovaná, difuzor sklo, LED 20W neutrální bílá 4000K, 1500lm, 230V, zvýšené krytí IP54, d=180	ks	1,000	995,86	995,86	
0	M		015	ROZVADĚČ RPA1 Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x915x250mm, jmenovitý proud 40A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 6kA, kompletní dod	ks	1,000	29 028,40	29 028,40	
0	M		016	ROZVADĚČ RPA2 Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x1055x250mm, jmenovitý proud 80A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní d	ks	1,000	47 430,10	47 430,10	
0	M		017	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ Jednopólový vypínač 10A/230V, řazení 1, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	17,000	179,10	3 044,70	
0	M		018	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ZAPÍNAČÍ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU Tlačítkový ovladač zapínací 10A/230V s orientační doutnavkou 230V, řazení 1/0, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svisl	ks	11,000	226,16	2 487,76	
0	M		019	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ Sériový vypínač 10A/230V, řazení 5, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	1,000	214,58	214,58	
0	M		020	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	8,000	184,13	1 473,04	
0	M		021	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, IP44 Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů), krytí IP44	ks	4,000	203,30	813,20	
0	M		022	DVOJITÝ SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ Dvojitý sériový přepínač 10A/230V, řazení 6+6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	16,000	255,90	4 094,40	
0	M		023	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ Křížový přepínač 10A/230V, řazení 7, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	8,000	222,16	1 777,28	
0	M		024	INFRAPASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ Stropní infrapasivní čidlo pohybu pro spínání osvětlení, 230V, třívodňové zapojení, indukční spínaná zátěž 600VA, detekční úhel 360°, nastavitelný čas sepnutí 5s - 10 min., detekční vzdálenost 6m, montážní výška méně jak	ks	2,000	1 346,82	2 693,64	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	025	JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícetáčky dle počtu přístř	ks	28,000	194,91	5 457,48	
0	M	026	JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP44 Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem, ochrannými clonkami a víčkem pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícetáčky dl	ks	17,000	306,66	5 213,22	
0	M	027	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku	ks	26,000	480,96	12 504,96	
0	M	028	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pro PC, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku, vybaveny popisovým pol	ks	1,000	491,18	491,18	
0	M	029	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pro PC, z toho jedna vybavena vestavěným 3. st. přepěťové ochrany se světelnou signalizací, pod omítk	ks	7,000	1 677,74	11 744,18	
0	M	030	TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 16A Zásuvka průmyslová třífázová 3P+N+PE 400V/32A, IP55, pod omítku s víčkem, kompletní	ks	1,000	276,75	276,75	
0	M	031	1-CYKY-J 5x25mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	48,000	270,98	13 007,04	
0	M	032	1-CYKY-J 5x6mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	13,000	87,66	1 139,58	
0	M	033	1-CYKY-J 5x4mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	43,000	64,59	2 777,37	
0	M	034	1-CYKY-J 5x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	22,000	43,26	951,72	
0	M	035	1-CYKY-J 5x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	55,000	32,00	1 760,00	
0	M	036	1-CYKY-J 3x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá	m	1 350,000	31,79	42 916,50	
0	M	037	1-CYKY-J 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá	m	1 640,000	25,56	41 918,40	
0	M	038	1-CYKY-O 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, hnědá, šedá	m	880,000	25,56	22 492,80	
0	M	039	1-CXKH-V-O 3x1,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 HFFR vícežilový kabel s funkční integritou kabelové trasy, měděné jádro, přídatná izolace ze skloslídových pásek, izolace žil zesílená bezhalogenová izolace, HFFR výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil če	m	20,000	42,21	844,20	
0	M	040	1-CXKH-V-J 3x1,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 HFFR vícežilový kabel s funkční integritou kabelové trasy, měděné jádro, přídatná izolace ze skloslídových pásek, izolace žil zesílená bezhalogenová izolace, HFFR výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil če	m	80,000	42,21	3 376,80	
0	M	041	H07V-K 1x4mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá	m	190,000	23,61	4 485,90	
0	M	042	H07V-K 1x6mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá	m	20,000	27,81	556,20	
0	M	043	H07V-K 1x25mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá	m	130,000	71,12	9 245,60	
0	M	044	UKONČENÍ KABELŮ Ukončení kabelů (kabelová oka, návlečky, izolace, atd.) - komplet	ks	1,000	4 660,26	4 660,26	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	045	ZNAČENÍ KABELŮ Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového	ks	90,000	10,72	964,80	
0	M	046	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 200/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	40,000	293,17	11 726,80	
0	M	047	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 100/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	55,000	228,57	12 571,35	
0	M	048	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 50/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	5,000	201,70	1 008,50	
0	M	049	PŘÍSTROJOVÉ KRABICE Elektroinstalační krabice pod omítku Č73x42, 66mm, do dutých příček, univerzální, spojovatelné do souvislé řady, vč. veškerého příslušenství pro montáž	ks	185,000	69,31	12 822,35	
0	M	050	ROZVODNÉ KRABICE POD OMÍTKU Elektroinstalační krabice pod omítku Č73x42mm, do dutých příček, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (víčko, trnů, atd.)	ks	40,000	159,82	6 392,80	
0	M	051	ROZVODNÉ KRABICE VELKÉ POD OMÍTKU Elektroinstalační krabice pod omítku Č103x50mm, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (víčko, trnů, atd.)	ks	20,000	162,74	3 254,80	
0	M	052	ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH Elektroinstalační krabice na povrch 85x85x40mm, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásy, atd.), krytí IP54	ks	60,000	94,75	5 685,00	
0	M	053	ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH VELKÉ Elektroinstalační krabice na povrch 105x105x40mm, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásy, atd.), krytí IP54	ks	30,000	103,34	3 100,20	
0	M	054	OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 25 Ohebná trubka PVC průměru 25mm, bezhalogenové, samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)	m	20,000	46,91	938,20	
0	M	055	PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 40/20 Plastová vkladací lišta hranatá, rozměry 40x20mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž (kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, up	m	10,000	70,68	706,80	
0	M	056	PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 20/20 Plastová vkladací lišta hranatá, rozměry 20x20mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž (kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, up	m	20,000	59,71	1 194,20	
0	M	057	SVORKY K OCHRANNÉMU POSPOJOVÁNÍ Svorka k ochrannému pospojování kompletní vč. veškerého příslušenství	ks	25,000	561,47	14 036,75	
0	M	058	KABELOVÉ PŘÍCHYTKY Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky průměru max. 50mm s uchycením šroubem do betonu, vč. příslušenství pro montáž (vázací pásy dle průměru kabelových svazků, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)	ks	500,000	37,75	18 875,00	
0	M	059	VÁZACÍ PÁSKY Plastová vázací páska pro vázání a uchycení kabelů, černá, délka 300mm, šířka 7,6mm, zatížitelnost 55kg	ks	200,000	2,42	484,00	
0	M	060	OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 40 Ohebná dvouplášťová kurugovaná chránička, vnější průměr 40mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, -45 - +60°C	m	12,000	40,26	483,12	
0	M	061	ZEMNÍČÍ PÁSEK Zemníčí pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. svorek pro spojení dvou pásků, ochrany spojů proti korozi	m	160,000	69,90	11 184,00	
0	M	062	ZEMNÍČÍ DRÁT Zemníčí drát FeZn průměru 10mm, pozinkovaný, potažený PVC	m	45,000	120,60	5 427,00	
0	M	063	DRÁT AlMgSi Drát AlMgSi průměru 8mm vč. podpěr svodového drátu na střeše pro daný typ střešní krytiny, kompletní vč. příslušenství pro montáž	m	210,000	81,32	17 077,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	064	OCHRANNÁ TRUBKA Ochranná trubka svodu u země před mechanickým poškozením, délka 1,7m, nerez	ks	10,000	418,96	4 189,60	
0	M	065	DRŽÁK OCHRANNÉ TRUBKY Držák ochranné trubky pro připevnění k objektu, nerez, délka a provedení dle stavby, kompletní	ks	20,000	167,30	3 346,00	
0	M	066	PODPĚRA SVODOVÉHO DRÁTU Podpěra svodového drátu do zdi, nerez, délka a provedení dle stavby, kompletní vč. příslušenství pro montáž	ks	200,000	97,49	19 498,00	
0	M	067	PODPĚRA SVODOVÉHO DRÁTU Podpěra svodového drátu na střeše, nerez, délka a provedení dle konkrétní střešní krytiny, kompletní vč. příslušenství pro montáž	ks	130,000	100,57	13 074,10	
0	M	068	JÍMACÍ TYČ Jímací tyč s rovným koncem AlMgSi, délka 1m vč. držáků a příslušenství pro montáž a připojení, kompletní	ks	3,000	629,23	1 887,69	
0	M	069	SPOJOVACÍ SVORKA Nerez Spojovací svorka pro spojení dvou vodičů, nerez	ks	48,000	63,75	3 060,00	
0	M	070	UNIVERZÁLNÍ SVORKA Nerez Univerzální svorka SU, SP, SK, SO, nerez	ks	70,000	75,03	5 252,10	
0	M	071	ZKUŠEBNÍ SVORKA SZ Zkušební svorka pro spojení nadzemních částí hromosvodu s uzemněním, nerez	ks	10,000	92,46	924,60	
0	M	072	SPOJOVACÍ SVORKA SR Spojovací svorka pro spojení pásek/vodič, pásek/pásek, pozinkovaná	ks	50,000	59,65	2 982,50	
0	M	073	OCHRANA PROTI KOROZI Ochrana podzemních částí a spojů uzemnění proti korozi	m2	1,000	295,93	295,93	
0	M	074	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, hmoždinky, příchytky, atd - komplet	ks	1,000	2 796,16	2 796,16	
0	M	075	OCELOVÁ KONSTRUKCE Ocelová konstrukce všeobecně (závitové tyče, příčníky, výložníky, atd.)	kg	100,000	62,17	6 217,00	
0	M	076	POŽÁRNÍ UCPÁVKY Požární ucpávky kabelových tras při průchodu dělicími stěnami požárních úseků, provedení a materiál dle specifikace požární zprávy	m2	1,000	6 524,37	6 524,37	
0	M	077	OSTATNÍ Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, odstranění vad a nedodělků, atd.	hod.	45,000	326,22	14 679,90	
0	M	078	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE Strojní sekání drážek pro kabelové trasy ve zděných konstrukcích, na betonových nosných prvcích ručně dle statického posouzení objektu, rozměry max. 100x40mm, prostupy stěnami a stropy, atd. - komplet	m	200,000	65,99	13 198,00	
0	M	079	LIKVIDACE Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet	ks	1,000	4 660,26	4 660,26	
0	M	080	CENTRAL TEST NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ Připojení nových svítidel nouzového osvětlení na stávající bezdrátový systém central test v objektu školky realizovaný v rámci SO03 - Hospodářský pavilon - nastavení svítidel, doprogramování ústředny pro nová svítidla, nas	ks	1,000	11 602,84	11 602,84	
0	M	081	ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o shodě, certifikáty, atd.	hod.	10,000	512,63	5 126,30	
0	K	085	MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů	ks	1,000	197 003,78	197 003,78	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.7 - MaR

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

205 819,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	205 819,44	21,00%	43 222,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

249 041,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.7 - MaR

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

205 819,44

1 - ROZVADĚČE -

60 413,75

2 - ČIDLA A POHONY

31 479,16

3 - KABELY ,KABELOVÉ TRASY

18 314,22

4 - OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE

51 909,24

5 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

43 703,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.7 - MaR

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

205 819,44

D		1	ROZVADĚČE -				60 413,75	
0	M	1-1	Rozváděč RMARA Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 600×1000×300 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň	ks	1,000	60 413,75	60 413,75	

D		2	ČIDLA A POHONY				31 479,16	
0	M	2-1	Venkovní teplotní čidlo Pt 1000, IP54, -40/+60°C,	ks	1,000	298,67	298,67	
0	M	2-2	Přepínač 1-0-A se signálkou na rozvaděči	ks	4,000	1 171,91	4 687,64	
0	M	2-3	Ovládací tlačítko se signálkou na rozvaděči	ks	1,000	879,81	879,81	
0	M	2-4	Servisní vypínač jednofázový na omítku , 16A s možností uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný kontakt	ks	4,000	879,81	3 519,24	
0	M	2-5	Regulátor radiátorového topení 1xSSR, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, týdenní program, přepínání a indikace stavů, 1 x DO triak 24 V st pro term. ventil topení, kom. Modbus / RS485	ks	4,000	3 137,41	12 549,64	
0	M	2-6	Termoelektrická hlavice low current 24VAC, NC, M30x1,5 Převedeno do souhrnu	ks	8,000	1 193,02	9 544,16	

D		3	KABELY ,KABELOVÉ TRASY				18 314,22	
0	M	3-1	Kabel JYTY J-Y(St)Y 1x2x0,8	m	245,000	5,77	1 413,65	
0	M	3-2	Kabel JYTY J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	90,000	8,20	738,00	
0	M	3-3	Kabel Ethernet cat 5E	m	40,000	6,77	270,80	
0	M	3-4	Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2	m	133,000	10,38	1 380,54	
0	M	3-5	Kabel 1-CYKY-O 3x1,5mm2	m	80,000	10,38	830,40	
0	M	3-6	Kabel 1-CYKY-O 3x2,5mm2	m	25,000	16,92	423,00	
0	M	3-7	Kabel CY6mm2	m	40,000	12,92	516,80	
0	M	3-8	Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž (konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd.)	m	30,000	221,36	6 640,80	
0	M	3-9	Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná, vč. příchytěk a montážního příslušenství	m	30,000	25,81	774,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	3-10	Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, ohebná, vč. příchytek a montážního příslušenství	m	45,000	14,08	633,60	
0	M	3-11	Požární ucpávky komplet	ks	1,000	2 932,71	2 932,71	
0	M	3-12	Ocelové nosné konstrukce Převedeno do souhrnu	ks	1,000	1 759,62	1 759,62	

D 4 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 51 909,24

0	M	4-1	Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál	ks	1,000	7 146,42	7 146,42	
0	K	4-2	Montáž, kompletace, oživení	ks	1,000	32 445,45	32 445,45	
0	K	4-3	Stavební připomocné práce, stavební připravenost	ks	1,000	2 932,71	2 932,71	
0	M	4-4	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál Převedeno do souhrnu	ks	1,000	9 384,66	9 384,66	

D 5 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 43 703,07

0	K	5-4	Provozní zkoušky	ks	1,000	5 750,40	5 750,40	
0	K	5-5	Výchozí revize elektro	ks	1,000	5 520,39	5 520,39	
0	K	5-6	Software pro DDC a PLC regulátory	ks	1,000	17 251,21	17 251,21	
0	K	5-7	Oživení systému	ks	1,000	11 500,81	11 500,81	
0	K	5-8	Zaučení obsluhy Převedeno do souhrnu	ks	1,000	3 680,26	3 680,26	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.8 - Gastro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

310 112,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	310 112,72	21,00%	65 123,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

375 236,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pavilon A

Soupis:

SO 02.8 - Gastro

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

310 112,72

D1 - Pavilon A - 1.NP

163 840,69

Q - Výdejní kuchyňka A.

163 840,69

D2 - Pavilon A - 2.NP

146 272,03

R - Výdejní kuchyňka B.

146 272,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 02 - Pávilon A

Soupis:

SO 02.8 - Gastro

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

310 112,72

D D1 Pávilon A - 1.NP

163 840,69

D Q Výdejní kuchyňka A.

163 840,69

0	K	Q1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, 1x plná police, prolomená pracovní deska, 1x otvor vlevo pro stojánkovou vodovodní baterii, částečná kapotáž dřezu z čela, vpravo ve spodním prostoru stolu místo pro umístění podstolové myčky,	ks	1,000	19 128,62	19 128,62	
0	K	Q2	Vodovodní stojánková baterie, pákové ovládání	ks	1,000	3 533,52	3 533,52	
0	K	Q3	Podstolová profesionální myčka, dvouplášťové provedení, čelní zakládání, velikost koše 400x400mm, pracovní výkon 20 košu za hod, mycí cykly 180", spotřeba vody 2,75 lt , objem mycí vany 10 litrů, magnetický spínač dvířek, zásuvná výška 320 mm, součástí m	ks	1,000	37 920,94	37 920,94	
0	K	Q4	Vyhřívavá výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x kolečko, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +	ks	1,000	28 490,28	28 490,28	
0	K	Q5	Pracovní stůl, 2x částečná police vpravo, vpravo úkos pracovní desky, prostor pro podstolovou chladničku vlevo , 6x noha, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení - viz projektová dokumentace - DOMĚREK 2700x700x900	ks	1,000	18 139,55	18 139,55	
0	K	Q6	Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1000x350	ks	2,000	6 983,77	13 967,54	
0	K	Q7	Vypuštěno	ks	1,000	0,00	0,00	
0	K	Q8	Vypuštěno	ks	1,000	0,00	0,00	
0	K	Q9	Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby	ks	1,000	5 639,54	5 639,54	
0	K	Q10	Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610	ks	1,000	4 913,62	4 913,62	
0	K	Q11	Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostát, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění odpadků 600x	ks	1,000	12 619,16	12 619,16	
0	K	Q12	Servírovací vozík, 2x plná police, obě police s prolisem, svařovaná, tuhá konstrukce zajišťující dostatečnou stabilitu a nosnost vozíku, pojízdný - 4x kolečko, každé o průměru 100mm, dvě kolečka opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení 700x500x850	ks	1,000	8 708,89	8 708,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Q13	Změkčovác vody pro myčku nadobí, konvektomat, provedení automatické s objemovým řízením - ne časovým !!!, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 10 lt, nastavení regenerace v rozsahu 0 až 99 m3	ks	1,000	10 779,03	10 779,03	

D D2 Pavilon A - 2.NP 146 272,03

D R Výdejní kuchyňka B. 146 272,03

0	K	R1	Pracovní stůl, 2x plná police, vpravo pod pracovní deskou umístěna podstolová chladnička, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení, DOMĚREK 2000x700x900	ks	1,000	19 128,62	19 128,62	
0	K	R2	Vodovodní stojánková baterie, pákové ovládání	ks	2,000	3 533,52	7 067,04	
0	K	R3	Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění odpadků 600x	ks	1,000	12 619,16	12 619,16	
0	K	R4	Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x kolečko, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +	ks	1,000	28 490,28	28 490,28	
0	K	R5	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250 mm, 1x vevařené lisované umyvadlo o rozměru 250x250x160mm, pravý přesah desky, v pravé přesahu desky úkos pracovní desky, 2x otvor pro stojánkovou baterii, vpravo mezi dřezy prostor pro podstolovo	ks	1,000	17 679,52	17 679,52	
0	K	R6	Podstolová profesionální myčka, dvouplášťové provedení, čelní zakládání, velikost koše 400x400mm, pracovní výkon 20 košu za hod, mycí cykly 180" , spotřeba vody 2,75 lt , objem mycí vany 10 litrů, magnetický spínač dveří, zásuvná výška 320 mm, součástí m	ks	1,000	37 920,94	37 920,94	
0	K	R7	Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610	ks	1,000	4 913,62	4 913,62	
0	K	R8	Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 2000x350	ks	1,000	9 743,96	9 743,96	
0	K	R9	Servírovací vozík, 2x plná police, obě police s prolisem, svařovaná, tuhá konstrukce zajišťující dostatečnou stabilitu a nosnost vozíku, pojízdný - 4x kolečko, každé o průměru 100mm, dvě kolečka opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení 700x500x850	ks	1,000	8 708,89	8 708,89	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.1 - ASŘ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 810 908,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 810 908,88	21,00%	2 690 290,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 501 199,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.1 - ASŘ

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 810 908,88

HSV - Práce a dodávky HSV

6 903 794,60

1 - Zemní práce	51 941,06
2 - Zakládání	674 971,77
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 482 099,99
4 - Vodorovné konstrukce	1 140 571,84
5 - Komunikace pozemní	4 880,03
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 421 632,27
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	708 070,50
997 - Přesun sutě	51 439,69
998 - Přesun hmot	368 187,45

PSV - Práce a dodávky PSV

5 336 674,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	398 652,50
712 - Povlakové krytiny	130 322,56
713 - Izolace tepelné	352 539,94
714 - Akustická a protiotřesová opatření	23 734,55
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	44 586,21
763 - Konstrukce suché výstavby	329 280,37

764 - Konstrukce klempířské	161 303,85
766 - Konstrukce truhlářské	1 838 416,57
767 - Konstrukce zámečnické	743 339,02
771 - Podlahy z dlaždic	652 867,47
776 - Podlahy povlakové	97 416,95
781 - Dokončovací práce - obklady	416 352,49
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	120 959,75
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	26 901,96
M - Práce a dodávky M	570 440,09
33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	570 440,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.1 - ASŘ

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 810 908,88

D HSV

Práce a dodávky HSV

6 903 794,60

D 1

Zemní práce

51 941,06

1	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,790	186,83	521,26	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.03.1.02					
	VV		3,29*2,12*0,40		2,790			
	VV		Součet		2,790			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	6,869	419,32	2 880,31	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.03.1.02					
	VV		(2,39+5,50+4,315+6,215+(4,315+1,10+6,215))*0,40*0,55		6,611			
	VV		1,075*0,60*0,40		0,258			
	VV		Součet		6,869			
5	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	21,387	578,02	12 362,11	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.03.1.02					
	VV		(16,215+0,55+3,165)*0,40*1,10		8,769			
	VV		21,03*0,40*0,80		6,730			
	VV		21,03*0,40*0,70		5,888			
	VV		Součet		21,387			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	31,046	375,39	11 654,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina na skládku					
	VV		2,79+6,869+21,387		31,046			
	VV		Součet		31,046			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	155,230	27,37	4 248,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		31,046*5 "Přepočtené koeficientem množství"		155,230			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	49,674	394,13	19 578,01	CS ÚRS 2020 02
	VV		31,046*1,60		49,674			
	VV		Součet		49,674			
310	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	31,046	22,43	696,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina na skládku					
	VV		2,79+6,869+21,387		31,046			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		31,046			
	D	2	Zakládání				674 971,77	
10	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	164,176	1 380,10	226 579,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		podšyp tl 0,65 m					
	VV		((16,215+0,15+0,075)*(6,215+0,2+0,35)-2,15*1,95)*0,65		69,566			
	VV		((16,215+0,15+0,075)*(6,215+0,2+0,35)-(5,90*0,40+2,615*0,40+0,60*1,075))*0,65		69,658			
	VV		(3,165+0,15)*(6,215+0,20+0,35)*0,65		14,577			
	VV		(4,315+0,35+0,15)*(3,165+0,15)*0,65		10,375			
	VV		Součet		164,176			
11	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,882	5 175,36	4 564,67	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		skladba P5 - výtahová šachta					
	VV		2,05*2,15*0,20		0,882			
	VV		Součet		0,882			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,680	690,05	1 159,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		skladba P5 - výtahová šachta					
	VV		(2,05+2,15)*2*0,20		1,680			
	VV		Součet		1,680			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,680	207,01	347,78	CS ÚRS 2020 02
14	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,115	37 377,63	4 298,43	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		0,882*0,130		0,115			
	VV		Součet		0,115			
15	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	26,578	3 438,74	91 394,83	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		20,93*0,60*0,40		5,023			
	VV		20,93*0,55*0,40		4,605			
	VV		(6,215+1,10+4,315)*2*0,40*0,475		4,419			
	VV		(12,45+5,40)*0,40*1,10+2,05*0,40*0,30		8,100			
	VV		(6,215+4,315+6,05+2,39)*0,40*0,55		4,173			
	VV		1,075*0,60*0,40		0,258			
	VV		Součet		26,578			
16	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	89,096	690,05	61 480,69	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		(20,93+16,215+3,165)*0,40		16,124			
	VV		(20,93+16,215-0,55+3,165)*0,40		15,904			
	VV		((6,215+1,10+4,315)*2+(6,215+4,315))*0,40		13,516			
	VV		(12,45+5,40-0,55)*2*0,40+2,05*0,40		14,660			
	VV		(6,215+4,315)*2+(6,05+2,39+2,39+0,55*2+5,50)*0,40		28,032			
	VV		1,075*2*0,40		0,860			
	VV		Součet		89,096			
17	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	89,096	207,01	18 443,76	CS ÚRS 2020 02
18	K	279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	83,372	2 139,15	178 345,21	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		(20,93*2+(6,215+0,20+1,10+4,315+0,15)*2+6,215+1,10+4,315+0,20+0,15+12,50+5,40+5,90+2,39+0,15+0,075)*0,80		83,372			
	VV		Součet		83,372			
19	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,505	4 600,32	6 923,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,05+1,75)*2*0,90*0,22		1,505			
	VV		Součet		1,505			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	13,680	690,05	9 439,88	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,05+2,15+1,65+1,75)*2*0,90		13,680			
	VV		Součet		13,680			
21	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	13,680	172,51	2 359,94	CS ÚRS 2020 02
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,863	37 377,63	69 634,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		žlb základová zeď - množství výztuže 130kg/m3					
	VV		1,505*0,130		0,196			
	VV		základová zeď z prolévaných tvárnic - množství výztuže 20kg/m2					
	VV		83,372*0,020		1,667			
	VV		Součet		1,863			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				1 482 099,99	
23	K	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	49,785	1 242,09	61 837,45	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.4,5					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,05+1,75)*2*7,24-1,18*2,22*2		49,785			
	VV		Součet		49,785			
24	K	311234011	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 175 mm	m2	117,270	954,57	111 942,42	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.4					
	VV		1.NP					
	VV		1,855*3,45 "B.3/B.4		6,400			
	VV		1,165*3,45 "1.13/14		4,019			
	VV		2,115*3,45 "1.15/17		7,297			
	VV		(2,35+2,35)*3,45 "1.21/22		16,215			
	VV		(1,225+2,15*2)*3,45 "1.10/09,11,22		19,061			
	VV		2.NP					
	VV		2,885*3,35 "2.03/04		9,665			
	VV		(0,70+4,40+0,115+2,335+3,215+0,85)*3,35 "2.08,2.07/2.09		38,910			
	VV		(2,685+0,755+1,825)*3,35-0,90*2,15 "2.09/2.14		15,703			
	VV		Součet		117,270			
25	K	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm	m2	64,524	1 081,08	69 755,61	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.6					
	VV		atika					
	VV		(21,23+13,13-0,40)*2*0,95		64,524			
	VV		Součet		64,524			
26	K	311234061	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 300 mm	m2	140,235	1 437,60	201 601,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.4					
	VV		1.NP					
	VV		(12,05+3,40+5,40+3,0+10,85)*3,20		111,040			
	VV		odečet					
	VV		-(1,10*2,15*3+1,20*2,15*3)		-14,835			
	VV		2.NP					
	VV		(3,70+12,55)*3,20		52,000			
	VV		0,60*3,20		1,920			
	VV		odečet					
	VV		-(1,20*2,15*2+1,10*2,15*2)		-9,890			
	VV		Součet		140,235			
27	K	31123409R	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 365 mm	m2	344,821	1 587,11	547 268,86	
	VV		příloha D.1.03.1.4					
	VV		(20,15+12,05+0,365*2)*2*3,20*2		421,504			
	VV		odečet otvorů					
	VV		-(1,20*2,40*4+1,55*1,40*4+0,75*0,75*4+2,25*1,50*3+1,50*0,75*2+0,75*2,10+1,50*1,50*2)		-40,900			
	VV		-(0,75*0,75*3+1,50*1,50*3+0,75*2,20*2+1,50*0,75*2+2,25*1,50*4+1,40*2,40*2+0,75*2,10)		-35,783			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			344,821		
28	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,996	37 377,63	37 228,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.4,5					
	VV		výtahová šachta					
	VV		49,785*0,020		0,996			
	VV		Součet		0,996			
29	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	4,000	437,03	1 748,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.38					
	VV		4,0 "P4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
30	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	22,000	454,28	9 994,16	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.38					
	VV		22,0 "P5		22,000			
	VV		Součet		22,000			
31	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	60,000	483,03	28 981,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.38					
	VV		2,0*4 "P3		8,000			
	VV		13,0*4 "P6		52,000			
	VV		Součet		60,000			
32	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	8,000	506,04	4 048,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.38					
	VV		1,0*4 "P2		4,000			
	VV		1,0*4 "P11		4,000			
	VV		Součet		8,000			
33	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	44,000	529,04	23 277,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		11,0*4 "P1		44,000			
	VV		Součet		44,000			
34	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	28,000	621,04	17 389,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.38					
	VV		7,0*4 "P16		28,000			
	VV		Součet		28,000			
35	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	28,000	862,56	24 151,68	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.38					
	VV		7,0*4 "P7		28,000			
	VV		Součet		28,000			
36	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	28,000	1 265,09	35 422,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.38					
	VV		7,0*4 "P8		28,000			
	VV		Součet		28,000			
37	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,132	17 251,21	2 277,16	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.03.1.38					
	VV		66,0*2/1000 "P12 - 4x100 dl. 1800 mm		0,132			
	VV		Součet		0,132			
38	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,132	48 303,39	6 376,05	CS ÚRS 2020 02
39	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,029	17 251,21	500,29	CS ÚRS 2020 02
	VV		výtahová šachta - montážní nosník I140					
	VV		2,050*14,30/1000		0,029			
	VV		Součet		0,029			
40	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,029	48 303,39	1 400,80	CS ÚRS 2020 02
41	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	399,030	730,30	291 411,61	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.4					
	VV		1.NP					
	VV		(3,40+3,50)*3,35-0,70*2,0*2-0,80*2,0 "B.1,3,4,5		18,715			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,80+3,0+5,0+1,90+1,80)*3,35-0,90*2,0-0,80*2,0*2-0,70*2,0-1,25*2,40*3 "1.02,04,14,15,16,17		29,825			
	VV		(0,90+3,72*4+10,75+3,015+1,115+3,015+0,75)*3,35 "1.11,12,13,17,18,19,20,21		115,324			
	VV		(2,175+1,725+1,90)*3,35-0,80*2,0 "1.09/08,22		17,830			
	VV		(8,80+2,885*3)*3,35-0,80*2,0*3-1,25*2,40 "1.05,06,07,08/03		50,674			
	VV		(1,20+1,10)*2,40*3-0,80*2,0*3-0,90*2,0*3		6,360			
	VV		2.NP					
	VV		(3,97+4,30+2,435+2,885+3,585+0,115)*3,35-0,80*2,0*4 "2.11,12,13		51,522			
	VV		(3,0+1,90+5,0-0,175)*3,35-0,80*2,0*3-0,90*2,0-1,25*2,40 "2.10/01,14,15,16		22,979			
	VV		(0,90+1,87+0,175+1,015+1,905+0,175)*3,35 "2.09/14,15,16		20,234			
	VV		2,14*3,35 "2.09		7,169			
	VV		1,80*3,35 "2.08		6,030			
	VV		(8,80+2,885*2+0,93+1,35)*3,35-0,80*2,0*5-0,70*2,0 "2.03,04,05,06		47,048			
	VV		1,20*2,40*3-0,90*2,0*3+1,10*2,40*2-0,80*2,0*2		5,320			
	VV		Součet		399,030			
42	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,360	920,06	331,22	CS ÚRS 2020 02
	VV		"překlad P12" 1,80*0,10*2		0,360			
	VV		Součet		0,360			
43	K	346271113	Přizdívky z cihel betonových tl 65 mm	m2	7,360	460,03	3 385,82	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,25+2,35)*2*0,80		7,360			
	VV		Součet		7,360			
44	K	346271129	Příplatek k přizdívám za ochranu izolace zaléváním maltou	m2	6,720	195,51	1 313,83	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,05+2,15)*2*0,80		6,720			
	VV		Součet		6,720			
45	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabcovým pletivem	m2	0,720	632,54	455,43	CS ÚRS 2020 02
	VV		"překlad P12" 1,80*(0,10*2+0,20)		0,720			
	VV		Součet		0,720			
D 4			Vodorovné konstrukce				1 140 571,84	
46	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 3 t budova v do 18 m	kus	79,000	1 207,58	95 398,82	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		9+2+2+2+7+1+1+1+4+1+8+1+1+1		41,000			
	VV		2.NP					
	VV		11+1+3+2+16+1+1+1+1+1		38,000			
	VV		Součet		79,000			
47	M	593468R2	panel stropní předpjatý Spirrol HCE 250-0/8	m	428,585	1 414,60	606 276,34	
	VV		7,10*(9+11) "panel S1 - 1200x7100x250		142,000			
	VV		7,10*2 "panel S2 - 1010x7100x250		14,200			
	VV		7,10*(2+3) "panel S3 - 785x7100x250		35,500			
	VV		5,225*(2+2) "panel S4 - 1010x5225x250		20,900			
	VV		5,15*(7+16) "panel S5 - 1200x5150x250		118,450			
	VV		5,15*(1+1) "panel S6 - 1010*5150x250		10,300			
	VV		5,15*1 "panel S7 - 785*5150*250		5,150			
	VV		5,15*1 "panel S8 - 560x5150x250		5,150			
	VV		2,15*4 "panel S9 - 1200x2150x250		8,600			
	VV		2,15*1 "panel S10 - 1010x2150x250		2,150			
	VV		3,65*8 "panel S11 - 1200x3650*250		29,200			
	VV		3,65*1 "panel S12 - 1010x3650x250		3,650			
	VV		3,65*1 "panel S13 - 560x3650x250		3,650			
	VV		3,65*1 "panel S14 - 560x3650x250		3,650			
	VV		7,10*1 "panel S2 - 690x7100x250		7,100			
	VV		6,185*1 "panel S15 - 785x6185x250		6,185			
	VV		4,15*1 "panel S16 - 785x4150x250		4,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,50*1 "panel S17 - 785x1500x250		1,500			
	VV		7,10*1 "panel S17 - 345x7100x250		7,100			
	VV		Součet		428,585			
48	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	0,630	4 887,84	3 079,34	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.2.3					
	VV		dobetonávka stropu 2.NP					
	VV		2,05*2,05*0,15		0,630			
	VV		Součet		0,630			
49	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	0,738	5 175,36	3 819,42	CS ÚRS 2020 02
	VV		S4					
	VV		2,05*2,40*0,15		0,738			
	VV		Součet		0,738			
50	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	11,073	805,06	8 914,43	CS ÚRS 2020 02
	VV		S4					
	VV		2,05*2,40+(2,05+2,40)*2*0,15		6,255			
	VV		příloha D.1.03.2.3					
	VV		dobetonávka stropu 2.NP					
	VV		2,05*2,05+2,05*2*0,15		4,818			
	VV		Součet		11,073			
51	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	11,073	207,01	2 292,22	CS ÚRS 2020 02
52	K	411354311	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	4,203	287,52	1 208,45	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.2.3					
	VV		dobetonávka stropu 2.NP					
	VV		2,05*2,05		4,203			
	VV		Součet		4,203			
53	K	411354312	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15 cm	m2	4,203	172,51	725,06	CS ÚRS 2020 02
54	K	411354331	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm	m2	4,920	310,52	1 527,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.6					
	VV		S4					
	VV		2,05*2,40		4,920			
	VV		Součet		4,920			
55	K	411354332	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm	m2	4,920	184,01	905,33	CS ÚRS 2020 02
56	K	4113543R1	Příplatek k podpěrné konstrukce stropů za výšku podepření nad 8 m	m2	4,920	115,01	565,85	
57	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,178	37 377,63	6 653,22	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		příloha D.1.03.1.6					
	VV		S4					
	VV		2,05*2,40*0,15*0,130		0,096			
	VV		příloha D.1.03.2.3					
	VV		dobetonávka stropu 2.NP					
	VV		2,05*2,05*0,15*0,130		0,082			
	VV		Součet		0,178			
58	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	27,066	4 151,79	112 372,35	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.4					
	VV		1.NP					
	VV		(20,88+12,05)*2*0,50*0,365		12,019			
	VV		20,18*0,25*0,30		1,514			
	VV		2.NP					
	VV		(20,88+12,05)*2*0,50*0,365		12,019			
	VV		20,18*0,25*0,30		1,514			
	VV		Součet		27,066			
59	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	154,060	575,04	88 590,66	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.4,5					
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(20,88+12,05+21,23+12,78)*2*0,50		66,940			
	VV		20,18*0,25*2		10,090			
	VV		2.NP					
	VV		(20,88+12,05+21,23+12,78)*2*0,50		66,940			
	VV		20,18*0,25*2		10,090			
	VV		Součet		154,060			
60	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	154,060	149,51	23 033,51	CS ÚRS 2020 02
61	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	3,596	37 377,63	134 409,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		27,66*0,130		3,596			
	VV		Součet		3,596			
62	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	3,212	4 577,32	14 702,35	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.03.1.4,5					
	VV		schodiště 1.04					
	VV		3,0*1,20*0,20*2 "podstupňová deska		1,440			
	VV		0,30*0,20*1,20 "základ schodiště		0,072			
	VV		0,29*0,1636/2*1,20*22 "schody		0,626			
	VV		3,43*1,565*0,20 "podesta		1,074			
	VV		Součet		3,212			
63	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,418	35 882,52	14 998,89	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		3,212*0,130		0,418			
	VV		Součet		0,418			
64	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,940	1 092,58	13 045,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.23.1.4,5					
	VV		schodiště 1.07/2.07					
	VV		3,0*(1,20+0,20)*2 "podstupňová deska		8,400			
	VV		0,30*0,20+0,20*1,20 "základ schodiště		0,300			
	VV		2,70*1,20 "podesta		3,240			
	VV		Součet		11,940			
65	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	11,940	287,52	3 432,99	CS ÚRS 2020 02
66	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,319	862,56	3 725,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.02.1.4,5					
	VV		schodiště 1.04					
	VV		0,1636*1,20*22 "schody		4,319			
	VV		Součet		4,319			
67	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	4,319	207,01	894,08	CS ÚRS 2020 02
D 5			Komunikace pozemní				4 880,03	
68	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm 0/63	m2	35,360	138,01	4 880,03	CS ÚRS 2020 02
	VV		okapový chodník					
	VV		vymývané dlaždice 500x500x50 mm					
	VV		(21,23+14,13)*2*0,50		35,360			
	VV		Součet		35,360			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 421 632,27	
69	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášena ručně	m2	47,720	322,02	15 366,79	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.8,9 - C6					
	VV		1.NP					
	VV		17,10		17,100			
	VV		2.NP					
	VV		30,62		30,620			
	VV		Součet		47,720			
70	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	338,000	253,02	85 520,76	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		omítka pod obklad					
	VV		338,0		338,000			
	VV		Součet		338,000			
71	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 186,806	299,02	354 878,73	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.4					
	VV		1.NP					
	VV		(1,80+1,40)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,265-1,25*2,0-1,25*2,40 "mč. 1.01		13,143			
	VV		(1,80+8,51)*2*2,65-1,2*2,40*3-0,90*2,0*2-0,80*2,0-0,70*2,0 "mč. 1.02		39,403			
	VV		(12,695+1,90)*2*2,65+(1,20+2,15*2)*0,20+(1,10+2,15*2)*0,20-1,25*2,40*2-0,90*2,0*2-0,80*2,0*6 "mč. 1.03		60,334			
	VV		(5,40+2,70)*2*3,0+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 1.04		46,710			
	VV		(1,785+2,885)*2*2,65+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,80*2,0 "mč. 1.05		23,264			
	VV		(1,685+2,885)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,30-1,25*2,0-1,25*2,40 "mč. 1.06		20,626			
	VV		(2,135+2,885)*2*3,0+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,80*2,0 "mč. 1.07		28,633			
	VV		(2,885+2,885)*2*3,0+1,50*3*0,30+(0,75+1,50*2)*0,30-1,50*1,50-0,75*1,50-0,80*2,0 "mč. 1.08		32,120			
	VV		(2,175+4,235)*2*3,0+1,50*3*0,30-1,50*1,50-0,80*2,0 "mč. 1.09		35,960			
	VV		(1,225+2,035)*2*2,65-0,80*2,0 "mč. 1.10		15,678			
	VV		(2,05+3,015)*2*3,0-0,90*2,0 "mč. 1.11		28,590			
	VV		(3,985+3,015+1,115+0,75+0,115)*2*3,0-0,90*2,0 "mč. 1.12		52,080			
	VV		(2,585+3,015)*2*3,0-0,80*2,0 "mč.1.13		32,000			
	VV		(1,76+1,65)*2*2,65-0,70*2,0 "mč. 1.14		16,673			
	VV		(2,115+1,675)*2*3,0-0,80*2,0 "mč. 1.15		21,140			
	VV		(1,80+1,93)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,30-1,25*2,0-1,25*2,40 "mč. 1.16		16,174			
	VV		(2,115+1,87+0,90)*2*2,65+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,80*2,0 "mč. 1.17		24,403			
	VV		(2,29+3,72)*2*3,0+(1,55+2,40*2)*0,30-1,25*2,0 "mč. 1.18		35,465			
	VV		(1,935+3,72)*2*3,0+(1,20+2,40*2)*0,30-0,90*2,0 "mč. 1.19		33,930			
	VV		(1,935+3,72)*2*3,0+(1,20+2,40*2)*0,30-0,90*2,0 "mč. 1.20		33,930			
	VV		(2,05+3,72+0,62+0,115/2)*2*2,65+(1,20+2,40*2)*0,30-0,90*2,0 "mč. 1.21		34,172			
	VV		(3,575+4,70)*2*3,25+(2,25+0,75*2)*0,30+(1,20+2,40*2)*0,30-2,25*0,75-0,90*2,0 "mč. 1.22		53,225			
	VV		(1,40+3,50)*2*3,0+(1,20+2,15*2)*0,20-0,80*2,0*2-0,70*2,0*2-0,90*2,0 "mč. B1		22,700			
	VV		(3,40+4,90)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30-2,25*1,50-0,80*2,0 "mč. B2		46,400			
	VV		(2,205+1,855)*2*2,65+(1,50+0,75*2)*0,30-1,50*0,75-0,70*2,0 "mč. B3		19,893			
	VV		(1,855+1,12)*2*2,65+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,70*2,0 "mč. B4		14,480			
	VV		(3,40+3,235)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30-2,25*1,50-0,80*2,0 "mč. B5		36,410			
	VV		příloha D.1.03.1.5					
	VV		2.NP					
	VV		(5,40+2,70)*2*3,0+(0,75+2,20*2)*0,30*2-0,75*2,20*2-0,90*2,0*2 "mč. 2.01		44,790			
	VV		(14,535+1,90)*2*2,45+(1,55+2,15*2)*0,20+(1,20+2,15*2)*0,20*2-1,25*2,0-0,80*2,0*6-0,90*2,0*3-1,25*2,4 "mč. 2.02		63,402			
	VV		(1,60+1,80)*2*2,65-0,80*2,0-0,70*2,0 "mč. 2.03		15,020			
	VV		(1,60+0,95)*2*2,65+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,70*2,0 "mč. 2.03a		12,228			
	VV		(2,885+2,325+0,94)*2*3,0+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,80*2,0 "mč. 2.04		35,413			
	VV		(2,50+2,885)*2*3,0+1,50*3*0,30-1,50*1,50-0,80*2,0 "mč. 2.05		29,810			
	VV		(2,005+2,885)*2*3,0+0,75*3*0,30-0,75*0,75-0,80*2,0 "mč. 2.06		27,853			
	VV		(3,575+6,85)*2*3,25-0,80*2,0 "mč. 2.07		66,163			
	VV		(1,31+1,80)*2*2,65-0,80*2,0 "mč. 2.08		14,883			
	VV		(9,005+2,335+2,44+0,60+0,175+3,215+0,85+1,90+5,54+1,90+4,34*2+2,42+2,53)*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30*2+1,50*3*0,30		114,714			
	VV		(4,40+3,05)*2*2,65		39,485			
	VV		-(0,95*2,15*2+0,90*2,0*2+0,90*2,15*2+2,25*1,50*2+1,50*1,50) "mč. 2.09		-20,555			
	VV		(1,80+12,08+3,70)*2*2,60+(1,50+0,75*2)*0,30+(0,75+2,10*2)*0,30-0,75*2,10-1,50*0,75-0,90*2,0-0,80*2,0*6-1,25*2,40 "mč. 2.10		76,701			
	VV		(3,585+2,885)*2*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30-2,25*1,50-0,80*2,0 "mč. 2.11		30,891			
	VV		(2,435+3,97)*2*3,0+1,50*3*0,30-1,50*1,50-0,80*2,0*2 "mč. 2.12		34,330			
	VV		(3,97+4,30)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30-2,25*1,50-0,80*2,0 "mč. 2.13		46,220			
	VV		(1,905+1,825)*2*2,65-0,80*2,0 "mč. 2.14		18,169			
	VV		(1,905+1,0)*2*2,65-0,80*2,0 "mč. 2.15		13,797			
	VV		(1,905+1,87+0,90+0,115/2)*2*2,70+(0,75+1,50*2)*0,30-0,75*1,50-0,80*2,0 "mč. 2.16		23,956			
	VV		odečet obkladů					
	VV		-338,0		-338,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 186,806			
72	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	221,800	102,36	22 703,45	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.8					
	VV		1.NP					
	VV		(2,25+0,75)*2		6,000			
	VV		(1,20+2,40*2)*4		24,000			
	VV		(1,55+2,40*2)*4		25,400			
	VV		(2,25+1,50)*2*2		15,000			
	VV		0,75*4*4		12,000			
	VV		(1,50+0,75)*2		4,500			
	VV		(0,75+2,10)*2		5,700			
	VV		1,50*4*2		12,000			
	VV		(0,75+1,50)*2		4,500			
	VV		2.NP					
	VV		(2,25+1,50)*2*4		30,000			
	VV		1,50*4*3		18,000			
	VV		(0,75+1,50)*2*2		9,000			
	VV		(1,50+0,75)*2		4,500			
	VV		(0,75+2,20)*2*2		11,800			
	VV		0,75*4*3		9,000			
	VV		7,60*4		30,400			
	VV		Součet		221,800			
73	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	232,890	38,30	8 919,69	CS ÚRS 2020 02
	VV		221,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		232,890			
74	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	191,400	104,66	20 031,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		(2,25+0,75)*2		6,000			
	VV		(1,20+2,40*2)*4		24,000			
	VV		(1,55+2,40*2)*4		25,400			
	VV		(2,25+1,50)*2*2		15,000			
	VV		0,75*4*4		12,000			
	VV		(1,50+0,75)*2		4,500			
	VV		(0,75+2,10)*2		5,700			
	VV		1,50*4*2		12,000			
	VV		(0,75+1,50)*2		4,500			
	VV		2.NP					
	VV		(2,25+1,50)*2*4		30,000			
	VV		1,50*4*3		18,000			
	VV		(0,75+1,50)*2*2		9,000			
	VV		(1,50+0,75)*2		4,500			
	VV		(0,75+2,20)*2*2		11,800			
	VV		0,75*4*3		9,000			
	VV		Součet		191,400			
75	M	59051476	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	200,970	56,70	11 395,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		191,4*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		200,970			
76	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	95,662	1 159,28	110 899,04	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		zateplení základů					
	VV		(13,13+21,035)*2*1,40		95,662			
	VV		Součet		95,662			
77	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034	m3	13,661	3 217,93	43 960,14	CS ÚRS 2020 02
	VV		95,662*0,14		13,393			
	VV		Součet		13,393			
	VV		13,393*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		13,661			
78	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	100,350	1 059,22	106 292,73	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	atiky zevnitř					
		VV	(20,83+12,73)*2*0,95		63,764			
		VV	(21,23+12,03)*2*0,55		36,586			
		VV	Součet		100,350			
79	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	102,357	266,82	27 310,89	CS ÚRS 2020 02
		VV	100,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		102,357			
80	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	483,327	1 206,43	583 100,19	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.03.1.4,5,6					
		VV	(21,16+13,13-0,175*2)*2*8,25		560,010			
		VV	odečet otvorů					
		VV	-(1,20*2,40*4+1,55*1,40*4+0,75*0,75*4+2,25*1,50*3+1,50*0,75*2+0,75*2,10+1,50*1,50*2)		-40,900			
		VV	-(0,75*0,75*3+1,50*1,50*3+0,75*2,20*2+1,50*0,75*2+2,25*1,50*4+1,40*2,40*2+0,75*2,10)		-35,783			
		VV	Součet		483,327			
81	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 160mm	m2	492,994	373,78	184 271,30	CS ÚRS 2020 02
		VV	483,327*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		492,994			
82	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	40,998	656,70	26 923,39	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.03.1.3					
		VV	sokl					
		VV	(13,13+21,035)*2*0,60		40,998			
		VV	Součet		40,998			
83	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	574,433	430,13	247 080,87	CS ÚRS 2020 02
		VV	atiky zevnitř					
		VV	(20,83+12,73)*2*0,95		63,764			
		VV	fasáda					
		VV	483,327		483,327			
		VV	ostění, nadpraží					
		VV	"1.NP" 0,18*(3*1,5*2+3*0,8*4+2,1*2+0,8+(1,5*2+2,3)*2+0,8*2+1,5+0,8*2+2,3+1,5*2+0,8+(2,4*2+1,4)*4+(2,4*2+1,0)*4)		16,740			
		VV	"2.NP" 0,18*(0,8*3*3+1,5*3*3+(2,2*2+0,8)*2+0,8*2+1,5+(1,5*2+2,3)*3+2,1*2+0,8+1,5*2+0,8)		10,602			
		VV	Součet		574,433			
84	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	103,000	196,66	20 255,98	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.03.1.8					
		VV	0,90*4*12		43,200			
		VV	(1,40+0,50)*2		3,800			
		VV	(1,70+0,80)*2*7		35,000			
		VV	(2,80+0,70)*2*3		21,000			
		VV	Součet		103,000			
85	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,893	6 887,83	68 141,30	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.03.1.30					
		VV	skladba P2					
		VV	(5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10)*0,075		3,409			
		VV	skladba P2a					
		VV	11,80*0,075		0,885			
		VV	skladba P2b					
		VV	17,10*(0,060+0,075)/2		1,154			
		VV	skladba P6					
		VV	58,25*0,045		2,621			
		VV	skladba P9					
		VV	21,84*0,045		0,983			
		VV	skladba P11					
		VV	(4,20+6,60+2,32+2,0+3,57)*0,045		0,841			
		VV	Součet		9,893			
86	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,529	4 969,50	2 628,87	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.03.1.3					
		VV	výtahová šachta - podkladní beton					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,25*2,35*0,10		0,529			
	VV		Součet		0,529			
87	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	37,887	3 507,75	132 898,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		podkladní beton					
	VV		((16,215+0,15+0,075)*(6,215+0,2+0,35)-2,15*1,95)*0,15		16,054			
	VV		((16,215+0,15+0,075)*(6,215+0,2+0,35)-(5,90*0,40+2,615*0,40+0,60*1,075))*0,15		16,075			
	VV		(3,165+0,15)*(6,215+0,20+0,35)*0,15		3,364			
	VV		(4,315+0,35+0,15)*(3,165+0,15)*0,15		2,394			
	VV		Součet		37,887			
88	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,893	103,51	1 024,02	CS ÚRS 2020 02
89	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,529	103,51	54,76	CS ÚRS 2020 02
90	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	37,887	103,51	3 921,68	CS ÚRS 2020 02
91	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,534	36 802,59	130 060,35	CS ÚRS 2020 02
	VV		síť KARI 8/150 + 10% ztratiné					
	VV		výtahová šachta - podkladní beton					
	VV		2,25*2,35*0,005267*1,10		0,031			
	VV		podkladní beton					
	VV		37,887/0,15*0,005267*1,10		1,463			
	VV		podklad pod nášlapnou vrstvou					
	VV		252,60*0,005267*1,10		1,463			
	VV		síť KARI 6/150+10% ztratiné					
	VV		skladba P2					
	VV		(5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10)*0,003033*1,10		0,152			
	VV		skladba P2a					
	VV		11,80*0,003033*1,10		0,039			
	VV		skladba P2b					
	VV		17,10*0,003033*1,10		0,057			
	VV		skladba P6					
	VV		58,25*0,003033*1,10		0,194			
	VV		skladba P9					
	VV		21,84*0,003033*1,10		0,073			
	VV		skladba P11					
	VV		(4,20+6,60+2,32+2,0+3,57)*0,003033*1,10		0,062			
	VV		Součet		3,534			
92	K	632451234.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 50 mm	m2	65,454	369,18	24 164,31	
	VV		příloha D.1.03.1.30					
	VV		skladba P10					
	VV		28,90+14,50-(0,29*1,20*22+2,70*1,20)+29,55+3,40		65,454			
	VV		Součet		65,454			
93	K	63245124R.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 60 mm	m2	47,380	409,43	19 398,79	
	VV		příloha D.1.03.1.30					
	VV		skladba P7					
	VV		7,20+5,78+10,30+8,70+15,40		47,380			
	VV		Součet		47,380			
94	K	63245125R.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 80 mm	m2	146,000	488,78	71 361,88	
	VV		příloha D.1.03.1.30					
	VV		skladba P1					
	VV		2,80+15,30+25,0+14,60+5,25+6,20+8,15+6,20+7,80+2,0+3,90+7,50+5,10		109,800			
	VV		skladba P3					
	VV		8,30+16,90+11,0		36,200			
	VV		Součet		146,000			
95	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	431,964	16,10	6 954,62	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.30					
	VV		skladba P1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,80+15,30+25,0+14,60+5,25+6,20+8,15+6,20+7,80+2,0+3,90+7,50+5,10		109,800			
	VV		skladba P2					
	VV		5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10		45,450			
	VV		skladba P2a					
	VV		11,80		11,800			
	VV		skladba P2b					
	VV		17,10		17,100			
	VV		skladba P3					
	VV		8,30+16,90+11,0		36,200			
	VV		skladba P6					
	VV		58,25		58,250			
	VV		skladba P7					
	VV		7,20+5,78+10,30+8,70+15,40		47,380			
	VV		skladba P9					
	VV		21,84		21,840			
	VV		skladba P10					
	VV		28,90+14,50-(0,29*1,20*22+2,70*1,20)+29,55+3,40		65,454			
	VV		skladba P11					
	VV		4,20+6,60+2,32+2,0+3,57		18,690			
	VV		Součet		431,964			
96	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	606,783	20,70	12 560,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.4					
	VV		1.NP					
	VV		(1,80+1,40)*2 "mč. 1.01		6,400			
	VV		(1,80+8,51)*2 "mč. 1.02		20,620			
	VV		(12,695+1,90)*2 "mč. 1.03		29,190			
	VV		(5,40+2,70)*2 "mč. 1.04		16,200			
	VV		(1,785+2,885)*2 "mč. 1.05		9,340			
	VV		(1,685+2,885)*2 "mč. 1.06		9,140			
	VV		(2,135+2,885)*2 "mč. 1.07		10,040			
	VV		(2,885+2,885)*2		11,540			
	VV		(2,175+4,235)*2 "mč. 1.09		12,820			
	VV		(1,225+2,035)*2 "mč. 1.10		6,520			
	VV		(2,05+3,015)*2 "mč. 1.11		10,130			
	VV		(3,985+3,015+1,115+0,75+0,115)*2 "mč. 1.12		17,960			
	VV		(2,585+3,015)*2 "mč. 1.13		11,200			
	VV		(1,76+1,65)*2 "mč. 1.14		6,820			
	VV		(2,115+1,675)*2 "mč. 1.15		7,580			
	VV		(1,80+1,93)*2 "mč. 1.16		7,460			
	VV		(2,115+1,87+0,90)*2 "mč. 1.17		9,770			
	VV		(2,29+3,72)*2 "mč. 1.18		12,020			
	VV		(1,935+3,72)*2 "mč. 1.19		11,310			
	VV		(1,935+3,72)*2 "mč. 1.20		11,310			
	VV		(2,05+3,72+0,62+0,115/2)*2 "mč. 1.21		12,895			
	VV		(3,575+4,70)*2 "mč. 1.22		16,550			
	VV		(1,40+3,50)*2 "mč. B1		9,800			
	VV		(3,40+4,90)*2 "mč. B2		16,600			
	VV		(2,205+1,855)*2 "mč. B3		8,120			
	VV		(1,855+1,12)*2 "mč. B4		5,950			
	VV		(3,40+3,235)*2 "mč. B5		13,270			
	VV		příloha D.1.03.1.5					
	VV		2.NP					
	VV		(5,40+2,70)*2 "mč. 2.01		16,200			
	VV		(14,535+1,90)*2 "mč. 2.02		32,870			
	VV		(1,60+1,80)*2 "mč. 2.03		6,800			
	VV		(1,60+0,95)*2 "mč. 2.03a		5,100			
	VV		(2,885+2,325+0,94)*2 "mč. 2.04		12,300			
	VV		(2,50+2,885)*2 "mč. 2.05		10,770			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,005+2,885)*2 "mč. 2.06		9,780			
	VV		(3,575+6,85)*2 "mč. 2.07		20,850			
	VV		(1,31+1,80)*2*2,65-0,80*2,0 "mč. 2.08		14,883			
	VV		9,005+2,335+2,44+0,60+0,175+3,215+0,85+1,90+5,54+1,90+4,34*2+2,42+2,53		41,590			
	VV		(4,40+3,05)*2 "mč. 2.09		14,900			
	VV		(1,80+12,08+3,70)*2 "mč. 2.10		35,160			
	VV		(3,585+2,885)*2 "mč. 2.11		12,940			
	VV		(2,435+3,97)*2 "mč. 2.12		12,810			
	VV		(3,97+4,30)*2 "mč. 2.13		16,540			
	VV		(1,905+1,825)*2 "mč. 2.14		7,460			
	VV		(1,905+1,0)*2 "mč. 2.15		5,810			
	VV		(1,905+1,87+0,90+0,115/2)*2 "mč. 2.16		9,465			
	VV		Součet		606,783			
97	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	35,360	736,05	26 026,73	CS ÚRS 2020 02
	VV		vymývané dlaždice 500x500x50 mm					
	VV		(21,23+14,13)*2*0,50		35,360			
	VV		Součet		35,360			
98	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton C16/20	m	72,720	736,05	53 525,56	CS ÚRS 2020 02
	VV		obrubník 50/200/1000 mm					
	VV		(22,23+14,13)*2		72,720			
	VV		Součet		72,720			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				708 070,50	
99	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	578,560	48,30	27 944,45	CS ÚRS 2020 02
	VV		fasádní lešení					
	VV		(21,23+13,13+0,90*2)*2*8,0		578,560			
	VV		Součet		578,560			
100	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	52 070,400	0,92	47 904,77	CS ÚRS 2020 02
	VV		578,56*90 "Přepočtené koeficientem množství		52 070,400			
101	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	578,560	36,80	21 291,01	CS ÚRS 2020 02
102	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	442,860	57,50	25 464,45	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		220,35		220,350			
	VV		2.NP					
	VV		222,51		222,510			
	VV		Součet		442,860			
103	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	8,240	1 092,58	9 002,86	CS ÚRS 2020 02
104	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	247,200	63,25	15 635,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		8,24*30 "Přepočtené koeficientem množství		247,200			
105	K	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	8,240	862,56	7 107,49	CS ÚRS 2020 02
106	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	557,500	138,01	76 940,58	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.+2.NP					
	VV		21,23*13,13*2		557,500			
	VV		Součet		557,500			
107	K	953611125	Schodistový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem Z x 4 x D6 (ref.vyr. Hairen H1F) - 18/O	kus	4,000	5 175,36	20 701,44	CS ÚRS 2020 02
108	K	953731113	Odvětrání svislé troubami plastovými DN do 110 mm ve stropních prostupech včetně obetonování - 13/O	m	7,000	713,05	4 991,35	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.03.1.35					
	VV		potrubí PPR + koleno 90°					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
109	K	953731311	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	1,000	80,51	80,51	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.03.1.35					
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
110	M	286110R	odvětrávací hlavice plastová pro potrubí PPR DN 100 - 14/O	kus	1,000	1 725,12	1 725,12	
111	K	9539414R1	D+M hasicí přístroj práškový 6kg 34A 183B včetně kovového držáku a pomocného materiálu - 20/O	kus	8,000	1 610,11	12 880,88	
	VV		příloha D.1.03.1.35 - výpis ostatních výrobků					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
112	K	9539415R1	D+M zápusťná krabice do zdi s rámečkem pro 1 modul tabla komunikátoru 125x235x46 mm - 21/O	kus	2,000	3 588,25	7 176,50	
	VV		příloha D.1.03.1.35 - výpis ostatních výrobků					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
113	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	2,246	719,76	1 616,58	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		1,60*2,60*0,54 "VZT1		2,246			
	VV		Součet		2,246			
114	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	24,000	68,69	1 648,56	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		1,0 "VZT2		1,000			
	VV		3,0 "VZT15		3,000			
	VV		1,0 "VZT16		1,000			
	VV		1,0 "VZT19		1,000			
	VV		1,0 "VZT22		1,000			
	VV		1,0 "VZT26		1,000			
	VV		1,0 "ZTI22		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		4,0 "VZT5,25,28,32		4,000			
	VV		2,0 "ZTI13,14		2,000			
	VV		1,0 "UT13		1,000			
	VV		8,0 "UT7-14		8,000			
	VV		Součet		24,000			
115	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	122,86	368,58	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		1,0 "ZTI23		1,000			
	VV		2.NP					
	VV		2,0 "ZTI12		2,000			
	VV		Součet		3,000			
116	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	1,000	272,82	272,82	CS ÚRS 2020 02
	VV		2.NP					
	VV		1,0 "ZTI16		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	68,69	206,07	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		2,0 "VZT22,23		2,000			
	VV		1,0 "ZTI15		1,000			
	VV		Součet		3,000			
118	K	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000	652,71	652,71	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		1,0 "VZT1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
119	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,447	1 617,58	723,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		0,73*0,50*0,30 "VZT4		0,110			
	VV		0,90*0,415*0,175 "VZT10		0,065			
	VV		0,75*0,60*0,30 "VZT17		0,135			
	VV		3,14*0,5*0,5*0,175 "VZT16		0,137			
	VV		Součet		0,447			
120	K	971042351	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	4,000	949,07	3 796,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		prostup základem					
	VV		1,0*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
121	K	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m2	m3	0,116	7 883,46	914,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		prostup základem					
	VV		0,20*0,20*0,700		0,028			
	VV		0,20*0,20*1,10*2		0,088			
	VV		Součet		0,116			
122	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,014	8 367,98	117,15	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,35*0,075*0,25 "EL2		0,007			
	VV		2.NP					
	VV		0,35*0,075*0,25 "EL1		0,007			
	VV		Součet		0,014			
123	K	974032154	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 150 mm	m	41,250	101,58	4 190,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		3,25		3,250			
	VV		2.NP					
	VV		3,25*4 "UT3-6		13,000			
	VV		11,50 "UT15		11,500			
	VV		13,50 "UT16		13,500			
	VV		Součet		41,250			
124	K	974032157	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 300 mm	m	2,600	153,82	399,93	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		2,60 "ZTI21		2,600			
	VV		Součet		2,600			
125	K	974032167	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 300 mm	m	12,700	244,12	3 100,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		3,25 "UT2		3,250			
	VV		2.NP					
	VV		3,10*2 "ZTI17,18		6,200			
	VV		3,25 "UT2		3,250			
	VV		Součet		12,700			
126	K	974032169	Příplatek k vysekání rýh ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	19,200	61,92	1 188,86	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,25*2 "UT2		6,500			
	VV		3,10*2 "ZTI17,18		6,200			
	VV		3,25*2 "UT2		6,500			
	VV		Součet		19,200			
127	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	1,650	245,08	404,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		(0,95+0,70) "ZTI19		1,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,650			
128	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,540	2 472,67	1 335,24	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		0,54 "VZT2		0,540			
	VV		Součet		0,540			
129	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	1,045	3 047,71	3 184,86	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,175 "VZT3		0,175			
	VV		0,115 "VZT21		0,115			
	VV		0,35 "VZT24		0,350			
	VV		0,115 "VZT25		0,115			
	VV		2.NP					
	VV		0,175 "VZT27		0,175			
	VV		0,115 "VZT31		0,115			
	VV		Součet		1,045			
130	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů	m	0,465	3 565,25	1 657,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,175 "VZT7		0,175			
	VV		0,115 "VZT11		0,115			
	VV		2.NP					
	VV		0,175 "VZT30		0,175			
	VV		Součet		0,465			
131	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	3,170	4 312,80	13 671,58	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,175*3 "VZT5-7		0,525			
	VV		0,115*4 "VZT8-9,13,14		0,460			
	VV		0,54 "VZT12		0,540			
	VV		0,175 "VZT20		0,175			
	VV		0,25 "VZT23		0,250			
	VV		2.NP					
	VV		0,115 "VZT6		0,115			
	VV		0,175*4 "VZT7-9,15		0,700			
	VV		0,115*2 "VZT18,19		0,230			
	VV		0,175 "VZT21		0,175			
	VV		Součet		3,170			
132	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,175	5 462,88	956,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		0,175 "VZT11		0,175			
	VV		Součet		0,175			
133	K	977151131	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů	m	1,195	5 922,92	7 077,89	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,54*2 "VZT27,29		1,080			
	VV		0,115 "VZT28		0,115			
	VV		Součet		1,195			
134	K	977151213	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	0,750	1 897,63	1 423,22	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		strop					
	VV		0,25*3		0,750			
	VV		Součet		0,750			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
135	K	977151216	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	1,000	2 242,66	2 242,66	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,25*4 "ZTI20		1,000			
	VV		Součet		1,000			
136	K	977151218	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	3,500	2 242,66	7 849,31	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,25*3 "ZTI18		0,750			
	VV		0,25*2 "UT2-3		0,500			
	VV		2.NP					
	VV		0,25*4 "UT2		1,000			
	VV		0,25*2 "UT3		0,500			
	VV		strop					
	VV		0,25*3 "ZTI3,4,5		0,750			
	VV		Součet		3,500			
137	K	977151219	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 110 mm do stavebních materiálů	m	1,750	2 472,67	4 327,17	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,25*7 "EL1,3,4		1,750			
	VV		Součet		1,750			
138	K	977151221	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	0,500	2 472,67	1 236,34	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,25 "ZTI19		0,250			
	VV		0,25 "ZTI24		0,250			
	VV		Součet		0,500			
139	K	977151223	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů	m	0,500	2 472,67	1 236,34	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		0,25*2 "ZTI8,9		0,500			
	VV		Součet		0,500			
140	K	977151224	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	7,250	3 047,71	22 095,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,25*17 "ZTI11-17		4,250			
	VV		0,25 "UT1		0,250			
	VV		2.NP					
	VV		0,25*8 "ZTI11-7,10		2,000			
	VV		0,25 "UT1		0,250			
	VV		strop					
	VV		0,25*2 "ZTI1,2		0,500			
	VV		Součet		7,250			
141	K	977151228	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	77,250	4 312,80	333 163,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,25 "VZT4		0,250			
	VV		0,25 "VT18		0,250			
	VV		2.NP					
	VV		25*3 "VZT12-14		75,000			
	VV		0,25 "VZT20		0,250			
	VV		0,25 "VZT26		0,250			
	VV		0,25 "VZT29		0,250			
	VV		strop					
	VV		0,25*4 "VZT2,3,4,5		1,000			
	VV		Součet		77,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
142	K	9771512R1	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 800 mm do stavebních materiálů	m	0,500	16 331,15	8 165,58	
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		0,25 "VZT3		0,250			
	VV		strop					
	VV		0,25 "VZT1		0,250			
	VV		Součet		0,500			
D	997		Přesun sutě				51 439,69	
143	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	34,198	728,04	24 897,51	CS ÚRS 2020 02
144	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	34,198	242,60	8 296,43	CS ÚRS 2020 02
145	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	478,772	10,61	5 079,77	CS ÚRS 2020 02
	VV		34,198*14 "Přepočtené koeficientem množství		478,772			
146	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	33,670	391,03	13 165,98	CS ÚRS 2020 02
D	998		Přesun hmot				368 187,45	
147	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	1 238,021	297,40	368 187,45	CS ÚRS 2020 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 336 674,19	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				398 652,50	
148	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	248,096	18,40	4 564,97	CS ÚRS 2020 02
	VV		izolace základů					
	VV		20,15*12,05		242,808			
	VV		skladba P5					
	VV		výtahová šachta - podkladní beton					
	VV		2,25*2,35		5,288			
	VV		Součet		248,096			
149	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,074	56 123,94	4 153,17	CS ÚRS 2020 02
	VV		248,096*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,074			
150	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	47,718	27,60	1 317,02	CS ÚRS 2020 02
	VV		izolace základů					
	VV		(13,13+21,035)*2*0,60		40,998			
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,05+2,15)*2*0,80		6,720			
	VV		Součet		47,718			
151	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,017	56 123,94	954,11	CS ÚRS 2020 02
	VV		47,718*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,017			
152	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	496,190	123,06	61 061,14	CS ÚRS 2020 02
	VV		izolace základů - 2x pás SBS					
	VV		20,15*12,05*2		485,615			
	VV		skladba P5					
	VV		výtahová šachta - podkladní beton					
	VV		2,25*2,35*2		10,575			
	VV		Součet		496,190			
153	M	628361R1	pás asfaltový natavitelný pro střední radonový index	m2	12,161	177,11	2 153,83	
	VV		10,575*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		12,161			
154	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index	m2	495,225	203,56	100 808,00	
	VV		485,515*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		495,225			
155	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	95,436	134,56	12 841,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		izolace základů - 2x pás SBS					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (13,13+21,035)*2*0,60*2		81,996			
			VV příloha D.1.03.1.3					
			VV výtahová šachta					
			VV (2,05+2,15)*2*0,80*2		13,440			
			VV Součet		95,436			
156	M	628361R1	pás asfaltový natavitelný pro střední radonový index	m2	16,128	177,11	2 856,43	
			VV 13,44*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		16,128			
157	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index	m2	83,636	203,56	17 024,94	
			VV izolace základů - 2x pás SBS					
			VV (13,13+21,035)*2*0,60*2		81,996			
			VV Součet		81,996			
			VV 81,996*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		83,636			
158	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva	m2	176,018	138,01	24 292,24	CS ÚRS 2020 02
			VV skladba P2					
			VV 5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10		45,450			
			VV skladba P2a					
			VV 11,80		11,800			
			VV skladba P2b					
			VV 17,10		17,100			
			VV skladba P6					
			VV 58,25		58,250			
			VV skladba P9					
			VV 21,84		21,840			
			VV skladba P11					
			VV 4,20+6,60+2,32+2,0+3,57		18,690			
			VV skladba P5					
			VV výtahová šachta - podkladní beton					
			VV 1,65*1,75		2,888			
			VV Součet		176,018			
159	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	1 601,764	65,55	104 995,63	CS ÚRS 2020 02
			VV 176,018*9,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 601,764			
160	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva	m2	68,096	138,01	9 397,93	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.03.1.30					
			VV 1.NP					
			VV (1,785+2,885)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 1.05		2,562			
			VV (1,225+2,035)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 1.10		1,716			
			VV (3,985+3,015+1,115+0,75+0,115)*2*0,30-0,90*0,30 "mč. 1.12		5,118			
			VV (2,115+1,675)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 1.15		2,034			
			VV (2,115+1,87+0,90)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 1.17		2,691			
			VV (2,29+3,72)*2*0,30-1,25*0,30 "mč. 1.18		3,231			
			VV (1,935+3,72)*2*0,30-0,90*0,30 "mč. 1.19		3,123			
			VV (2,05+3,72+0,62+0,115/2)*2*0,30-0,90*0,30 "mč. 1.21		3,599			
			VV (3,575+4,70)*2*0,30+(2,25+0,75*2)*0,30-0,90*0,30 "mč. 1.22		5,820			
			VV (2,205+1,855)*2*0,30-0,70*0,30 "mč. B3		2,226			
			VV (1,855+1,12)*2*0,30-0,70*0,30 "mč. B4		1,575			
			VV 2.NP					
			VV (1,60+1,80)*2*0,30-0,80*0,30-0,70*0,30 "mč. 2.03		1,590			
			VV (1,60+0,95)*2*0,30-0,70*0,30 "mč. 2.03a		1,320			
			VV (2,885+2,325+0,94)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 2.04		3,450			
			VV (3,575+6,85)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 2.07		6,015			
			VV (1,31+1,80)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 2.08		1,626			
			VV (9,005+2,335+2,44+0,60+0,175+3,215+0,85+1,90+5,54+1,90+4,34*2+2,42+2,53)*0,30-0,90*0,30*6 "mč. 2.09		10,857			
			VV (1,905+1,0)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 2.15		1,503			
			VV (1,905+1,87+0,90+0,115/2)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 2.16		2,600			
			VV výtahová šachta					
			VV (1,65+1,75)*2*0,80		5,440			
			VV Součet		68,096			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
161	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	619,674	65,55	40 619,63	CS ÚRS 2020 02
	VV		68,096*9,1 "Přepočtené koeficientem množství		619,674			
162	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,000	3 870,53	11 611,59	CS ÚRS 2020 02
D 712			Povlakové krytiny				130 322,56	
163	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	130,008	172,51	22 427,68	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S1					
	VV		(20,15-4,0)*(12,05-4,0)		130,008			
	VV		Součet		130,008			
164	M	2832201R	folie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	149,509	256,12	38 292,25	
	VV		130,008*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		149,509			
165	K	712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	112,800	172,51	19 459,13	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S1					
	VV		20,15*4,0+8,05*4,0		112,800			
	VV		Součet		112,800			
166	M	283220R1	folie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,8mm šedá	m2	129,720	256,12	33 223,89	CS ÚRS 2020 02
	VV		112,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		129,720			
167	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	242,808	27,60	6 701,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S1					
	VV		20,15*12,05		242,808			
	VV		Součet		242,808			
168	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 (r.f. Filtek 300)	m2	279,229	23,00	6 422,27	CS ÚRS 2020 02
	VV		242,808*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		279,229			
169	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,000	1 265,28	3 795,84	CS ÚRS 2020 02
D 713			Izolace tepelné				352 539,94	
170	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	715,200	113,86	81 432,67	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S1 - spádové klíny					
	VV		20,15*12,05		242,808			
	VV		odečet S4					
	VV		-2,05*2,15		-4,408			
	VV		skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách					
	VV		20,15*12,05*2		485,615			
	VV		odečet S4					
	VV		-2,05*2,15*2		-8,815			
	VV		Součet		715,200			
171	M	28372312	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm	m2	486,336	176,78	85 974,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách					
	VV		20,15*12,05*2		485,615			
	VV		odečet S4					
	VV		-2,05*2,15*2		-8,815			
	VV		Součet		476,800			
	VV		476,8*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		486,336			
172	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	21,885	1 304,58	28 550,73	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S1 - spádové klíny					
	VV		20,15*12,05*(0,02+0,16)/2		21,853			
	VV		odečet S4					
	VV		-2,05*2,15*(0,02+0,16)/2		-0,397			
	VV		Součet		21,456			
	VV		21,456*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		21,885			
173	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	220,350	51,75	11 403,11	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.30					
	VV		skladba P1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,80+15,30+25,0+14,60+5,25+6,20+8,15+6,20+7,80+2,0+3,90+7,50+5,10		109,800			
	VV		skladba P2					
	VV		5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10		45,450			
	VV		skladba P2a					
	VV		11,80		11,800			
	VV		skladba P2b					
	VV		17,10		17,100			
	VV		skladba P3					
	VV		8,30+16,90+11,0		36,200			
	VV		Součet		220,350			
174	M	28372309	deska EPS 100S pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	224,757	189,76	42 649,89	CS ÚRS 2020 02
	VV		220,35*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		224,757			
175	K	7131311R1	D+M podkladní izolační profil z PUR pěny a PIR izolace pod vstupní dveře a prosklené stěny - 19/O	m	10,500	1 322,59	13 887,20	
	VV		ref. výrobek Purenit 550MD					
	VV		průřez 80x200 mm					
	VV		10,50		10,500			
	VV		Součet		10,500			
176	K	713291122	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	238,400	123,06	29 337,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S1					
	VV		20,15*12,05		242,808			
	VV		odečet S4					
	VV		-2,05*2,15		-4,408			
	VV		Součet		238,400			
177	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	274,160	150,61	41 291,24	CS ÚRS 2020 02
	VV		238,4*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		274,160			
178	K	713291142	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr	m2	238,400	18,40	4 386,56	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S1					
	VV		20,15*12,05		242,808			
	VV		odečet S4					
	VV		-2,05*2,15		-4,408			
	VV		Součet		238,400			
179	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	59,600	56,35	3 358,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		238,4*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		59,600			
180	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3,000	3 422,70	10 268,10	CS ÚRS 2020 02
D	714		Akustická a protiotřesová opatření				23 734,55	
181	K	714183002	Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů	m2	211,614	57,37	12 140,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.30					
	VV		kročejová izolace					
	VV		skladba P6					
	VV		58,25		58,250			
	VV		skladba P7					
	VV		7,20+5,78+10,30+8,70+15,40		47,380			
	VV		skladba P9					
	VV		21,84		21,840			
	VV		skladba P10					
	VV		28,90+14,50-(0,29*1,20*22+2,70*1,20)+29,55+3,40		65,454			
	VV		skladba P11					
	VV		4,20+6,60+2,32+2,0+3,57		18,690			
	VV		Součet		211,614			
182	M	28376643	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2)	m3	8,634	1 262,79	10 902,93	CS ÚRS 2020 02
	VV		8,46472845230751*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		8,634			
183	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	3,000	230,44	691,32	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty	44 586,21				
184	K	725244R3O	D+M zalamovací sprchové dveře pro montáž do výklenku 950x1900 mm, bezpečnostní sklo matné - 3/O	soubor	1,000	12 650,89	12 650,89	
	VV		přílha D.1.03.1.35					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
185	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů - 6/O	soubor	3,000	1 485,47	4 456,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.03.1.35					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
186	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků obdélníkový - 5/O	soubor	5,000	1 640,73	8 203,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.03.1.35					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
187	K	725291R2O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo v rámu závěsné 300x500 mm - 2/O	soubor	6,000	1 433,71	8 602,26	
	VV		přílha D.1.03.1.35					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
188	K	725291R4O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš odpadkový objem 3L, nášlapný otevírací mechanismus, vyjímatelný plastový košík s uchem uvnitř - 4/O	soubor	5,000	709,16	3 545,80	
	VV		přílha D.1.03.1.35					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
189	K	725291R7O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC štětka - 7/O	soubor	3,000	1 149,07	3 447,21	
	VV		přílha D.1.03.1.35					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
190	K	725291R8O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové háček na oděvy - 8/O	soubor	5,000	476,27	2 381,35	
	VV		přílha D.1.03.1.35					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
191	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	3,000	432,88	1 298,64	CS ÚRS 2020 02
D 763			Konstrukce suché výstavby	329 280,37				
192	K	76312144R	SDK stěna přesazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 bez TI 50 kg/m3 EI 30 - W2	m2	6,760	990,22	6 693,89	
	VV		příloha D.1.23.1.30					
	VV		zákryt ZTI a VZT					
	VV		(0,45+0,30)*2,60+0,30*3*2,60+(0,65+0,30)*2,60		6,760			
	VV		Součet		6,760			
193	K	763121714	SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr	m2	6,760	29,90	202,12	CS ÚRS 2020 02
194	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C3	m2	184,120	715,35	131 710,24	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.8,9					
	VV		1.NP					
	VV		124,60		124,600			
	VV		2.NP					
	VV		59,52		59,520			
	VV		Součet		184,120			
195	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C4	m2	50,690	797,01	40 400,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.8,9					
	VV		1.NP					
	VV		32,0		32,000			
	VV		2.NP					
	VV		18,69		18,690			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		50,690			
196	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	234,810	29,90	7 020,82	CS ÚRS 2020 02
	VV		184,12+50,69		234,810			
	VV		Součet		234,810			
197	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	149,000	414,03	61 690,47	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.8,9					
	VV		1.NP					
	VV		48,30		48,300			
	VV		2.NP					
	VV		100,70		100,700			
	VV		Součet		149,000			
198	M	ECP.354222R1	panel minerální 600/600 polozapuštěný rastr - C2	m2	156,450	460,03	71 971,69	
	VV		149*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		156,450			
199	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,000	3 196,90	9 590,70	CS ÚRS 2020 02
D	764		Konstrukce klempířské				161 303,85	
200	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	1,260	1 725,12	2 173,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.37					
	VV		oplechování stříšky agregátu					
	VV		0,90*1,40 "5/K		1,260			
	VV		Součet		1,260			
201	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou poplastováním mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	68,840	1 725,12	118 757,26	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.37					
	VV		68,84*1,0 "4/K		68,840			
	VV		Součet		68,840			
202	K	7642166R1	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 285 mm	m	34,650	511,79	17 733,52	
	VV		příloha D.1.03.1.37					
	VV		1,45*7 "1/K		10,150			
	VV		0,70*13 "2/K		9,100			
	VV		2,20*7 "3/K		15,400			
	VV		Součet		34,650			
203	K	76460R08K	D+M kulatý chrlic s integrovanou PVC manžetou DN 100, di. 600 mm včetně vyjímatelné ochranné mřížky - 8/K	kus	2,000	3 220,23	6 440,46	
	VV		příloha D.1.23.1.36					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
204	K	76460R09K	D+M těsnící manžeta, tvarovka pro prostup hydroizolací z PVC fólie DN 110 - 7/K	kus	5,000	920,06	4 600,30	
	VV		příloha D.1.03.1.37					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
205	K	76460R10K	D+M prostup pro kabely DN 50, integrovaná manžeta výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm - 8/K	kus	3,000	2 300,16	6 900,48	
	VV		příloha D.1.03.1.37					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
206	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	1 566,06	4 698,18	CS ÚRS 2020 02
D	766		Konstrukce truhlářské				1 838 416,57	
207	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	37,688	947,57	35 712,02	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.31					
	VV		1,50*1,50*5,0 "O01		11,250			
	VV		2,25*1,50*2,0 "O04		6,750			
	VV		1,50*0,75*2,0 "O05		2,250			
	VV		2,25*0,75*1,0 "O06		1,688			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV 0,75*1,50*2,0 "O07		2,250			
			VV 2,25*1,50*4,0 "O08		13,500			
			VV Součet		37,688			
208	M	6111RO01	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklpné izolační trojkřídlové 1500x1500 mm, trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O01	kus	5,000	25 354,17	126 770,85	
			VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
			VV - integrované speciální reflexní izolační můstky					
			VV - stavební hl. křídla 78 mm					
			VV - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			VV - minimálně 2 bezpečnostní body					
			VV - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			VV - standardní závěsy					
			VV - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			VV - barva bílá RAL 9016					
			VV - otevíravé sklopné a pevné, trojkřídlové se sloupkem a poutcem vlevo uprostřed, vrchní a pravá část otevíravá					
			VV spodní levá část pevná					
			VV - součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a					
			VV kabelem dl. 0,5m					
			VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
			VV - z vnitřní strany matné fólie					
			VV 5,0		5,000			
			VV Součet		5,000			
209	M	6111RO04	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklpné izolační trojkřídlové 2250x1500 mm, trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O04	kus	2,000	29 197,11	58 394,22	
			VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
			VV - integrované speciální reflexní izolační můstky					
			VV - stavební hl. křídla 78 mm					
			VV - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			VV - minimálně 2 bezpečnostní body					
			VV - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			VV - standardní závěsy					
			VV - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			VV - barva bílá RAL 9016					
			VV - otevíravé sklopné a pevné, trojkřídlové se sloupkem a poutcem vpravo uprostřed, vrchní a levá část otevíravá					
			VV - spodní pravá část pevná					
			VV - součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a					
			VV kabelem dl. 0,5m					
			VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
			VV 2,0		2,000			
			VV Součet		2,000			
210	M	6111RO05	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklpné dvoukřídlové 1500x750 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O05	kus	2,000	19 906,94	39 813,88	
			VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
			VV - integrované speciální reflexní izolační můstky					
			VV - stavební hl. křídla 78 mm					
			VV - celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			VV - minimálně 2 bezpečnostní body					
			VV - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			VV - standardní závěsy					
			VV - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			VV - barva bílá RAL 9016					
			VV - se sloupkem uprostřed					
			VV - součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a					
			VV kabelem dl. 0,5m					
			VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
			VV - z vnitřní strany matné fólie					
			VV 2,0		2,000			
			VV Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
211	M	6111RO06	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřídlové 2250x750 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O06	kus	1,000	29 599,83	29 599,83	
	VV		- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
	VV		- integrované speciální reflexní izolační můstky					
	VV		- stavební hl. křídla 78 mm					
	VV		- celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
	VV		- minimálně 2 bezpečnostní body					
	VV		- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
	VV		- standardní závěsy					
	VV		- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
	VV		- barva bílá RAL 9016					
	VV		- členění dvěma sloupky na tři části					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
	VV		- dvoupákový ovladač sklopného křídla 3 kusy					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
212	M	6111RO07	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné dvojkrídlové 750x1500 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O07	kus	2,000	16 733,89	33 467,78	
	VV		- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
	VV		- integrované speciální reflexní izolační můstky					
	VV		- stavební hl. křídla 78 mm					
	VV		- celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
	VV		- minimálně 2 bezpečnostní body					
	VV		- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
	VV		- standardní závěsy					
	VV		- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
	VV		- barva bílá RAL 9016					
	VV		- členění středním poutcem					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
	VV		- dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
213	M	6111RO08	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné izolační trojkřídlové 2250x1500 mm, trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O08	kus	4,000	29 197,11	116 788,44	
	VV		- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
	VV		- integrované speciální reflexní izolační můstky					
	VV		- stavební hl. křídla 78 mm					
	VV		- celoobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
	VV		- minimálně 2 bezpečnostní body					
	VV		- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
	VV		- standardní závěsy					
	VV		- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
	VV		- barva bílá RAL 9016					
	VV		- otevíravé sklopné a pevné, trojkřídlové se skloupkem a poutcem vlevo uprostřed, vrchní a pravá část otevíravá					
	VV		- spodní levá část pevná					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
	VV		- dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
214	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	6,300	996,82	6 279,97	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.31					
	VV		0,75*2,10*4,0 "O03					
	VV		Součet					

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	M	6111RO03	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 750x2100 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O03	kus	4,000	21 815,25	87 261,00	
	VV		- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídatné těsnění v zasklívací drážce					
	VV		- integrované speciální reflexní izolační můstky					
	VV		- stavební hl. křídla 78 mm					
	VV		- celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
	VV		- minimálně 2 bezpečnostní body					
	VV		- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
	VV		- standartní závěsy					
	VV		- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
	VV		- barva bílá RAL 9016					
	VV		- členění dvěma poutci					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
	VV		- dvoupákový ovladač sklopného křídla 3 kusy					
	VV		- spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
216	K	766621622	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených otevíravých do zdiva	kus	3,938	996,82	3 925,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.31					
	VV		0,75*0,75*7,0 "O02		3,938			
	VV		Součet		3,938			
217	M	6111RO02	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné jednokřílové 750x750 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O02	kus	7,000	10 324,60	72 272,20	
	VV		- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídatné těsnění v zasklívací drážce					
	VV		- integrované speciální reflexní izolační můstky					
	VV		- stavební hl. křídla 78 mm					
	VV		- celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
	VV		- minimálně 2 bezpečnostní body					
	VV		- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
	VV		- standartní závěsy					
	VV		- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
	VV		- barva bílá RAL 9016					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
	VV		- z vnitřní strany matné fólie					
	VV		7,0		7,000			
	VV		Součet		7,000			
218	K	76662R100	D+M síť plastová proti hmyzu v kovovém rámu pro upevnění do okna 750x750 (k oknu č. 02) - 10/O	kus	3,000	345,02	1 035,06	
	VV		příloha D.1.03.1.35					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
219	K	76662R110	D+M síť plastová proti hmyzu v kovovém rámu pro upevnění do okna 1500x1500 (k oknu č. 01) - 11/O	kus	1,000	1 334,09	1 334,09	
	VV		příloha D.1.03.1.35					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
220	K	76662R120	D+M síť plastová proti hmyzu v kovovém rámu pro upevnění do okna 2250x1500 (k oknu č. 08) - 12/O	kus	2,000	1 978,14	3 956,28	
	VV		příloha D.1.03.1.35					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
221	K	76660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	19,000	1 365,15	25 937,85	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		16,0 "7		16,000			
	VV		3,0 "8		3,000			
	VV		Součet		19,000			
222	M	61162R07	dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídle 800x1970mm otočné - 7	kus	16,000	11 272,88	180 366,08	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- ocelová zárubeň na celou šířku zdíva					
	VV		- stavěč dveřního křídla					
	VV		- ZV typ 8, SG, KL/KL typ 8					
	VV		- okopový plech nerez v. 300 mm					
	VV		- dodávka včetně kotevnic, montážních a lemovacích prvků					
	VV		16,0		16,000			
	VV		Součet		16,000			
223	M	61162R08	dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídle 700x1970mm otočné - 8	kus	3,000	10 526,69	31 580,07	
	VV		- ocelová zárubeň na celou šířku zdíva					
	VV		- ZV WC typ 9, SG					
	VV		- KL/KL WC typ 9					
	VV		- dodávka včetně kotevnic, montážních a lemovacích prvků					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
224	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000	1 466,35	4 399,05	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		3,0 "3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
225	M	61162R03	dveře vnitřní prosklené vysokotlaký laminát HPL plné 1křídle 900x1970mm, prosklení bezpečnostní sklo - 3	kus	3,000	16 523,21	49 569,63	
	VV		- ocelová zárubeň na celou šířku zdíva					
	VV		- stavěč dveřního křídla					
	VV		- okopový plech nerez v. 300 mm					
	VV		- ZV typ5, SG					
	VV		- KL/KL typ 5 SD					
	VV		- dodávka včetně kotevnic, montážních a lemovacích prvků					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
226	K	766660011	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do 1,45 m do ocelové zárubně	kus	5,000	3 441,04	17 205,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		5,0 "2		5,000			
	VV		Součet		5,000			
227	M	61161R02	dveře 1250x1970 mm s proskleným nadsvětlíkem 1250x430 mm, materiál vysokotlaký materiál HPL, prosklené bezpečnostním sklem, dvoukřídlové otočné - 2	kus	5,000	34 358,66	171 793,30	
	VV		- ocelová zárubeň na celou šířku zdíva					
	VV		- dveřní křídla š. 900 a 350 mm					
	VV		- vodorovné madlo v. 800 mm					
	VV		- kování klika-klika, stavěč dveřního křídla na obě křídla typ 5, 2xSD					
	VV		- ZV typ5, SG					
	VV		- okopový nerez plech v. 300 mm					
	VV		- dodávka včetně kotevnic, montážních a lemovacích prvků					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
228	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	9,000	2 141,83	19 276,47	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		6,0 "4		6,000			
	VV		1,0 "6		1,000			
	VV		1,0 "9		1,000			
	VV		1,0 "13		1,000			
	VV		Součet		9,000			
229	M	61162R04	dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídle 800x1970mm, PO EI15DP3-C3 - 4	kus	6,000	19 084,44	114 506,64	
	VV		- ocelová zárubeň na celou šířku zdíva					
	VV		- samozavírač C3					
	VV		- stavěč dveřního křídla					
	VV		- ZV typ 7, SG					
	VV		- KL/KL typ 7 SD					
	VV		- okopový plech nerez v. 300 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
			6,0		6,000			
			Součet		6,000			
230	M	61162R09	dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídle 800x1970mm, PO EI15DP3-C3, bezpečnostní dveře - 9	kus	1,000	21 719,28	21 719,28	
			- ocelová zárubeň na celou šířku zdíva					
			- samozavírač C3					
			- stavěč dveřního křídla					
			- ZB typ 10, SG					
			- KL/MA typ 10					
			- okopový plech nerez v. 300 mm					
			- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
231	M	61162R13	dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídle 800x1970mm, PO EW15DP3-C3, akustická odolnost 32dB - 13	kus	1,000	21 468,56	21 468,56	
			- samozavírač C3					
			- ocelová zárubeň na celou šířku zdíva					
			- stavěč dveřního křídla					
			- ZV typ 7, SG					
			- KL/KL typ 7 SD					
			- okopový plech nerez v. 300 mm					
			- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
232	M	61162R06	dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídle 700x1970mm, PO EI15DP3-C3 - 6	kus	1,000	19 084,44	19 084,44	
			- samozavírač C3					
			- ocelová zárubeň na celou šířku zdíva					
			- stavěč dveřního křídla					
			- ZV typ 7, SG					
			- KL/KL typ 7 SD					
			- okopový plech nerez v. 300 mm					
			- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
233	K	76660022	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	5,000	2 797,00	13 985,00	CS ÚRS 2020 02
			příloha D.1.02.1.33					
			2,0 "5		2,000			
			1,0 "10		1,000			
			2,0 "11		2,000			
			Součet		5,000			
234	M	61162R05	dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídle 900x1970mm, PO EI15DP3-C3 - 5	kus	2,000	19 084,44	38 168,88	
			- samozavírač C3					
			- ocelová zárubeň na celou šířku zdíva					
			- stavěč dveřního křídla					
			- ZV typ 7, SG					
			- KL/KL typ 7 SD					
			- okopový plech nerez v. 300 mm					
			- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
			2,0		2,000			
			Součet		2,000			
235	M	61162R10	dveře vnitřní hladké vysokotlaký laminát HPL plné 1křídle 900x1970mm, PO EI15DP3-C3, dveře bezpečnostní, akustická odolnost 32dB - 10	kus	1,000	32 270,12	32 270,12	
			- samozavírač C3					
			- ocelová zárubeň na celou šířku zdíva					
			- stavěč dveřního křídla					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- ZB typ 10, SG					
			- KL/MA typ 10					
			- okopový plech nerez v. 300 mm					
			- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
			1,0		1,000			
			Součet		1,000			
236	M	61162R11	dveře vnitřní prosklené vysokotlaký laminát HPL plné 1křídle 900x1970mm, PO EW15DP3-C3 - 11	kus	2,000	30 148,22	60 296,44	
			- prosklení křídla a nadsvětlíku PO sklo bezpečné proti rozbití (drátosklo)					
			- samozavírač C3					
			- ocelová zárubeň na celou šířku zdiva					
			- stavěč dveřního křídla					
			- ZV typ 5, SG					
			- KL/KL typ 5					
			- okopový plech nerez v. 300 mm					
			- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
			2,0		2,000			
			Součet		2,000			
237	K	766660031	Montáž dveřních křidel otvíravých dvoukřídlových požárních do ocelové zárubně	kus	2,000	5 009,75	10 019,50	CS ÚRS 2020 02
			příloha D.1.02.1.33					
			2,0 "12		2,000			
			Součet		2,000			
238	M	61161R12	dveře 1250x1970 mm s proskleným nadsvětlíkem 1250x430 mm, materiál vysokotlaký materiál HPL, PO EW15DP3-C3, dvoukřídlové otočné - 12	kus	2,000	62 456,29	124 912,58	
			- prosklení křídla a nadsvětlíku PO sklo bezpečné proti rozbití (drátosklo)					
			- ocelová zárubeň na celou šířku zdiva					
			- dveřní křídla š. 900 a 350 mm					
			- vodorovné madlo v. 800 mm					
			- kování klika-klika, stavěč dveřního křídla na obě křídla KL/KL typ 5 MA, 2xSD					
			- samozavírač C3					
			- ZV typ 5, SG					
			- okopový nerez plech v. 300 mm					
			- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
			2,0		2,000			
			Součet		2,000			
239	K	7666607R1	SD+M systém generální klíče - vložka a zámek FAB 300/FAB 300 HD + 2x klíč	kus	51,000	460,68	23 494,68	
			• vhodné pro projekty středního rozsahu					
			• zabezpečení splňující požadavky					
			pro RC3 podle ENV 1627 nebo NBÚ SS4=2					
			• systémy chráněné patentem					
			• vysoká úroveň zabezpečení					
			• rozsáhlá rozměrová řada					
			• široká nabídka kompatibilních zámků					
			• výroba klíče ve výrobním závodě pouze se					
			souhlasem majitele					
			POPIS VÝROBKU					
			• 5ti stavítkový uzamykací systém					
			• přídatné kódování na hřbetu klíče-HD					
			• mosazné těleso i bubínek					
			• spojka úplná nesymetrická					
			PROVEDENÍ VÝROBKU					
			• standardní povrchová úprava:					
			– leštěná mosaz					
			– saténový nikl, označení „Ns“					
			• oboustranná cylindrická vložka:					
			– označení „FAB 300 nebo FAB 300HD“					
			– rozměr od 30+30 mm					
			– další rozměry odstupňované po 5mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		• knoflíková cylindrická vložka:					
	VV		– označení „FAB 302 nebo FAB 302HD“					
	VV		– rozměr od 30+30mm					
	VV		– standardně osazen černý plastový					
	VV		knoflík 22mm					
	VV		– další rozměry odstupňované po 5 mm					
	VV		• jednostranná cylindrická vložka:					
	VV		– označení „FAB 301 nebo FAB 301HD“					
	VV		– standardně nastavitelný zub „Z“					
	VV		– rozměr od 30+10mm					
	VV		– další rozměry odstupňované po 5mm					
	VV		RC3, dle ČSN EN 1627:2012 Uzamykací systém typ 2. Dle požadavku NBÚ					
	VV		v souladu se zákonem č. 412/205 sb.					
	VV		Systémy generálního klíče FAB 300/ FAB 300 HD					
	VV		Klíč FAB 300HD					
	VV		DOPLŇKY					
	VV		• zvýšená ochrana proti odvrtání,					
	VV		označení „B“					
	VV		• prostupová spojka, označení „P“					
	VV		• ozubené kolo, 10 zubů („K10“)					
	VV		nebo 12 zubů („K12“)					
	VV		• malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“					
	VV		nebo velký kovový knoflík 30 mm,					
	VV		označení „VK“					
	VV		KLÍČE					
	VV		• polotovary klíče FAB 300HD					
	VV		• patentově chráněná technologie					
	VV		51,0		51,000			
	VV		Součet		51,000			
240	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	13,000	242,58	3 153,54	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		13,0 "2/T		13,000			
	VV		Součet		13,000			
241	M	607941R2	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 2/T	m	9,750	384,71	3 750,92	
	VV		0,75*13		9,750			
	VV		Součet		9,750			
242	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	13,000	26,53	344,89	CS ÚRS 2020 02
243	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	7,000	242,58	1 698,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		7,0 "1/T		7,000			
	VV		Součet		7,000			
244	M	607941R1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 1/T	m	10,500	384,71	4 039,46	
	VV		1,50*7,000		10,500			
	VV		Součet		10,500			
245	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	7,000	26,53	185,71	CS ÚRS 2020 02
246	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	7,000	242,58	1 698,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		7,0 "3/T		7,000			
	VV		Součet		7,000			
247	M	607941R3	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 3/T	m	15,575	384,71	5 991,86	
	VV		2,225*7		15,575			
	VV		Součet		15,575			
248	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	7,000	26,53	185,71	CS ÚRS 2020 02
249	K	766811R5T	D+M kuchyňská linka rohová 2275+2075x600 mm v. 900 mm, horní skříňky š. 370 mm v. 600 mm - 5/T	kus	1,000	109 276,08	109 276,08	
	VV		příloha D.1.03.1.33					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		- nerezový dřez 800x600x900 mm					
	VV		- varná keramická deska					
	VV		- vestavěná lednice					
	VV		- nástěnná digestoř					
	VV		- korpus a dvířka - lamino lesklá bílá					
	VV		- pracovní deska 28 mm - lamino matné tmavě šedé					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
250	K	766821R4T	D+M šatní skříňky půlené do zaměstnanecké šatny 400x500x1900 mm s klasickými šatními zámky, materiál laminová dřevotřískas s povrchem melanin, s ABS plastovými hranami - 4/T	kus	8,000	7 235,16	57 881,28	
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		8,0 "4/T		8,000			
	VV		Součet		8,000			
251	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3,000	17 848,71	53 546,13	CS ÚRS 2020 02
D	767		Konstrukce zámečnické				743 339,02	
252	K	767100R1Z	D+M ocelové zábradlí včetně dřevěného madla a povrchové úpravy světle šedou barvou RAL 7035 - 1/Z	kpl	1,000	57 504,04	57 504,04	
	VV		příloha D.1.03.1.34					
	VV		celková hm. 157,54kg					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
253	K	767100R2Z	D+M ocelový žárově pozinkovaný přístřešek agregátu chlazení 1212x712x1324 mm - 2/Z	kpl	1,000	25 301,78	25 301,78	
	VV		příloha D.1.03.1.34					
	VV		celková hm. 132,70kg					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
254	K	767100R3Z	D+M schody skládací typové do poklopu 700x1400 mm, v. 3,50+0,3 m se zatepleným střešním poklopem, požární odolnost EI30, horní poklop žárově pozinkován, uzamykatelný - 3/Z	kpl	1,000	34 502,42	34 502,42	
	VV		příloha D.1.03.1.34					
	VV		- plynový píst pro snadné otevření					
	VV		- svařovaný tubus pro obložení stropního prostupu					
	VV		- schůdky kovové s nástřikem práškovou barvou, nášlapy s protiskluzovou úpravou 390x120 mm					
	VV		Kompletizovaný typový výrobek					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
255	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón - 1/O	m2	5,220	511,79	2 671,54	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.35					
	VV		1,45*1,20*3 "1/O		5,220			
	VV		Součet		5,220			
256	M	697520R1	<i>rohož vstupní rozdělená na dvě části- první část hrubé nečistoty z Al profilů s gumovým páskem a druhé části na jemné nečistoty z Al profilů a textilní rohože Shatwell</i>	m2	5,220	1 707,88	8 915,13	
257	K	76764RD01	D+M vnější vstupní dveře dvojkřídlové prosklené s pevným nadsvětlíkem 1390x2400 mm, otočné, aktivní křídlo pravé, nadsvětlík prosklený - D1	kpl	2,000	89 217,71	178 435,42	
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		- bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916					
	VV		- zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické zavrtané čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5 m					
	VV		- hliníkový práh					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků.					
	VV		kování:					
	VV		elektromagnetický samozavírací zámek					
	VV		bezpečnostní kování s možností změny rozteče kl/kl rozteč 92 mm tl dv. 55-60 mm, bez.tř RC-3					
	VV		samoavírač s vačkovou technologií, kluzným ramínkem, kluzné ramínko					
	VV		oboustranně cylindrická vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		rozpojitelná kabelová průchodka					
	VV		kabel k elektromechanickému zámku 6 m					
	VV		protiplech k el. zámkům					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
258	K	76764RD02	D+M vnější vstupní dveře dvojkřídlové prosklené s pevným nadsvětlíkem 1390x2400 mm, otočné, aktivní křídlo levé, nadsvětlík prosklený - D2	kpl	1,000	89 217,71	89 217,71	
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		- bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916					
	VV		- zasklení číré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické zavrtané čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5 m					
	VV		- hliníkový práh					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		kování:					
	VV		elektromagnetický samozavírací zámek					
	VV		bezpečnostní kování s možností změny rozteče kl/kl rozteč 92 mm tl dv. 55-60 mm, bez.tř RC-3					
	VV		samoavírač s vačkovou technologií, kluzným rámečkem, kluzné ramínko					
	VV		oboustranné cylindrická vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3					
	VV		rozpojitelná kabelová průchodka					
	VV		kabel k elektromechanickému zámku 6 m					
	VV		protiplech k el. zámkům					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
259	K	76764RD03	D+M vnější vstupní dveře dvojkřídlové s pevným nadsvětlíkem 1390x2400 mm, otočné, aktivní křídlo pravé plné, nadsvětlík prosklený - D3	kpl	1,000	62 989,54	62 989,54	
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		- bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916					
	VV		- zasklení číré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické zavrtané čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5 mmechanická zástrčka km pas					
	VV		- mechanická zástrčka k pasivnímu křídlu					
	VV		- hliníkový práh					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		kování:					
	VV		protipožární mechanický zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku					
	VV		protiplech pro interiérové zámky, levý					
	VV		bezpečnostní kování KL/KL tvar kliky L, tř. bezp RC3					
	VV		dveřní samozavírač s hřebenovou technologií s lomeným rámečkem					
	VV		kluzné ramínko k samozavíračům					
	VV		oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
260	K	76764RD04	D+M vnější vstupní dveře jednokřídlové pevným nadsvětlíkem 1040x2400 mm, otočné, křídlo levé plné, nadsvětlík prosklený - D4	kpl	3,000	43 763,07	131 289,21	
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		- bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916					
	VV		- zasklení číré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické zavrtané čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5 mmechanická zástrčka km pas					
	VV		- hliníkový práh					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		kování:					
	VV		protipožární mechanický zadlabávací zámek pro cylindrickou vložku					
	VV		protiplech pro interiérové zámky, levý					
	VV		bezpečnostní kování KL/KL tvar kliky L, tř. bezp RC3					
	VV		dveřní samozavírač s hřebenovou technologií s lomeným rámečkem					
	VV		kluzné ramínko k samozavíračům					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
261	K	76764RD05	D+M vnější vstupní dveře jednokřídlové pevným nadsvětlíkem 1040x2400 mm, otočné, křídlo levé v horní části prosklené, nadsvětlík prosklený - D5	kpl	1,000	46 488,18	46 488,18	
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		- bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 916					
	VV		- zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické zavrtané čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5 mmechanická zástrč km pas					
	VV		- hliníkový práh					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		kování:					
	VV		uzký mechanický zadlabávací zámek					
	VV		protiplech pro úzké zámky					
	VV		úzké bezpečnostní kování madlo/klika, tvar kliky L, tř. bezp. RC3					
	VV		dveřní samozavírač s hřebenovou technologií s lomeným rámečkem					
	VV		kluzné ramínko k samozavíračům					
	VV		oboustranná cylindrická vložka v systému SGK, tř. bezp. RC3					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
262	K	7678101R1	D+M dvířka z ocelového plechu komaxit v ocelovém rámu 300x300 mm - 19/Oa	kus	18,000	805,06	14 491,08	
	VV		příloha D.1.23.1.35					
	VV		10,0 "čistící kusy ZTI		10,000			
	VV		8,0 " na ventily vody do zdiva		8,000			
	VV		Součet		18,000			
263	K	7678811R1	D+M certifikovaný záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky, lano+kotevní prvky, revize	kpl	1,000	33 079,77	33 079,77	
264	K	767893115	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná šířky do 1,50 m	kus	4,000	4 600,32	18 401,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.35					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
265	M	28315R9O	prosklená stříška nad vstupem na kovové konstrukci 1500x1200 mm - 9/O	kus	4,000	4 600,32	18 401,28	
266	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,000	7 216,88	21 650,64	CS ÚRS 2020 02
D 771			Podlahy z dlaždic				652 867,47	
267	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	363,600	17,25	6 272,10	CS ÚRS 2020 02
268	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	363,600	57,50	20 907,00	CS ÚRS 2020 02
269	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	363,600	368,03	133 815,71	CS ÚRS 2020 02
270	K	77115101R	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 30 mm (ref.v. Poriment)	m2	10,200	471,53	4 809,61	
	VV		skladba P12					
	VV		0,29*1,20*20+1,20*2,70		10,200			
	VV		Součet		10,200			
271	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	26,400	402,53	10 626,79	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.04,05					
	VV		1,20*22		26,400			
	VV		Součet		26,400			
272	M	597614R1	dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	8,422	154,44	1 300,69	
	VV		příloha D.1.02.1.04,05					
	VV		1,20*0,29*22		7,656			
	VV		Součet		7,656			
	VV		7,656*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		8,422			
273	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	36,000	345,02	12 420,72	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vV příloha D.1.02.1.04,05					
			vV 1,50*24		36,000			
			vV Součet		36,000			
274	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	26,400	368,03	9 715,99	CS ÚRS 2020 02
			vV příloha D.1.02.1.04,05					
			vV 1,20*22		26,400			
			vV Součet		26,400			
275	M	597614R1	dlažba keramická slinutá protisklzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	4,751	154,44	733,74	
			vV příloha D.1.02.1.04,05					
			vV 1,20*0,1636*22		4,319			
			vV Součet		4,319			
			vV 4,319*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,751			
276	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	204,505	172,51	35 279,16	CS ÚRS 2020 02
			vV příloha D.1.03.1.4					
			vV 1.NP					
			vV (1,80+1,40)*2-1,25 "mč.1.01		5,150			
			vV (1,80+8,51)*2-0,90*2-0,80-0,70 "mč. 1.02		17,320			
			vV (12,695+1,90)*2-0,90*2-0,80*6 "mč. 1.03		22,590			
			vV (1,685+2,885)*2*1,25 "mč. 1.06		11,425			
			vV (2,135+2,885)*2-0,80 "mč. 1.07		9,240			
			vV (2,175+4,235)*2-0,80 "mč. 1.09		12,020			
			vV (2,05+3,015)*2-0,90 "mč. 1.11		9,230			
			vV (2,585+3,015)*2-0,80 "mč.1.13		10,400			
			vV (1,76+1,65)*2-0,70 "mč. 1.14		6,120			
			vV (1,80+1,93)*2-1,25 "mč. 1.16		6,210			
			vV (1,935+3,72)*2-0,90 "mč. 1.20		10,410			
			vV (1,40+3,50)*2-0,80*2-0,70*2-0,90 "mč. B1		5,900			
			vV příloha D.1.03.1.5					
			vV 2.NP					
			vV (5,40+2,70)*2-0,90*2 "mč. 2.01		14,400			
			vV (14,535+1,90)*2-1,25-0,80*6-0,90*3 "mč. 2.02		24,120			
			vV (1,80+12,08+3,70)*2-0,90-0,80*6-1,25 "mč. 2.10		28,210			
			vV (1,905+1,825)*2-0,80 "mč. 2.14		6,660			
			vV skladba P12					
			vV 1,20*2+2,70		5,100			
			vV Součet		204,505			
277	M	597612R1	sokl keramický v. 100 mm	kus	681,683	80,51	54 882,30	
			vV 204,505/0,33		619,712			
			vV Součet		619,712			
			vV 619,712*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		681,683			
278	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	6,380	172,51	1 100,61	CS ÚRS 2020 02
			vV skladba P12					
			vV 0,290*22		6,380			
			vV Součet		6,380			
279	M	597612R1	sokl keramický v. 100 mm	kus	21,266	80,51	1 712,13	
			vV 6,38/0,33		19,333			
			vV Součet		19,333			
			vV 19,333*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,266			
280	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protisklzných tepelných flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	351,624	690,05	242 638,14	CS ÚRS 2020 02
			vV 1.+2.NP					
			vV skladba P1					
			vV 2,80+15,30+25,0+14,60+5,25+6,20+8,15+6,20+7,80+2,0+3,90+7,50+5,10		109,800			
			vV skladba P2					
			vV 5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10		45,450			
			vV skladba P2a					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		11,80		11,800			
	VV		skladba P2b					
	VV		17,10		17,100			
	VV		skladba P6					
	VV		58,25		58,250			
	VV		skladba P9					
	VV		21,84		21,840			
	VV		skladba P10					
	VV		28,90+14,50-(0,29*1,20*22+2,70*1,20)+29,55+3,40		65,454			
	VV		skladba P11					
	VV		4,20+6,60+2,32+2,0+3,57		18,690			
	VV		skladba P12					
	VV		1,20*2,70		3,240			
	VV		Součet		351,624			
281	M	597614R1	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2</i>	m2	180,794	262,18	47 400,57	
	VV		skladba P1					
	VV		2,80+15,30+25,0+14,60+5,25+6,20+8,15+6,20+7,80+2,0+3,90+7,50+5,10-(0,29*1,20*22+2,70*1,20)		98,904			
	VV		skladba P10					
	VV		28,90+14,50-(0,29*1,20*22+2,70*1,20)+29,55+3,40		65,454			
	VV		Součet		164,358			
	VV		164,358*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		180,794			
282	M	597614R2	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2</i>	m2	106,320	262,18	27 874,98	
	VV		skladba P2					
	VV		5,15+2,35+3,50+3,85+8,90+7,50+7,90+4,20+2,10		45,450			
	VV		skladba P2b					
	VV		17,10		17,100			
	VV		skladba P9					
	VV		21,84		21,840			
	VV		skladba P11					
	VV		4,20+6,60+2,32+2,0+3,57		18,690			
	VV		skladba P12					
	VV		1,20*2,70		3,240			
	VV		Součet		106,320			
283	M	597614R3	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná R11 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2</i>	m2	58,250	262,18	15 271,99	
	VV		skladba P6					
	VV		58,25		58,250			
	VV		Součet		58,250			
284	M	597614R4	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná R12 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2</i>	m2	11,800	262,18	3 093,72	
	VV		skladba P2a					
	VV		11,80		11,800			
	VV		Součet		11,800			
285	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	43,430	92,01	3 995,99	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba P1					
	VV		2,80+2,0+3,90		8,700			
	VV		skladba P2					
	VV		2,35+3,50+3,85+4,20+2,10		16,000			
	VV		skladba P10					
	VV		+3,40		3,400			
	VV		skladba P11					
	VV		4,20+2,32+2,0+3,57		12,090			
	VV		skladba P12					
	VV		1,20*2,70		3,240			
	VV		Součet		43,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
286	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	3,000	6 338,51	19 015,53	CS ÚRS 2020 02
D 776			Podlahy povlakové				97 416,95	
287	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	66,680	9,20	613,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		66,68 "vinyl		66,680			
	VV		Součet		66,680			
288	K	776141112	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	66,680	71,77	4 785,62	CS ÚRS 2020 02
	VV		66,68 "vinyl		66,680			
	VV		Součet		66,680			
289	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	83,580	192,98	16 129,27	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. + 2. NP					
	VV		8,30+16,90+11,0+7,20+5,78+10,3+8,7+15,40		83,580			
	VV		Součet		83,580			
290	M	2841211R	PVC vinylová akustická podlahovina s kročejovým útlumem 15dB tl. 34 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm	m2	91,938	570,21	52 423,97	
	VV		83,58*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		91,938			
291	K	7764211R1	D+M soklová lišta vinyl h=57mm	m	89,500	127,54	11 414,83	
	VV		1. + 2. NP					
	VV		10,6+12,10+12,30+9,0+8,9+12,0+10,4+14,20		89,500			
	VV		Součet		89,500			
292	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	46,500	65,21	3 032,27	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.03.1.35					
	VV		46,50		46,500			
	VV		Součet		46,500			
293	M	5905410R	profil přechodový Al š. 50mm	m	47,430	130,30	6 180,13	
	VV		46,5*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		47,430			
294	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	3,000	945,80	2 837,40	CS ÚRS 2020 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				416 352,49	
295	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	338,000	17,25	5 830,50	CS ÚRS 2020 02
296	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	338,000	57,50	19 435,00	CS ÚRS 2020 02
297	K	781474117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	338,000	713,05	241 010,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.+2.NP					
	VV		338,0		338,000			
	VV		Součet		338,000			
298	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	371,800	183,12	68 084,02	CS ÚRS 2020 02
	VV		338*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		371,800			
299	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	186,300	172,51	32 138,61	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		4*2,10 "mč. 1.05		8,400			
	VV		12*2,10 "mč. 1.12		25,200			
	VV		4*2,10 "mč. 1.15		8,400			
	VV		8*2,10 "mč. 1.17		16,800			
	VV		4*2,10 "B3		8,400			
	VV		4*2,1 "mč. B4		8,400			
	VV		1*1,50 "mč. B2		1,500			
	VV		2.NP					
	VV		8*2,10 "mč. 2.03		16,800			
	VV		8*2,10 "mč. 2.04		16,800			
	VV		4*2,10 "mč. 2.08		8,400			
	VV		19*2,10 "mč. 2.09		39,900			
	VV		5*2,10 "mč. 2.15		10,500			
	VV		8*2,10 "mč. 2.16		16,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		186,300			
300	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	205,025	184,01	37 726,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		(1,785+2,885)*2-0,80 "mč. 1.05		8,540			
	VV		(1,225+2,035)*2-0,80 "mč. 1.10		5,720			
	VV		(3,985+3,015+1,115+0,75+0,115)*2-0,90 "mč. 1.12		17,060			
	VV		(2,115+1,675)*2-0,80 "mč. 1.15		6,780			
	VV		(2,115+1,87+0,90)*2-0,80 "mč. 1.17		8,970			
	VV		(2,205+1,855)*2-0,70 "mč. B3		7,420			
	VV		(1,855+1,12)*2-0,70 "mč. B4		5,250			
	VV		2,30+2,10 "mč. B5		4,400			
	VV		2.NP					
	VV		(1,60+1,80)*2-0,70 "mč. 2.03		6,100			
	VV		(1,60+0,95)*2-0,70 "mč. 2.03a		4,400			
	VV		(1,31+1,80)*2-0,80 "mč. 2.08		5,420			
	VV		(9,005+2,335+2,44+0,60+0,175+3,215+0,85+1,90+5,54+1,90+4,34*2+2,42+2,53)		41,590			
	VV		-0,90*2,0*2 "mč. 2.09		-3,600			
	VV		(1,905+1,0)*2-0,80 "mč. 2.15		5,010			
	VV		(1,905+1,87+0,90+0,115/2)*2-0,80 "mč. 2.16		8,665			
	VV		(2,0*2+0,80)*4+(1,20+2,40*2)+(2,0*2+0,90)+(2,0*2+0,70)*2		39,500			
	VV		(2,0*2+0,80)*5+(2,0*2+0,90)*2		33,800			
	VV		Součet		205,025			
301	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,000	4 042,27	12 126,81	CS ÚRS 2020 02
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				120 959,75	
302	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 332,180	16,10	21 448,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		stropy					
	VV		47,72		47,720			
	VV		stěny					
	VV		1.NP					
	VV		(1,80+1,40)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,265-1,25*2,0 "mč.1.01		16,143			
	VV		(1,80+8,51)*2*2,65-1,2*2,40*3-0,90*2,0*2-0,80*2,0 "mč. 1.02		40,803			
	VV		(12,695+1,90)*2*2,65+(1,20+2,15*2)*0,20+(1,10+2,15*2)*0,20 "mč. 1.03		79,534			
	VV		(1,785+2,885)*2*2,65+0,75*3*0,30 "mč. 1.05		25,426			
	VV		(1,685+2,885)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,30 "mč. 1.06		26,126			
	VV		(2,135+2,885)*2*3,0+0,75*3*0,30 "mč. 1.07		30,795			
	VV		(2,885+2,885)*2*3,0+1,50*3*0,30+(0,75+1,50*2)*0,30 "mč. 1.08		37,095			
	VV		(2,175+4,235)*2*3,0+1,50*3*0,30 "mč. 1.09		39,810			
	VV		(1,225+2,035)*2*2,65 "mč. 1.10		17,278			
	VV		(2,05+3,015)*2*3,0 "mč. 1.11		30,390			
	VV		(3,985+3,015+1,115+0,75+0,115)*2*3,0 "mč. 1.12		53,880			
	VV		(2,585+3,015)*2*3,0 "mč.1.13		33,600			
	VV		(1,76+1,65)*2*2,65 "mč. 1.14		18,073			
	VV		(2,115+1,675)*2*3,0 "mč. 1.15		22,740			
	VV		(1,80+1,93)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,30 "mč. 1.16		21,674			
	VV		(2,115+1,87+0,90)*2*2,65+0,75*3*0,30 "mč. 1.17		26,566			
	VV		(2,29+3,72)*2*3,0+(1,55+2,40*2)*0,30 "mč. 1.18		37,965			
	VV		(1,935+3,72)*2*3,0+(1,20+2,40*2)*0,30 "mč. 1.19		35,730			
	VV		(1,935+3,72)*2*3,0+(1,20+2,40*2)*0,30 "mč. 1.20		35,730			
	VV		(2,05+3,72+0,62+0,115/2)*2*2,65+(1,20+2,40*2)*0,30 "mč. 1.21		35,972			
	VV		(3,575+4,70)*2*3,25+(2,25+0,75*2)*0,30+(1,20+2,40*2)*0,30 "mč. 1.22		56,713			
	VV		(1,40+3,50)*2*3,0+(1,20+2,15*2)*0,20 "mč. B1		30,500			
	VV		(3,40+4,90)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30 "mč. B2		51,375			
	VV		(2,205+1,855)*2*2,65+(1,50+0,75*2)*0,30 "mč. B3		22,418			
	VV		(1,855+1,12)*2*2,65+0,75*3*0,30 "mč. B4		16,443			
	VV		(3,40+3,235)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30 "mč. B5		41,385			
	VV		2.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(14,535+1,90)*2*2,45+(1,55+2,15*2)*0,20+(1,20+2,15*2)*0,20*2 "mč. 2.02		83,902			
	VV		(1,60+1,80)*2*2,65 "mč. 2.03		18,020			
	VV		(1,60+0,95)*2*2,65+0,75*3*0,30 "mč. 2.03a		14,190			
	VV		(2,885+2,325+0,94)*2*3,0+0,75*3*0,30 "mč. 2.04		37,575			
	VV		(2,50+2,885)*2*3,0+1,50*3*0,30 "mč. 2.05		33,660			
	VV		(2,005+2,885)*2*3,0+0,75*3*0,30 "mč. 2.06		30,015			
	VV		(3,575+6,85)*2*3,25 "mč. 2.07		67,763			
	VV		(1,31+1,80)*2*2,65 "mč. 2.08		16,483			
	VV		(9,005+2,335+2,44+0,60+0,175+3,215+0,85+1,90+5,54+1,90+4,34*2+2,42+2,53)*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30*2+1,50*3*0,30		114,714			
	VV		(4,40+3,05)*2*2,65 "mč. 2.09		39,485			
	VV		(1,80+12,08+3,70)*2*2,60+(1,50+0,75*2)*0,30+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 2.10		93,801			
	VV		(3,585+2,885)*2*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30 "mč. 2.11		35,866			
	VV		(2,435+3,97)*2*3,0+1,50*3*0,30 "mč. 2.12		39,780			
	VV		(3,97+4,30)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30 "mč. 2.13		51,195			
	VV		(1,905+1,825)*2*2,65 "mč. 2.14		19,769			
	VV		(1,905+1,0)*2*2,65 "mč. 2.15		15,397			
	VV		(1,905+1,87+0,90+0,115/2)*2*2,70+(0,75+1,50*2)*0,30 "mč. 2.16		26,681			
	VV		odečet obkladů					
	VV		-338,0		-338,000			
	VV		Součet		1 332,180			
303	K	784181117	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu na schodišti o výšce podlaží do 3,80 m	m2	101,775	16,10	1 638,58	CS ÚRS 2020 02
	VV		(5,40+2,70)*2*3,0+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 1.04		50,085			
	VV		(5,40+2,70)*2*3,0+(0,75+2,20*2)*0,30*2 "mč. 2.01		51,690			
	VV		Součet		101,775			
304	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ořezuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 566,990	35,65	55 863,19	CS ÚRS 2020 02
	VV		stropy					
	VV		47,72+234,81		282,530			
	VV		stěny					
	VV		1.NP					
	VV		(1,80+1,40)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,265-1,25*2,0 "mč.1.01		16,143			
	VV		(1,80+8,51)*2*2,65-1,2*2,40*3-0,90*2,0*2-0,80*2,0 "mč. 1.02		40,803			
	VV		(12,695+1,90)*2*2,65+(1,20+2,15*2)*0,20+(1,10+2,15*2)*0,20 "mč. 1.03		79,534			
	VV		(1,785+2,885)*2*2,65+0,75*3*0,30 "mč. 1.05		25,426			
	VV		(1,685+2,885)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,30 "mč. 1.06		26,126			
	VV		(2,135+2,885)*2*3,0+0,75*3*0,30 "mč. 1.07		30,795			
	VV		(2,885+2,885)*2*3,0+1,50*3*0,30+(0,75+1,50*2)*0,30 "mč. 1.08		37,095			
	VV		(2,175+4,235)*2*3,0+1,50*3*0,30 "mč. 1.09		39,810			
	VV		(1,225+2,035)*2*2,65 "mč. 1.10		17,278			
	VV		(2,05+3,015)*2*3,0 "mč. 1.11		30,390			
	VV		(3,985+3,015+1,115+0,75+0,115)*2*3,0 "mč. 1.12		53,880			
	VV		(2,585+3,015)*2*3,0 "mč.1.13		33,600			
	VV		(1,76+1,65)*2*2,65 "mč. 1.14		18,073			
	VV		(2,115+1,675)*2*3,0 "mč. 1.15		22,740			
	VV		(1,80+1,93)*2*2,65+(1,55+2,40*2)*0,30 "mč. 1.16		21,674			
	VV		(2,115+1,87+0,90)*2*2,65+0,75*3*0,30 "mč. 1.17		26,566			
	VV		(2,29+3,72)*2*3,0+(1,55+2,40*2)*0,30 "mč. 1.18		37,965			
	VV		(1,935+3,72)*2*3,0+(1,20+2,40*2)*0,30 "mč. 1.19		35,730			
	VV		(1,935+3,72)*2*3,0+(1,20+2,40*2)*0,30 "mč. 1.20		35,730			
	VV		(2,05+3,72+0,62+0,115/2)*2*2,65+(1,20+2,40*2)*0,30 "mč. 1.21		35,972			
	VV		(3,575+4,70)*2*3,25+(2,25+0,75*2)*0,30+(1,20+2,40*2)*0,30 "mč. 1.22		56,713			
	VV		(1,40+3,50)*2*3,0+(1,20+2,15*2)*0,20 "mč. B1		30,500			
	VV		(3,40+4,90)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30 "mč. B2		51,375			
	VV		(2,205+1,855)*2*2,65+(1,50+0,75*2)*0,30 "mč. B3		22,418			
	VV		(1,855+1,12)*2*2,65+0,75*3*0,30 "mč. B4		16,443			
	VV		(3,40+3,235)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30 "mč. B5		41,385			
	VV		2.NP					
	VV		(14,535+1,90)*2*2,45+(1,55+2,15*2)*0,20+(1,20+2,15*2)*0,20*2 "mč. 2.02		83,902			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,60+1,80)*2*2,65 "mč. 2.03		18,020			
	VV		(1,60+0,95)*2*2,65+0,75*3*0,30 "mč. 2.03a		14,190			
	VV		(2,885+2,325+0,94)*2*3,0+0,75*3*0,30 "mč. 2.04		37,575			
	VV		(2,50+2,885)*2*3,0+1,50*3*0,30 "mč. 2.05		33,660			
	VV		(2,005+2,885)*2*3,0+0,75*3*0,30 "mč. 2.06		30,015			
	VV		(3,575+6,85)*2*3,25 "mč. 2.07		67,763			
	VV		(1,31+1,80)*2*2,65 "mč. 2.08		16,483			
	VV		(9,005+2,335+2,44+0,60+0,175+3,215+0,85+1,90+5,54+1,90+4,34*2+2,42+2,53)*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30*2+1,50*3*0,30		114,714			
	VV		(4,40+3,05)*2*2,65 "mč. 2.09		39,485			
	VV		(1,80+12,08+3,70)*2*2,60+(1,50+0,75*2)*0,30+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 2.10		93,801			
	VV		(3,585+2,885)*2*2,65+(2,25+1,50*2)*0,30 "mč. 2.11		35,866			
	VV		(2,435+3,97)*2*3,0+1,50*3*0,30 "mč. 2.12		39,780			
	VV		(3,97+4,30)*2*3,0+(2,25+1,50*2)*0,30 "mč. 2.13		51,195			
	VV		(1,905+1,825)*2*2,65 "mč. 2.14		19,769			
	VV		(1,905+1,0)*2*2,65 "mč. 2.15		15,397			
	VV		(1,905+1,87+0,90+0,115/2)*2*2,70+(0,75+1,50*2)*0,30 "mč. 2.16		26,681			
	VV		odečet obkladů					
	VV		-338,0		-338,000			
	VV		Součet		1 566,990			
305	K	784211107	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných na schodišti výšky do 3,80 m	m2	101,775	35,65	3 628,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		(5,40+2,70)*2*3,0+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 1.04		50,085			
	VV		(5,40+2,70)*2*3,0+(0,75+2,20*2)*0,30*2 "mč. 2.01		51,690			
	VV		Součet		101,775			
306	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	1 668,765	23,00	38 381,60	CS ÚRS 2020 02
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				26 901,96	
307	K	7866271R1	D+M žaluzie hliníková vnitřní vodorovná se zesílenými profily, barva bílá, manuální ovládání, šířka lamely 25 mm - 17/O	m2	29,335	890,35	26 118,42	
	VV		přílha D.1.03.1.37					
	VV		1,40*1,40*6		11,760			
	VV		0,68*0,68*22		10,173			
	VV		0,61*1,37*5		4,179			
	VV		0,55*0,61*6		2,013			
	VV		0,55*0,55*4		1,210			
	VV		Součet		29,335			
308	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	3,000	261,18	783,54	CS ÚRS 2020 02
D M			Práce a dodávky M				570 440,09	
D 33-M			Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh				570 440,09	
309	K	3300300R	D+M osobní výtah nosnost 630kg, bezpřevodový, počet stanic 2, bez strojovny pod stropem, 2 kusy panelových dveří, kabina 1100x1400x2100 mm - V1	kpl	1,000	570 440,09	570 440,09	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.2 - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 360 762,71

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 360 762,71	21,00%	285 760,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 646 522,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.2 - ZTI

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 360 762,71

HSV - Práce a dodávky HSV

52 683,58

8 - Trubní vedení

622,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 006,40

998 - Přesun hmot

54,34

PSV - Práce a dodávky PSV

1 301 316,65

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

277 504,90

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

599 059,97

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

280 860,97

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

94 069,76

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

25 186,76

767 - Konstrukce zámečnické

6 549,25

783 - Dokončovací práce - nátěry

18 085,04

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 762,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.2 - ZTI

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 360 762,71

D HSV Práce a dodávky HSV

52 683,58

D 8 Trubní vedení

622,84

1	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	2,000	241,52	483,04	CS ÚRS 2020 02
2	M	28613109	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 25x2,3mm	m	2,000	69,90	139,80	CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 006,40

3	K	953945121	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	170,000	305,92	52 006,40	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot

54,34

4	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,045	966,07	43,47	CS ÚRS 2020 02
5	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,045	241,52	10,87	CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV

1 301 316,65

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

277 504,90

6	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 110	m	23,000	398,91	9 174,93	CS ÚRS 2020 02
7	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125	m	57,000	434,45	24 763,65	CS ÚRS 2020 02
8	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 150	m	37,000	584,01	21 608,37	CS ÚRS 2020 02
9	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	16,000	288,26	4 612,16	CS ÚRS 2020 02
10	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	25,000	309,74	7 743,50	CS ÚRS 2020 02
11	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	11,000	482,83	5 311,13	CS ÚRS 2020 02
12	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	5,000	316,59	1 582,95	CS ÚRS 2020 02
13	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	23,000	482,83	11 105,09	CS ÚRS 2020 02
14	K	721175111	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučňené třívrstvé DN 75	m	10,000	784,88	7 848,80	CS ÚRS 2020 02
15	K	721175112	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučňené třívrstvé DN 110	m	33,000	1 172,07	38 678,31	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	721175113	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučňené třívrstvé DN 125	m	16,000	1 676,15	26 818,40	CS ÚRS 2020 02
17	K	721175121	Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučňené třívrstvé DN 50+75	m	25,000	784,88	19 622,00	CS ÚRS 2020 02
18	K	721175122	Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučňené třívrstvé DN 110	m	4,000	1 172,07	4 688,28	CS ÚRS 2020 02
19	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	13,000	125,36	1 629,68	CS ÚRS 2020 02
20	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	18,000	132,83	2 390,94	CS ÚRS 2020 02
21	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	156,41	156,41	CS ÚRS 2020 02
22	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	18,000	234,62	4 223,16	CS ÚRS 2020 02
23	K	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138	kus	1,000	3 251,29	3 251,29	CS ÚRS 2020 02
24	K	721211912	Montáž vpustí podlahových DN 50/75	kus	1,000	322,02	322,02	CS ÚRS 2020 02
25	M	HLE.HL300	Podlahová vpust DN50 s ležatým odtokem, s pevnou izolační přírubou, ZU standard vodní, s přítokovou trubicí DN40/50, plast 123x123mm/nerez 115x115mm, HL300	kus	1,000	783,88	783,88	
26	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110	kus	6,000	402,53	2 415,18	CS ÚRS 2020 02
27	M	HLE.HL310N	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, sifon Primus, 310NPr	kus	4,000	1 101,83	4 407,32	
28	M	HLE.HL3100Npr	Podlahová vpust DN50/75/110 se svislým odtokem, sifon Primus, 3100NPr	kus	1,000	2 016,85	2 016,85	
29	M	55161770	vpust' podlahová nerezový rošt DN 100, 400x800, včetně sifonu	kus	1,000	23 604,70	23 604,70	CS ÚRS 2020 02
30	M	55161814R01	izolační příruba DN 100	kus	5,000	2 103,82	10 519,10	
31	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	1,000	805,06	805,06	CS ÚRS 2020 02
32	M	HLE.HL50F080	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 800mm	kus	1,000	2 659,06	2 659,06	
33	K	721226512.HLE	Zápachová uzávěrka HL 440 podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	4,000	546,28	2 185,12	
34	K	721226512R01	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu HL138	kus	1,000	878,15	878,15	
35	K	721233213R01	Střešní vtok DN125, svislý, svislý, el.ohřev,s izolační přírubou, tepelně izolovaný HL 62.1P/2	kus	2,000	5 167,40	10 334,80	
36	K	721259103	Montáž tvarovky DN 70	kus	1,000	241,52	241,52	CS ÚRS 2020 02
37	M	28611086	čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70	kus	1,000	366,72	366,72	CS ÚRS 2020 02
38	K	721259105	Montáž tvarovky DN 100	kus	8,000	193,21	1 545,68	
39	M	28611087	čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100	kus	8,000	382,00	3 056,00	CS ÚRS 2020 02
40	K	721259106	Montáž tvarovky DN 125	kus	2,000	241,52	483,04	CS ÚRS 2020 02
41	M	28611088	čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 125	kus	2,000	600,28	1 200,56	CS ÚRS 2020 02
42	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	1,000	859,83	859,83	CS ÚRS 2020 02
43	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	710,38	2 841,52	CS ÚRS 2020 02
44	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	168,000	32,20	5 409,60	CS ÚRS 2020 02
45	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	117,000	40,25	4 709,25	CS ÚRS 2020 02
46	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,539	966,07	520,71	CS ÚRS 2020 02
47	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,539	241,52	130,18	CS ÚRS 2020 02

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					599 059,97	
48	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	5,000	509,47	2 547,35	CS ÚRS 2020 02
49	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	66,000	583,19	38 490,54	CS ÚRS 2020 02
50	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	2,000	397,58	795,16	CS ÚRS 2020 02
51	K	722140109	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 80	m	8,000	5 673,71	45 389,68	CS ÚRS 2020 02
52	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	245,000	303,23	74 291,35	CS ÚRS 2020 02
53	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	47,000	324,35	15 244,45	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	74,000	362,74	26 842,76	CS ÚRS 2020 02
55	K	722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	m	36,000	415,33	14 951,88	CS ÚRS 2020 02
56	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	54,000	513,38	27 722,52	CS ÚRS 2020 02
57	K	722174027	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 63 x 10,5 mm	m	23,000	620,09	14 262,07	CS ÚRS 2020 02
58	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm	kus	144,500	90,51	13 078,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		289/2		144,500			
	VV		Součet		144,500			
59	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm	kus	93,500	130,53	12 204,56	CS ÚRS 2020 02
	VV		187/2		93,500			
	VV		Součet		93,500			
60	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	57,000	34,51	1 967,07	CS ÚRS 2020 02
61	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	7,000	49,47	346,29	CS ÚRS 2020 02
62	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	71,000	95,26	6 763,46	CS ÚRS 2020 02
63	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	58,000	59,01	3 422,58	CS ÚRS 2020 02
64	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	53,000	116,21	6 159,13	CS ÚRS 2020 02
65	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	39,000	153,69	5 993,91	CS ÚRS 2020 02
66	K	722181235	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN přes 89 mm	m	8,000	198,57	1 588,56	CS ÚRS 2020 02
67	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	130,000	143,35	18 635,50	CS ÚRS 2020 02
68	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	97,000	198,10	19 215,70	CS ÚRS 2020 02
69	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm	m	38,000	273,40	10 389,20	CS ÚRS 2020 02
70	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	143,000	65,89	9 422,27	CS ÚRS 2020 02
71	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	40,000	75,51	3 020,40	CS ÚRS 2020 02
72	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	64,000	79,70	5 100,80	CS ÚRS 2020 02
73	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40	m	36,000	94,55	3 403,80	CS ÚRS 2020 02
74	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	54,000	110,98	5 992,92	CS ÚRS 2020 02
75	K	722182016	Podpurný žlab pro potrubí D 63	m	23,000	114,64	2 636,72	CS ÚRS 2020 02
76	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	64,000	150,09	9 605,76	CS ÚRS 2020 02
77	K	722219104	Montáž armatur vodovodních přírubových DN 80 ostatní typ	kus	3,000	322,02	966,06	CS ÚRS 2020 02
78	M	42245320R01	ventil redukční šedá litina DN80 PN 16 s manometrem D15P	kus	1,000	49 448,42	49 448,42	
79	M	42221212	šoupě přírubové vodovodní krátká stavební dl DN 80 PN 10-16	kus	2,000	10 052,19	20 104,38	CS ÚRS 2020 02
80	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	26,000	123,75	3 217,50	CS ÚRS 2020 02
81	K	722220153	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4	kus	2,000	153,03	306,06	CS ÚRS 2020 02
82	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	17,000	329,21	5 596,57	CS ÚRS 2020 02
83	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	78,000	84,29	6 574,62	CS ÚRS 2020 02
84	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	8,000	110,99	887,92	CS ÚRS 2020 02
85	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	14,000	166,80	2 335,20	CS ÚRS 2020 02
86	K	722220234	Přechodka dGK PPR PN 20 D 40 x G 5/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	361,20	2 167,20	CS ÚRS 2020 02
87	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	20,000	483,78	9 675,60	CS ÚRS 2020 02
88	K	722220236	Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem	kus	3,000	727,12	2 181,36	CS ÚRS 2020 02
89	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	7,000	270,70	1 894,90	CS ÚRS 2020 02
90	K	722224152R01	Kulový kohout zahradní nezámrzný 3/4"	kus	2,000	7 162,48	14 324,96	
91	K	722231076	Ventil zpětný mosazný G 6/4 PN 10 do 110°C se dvěma závit	kus	1,000	668,30	668,30	CS ÚRS 2020 02
92	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový vnitřní závit	kus	31,000	238,82	7 403,42	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	4,000	332,97	1 331,88	CS ÚRS 2020 02
94	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	6,000	475,67	2 854,02	CS ÚRS 2020 02
95	K	722232125	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	3,000	637,46	1 912,38	CS ÚRS 2020 02
96	K	722232126	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	9,000	890,29	8 012,61	CS ÚRS 2020 02
97	K	722232127	Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	1 290,55	1 290,55	CS ÚRS 2020 02
98	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	3,000	241,52	724,56	CS ÚRS 2020 02
99	M	42210770R01	ventil s regulační přímý DN 15 termostatický (MTCV)	kus	3,000	2 658,57	7 975,71	
100	K	722239103	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1	kus	1,000	241,52	241,52	CS ÚRS 2020 02
101	M	42211433	ventil s regulační kuželkou přímý DN 25	kus	1,000	2 020,48	2 020,48	CS ÚRS 2020 02
102	K	722239104R01	Montáž armatur vodovodních se třemi závitů G 1/2-3/4	kus	1,000	289,82	289,82	
103	M	55145541R01	ventil termostatický DN15, vestavěné zpětné klapky, Presto29007	kus	1,000	5 624,59	5 624,59	
104	K	722250133R01	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový, Q 1,1 l/s	kus	2,000	9 543,74	19 087,48	
105	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	559,000	16,10	8 999,90	CS ÚRS 2020 02
106	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	488,000	19,32	9 428,16	CS ÚRS 2020 02
107	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,680	966,07	1 623,00	CS ÚRS 2020 02
108	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	1,680	241,52	405,75	CS ÚRS 2020 02

D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty			280 860,97			
109	K	725119123	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	6,000	805,06	4 830,36	CS ÚRS 2020 02
110	M	642360710	klozet keramický závěsný hluboké splachování dětský	kus	2,000	7 538,92	15 077,84	
111	M	64236041	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování	kus	4,000	2 325,79	9 303,16	CS ÚRS 2020 02
112	M	551673810R01	sedátko klozetové s poklopem duroplastové dětské	kus	2,000	3 069,75	6 139,50	
113	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	4,000	1 302,30	5 209,20	CS ÚRS 2020 02
114	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	11,000	724,55	7 970,05	CS ÚRS 2020 02
115	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus	2,000	1 027,44	2 054,88	CS ÚRS 2020 02
116	M	64211045	umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm	kus	9,000	1 066,67	9 600,03	CS ÚRS 2020 02
117	M	64211034	kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý	kus	9,000	1 487,51	13 387,59	CS ÚRS 2020 02
118	K	725229102	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové	kus	1,000	1 433,00	1 433,00	CS ÚRS 2020 02
119	M	55220504	vana plechová smaltovaná bílá 1700x700mm	kus	1,000	2 157,08	2 157,08	CS ÚRS 2020 02
120	K	725244505	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednodílné vstup z čela na vaničku 1000x800 mm	kus	1,000	15 341,96	15 341,96	CS ÚRS 2020 02
121	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	10,000	1 023,53	10 235,30	CS ÚRS 2020 02
122	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	kus	4,000	2 178,88	8 715,52	CS ÚRS 2020 02
123	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	kus	9,000	2 268,59	20 417,31	CS ÚRS 2020 02
124	K	725319111R01	Montáž dřezu nebo připojení výpustek DN 50 ostatních typů	kus	11,000	805,06	8 855,66	
125	K	725319111	Montáž dřezu ostatních typů	soubor	1,000	805,06	805,06	CS ÚRS 2020 02
126	M	551458210	fontánka pitná závěsná s automaticky ovládaným výtokem, zaoblené rohy, dětská	kus	1,000	14 092,70	14 092,70	
127	M	562414130	příslušenství sítko - vložka s menšími otvory	kus	1,000	454,28	454,28	
128	K	725339111	Montáž výlevky	kus	3,000	788,96	2 366,88	CS ÚRS 2020 02
129	M	642711010	výlevka keramická závěsná bílá	kus	3,000	5 053,51	15 160,53	
130	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	44,000	228,52	10 054,88	CS ÚRS 2020 02
131	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	kus	6,000	202,13	1 212,78	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
132	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	6,000	389,12	2 334,72	CS ÚRS 2020 02
133	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	3,000	322,02	966,06	CS ÚRS 2020 02
134	M	55143976	baterie dřezová páková nástěnná s kulatým ústím 300mm	kus	3,000	2 015,75	6 047,25	CS ÚRS 2020 02
135	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	1,000	322,02	322,02	CS ÚRS 2020 02
136	M	55143181	baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm	kus	1,000	2 015,75	2 015,75	CS ÚRS 2020 02
137	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	9,000	402,53	3 622,77	CS ÚRS 2020 02
138	M	55144004	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním odpadu	kus	9,000	2 843,93	25 595,37	CS ÚRS 2020 02
139	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	2,000	483,03	966,06	CS ÚRS 2020 02
140	M	55144006	baterie umyvadlová stojánková páková nízkotlaká otáčivé ústí	kus	2,000	7 015,93	14 031,86	CS ÚRS 2020 02
141	K	725839101	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ	kus	1,000	1 529,61	1 529,61	CS ÚRS 2020 02
142	M	55144923	baterie vanová páková s automatickým přepínačem a sprchou rozteč 150mm	kus	1,000	7 116,76	7 116,76	CS ÚRS 2020 02
143	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	2,000	1 207,58	2 415,16	CS ÚRS 2020 02
144	M	551455390	baterie sprchová zapuštěná s přepínačem	kus	2,000	3 827,54	7 655,08	CS ÚRS 2020 02
145	M	551455450	souprava sprchová komplet	kus	2,000	2 007,33	4 014,66	CS ÚRS 2020 02
146	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	1,000	435,48	435,48	CS ÚRS 2020 02
147	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	11,000	1 348,65	14 835,15	CS ÚRS 2020 02
148	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	1,000	513,06	513,06	CS ÚRS 2020 02
149	K	725864311	Zápachová uzávěrka van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,000	869,41	869,41	CS ÚRS 2020 02
150	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	0,579	966,07	559,35	CS ÚRS 2020 02
151	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,579	241,52	139,84	CS ÚRS 2020 02

D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	94 069,76				
152	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí	kus	2,000	4 431,24	8 862,48	CS ÚRS 2020 02
153	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	kus	9,000	8 497,57	76 478,13	CS ÚRS 2020 02
154	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	kus	9,000	357,10	3 213,90	CS ÚRS 2020 02
155	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	kus	11,000	479,54	5 274,94	CS ÚRS 2020 02
156	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	0,199	966,07	192,25	CS ÚRS 2020 02
157	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	0,199	241,52	48,06	CS ÚRS 2020 02

D		727	Zdravotechnika - požární ochrana	25 186,76				
158	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	6,000	1 725,12	10 350,72	CS ÚRS 2020 02
159	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	6,000	1 840,13	11 040,78	CS ÚRS 2020 02
160	K	727121108	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	2,000	1 897,63	3 795,26	CS ÚRS 2020 02

D		767	Konstrukce zámečnické	6 549,25				
161	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	85,000	32,20	2 737,00	CS ÚRS 2020 02
162	M	48455984R01	konzole stěnová nebo závěsná C-nosník, konzoly, spojovací materiál-sestavy	pár	85,000	44,85	3 812,25	

D		783	Dokončovací práce - nátěry	18 085,04				
163	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	42,500	34,50	1 466,25	CS ÚRS 2020 02
164	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	42,500	23,00	977,50	CS ÚRS 2020 02
165	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	42,500	138,01	5 865,43	CS ÚRS 2020 02
166	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	42,500	92,01	3 910,43	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	42,500	138,01	5 865,43	CS ÚRS 2020 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							6 762,48	
168	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	6,000	1 127,08	6 762,48	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.2.1 - ZTI - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

788 871,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	788 871,96	21,00%	165 663,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

954 535,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.2.1 - ZTI - zemní práce

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

788 871,96

HSV - Práce a dodávky HSV

762 661,87

1 - Zemní práce

646 813,61

2 - Zakládání

4 714,35

998 - Přesun hmot

111 133,91

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

26 210,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.2.1 - ZTI - zemní práce

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

788 871,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

762 661,87

D 1

Zemní práce

646 813,61

3	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	427,72	12 831,60	CS ÚRS 2020 02
14	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	70,000	34,62	2 423,40	CS ÚRS 2020 02
15	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	70,000	18,86	1 320,20	CS ÚRS 2020 02
35	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	130,000	1 841,97	239 456,10	CS ÚRS 2020 02
42	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	88,200	326,97	28 838,75	CS ÚRS 2020 02
43	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	88,200	172,86	15 246,25	CS ÚRS 2020 02
52	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	130,000	323,98	42 117,40	CS ÚRS 2020 02
53	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	130,000	288,56	37 512,80	CS ÚRS 2020 02
49	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	73,920	62,68	4 633,31	CS ÚRS 2020 02
VV		zemina na meziskládku a zpětný zásyp						
VV		36,96*2			73,920			
1305	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	93,040	375,39	34 926,29	CS ÚRS 2020 02
VV		přebytečná zemina na skládku						
VV		130,0-36,96			93,040			
1306	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	465,200	27,37	12 732,52	CS ÚRS 2020 02
VV		93,04*5 'Přepočtené koeficientem množství			465,200			
54	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	130,000	348,01	45 241,30	CS ÚRS 2020 02
55	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	130,000	22,43	2 915,90	CS ÚRS 2020 02
1307	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	93,040	394,13	36 669,86	CS ÚRS 2020 02
VV		přebytečná zemina na skládku						
VV		130,0-36,96			93,040			
56	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	36,960	165,84	6 129,45	CS ÚRS 2020 02
58	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	54,060	767,91	41 513,21	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	108,120	761,24	82 305,27	CS ÚRS 2020 02
	VV		54,06*2 "Přepočtené koeficientem množství		108,120			
	D	2	Zakládání				4 714,35	
1304	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	10,810	436,11	4 714,35	CS ÚRS 2020 02
	D	998	Přesun hmot				111 133,91	
141	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	129,637	617,71	80 078,07	CS ÚRS 2020 02
142	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	129,637	239,56	31 055,84	CS ÚRS 2020 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				26 210,09	
1199	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	494,53	9 890,60	CS ÚRS 2020 02
1201	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	10,000	494,53	4 945,30	CS ÚRS 2020 02
1202	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	18,000	494,53	8 901,54	CS ÚRS 2020 02
1204	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	5,000	494,53	2 472,65	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.3 - UT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 607 933,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 607 933,11	21,00%	337 665,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 945 599,06

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.3 - UT

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 607 933,11

1 - Otopná tělesa	223 222,03
2 - Příslušenství otopných těles	99 189,18
3 - Regulační vyvažovací ventily	3 682,16
4 - Kulové kohouty a uzavírací klapky	643,98
5 - Filtry	264,12
6 - Zpětné klapky a ventily	229,27
7 - Vypouštění a odvzdušnění	2 706,10
8 - Teploměry	1 283,42
9 - Potrubí	880 828,48
10 - Požární ucpávky	10 420,90
11 - Nátěry	16 606,68
12 - Izolace	192 522,68
13 - Společné položky	176 334,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.3 - UT

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 607 933,11

D 1 Otopná tělesa 223 222,03

0	M	1.1	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 10VK/6060 výška: 600mm, délka: 600mm, hloubka: 47mm	ks	2,000	2 259,65	4 519,30	
0	M	1.2	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6040 výška: 600mm, délka: 400mm, hloubka: 66mm	ks	6,000	2 648,79	15 892,74	
0	M	1.3	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6050 výška: 600mm, délka: 500mm, hloubka: 66mm	ks	12,000	2 769,22	33 230,64	
0	M	1.4	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6060 výška: 600mm, délka: 600mm, hloubka: 66mm	ks	4,000	2 889,66	11 558,64	
0	M	1.5	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6090 výška: 600mm, délka: 900mm, hloubka: 66mm	ks	3,000	3 251,98	9 755,94	
0	M	1.6	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/6110 výška: 600mm, délka: 1100mm, hloubka: 66mm	ks	4,000	3 571,71	14 286,84	
0	M	1.7	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/9040 výška: 900mm, délka: 400mm, hloubka: 66mm	ks	8,000	3 052,09	24 416,72	
0	M	1.8	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/3230 výška: 300mm, délka: 2300mm, hloubka: 100mm	ks	16,000	4 852,96	77 647,36	
0	M	1.9	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/5100 výška: 500mm, délka: 1000mm, hloubka: 100mm	ks	3,000	3 578,87	10 736,61	
0	M	1.10	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/6080 výška: 600mm, délka: 800mm, hloubka: 100mm	ks	2,000	3 371,90	6 743,80	
0	M	1.11	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/6110 výška: 600mm, délka: 1100mm, hloubka: 100mm	ks	2,000	3 966,84	7 933,68	
0	M	1.12	Otopné trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodávána se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. výška: 1500mm, délka: 450mm, hloubka: 30mm	ks	2,000	3 249,88	6 499,76	

D 2 Příslušenství otopných těles 99 189,18

0	M	2.1	Termostatická hlavice	ks	48,000	368,46	17 686,08	
0	M	2.2	Termoelektrická hlavice pro ventily OT, 24 V, (on/off), 50 Hz	ks	16,000	870,13	13 922,08	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	2.3		Radiátorové šroubení tvaru H přímé je vhodné pro každý radiátor se spodním přívodem se vzdáleností přívodu a vývodu 50 mm. Šroubení umožňuje uzavřít okruh a vypustit topné těleso při jeho demontáži. Jako příslušenství se dodává kohout pro vypouštění a nap	ks	62,000	1 052,20	65 236,40	
0	M	2.4		Rohový regulační ventil DN15, vč.montáže	ks	2,000	644,87	1 289,74	
0	M	2.5		Rohové regulační šroubení DN15, vč.montáže	ks	2,000	527,44	1 054,88	
D 3 Regulační vyvažovací ventily								3 682,16	
0	M	3.1		Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 s vnitřním závitem, s měřicími koncovkami, vč. montáže	ks	2,000	1 841,08	3 682,16	
D 4 Kulové kohouty a uzavírací klapky								643,98	
0	M	4.1		Závitový kulový kohout DN 20, PN 6, včetně montáže	ks	2,000	321,99	643,98	
D 5 Filtry								264,12	
0	M	5.1		Filtr závitový DN 20, PN 6, vč. montáže	ks	1,000	264,12	264,12	
D 6 Zpětné klapky a ventily								229,27	
0	M	6.1		Zpětný ventil, DN 15, PN 16, vč. montáže	ks	1,000	229,27	229,27	
D 7 Vypouštění a odvzdušnění								2 706,10	
0	M	7.1		Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a zátkou, vč. montáže	ks	4,000	310,25	1 241,00	
0	M	7.2		Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 25, vč. montáže	ks	2,000	465,55	931,10	
0	M	7.3		Odvzdušňovací ventil, PN 6, DN 15, vč. montáže	ks	2,000	267,00	534,00	
D 8 Teploměry								1 283,42	
0	M	8.1		Teploměr 0 - 120°C axiální, vč. návarku, jímky a montáže	ks	2,000	641,71	1 283,42	
D 9 Potrubí								880 828,48	
0	M	9.1		Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 20(26,9x2,65)	m	96,000	526,76	50 568,96	
0	M	9.2		Měděné potrubí 15x1	m	569,000	435,82	247 981,58	
0	M	9.3		Měděné potrubí 18x1	m	161,000	465,49	74 943,89	
0	M	9.4		Měděné potrubí 22x1	m	98,000	533,69	52 301,62	
0	M	9.5		Měděné potrubí 28x1,5	m	87,000	880,06	76 565,22	
0	M	9.6		Měděné potrubí 35x1,5	m	47,000	1 070,09	50 294,23	
0	M	9.7		Měděné potrubí 42x1,5	m	3,000	1 239,78	3 719,34	
0	M	9.8		Měděné potrubí 54x2	m	166,000	1 954,54	324 453,64	
D 10 Požární ucpávky								10 420,90	
0	M	10.1		Protipožární tmel	kpl.	10,000	1 042,09	10 420,90	
D 11 Nátěry								16 606,68	
0	K	11.1		Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a dvojnásobným nátěrem prostým. Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním... Nátěr pro armatury, doplňkové konstrukce, uložení	kpl.	1,000	13 318,68	13 318,68	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	11.2	Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a dvojnásobným nátěrem prostým. Veškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Armatu... základní nátěr potrubí do DN 50 mm včetně	m	96,000	34,25	3 288,00	

D		12	Izolace	192 522,68				
0	M	12.1	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 15x1, tl. 30 mm	m	569,000	137,98	78 510,62	
0	M	12.2	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 18x1, tl. 30 mm	m	161,000	145,85	23 481,85	
0	M	12.3	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 22x1, tl. 30 mm	m	98,000	159,53	15 633,94	
0	M	12.4	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 28x1,5, tl. 30 mm	m	87,000	170,27	14 813,49	
0	M	12.5	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 35x1,5, tl. 30 mm	m	47,000	181,98	8 553,06	
0	M	12.6	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 42x1,5, tl. 30 mm	m	3,000	193,70	581,10	
0	M	12.7	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 54x2, tl. 30 mm	m	166,000	208,45	34 602,70	
0	M	12.8	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro ocelové potrubí DN20; tl.30 mm	m	96,000	170,27	16 345,92	

D		13	Společné položky	176 334,11				
0	K	13.3	Doprava materiálu	kpl	1,000	20 395,53	20 395,53	
0	K	13.5	Pomocné ocelové konstrukce	kpl	1,000	10 643,96	10 643,96	
0	K	13.6	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle DN	kpl	1,000	26 609,90	26 609,90	
0	K	13.7	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky)	kpl	1,000	41 525,52	41 525,52	
0	K	13.8	Jemné zaregulování systému	kpl	1,000	10 867,95	10 867,95	
0	K	13.9	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu	kpl	1,000	5 449,54	5 449,54	
0	K	13.10	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou	kpl	1,000	22 925,45	22 925,45	
0	K	13.11	Štítky a popisy potrubí a zařízení	kpl	1,000	2 947,20	2 947,20	
0	K	13.12	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 335,52	2 335,52	
0	K	13.13	Kotevní materiál	kpl	1,000	12 238,01	12 238,01	
0	K	13.14	Montážní materiál	kpl	1,000	20 395,53	20 395,53	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.4 - VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 166 812,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 166 812,13	21,00%	455 030,55
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 621 842,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.4 - VZT

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 166 812,13

D1 - Vzduchotechnika

2 166 812,13

D2 - Zař.č.1 - Větrání a chlazení kuchyně a zázemí

1 808 053,83

D3 - Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení

57 439,71

D4 - Zař.č.3 - Větrání rozvodny elektro

38 771,06

D5 - Zař.č.4 - Větrání výměňkové stanice

10 967,36

D6 - Ostatní

238 354,24

D8 - Měření hluku

13 225,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.4 - VZT

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 166 812,13

D D1 Vzduchotechnika

2 166 812,13

D D2 Zař.č.1 - Větrání a chlazení kuchyně a zázemí

1 808 053,83

1	M	1.1	Sestavná vzduchotechnická rekuperační jednotka ve vnitřním provedení, se stěnovými panely o tloušťce 60mm, vyrobené z Alu-Zinc plechu s odolností C4 proti korozi. Panely jsou uvnitř vyplněné zvukovou a tepelnou izolací z nehořlavé minerální vlny s odolnos	ks	1,000	644 494,25	644 494,25	
2	M	1.1.1	Směšovací uzel, 0-10V, 24V	ks	1,000	19 843,13	19 843,13	
3	M	1.1.2	Hlásič kouře včetně patice a adaptéru pro VZT potrubí	ks	1,000	8 169,39	8 169,39	
4	M	1.2	Kondenzační jednotka v nízkohlukovém provedení s antivibračními izolátory chvění, chlazená vzduchem, pro venkovní instalace. Inverterový kompresor - plynulá regulace chladicího výkonu 0-10V. Axiální ventilátor s plynulou regulací otáček s EC motorem. Sam	ks	1,000	170 785,99	170 785,99	
5	M	1.2.1	Trasa propojovacího CU potrubí 28/16 mm; dodávka zahrnuje potrubí, tvarovky, antivibrační prvky – vlnovce, Ag pájku, přichytky, kotvicí materiál, parotěsná tepelná izolace s UV ochranou (Al polep) 13 mm; komunikační kabel	bm	6,000	1 150,08	6 900,48	
6	M	1.3	Buňka tlumiče 500x200/1000	ks	32,000	603,10	19 299,20	
7	M	1.4	Protidešťová žaluzie z pozink plechu 800x1500, barva dle fasády RAL 6018 (světle zelená)	ks	1,000	6 123,08	6 123,08	
8	M	1.5	Výfuková hlavice z pozink plechu ø630	ks	1,000	5 860,41	5 860,41	
9	M	1.6	Vzduchotechnický gastro strop - otevřený větrací stropní systém, včetně osvětlovacích LED těles s přívodem vzduchu, technické parametry viz dokumenty D.1.03.4.6.9 - Technická zpráva vzduchotechnického stropu a D.1.03.4.6.6 - Vzduchotechnický strop.	m2	36,930	20 413,70	753 877,94	
10	M	1.7	Požární klapka 800x315 s teplotním a mechanickým ovládáním	ks	1,000	2 843,83	2 843,83	
11	M	1.8	Požární klapka 630x500 s teplotním a mechanickým ovládáním	ks	1,000	3 111,29	3 111,29	
12	M	1.9	Požární klapka 250x250 s teplotním a mechanickým ovládáním	ks	1,000	1 857,28	1 857,28	
13	M	1.10	Regulační klapka 800x315 ruční	ks	1,000	2 075,94	2 075,94	
14	M	1.11	Regulační klapka 630x500 ruční	ks	1,000	2 403,68	2 403,68	
15	M	1.12	Regulační klapka 250x250 ruční	ks	1,000	1 137,96	1 137,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	M	1.13	Regulační klapka o200 ruční	ks	1,000	335,67	335,67	
17	M	1.14	Regulační klapka o160 ruční	ks	5,000	301,55	1 507,75	
18	M	1.15	Regulační klapka o100 ruční	ks	7,000	248,38	1 738,66	
19	M	1.16	Talířový ventil odvodní o160mm	ks	4,000	84,71	338,84	
20	M	1.17	Talířový ventil přívodní o160mm	ks	4,000	84,71	338,84	
21	M	1.18	Talířový ventil přívodní o100mm	ks	2,000	43,05	86,10	
22	M	1.19	Ohebná Al laminátová hadice tepelně izolovaná o160 á10bm/bal	ks	1,000	1 983,89	1 983,89	
23	M	1.20	Ohebná Al laminátová hadice o160 á10bm/bal	ks	1,000	611,04	611,04	
24	M	1.21	Ohebná Al laminátová hadice tepelně izolovaná o100 á10bm/bal	ks	1,000	1 412,53	1 412,53	
25	M	1.22	Stěnová Al mřížka SM12,5-300x100	ks	6,000	360,54	2 163,24	
26	M	1.23	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o200/20% tvarovek	bm	6,000	263,08	1 578,48	
27	M	1.23.1	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o160/30% tvarovek	bm	34,000	273,14	9 286,76	
28	M	1.23.2	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o100/30% tvarovek	bm	9,000	214,20	1 927,80	
29	M	1.24	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu	m2	133,000	452,84	60 227,72	
30	M	1.25	Akustická izolace vzduchotechnického potrubí z minerální vlny tl. 60mm s Al polepem	m2	113,000	460,03	51 983,39	
31	M	1.26	Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí z minerální vlny tl. 40mm s Al polepem	m2	59,000	402,53	23 749,27	

D D3 Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení 57 439,71

32	M	2.1	Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí o160mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.03.4.6.7 - Tabulka zařízení.	ks	3,000	7 487,99	22 463,97	
33	M	2.2	Protipožární větrací mřížka EI45 300x106	ks	4,000	4 532,53	18 130,12	
34	M	2.3	Talířový ventil odvodní o160mm	ks	1,000	84,71	84,71	
35	M	2.4	Talířový ventil odvodní o100mm	ks	16,000	43,05	688,80	
36	M	2.5	Stěnová Al mřížka SM12,5-400x200	ks	4,000	513,96	2 055,84	
37	M	2.6	Stěnová Al mřížka SM12,5-300x100	ks	10,000	360,54	3 605,40	
38	M	2.7	Ohebná Al laminátová hadice o160 á10bm/bal	ks	1,000	611,04	611,04	
39	M	2.8	Ohebná Al laminátová hadice o100 á10bm/bal	ks	4,000	380,91	1 523,64	
40	M	2.9	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o160/30% tvarovek	bm	16,000	273,14	4 370,24	
41	M	2.9.1	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o125/30% tvarovek	bm	5,000	224,27	1 121,35	
42	M	2.9.2	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o100/30% tvarovek	bm	13,000	214,20	2 784,60	

D D4 Zař.č.3 - Větrání rozvodny elektro 38 771,06

43	M	3.1	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí o200mm. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.03.4.6.7 - Tabulka zařízení.	ks	1,000	8 725,94	8 725,94	
44	M	3.2	Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí o200mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.03.4.6.7 - Tabulka zařízení.	ks	1,000	8 983,84	8 983,84	
45	M	3.3	Filtrační kazeta do kruhového potrubí o200mm s kapsovým filtrem M5	ks	1,000	1 229,22	1 229,22	
46	M	3.4	Zpětná klapka do kruhového potrubí o200mm	ks	1,000	261,87	261,87	
47	M	3.5	Tlumič hluku pro kruhové potrubí o200/900	ks	3,000	2 116,41	6 349,23	
48	M	3.6	Protidešťová žaluzie z pozink plechu 300x300, barva dle fasády RAL 6018 (světle zelená)	ks	1,000	1 316,51	1 316,51	
49	M	3.7	Přívodní vyústka do kruhového potrubí 525x85	ks	3,000	738,01	2 214,03	
50	M	3.8	Odvodní vyústka do kruhového potrubí 525x85	ks	3,000	690,39	2 071,17	
51	M	3.9	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o200/30% tvarovek	bm	19,000	316,27	6 009,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	3.10	Tepelná izolace vzduchotechnického potrubí z minerální vlny tl. 40mm s Al polepem	m2	4,000	402,53	1 610,12	
D D5 Zař.č.4 - Větrání výměňkové stanice							10 967,36	
53	M	4.1	Axiální ventilátor nástěnný ø200mm. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.03.4.6.7 - Tabulka zařízení.	ks	1,000	3 882,07	3 882,07	
54	M	4.2	Žaluziová klapka samotížná s připojením na kruhové potrubí ø200mm, barva dle fasády RAL 6018 (světle zelená)	ks	1,000	860,21	860,21	
55	M	4.3	Žaluziová klapka samotížná s připojením na čtyřhranné potrubí 400x200	ks	1,000	4 343,92	4 343,92	
56	M	4.4	Protidešťová žaluzie z pozink plechu 400x200, barva dle fasády RAL 6018 (světle zelená)	ks	1,000	1 267,31	1 267,31	
57	M	4.5	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - ø200/0% tvarovek	bm	1,000	161,01	161,01	
58	M	4.6	Čtyřhranné potrubí sk.l z pozink. plechu	m2	1,000	452,84	452,84	
D D6 Ostatní							238 354,24	
59	K	Pol65	Montáž VZT a CHL	kpl	1,000	172 512,12	172 512,12	
60	K	Pol66	Zkoušky a protokoly	kpl	1,000	20 701,45	20 701,45	
61	K	Pol67	Naprogramování zařízení a uvedení do provozu	kpl	1,000	19 838,89	19 838,89	
62	K	Pol68	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	5 750,40	5 750,40	
63	K	Pol69	Měření průtočných množství	kpl	1,000	8 050,57	8 050,57	
64	K	Pol70	Doprava	kpl	1,000	11 500,81	11 500,81	
D D8 Měření hluku							13 225,93	
68	K	Pol74	Měření hluku od vzduchotechniky a chlazení	kpl	1,000	13 225,93	13 225,93	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.5 - Slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

557 736,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	557 736,13	21,00%	117 124,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

674 860,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.5 - Slaboproud

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

557 736,13

D1 - Telekomunikační a datové rozvody

231 195,85

D2 - Elektrická zabezpečovací signalizace

162 348,16

D3 - Společní televizní anténa

48 634,94

D4 - Společné kabelové trasy

109 806,78

D5 - Požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru

5 750,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.5 - Slaboproud

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

557 736,13

D		D1	Telekomunikační a datové rozvody						231 195,85
1	K	Pol30	Stojanový rozvaděč, výška 42U, šířka 600mm, hloubka 600mm,prosklené dveře se zámkem, ventilační jednotka, rozvodný napájecí panel 8x230V, včetně montážního příslušenství	ks	1,000	14 723,33	14 723,33		
1	K	Pol31	19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.5e, výška 1U	ks	6,000	2 145,94	12 875,64		
1	K	Pol32	19" vyvazovací kovový panel, 5x velké kovové oko, výška 1U	ks	10,000	408,51	4 085,10		
1	K	Pol33	19" patchpanel kompaktní, 25xRJ-11 nestíněný Cat.3, výška 1U	ks	1,000	1 607,70	1 607,70		
2	K	Pol1	Zásuvka 1xRJ-45 nestíněná - Cat.5e, včetně rámečku, design dle standardu silnoproud	ks	3,000	261,21	783,63		
2	K	Pol2	Dvozásuvka 2xRJ-45 nestíněná - Cat.5e, včetně rámečku, design dle standardu silnoproud	ks	11,000	357,47	3 932,17		
2	K	Pol34	IP telefonie - 19" provedení/ stand alone+ CPU + Switch + VoIP karta 32 hovorových kanálů. 2 licence slotů (podrobná specifikace v TZ)	kpl.	1,000	102 306,98	102 306,98		
2	K	Pol35	Instalace systému	kpl.	1,000	4 830,34	4 830,34		
2	K	Pol3	IP dveřní komunikátor s klávesnicí ve verzi pro VoIP síť, spínač na ovládání elektrického zámku	ks	2,000	23 323,96	46 647,92		
1	K	Pol4	VoIP telefonní přístroj s displejem (PoE)	ks	8,000	1 832,38	14 659,04		
1	K	Pol5	Instalační krabice KO68	ks	14,000	68,56	959,84		
1	K	Pol6	Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5e, b2ca s1 d0	m	500,000	6,33	3 165,00		
1	K	Pol7	Instalace kabelu UTP4x2x0,5 Cat.5e	m	500,000	19,32	9 660,00		
1	K	Pol36	Kabel J-H(St)H 10x2x0,8, b2ca s1 d0	m	15,000	102,89	1 543,35		
1	K	Pol37	Instalace kabelu J-H(St)H 10x2x0,8, b2ca s1 d0	m	15,000	20,70	310,50		
1	K	Pol38	Propojovací patch kabely Cat 5e UTP, 0,5m	ks	30,000	16,45	493,50		
1	K	Pol39	Certifikační zkoušky, instalace tras, rozváděče, přípomocné práce	kpl.	1,000	8 611,81	8 611,81		

D		D2	Elektrická zabezpečovací signalizace						162 348,16
2	K	Pol40	Systém EZS, minimální počet 192 zón dvojitě vyvážených, včetně napájecího zdroje, akumulátorů v kovovém krytu (12V/38Ah), telefonní komunikátor pro možnost připojení na PCO	kpl.	1,000	36 094,10	36 094,10		
2	K	Pol8	Expander (koncentrátor), tamper kontakt, plastový box na povrch	ks	7,000	3 075,32	21 527,24		
2	K	Pol9	Prostorový duální PIR+MW detektor	ks	9,000	1 075,38	9 678,42		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	Pol10	Bezdotyková LED klávesnice pro ovládání a programování systému	ks	3,000	4 027,80	12 083,40	
2	K	Pol11	Vnitřní akustická a optická signalizace	ks	2,000	790,11	1 580,22	
3	K	Pol12	Požární hlásič opticko kouřový	ks	9,000	1 182,20	10 639,80	
3	K	Pol41	Požární hlásič opticko teplotní	ks	3,000	1 127,93	3 383,79	
3	K	Pol13	Dveřní a okenní magnetický kontakt (dodávka v rámci oken a dveří)	ks	35,000	165,61	5 796,35	
3	K	Pol14	Propojovací krabice s tamper kontaktem a krabici KO68	ks	22,000	367,11	8 076,42	
2	K	Pol16	Kabel J-H(St)-H 4x2x0,6mm s pláštěm LSOH	m	400,000	68,88	27 552,00	
2	K	Pol17	Kabel S/FUTP4x2x0,5 Cat.6, b2ca s1 d0 včetně instalace	m	100,000	29,44	2 944,00	
2	K	Pol42	Oživení systému, programování ústředny, návazností, zkoušky atd., zaškolení obsluhy	kpl.	1,000	22 992,42	22 992,42	

D D3 Společní televizní anténa 48 634,94

3	K	Pol43	Hlavní stanice STA , oceloplechový nástěnný rozváděč 700x500x220mm, Komaxit, uzávěr s vložkovým zámkem vystrojený zesilovačem, anténním rozbočovačem 12x12,6 dB, anténním odbočovačem pro napojení 9 koncových zásuvek	ks	1,000	21 398,40	21 398,40	
3	K	Pol44	Rozvodnice plastová na omítku s přístrojovou lištou 430x250x155mm	ks	1,000	2 290,96	2 290,96	
3	K	Pol45	Anténní stožár trubkový, průměr 76 mm, délka 3 metry	ks	1,000	5 852,76	5 852,76	
3	K	Pol46	Vertikální anténa	ks	1,000	1 262,79	1 262,79	
4	K	Pol47	Anténa FM vertikální / horizontální polarizace	ks	1,000	734,90	734,90	
4	K	Pol48	Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení F konektory	ks	3,000	2 456,57	7 369,71	
4	K	Pol18	Koaxiální kabel 75 ohmů, v dig. kvalitě	m	200,000	31,85	6 370,00	
4	K	Pol49	Koaxiální kabel 75 ohmů, v dig. kvalitě venkovní, odolný UV záření	m	30,000	40,07	1 202,10	
4	K	Pol50	Účastnická zásuvka TV+R+SAT včetně přístrojové krabice a rámečku	ks	4,000	469,77	1 879,08	
3	K	Pol5	Instalační krabice KO68	ks	4,000	68,56	274,24	

D D4 Společné kabelové trasy 109 806,78

4	K	Pol20	Trubka instalační ohebná průměr 30 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu pro vysokou mechanickou zátěž, instalace do podlahy	m	50,000	51,05	2 552,50	
4	K	Pol21	Elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 30mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami	m	1 500,000	33,92	50 880,00	
4	K	Pol22	Elektroinstalační trubka pevná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 50mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vertikální SLB trasy mezi podlažími	m	20,000	88,06	1 761,20	
4	K	Pol23	Kabelový prostup v podlaze, stropu do průměru 100 mm pro vertikální trasy SLB systémů	kpl.	1,000	6 900,48	6 900,48	
4	K	Pol24	Kabelová příchytka nylonová pro hlavní horizontální trasy v mezistropním prostoru, včetně upevňovacího a vázacího materiálu (hmoždinky, šrouby, vázací pásy).	ks	500,000	18,75	9 375,00	
4	K	Pol25	Kabelový žlab drátěný 150x50 mm včetně upevňovacího materiálu pro hlavní horizontální trasy SLB v chodbách a spojovacích mostech nad SDK podhledy.	m	120,000	319,48	38 337,60	

D D5 Požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru 5 750,40

5	K	Pol26	Certifikovaný systém požárních ucpávek splňující podmínky vyhlášky č.246/2001Sb.	kpl	1,000	5 750,40	5 750,40	
---	---	-------	--	-----	-------	----------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.6 - Silnoproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 234 638,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 234 638,78	21,00%	259 274,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 493 912,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.6 - Silnoprúd

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 234 638,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.6 - Silnoproud

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 234 638,78

0	M	001	SVÍTIDLO 2 - stopní LED vestavěné svítidlo downlight 25W vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z hliníkového profilu, opálový difuzor, 230 x 100 (pr. x v), montážní otvor 200mm (pr.), 25W LED, 4000K, 2350lm, Ra>80, IP44, životnost>30000hod., vyzařovací úh	ks	15,000	885,04	13 275,60	
0	M	002	SVÍTIDLO 4 - stropní LED panel vestavěný 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, mikroprismatický optický kryt, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 4230lm, Ra>80, IP20, třída ochrany II, životnost>40000hod., vyzařovací úhel 120°, n	ks	26,000	1 299,67	33 791,42	
0	M	003	SVÍTIDLO 5 - stopní LED vestavěné svítidlo downlight 21W vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z hliníkového profilu, opálový difuzor, 225 x 25 (pr. x v), montážní otvor 210mm (pr.), 21W LED, 4000K, 1600lm, Ra>80, IP20, životnost>50000hod., vyzařovací úhe	ks	75,000	838,33	62 874,75	
0	M	004	SVÍTIDLO 6 - stropní přisazené, zavěšené LED svítidlo 45W přisazené/zavěšené svítidlo, těleso ze světlešedého plastu, opálový difusor z optického polykarbonátu, 1238 x 63 x 75 (š x h x v), 45W LED, 5000lm, 4000K, Ra>80, IP66, třída ochrany I, životnost>5	ks	4,000	1 329,13	5 316,52	
0	M	005	SVÍTIDLO 7 - stropní přisazené, zavěšené LED svítidlo 60W přisazené/zavěšené svítidlo, těleso ze světlešedého plastu, opálový difusor z optického polykarbonátu, 1609 x 63 x 75 (š x h x v), 60W LED, 6500lm, 4000K, Ra>80, IP66, třída ochrany I, životnost>5	ks	2,000	1 518,84	3 037,68	
0	M	006	N1 - nouzové svítidlo nástěnné, stropní LED nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na stěnu nebo strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso bílý polykarbonát v barvě RAL 9003, optika transparentní polykarbonátové čočky, optická část vyrobena z met	ks	14,000	2 281,79	31 945,06	
0	M	007	N1 IP66 - nouzové svítidlo nástěnné, stropní LED, IP66 nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na stěnu nebo strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso bílý polykarbonát v barvě RAL 9003, optika transparentní polykarbonátové čočky, optická část vyr	ks	4,000	2 508,67	10 034,68	
0	M	008	N2 - nouzové svítidlo stropní oboustranné LED nouzové LED svítidlo oboustranné přisazené na strop, vestavné do stropu, těleso polykarbonát v bílé barvě RAL 9003, vybaveno plastovou signalizační prosvětlenou tabulkou z opálového polykarbonátu a zajišťuje v	ks	3,000	3 524,98	10 574,94	
0	M	009	SVÍTIDLO NA - stropní vestavěné nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní vestavěné, svítí při výpadku napájení, 24W, 180 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003, optický kryt z vysoce průhledného PMMA, 90 x 40 (pr. X	ks	14,000	2 737,59	38 326,26	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M		010	SVÍTIDLO NB - stropní vestavěné nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní vestavěné, svítí při výpadku napájení, 24W, 180 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003, optický kryt z vysoce průhledného PMMA, 90 x 40 (pr. X	ks	5,000	2 737,59	13 687,95	
0	M		011	SVÍTIDLO NA.1 - stropní přisazené nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní přisazené, svítí při výpadku napájení, 24W, 250 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003,transparentní polykarbonátové čočky, 213 x 83 x 20 (š	ks	4,000	2 131,91	8 527,64	
0	M		012	SVÍTIDLO NB.1 - stropní přisazené nouzové LED svítidlo 36W nouzové svítidlo LED stropní přisazené, svítí při výpadku napájení, 36W, 450 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003,transparentní polykarbonátové čočky, 213 x 83 x 20 (š	ks	1,000	2 244,84	2 244,84	
0	M		013	Reflektorové LED svítidlo 20W s infrapasivním čidlem pohybu PIR nástěnné LED svítidlo reflektor 20W s infrapasivním čidlem pohybu PIR, hliníková slitina práškově lakovaná, difuzor sklo, LED 20W neutrální bílá 4000K, 1500lm, 230V, zvýšené krytí IP54, d=180	ks	1,000	997,14	997,14	
0	M		014	HLAVNÍ ROZVADĚČ HR Oceloplechový, skříňový, volně stojící, IP 55/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívod spodem a vývody horem, spodem, rozměry: 800+600x2200x400mm, jmenovitý proud 400A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"	ks	1,000	100 345,58	100 345,58	
0	M		015	ROZVADĚČ RK Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 54/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 845x1645x270mm, jmenovitý proud 160A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní do	ks	1,000	53 717,55	53 717,55	
0	M		016	ROZVADĚČ RPH1 Oceloplechový nástěnný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x1070x135mm, jmenovitý proud 63A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 6kA, kompletní dodávka sesta	ks	1,000	38 336,58	38 336,58	
0	M		017	ROZVADĚČ RPH2 Oceloplechový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x770x135mm, jmenovitý proud 40A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 6kA, kompletní dodávka sest	ks	1,000	24 946,03	24 946,03	
0	M		018	ROZVADĚČ RB Plastový, zapuštěný, IP 40/20, zaměnitelné plné plastové dveře levé/pravé provedení, přívod horem, vývody horem, rozměry: 282x482x70mm, 2 řady, 24 DIN modulů, jmenovitý proud 25A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 6kA, kompletní dodávka se	ks	1,000	26 141,99	26 141,99	
0	M		019	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ Jednopolový vypínač 10A/230V, řazení 1, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	27,000	179,33	4 841,91	
0	M		020	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ, IP44 Jednopolový vypínač 10A/230V, řazení 1, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů), krytí IP44	ks	2,000	203,56	407,12	
0	M		021	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ZAPÍNAČÍ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU Tlačítkový ovladač zapínací 10A/230V s orientační doutnavkou 230V, řazení 1/0, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svisl	ks	20,000	226,45	4 529,00	
0	M		022	SÉRIOVÝ VYPÍNAČ Sériový vypínač 10A/230V, řazení 5, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	5,000	214,85	1 074,25	
0	M		023	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	14,000	184,36	2 581,04	
0	M		024	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, IP44 Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů), krytí IP44	ks	6,000	203,56	1 221,36	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	025	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ Křížový přepínač 10A/230V, řazení 7, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	2,000	222,45	444,90	
0	M	026	JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístř	ks	46,000	189,93	8 736,78	
0	M	027	JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP44 Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem, ochrannými clonkami a víčkem pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dl	ks	23,000	307,06	7 062,38	
0	M	028	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku	ks	25,000	481,58	12 039,50	
0	M	029	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pro PC, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku, vybaveny popisovým pol	ks	4,000	491,81	1 967,24	
0	M	030	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pro PC, z toho jedna vybavena vestavěným 3. st. přepětové ochrany se světelnou signalizací, pod omítk	ks	6,000	1 679,90	10 079,40	
0	M	031	BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČÍ TLAČÍTKO Bezpečnostní vypínací tlačítko v plastové skříni na povrch 120x120x50mm, ovládač nouzového zastavení krytý sklem průměru 22mm, po rozbití trvale sepnutý, odblokování pouze po výměně krycího skla, barva červená, osazen 1x spí	ks	1,000	835,26	835,26	
0	M	032	BEZPEČNOSTNÍ VYPÍNAČÍ TLAČÍTKO Hřibovité vypínací tlačítko v plastové skříni na povrch 68x68x91mm, ovládač nouzového zastavení s hřibovitým knoflíkem průměru 40mm, odblokování po zamáčknutí pootočením, barva červená, osazen 1x spínacím a 1x rozpínacím kon	ks	1,000	835,26	835,26	
0	M	033	TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 16A Zásuvka průmyslová třífázová 3P+N+PE 400V/32A, IP55, pod omítku s víčkem, kompletní	ks	3,000	277,11	831,33	
0	M	034	TŘÍFÁZOVÝ VYPÍNAČ 25A Spínač stiskací 400V v plastové skříni pod omítku se signalizační doutnavkou, jmenovitý proud 25A, součástí spínače svorky PE a N, barva bílá, IP55, vč. kompletního příslušenství pro montáž (upevňovací materiál, atd.)	ks	7,000	610,39	4 272,73	
0	M	035	TŘÍFÁZOVÝ VYPÍNAČ 40A Trojpólový otočný spínač 400V v plastové skříni na povrch, jmenovitý proud 40A pro AC-23A, součástí spínače svorky PE a N, IP65, vč. kompletního příslušenství pro montáž (upevňovací materiál, kabelové průchodky, atd.)	ks	2,000	1 184,11	2 368,22	
0	M	036	PŘÍPOJNICE POTENCIÁLOVÉHO VYROVNÁNÍ Přípojnice potenciálového vyrovnání pro vyrovnání potenciálů dle ČSN, na povrch, připojení 7x plný nebo laněný vodič 2,5-25mm2, 2x plný nebo laněný vodič 25-95mm2, 1x plochý vodič 30x3,5mm, svorkovnice 10x10mm z niklova	ks	1,000	4 152,96	4 152,96	
0	M	037	1-CYKY-J 5x70mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	21,000	713,47	14 982,87	
0	M	038	1-CYKY-J 5x16mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	15,000	194,07	2 911,05	
0	M	039	1-CYKY-J 5x10mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	15,000	126,84	1 902,60	
0	M	040	1-CYKY-J 5x6mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	83,000	87,77	7 284,91	
0	M	041	1-CYKY-J 5x4mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	80,000	64,67	5 173,60	
0	M	042	1-CYKY-J 5x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	162,000	43,31	7 016,22	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	043	1-CYKY-J 5x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	85,000	32,04	2 723,40	
0	M	044	1-CYKY-J 3x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá	m	1 550,000	31,83	49 336,50	
0	M	045	1-CYKY-J 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá	m	1 100,000	25,59	28 149,00	
0	M	046	1-CYKY-O 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, hnědá, šedá	m	690,000	25,59	17 657,10	
0	M	047	1-CXKH-V-O 3x1,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 HFFR vícežilový kabel s funkční integritou kabelové trasy, měděné jádro, přídatná izolace ze skloslídových pásek, izolace žil zesílená bezhalogenová izolace, HFFR výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil če	m	20,000	42,27	845,40	
0	M	048	H07V-K 1x4mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá	m	90,000	23,64	2 127,60	
0	M	049	H07V-K 1x6mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá	m	50,000	27,85	1 392,50	
0	M	050	H07V-K 1x10mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá	m	40,000	36,21	1 448,40	
0	M	051	H07V-K 1x25mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá	m	195,000	71,21	13 885,95	
0	M	052	1-YY 50mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá	m	23,000	135,94	3 126,62	
0	M	053	1-YY 70mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá	m	10,000	173,41	1 734,10	
0	M	054	JYTY 7x1,0mm2 Celoplastový vícežilový ovládací a signalizační kabel stíněný, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště	m	8,000	31,22	249,76	
0	M	055	H07RN-F 5x10mm2 Gumový vícežilový připojovací a ovládací kabel, měděné jádro z jemných drátků, gumová izolace jednotlivých žil, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	8,000	183,07	1 464,56	
0	M	056	H07RN-F 5x6mm2 Gumový vícežilový připojovací a ovládací kabel, měděné jádro z jemných drátků, gumová izolace jednotlivých žil, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	8,000	112,80	902,40	
0	M	057	H07RN-F 5x4mm2 Gumový vícežilový připojovací a ovládací kabel, měděné jádro z jemných drátků, gumová izolace jednotlivých žil, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	8,000	81,56	652,48	
0	M	058	H07RN-F 5x2,5mm2 Gumový vícežilový připojovací a ovládací kabel, měděné jádro z jemných drátků, gumová izolace jednotlivých žil, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	32,000	58,72	1 879,04	
0	M	059	H07RN-F 5x1,5mm2 Gumový vícežilový připojovací a ovládací kabel, měděné jádro z jemných drátků, gumová izolace jednotlivých žil, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	14,000	44,05	616,70	
0	M	060	UKONČENÍ KABELŮ Ukončení kabelů (kabelová oka, návlečky, izolace, atd.) - komplet	ks	1,000	4 666,25	4 666,25	
0	M	061	ZNAČENÍ KABELŮ Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového	ks	120,000	10,73	1 287,60	
0	M	062	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 500/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	6,000	553,60	3 321,60	
0	M	063	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 300/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	26,000	362,33	9 420,58	
0	M	064	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 200/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	15,000	293,54	4 403,10	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	065	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 100/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	50,000	228,86	11 443,00	
0	M	066	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 50/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	15,000	201,96	3 029,40	
0	M	067	PŘÍSTROJOVÉ KRABICE Elektroinstalační krabice pod omítku Č73x42, 66mm, do dutých přiček, univerzální, spojovatelné do souvislé řady, vč. veškerého příslušenství pro montáž	ks	220,000	69,40	15 268,00	
0	M	068	ROZVODNÉ KRABICE POD OMÍTKU Elektroinstalační krabice pod omítku Č73x42mm, do dutých přiček, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (víčko, trnů, atd.)	ks	55,000	160,02	8 801,10	
0	M	069	ROZVODNÉ KRABICE VELKÉ POD OMÍTKU Elektroinstalační krabice pod omítku Č103x50mm, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (víčko, trnů, atd.)	ks	30,000	162,95	4 888,50	
0	M	070	ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH Elektroinstalační krabice na povrch 85x85x40mm, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásy, atd.), krytí IP54	ks	80,000	94,87	7 589,60	
0	M	071	ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH VELKÉ Elektroinstalační krabice na povrch 105x105x40mm, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásy, atd.), krytí IP54	ks	45,000	103,47	4 656,15	
0	M	072	ROZVODNÉ KRABICE VELKÉ POD OMÍTKU PRO POSPOJENÍ Elektroinstalační krabice osazena pod omítku 114x114x57mm, rozvodná, vč. šroubových svorek 4 x 25mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (spojovací materiál, upevňovací materiál, atd.), např. OBO T60	ks	25,000	197,57	4 939,25	
0	M	073	ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH VELKÉ PRO POSPOJENÍ Elektroinstalační krabice na povrch 105x105x40mm, univerzální, vč. šroubových svorek 4 x 25mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásy, atd.), krytí IP54	ks	5,000	197,57	987,85	
0	M	074	OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 25 Ohebná trubka PVC průměru 25mm, bezhalogenové, samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)	m	170,000	46,97	7 984,90	
0	M	075	OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 32 Ohebná trubka PVC průměru 32mm, bezhalogenové, samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)	m	15,000	49,27	739,05	
0	M	076	OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 50 Ohebná trubka PVC průměru 50mm, bezhalogenové, samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)	m	25,000	71,51	1 787,75	
0	M	077	PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 40/20 Plastová vkladací lišta hranatá, rozměry 40x20mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž (kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, up	m	10,000	70,77	707,70	
0	M	078	PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 20/20 Plastová vkladací lišta hranatá, rozměry 20x20mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž (kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, up	m	20,000	59,78	1 195,60	
0	M	079	SVORKY K OCHRANNÉMU POSPOJOVÁNÍ Svorka k ochrannému pospojování kompletní vč. veškerého příslušenství	ks	15,000	562,19	8 432,85	
0	M	080	KABELOVÉ PŘÍCHYTKY Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky průměru max. 50mm s uchycením šroubem do betonu, vč. příslušenství pro montáž (vázací pásy dle průměru kabelových svazků, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)	ks	700,000	37,80	26 460,00	
0	M	081	KABELOVÉ PŘÍCHYTKY POŽÁRNĚ ODOLNÉ Kovové kabelové příchytky pro jeden požární kabel do průměru 15mm s uchycením šroubem do betonu s požární odolností P60-R, vč. příslušenství pro montáž (kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)	ks	45,000	19,32	869,40	

PČ Typ			Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	082		VÁZACÍ PÁSKY Plastová vázací páska pro vázání a uchycení kabelů, černá, délka 300mm, šířka 7,6mm, zatížitelnost 55kg	ks	300,000	2,43	729,00	
0	M	083		OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 110 Ohebná dvouplášťová kurugovaná chránička, vnější průměr 110mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, -45 - +60°C	m	40,000	79,03	3 161,20	
0	M	084		OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 40 Ohebná dvouplášťová kurugovaná chránička, vnější průměr 40mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, -45 - +60°C	m	7,000	40,32	282,24	
0	M	085		ZEMNÍ PÁSEK Zemnicí pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. svorek pro spojení dvou pásků, ochrany spojů proti korozi	m	110,000	69,99	7 698,90	
0	M	086		ZEMNÍ DRÁT Zemnicí drát FeZn průměru 10mm, pozinkovaný, potažený PVC	m	50,000	120,75	6 037,50	
0	M	087		DRÁT AlMgSi Drát AlMgSi průměru 8mm vč. podpěr svodového drátu na střeše pro daný typ střešní krytiny, kompletní vč. příslušenství pro montáž	m	225,000	81,43	18 321,75	
0	M	088		OCHRANÁ TRUBKA Ochranná trubka svodu u země před mechanickým poškozením, délka 1,7m, nerez	ks	8,000	419,50	3 356,00	
0	M	089		DRŽÁK OCHRANNÉ TRUBKY Držák ochranné trubky pro připevnění k objektu, nerez, délka a provedení dle stavby, kompletní	ks	16,000	167,52	2 680,32	
0	M	090		PODPĚRA SVODOVÉHO DRÁTU Podpěra svodového drátu do zdi, nerez, délka a provedení dle stavby, kompletní vč. příslušenství pro montáž	ks	160,000	97,62	15 619,20	
0	M	091		PODPĚRA SVODOVÉHO DRÁTU Podpěra svodového drátu na střeše, nerez, délka a provedení dle konkrétní střešní krytiny, kompletní vč. příslušenství pro montáž	ks	70,000	100,70	7 049,00	
0	M	092		JÍMACÍ TYČ Jímací tyč s rovným koncem AlMgSi, délka 1m vč. držáků a příslušenství pro montáž a připojení, kompletní	ks	3,000	630,04	1 890,12	
0	M	093		SPOJOVACÍ SVORKA Nerez Spojovací svorka pro spojení dvou vodičů, nerez	ks	26,000	63,83	1 659,58	
0	M	094		UNIVERZÁLNÍ SVORKA Nerez Univerzální svorka SU, SP, SK, SO, nerez	ks	55,000	75,13	4 132,15	
0	M	095		ZKUŠEBNÍ SVORKA SZ Zkušební svorka pro spojení nadzemních částí hromosvodu s uzemněním, nerez	ks	8,000	92,58	740,64	
0	M	096		SPOJOVACÍ SVORKA SR Spojovací svorka pro spojení pásek/vodič, pásek/pásek, pozinkovaná	ks	60,000	59,73	3 583,80	
0	M	097		OCHRANA PROTI KOROZI Ochrana podzemních částí a spojů uzemnění proti korozi	m2	1,000	296,31	296,31	
0	M	098		CENTRAL TEST NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ Centrál systému central test nouzového osvětlení WirelessControl, bezdrátový systém propojení svítidel, napájení ~230V, automaticky konfigurovatelná síť typu Ad-hoc, vzdálenost mezi svítidly max. 30m, max. počet svítidel	ks	1,000	11 617,74	11 617,74	
0	M	099		DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, hmoždinky, příchytka, atd - komplet	ks	1,000	4 666,25	4 666,25	
0	M	100		OCELOVÁ KONSTRUKCE Ocelová konstrukce všeobecně (závitové tyče, příčníky, výložníky, atd.)	kg	150,000	62,25	9 337,50	
0	M	101		POŽÁRNÍ UCPÁVKY Požární ucpávky kabelových tras při průchodu dělicími stěnami požárních úseků, provedení a materiál dle specifikace požární zprávy	m2	1,000	6 532,75	6 532,75	
0	M	102		OSTATNÍ Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, odstranění vad a nedodělků, atd.	hod.	50,000	326,64	16 332,00	
0	M	103		STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE Strojní sekání drážek pro kabelové trasy ve zděných konstrukcích, na betonových nosných prvcích ručně dle statického posouzení objektu, rozměry max. 100x40mm, prostupy stěnami a stropy, atd. - komplet	m	250,000	66,07	16 517,50	
0	M	104		LIKVIDACE Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet	ks	1,000	4 666,25	4 666,25	
0	M	105		ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o shodě, certifikáty, atd.	hod.	16,000	513,29	8 212,64	
0	K	109		MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů	ks	1,000	232 773,60	232 773,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.7 - MaR

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

295 028,74

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	295 028,74	21,00%	61 956,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

356 984,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.7 - MaR

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

295 028,74

1 - ROZVADĚČE -

65 686,75

2 - ČIDLA A POHONY

57 676,40

3 - KABELY ,KABELOVÉ TRASY

32 155,48

4 - OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE

79 935,92

5 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

59 574,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.7 - MaR

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

295 028,74

D		1	ROZVADĚČE -				65 686,75	
0	M	1-1	Rozváděč RMARB Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 600×1000×300 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň	ks	1,000	65 686,75	65 686,75	

D		2	ČIDLA A POHONY				57 676,40	
0	M	2-1	Venkovní teplotní čidlo Pt 1000, IP54, -40/+60°C,	ks	1,000	298,67	298,67	
0	M	2-2	Přepínač 1-0-A se signálkou na rozvaděči	ks	6,000	1 171,91	7 031,46	
0	M	2-3	Ovládací tlačítko se signálkou na rozvaděči	ks	1,000	879,81	879,81	
0	M	2-4	Servisní vypínač jednofázový na omítku , 16A s možností uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný kontakt	ks	6,000	879,81	5 278,86	
0	M	2-5	Regulátor radiátorového topení 1xSSR, komunikativní, displej 60 x 60 mm, otoč. knoflík s tlačítkem, měření teploty, nastav. hodnot, hodiny, týdenní program, přepínání a indikace stavů, 1 x DO triak 24 V st pro term. ventil topení, kom. Modbus / RS485	ks	8,000	3 137,41	25 099,28	
0	M	2-6	Termoelektrická hlavice low current 24VAC, NC, M30x1,5 Převedeno do souhrnu	ks	16,000	1 193,02	19 088,32	

D		3	KABELY ,KABELOVÉ TRASY				32 155,48	
0	M	3-1	Kabel JYTY J-Y(St)Y 1x2x0,8	m	485,000	5,77	2 798,45	
0	M	3-2	Kabel JYTY J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	170,000	8,20	1 394,00	
0	M	3-3	Kabel Ethernet cat 5E	m	80,000	6,77	541,60	
0	M	3-4	Kabel 1-CYKY-J 5x1,5mm2	m	10,000	17,14	171,40	
0	M	3-5	Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2	m	265,000	10,38	2 750,70	
0	M	3-6	Kabel 1-CYKY-O 3x1,5mm2	m	160,000	10,38	1 660,80	
0	M	3-7	Kabel 1-CYKY-O 3x2,5mm2	m	60,000	16,92	1 015,20	
0	M	3-8	Kabel CY6mm2	m	80,000	12,92	1 033,60	
0	M	3-9	Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž (konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd.)	m	60,000	221,36	13 281,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	3-10	Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná, vč. příchytěk a montážního příslušenství	m	60,000	25,81	1 548,60	
0	M	3-11	Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, ohebná, vč. příchytěk a montážního příslušenství	m	90,000	14,08	1 267,20	
0	M	3-12	Požární ucpávky komplet	ks	1,000	2 932,71	2 932,71	
0	M	3-13	Ocelové nosné konstrukce Převedeno do souhrnu	ks	1,000	1 759,62	1 759,62	

D 4 OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE 79 935,92

0	M	4-1	Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál	ks	1,000	12 584,83	12 584,83	
0	K	4-2	Montáž, kompletace, oživení	ks	1,000	55 033,72	55 033,72	
0	K	4-3	Stavební přípomocné práce, stavební připravenost	ks	1,000	2 932,71	2 932,71	
0	M	4-4	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál Převedeno do souhrnu	ks	1,000	9 384,66	9 384,66	

D 5 INŽENÝRSKÁ ČINNOST 59 574,19

0	K	5-4	Provozní zkoušky	ks	1,000	5 750,40	5 750,40	
0	K	5-5	Výchozí revize elektro	ks	1,000	7 360,52	7 360,52	
0	K	5-6	Software pro DDC a PLC regulátory	ks	1,000	23 001,62	23 001,62	
0	K	5-7	Oživení systému	ks	1,000	16 101,13	16 101,13	
0	K	5-8	Zaučení obsluhy Převedeno do souhrnu	ks	1,000	7 360,52	7 360,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.8 - Gastro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 777 857,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 777 857,81	21,00%	583 350,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 361 207,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.8 - Gastro

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 777 857,81

D1 - Pavilon H - 1.NP

574 260,10

A - Sklad špinavého prádla

364 678,73

B - Příjem a suchý sklad

29 858,48

C - Sklad odpadků

25 008,31

D - Sklad inventáře

19 884,50

E - Hrubá příprava zeleniny

134 830,08

D2 - Pavilon H - 2.NP

2 203 597,71

Ea - Úklidová komora

12 159,14

F - Chlazené potraviny

293 100,08

G - Příprava masa

102 480,14

H - Příprava těsta

132 267,23

I - Příprava zeleniny a studená kuchyně

227 850,05

J - Varna

1 327 720,73

K - Porcování a rozvoz jídel

36 100,64

L - Mytí provozního nádobí

71 919,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.8 - Gastro

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 777 857,81

D D1 Pavilon H - 1.NP

574 260,10

D A Sklad špinavého prádla

364 678,73

0	K	A1	Profesionální pračka, kapacita 8 litrů, verze pro samoobslužné prádelny, barevný displej, 26 přednastavených programů, komunika přes USB, Funkce WET Cleaning možnost editovat, kompletní proces ukládán do paměti (teploty výšky hladiny), oplastění "skinplat	ks	2,000	138 092,98	276 185,96	
0	K	A2	Profesionální sušička, kapacita 10 kg, verze pro samoobslužné prádelny, Robustní hliníkové dveře s velkým průměrem, široký filr v bukbu nikoli ve dveřích, objem bubnu 160 l, elektronické ovládání, 680x775x1040 7,2kW/400V	ks	1,000	79 323,85	79 323,85	
0	K	A3	Dvoupatrová police, nerezové provedení 1900x350	ks	1,000	9 168,92	9 168,92	

D B Příjem a suchý sklad

29 858,48

0	K	B1	Skladový regál, montovaný, 4x plná police, výškově stavitelné police, provedení polic komaxit, provedení stojen komaxit 1350x500x2000	ks	4,000	5 028,63	20 114,52	
0	K	B2	Váha můstková s LCD displejem, váživost: 30/60 (dílek 10/20), rozměr vážní plochy: 360 x 460 mm, provedení: vážní plocha – nerez, konstrukce – ocel, krytí proti vodě a prachu: IP-54, certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření, displej: LCD, napájení:	ks	1,000	9 743,96	9 743,96	

D C Sklad odpadků

25 008,31

0	K	C1	Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, bílá, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění odpadků 600x600x845 0,	ks	1,000	12 734,17	12 734,17	
0	K	C2	Podlahová vpusť, s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení do kanalizace 500x500	ks	1,000	9 398,94	9 398,94	
0	K	C3	Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby	ks	1,000	2 875,20	2 875,20	

D D Sklad inventáře

19 884,50

0	K	D1	Skladový regál, montovaný, 4x plná police, výškově stavitelné police, provedení polic komaxit, provedení stojen komaxit 1500x500x2000	ks	1,000	5 258,65	5 258,65	
---	---	----	---	----	-------	----------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	D2	Skladový regál, montovaný, 4x plná police, výškově stavitelné police, provedení polic komaxit, provedení stojen komaxit 900x500x2000	ks	1,000	4 798,61	4 798,61	
0	K	D3	Skladový regál, montovaný, 4x plná police, výškově stavitelné police, provedení polic komaxit, provedení stojen komaxit 1000x500x2000	ks	2,000	4 913,62	9 827,24	

D E Hrubá příprava zeleniny 134 830,08

0	K	E1	Profesionální chladnička, čistý objem 570 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř, vnitřní prostor vhodný pro gastronádoby GN 2/1 nebo přepravky 600x400mm, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výš	ks	1,000	23 084,90	23 084,90	
0	K	E2	Pracovní stůl, 1x plná police, zadní lem, výškově nastavitelné nožičky, nerezové provedení 1350x700x850	ks	1,000	10 779,03	10 779,03	
0	K	E3	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 600x500x300mm, 1x otvor pro stojánkou tlakovou sprchu, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní, levý lem, výškově nastavitelné nožičky 800x700x850	ks	1,000	15 011,33	15 011,33	
0	K	E4	Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby 0	ks	1,000	2 875,20	2 875,20	
0	K	E5	Škrabka brambor a kořenové zeleniny, nerezové opláštění, objem jedné náplně 12kg brambor, teoretická kapacita cca 200kg brambor / 1 hod. 700x850x700 0,55kW/400V	ks	1,000	44 131,38	44 131,38	
0	K	E6	Lapač škrobu a slupek, ke škrabce, celonerezové provedení, plně kompatibilní se škrabkou brambor 320x320x320	ks	1,000	6 523,73	6 523,73	
0	K	E7	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímátného roštu, vývod pro připojení do kanalizace 350x350	ks	2,000	7 098,77	14 197,54	
0	K	E8	Plošinový vozík, 4x kolečko, každé kolečko o průměru 100mm (2x opatřeno brzdou), madlo na kratší straně, nerezové provedení 800x600x850	ks	1,000	8 938,90	8 938,90	
0	K	E9	Dřevěný rošt na uskladnění brambor, vč. dřevěného obložení stěn 1800x1000x70	ks	1,000	3 648,53	3 648,53	
0	K	E10	Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby	ks	1,000	5 639,54	5 639,54	

D D2 Pavilon H - 2.NP 2 203 597,71

D Ea Úklidová komora 12 159,14

0	K	Ea1	Skladový regál, montovaný, 4x plná police, výškově stavitelné police, provedení polic komaxit, provedení stojen komaxit 600x500x2000		1,000	4 683,61	4 683,61	
0	K	Ea2	Keramická výlevka - dodávka stavby		1,000	7 475,53	7 475,53	

D F Chlazené potraviny 293 100,08

0	K	F1	Profesionální mraznička, objem 570 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř, 1x plné dveře, ventilované chlazení, 4x nastavitelné roštové police, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C, mraznička určena k uskladnění		1,000	24 234,98	24 234,98	
0	K	F2	Profesionální mraznička, objem 570 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř, 1x plné dveře, ventilované chlazení, 4x nastavitelné roštové police, digitální termostat, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -10°C až -25°C, mraznička určena k uskladnění		1,000	24 234,98	24 234,98	
0	K	F3	Profesionální chladnička, objem 570 lt, celonerezové provedení - vně i uvnitř, vnitřní prostor vhodný pro gastronádoby GN 2/1 nebo přepravky 600x400mm, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, 4x výškově n		1,000	23 084,90	23 084,90	
0	K	F4	Profesionální chladnička, objem 340 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění vajec 600x600x1850		1,000	21 129,76	21 129,76	
0	K	F5	Servírovací dvoupatrový vozík, 4x kolečko, každé kolečko o průměru 100mm (2x opatřeno brzdou), madlo na kratší straně, nerezové provedení 700x400x850		1,000	8 018,84	8 018,84	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	F6	Chlazený stavebnicový box, systém spojování zámkový - pero / drážka, účinná polyuretanová izolace zaručující nízkou spotřebu el. energie, šíře izolace min. 75mm, vč. nerezové podlahy, 1x křídlové dveře , rozměr dveří 800x1800mm, 1960x1960x2200		1,000	103 360,54	103 360,54	
0	K	F7	Chladicí jednotka splitová, oddělená řídicí jednotka, nutnost připojení na odpad, ovládání osvětlení na řídicí jednotce, rozsah teplot +5°C až -5°C 960x490x470 1,09kW/230V		1,000	63 567,74	63 567,74	
0	K	F8	Skladový regál, 4x plná police, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, nostnost jedné police min. 50 kg, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky 1750x500x1800		1,000	12 734,17	12 734,17	
0	K	F9	Skladový regál, 4x plná police, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, nostnost jedné police min. 50 kg, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky 1750x450x1800		1,000	12 734,17	12 734,17	

D G Příprava masa 102 480,14

0	K	G1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x250mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, kapotáž dřezu z čela a obou boků, zadní a levý lem, výškově nastavitelné nožičky 800x700x850		1,000	11 584,09	11 584,09	
0	K	G2	Nástěnná vodovodní baterie - dodávka stavby		1,000	2 875,20	2 875,20	
0	K	G3	Pracovní stůl, skřínový - opláštěné oba boky + oláštěná záda, z čela stůl přístupný formou posuvných dveří, vpravo ve spodním prostoru umístěn zásuvkový blok obsahující 3ks výsuvných zásuvek, vlevo v uzavřeném prostoru 2x plná police, zadní lem, nerezové		1,000	32 860,59	32 860,59	
0	K	G4	Dřevěná masodeska, stolní 600x400x100		1,000	3 993,56	3 993,56	
0	K	G5	Nástěnná skříňka, uzavřená, 1x plná police, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříňka přístupná formou posuvných dveří, nerezové provedení 1650x350x600		1,000	14 804,32	14 804,32	
0	K	G6	Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610		1,000	4 913,62	4 913,62	
0	K	G7	Základní příslušenství k robotu na pozici H6 - sada obsahuje: 1x šlehací metlu, 1x míchač, 1x hnětací hák, 1x kotlík o objemu 24 litrů		1,000	18 944,61	18 944,61	
0	K	G8	Mlýnek na maso, případný, kompatibilní s robotem na pozici H6		1,000	12 504,15	12 504,15	

D H Příprava těsta 132 267,23

0	K	H1	Nerezová kombinovaná výlevka, rozměr výlevky 400x400x200, rozměr umyvadla 440x280x140 500x700x850		1,000	15 839,39	15 839,39	
0	K	H2	Stojánková vodovodní baterie, hygienické pákové loketní ovládání "CLINIC"		1,000	6 868,76	6 868,76	
0	K	H3	Pracovní stůl, dřevěná (buková) pracovní deska, 1x plná police, pod pracovní deskou umístěna 2x výsuvná zásuvka, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem 1400x700x850		1,000	15 034,33	15 034,33	
0	K	H4	Nástěnná skříňka, uzavřená, 1x plná police, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříňka přístupná formou posuvných dveří, nerezové provedení 800x350x600		1,000	12 159,13	12 159,13	
0	K	H5	Pracovní stůl, 2x plná police, dřevěná (buková) pracovní deska, výškově nastavitelné nožičky, zadní lem - DOMĚREK 1500x700x850 DOĚMREK		1,000	11 814,11	11 814,11	
0	K	H6	Univerzální kuchyňský robot, objem nádoby 24 lt, 3x volitelné rychlosti otáček - 108 / 183 / 352 otáček / min., možnost přípojných strojků, total stop tlačítko, součástí robota odnímatelná nerezová nádoba o objemu 24 lt, vč. nástavce na míchání, hnětání a		1,000	58 737,40	58 737,40	
0	K	H7	Nástěnná skříňka, otevřená, 1x plná police, opláštěné oba boky, opláštěná záda, nerezové provedení 800x350x600		1,000	11 814,11	11 814,11	

D I Příprava zeleniny a studená kuchyně 227 850,05

0	K	I1	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 500x500x250mm, 1x otvor pro stojánkovou vodovodní baterii, zadní lem, výškově nastavitelné nožičky 800x700x850		1,000	11 584,09	11 584,09	
0	K	I2	Stojánková, vodovodní baterie, pákové ovládání		1,000	3 533,52	3 533,52	
0	K	I3	Pracovní stůl, skřínový - opláštěné oba boky + oláštěná záda, z čela stůl přístupný formou posuvných dveří, 2x plná police, zadní lem, nerezové provedení 1750x700x850		1,000	21 934,82	21 934,82	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	I4	Krouhač zeleniny, teoretický výkon cca 200 kg / 1 hod., kapacita 20 - 300 porcí, indukční motor, asynchronní motor, nerezová hřídel, magnetický bezpečnostní systém, kdy brzda motoru zastaví zařízení při otevření víka nebo při zvednutí přítlačné páky, auto		1,000	38 495,98	38 495,98	
0	K	I5	Sada 6 disků ke krouhači zeleniny - sada obsahuje : 1x plátkovač 2mm, 1x plátkovač 4mm, 1x strouhač 1,5mm, 1x nudličkovač 4x4mm, 1x kostičkovač 14x14x14mm		1,000	18 484,57	18 484,57	
0	K	I6	Chlazený stůl dvousekcový, první sekce vybavena dvěma výsuvnými zásuvkami, druhá sekce vybavena dvěma výsuvnými zásuvkami, celkem tak 4x výsuvná zásuvka, objem 290 litrů, nerezové provedení, perforované koše zásuvek z nerezové oceli pro velikost GN 1/1, c		1,000	55 057,15	55 057,15	
0	K	I7	Pracovní stůl, pod pracovní deskou umístěna 2x výsuvná zásuvka, spodní prostor uzavřený - opláštěné oba boky + opláštěná záda, zepředu stůl přístupný formou posuvných dvířek, 1x spodní police - dno, zadní lem, výškově nastavitelné nožičky, přesah pracovní		1,000	20 347,71	20 347,71	
0	K	I8	Nástěnná skříňka, uzavřená, 1x plná police, opláštěné oba boky, opláštěná záda, z čela skříňka přístupná formou posuvných dveří, nerezové provedení 1200x350x600		1,000	13 079,20	13 079,20	
0	K	I9	Profesionální chladnička, objem 340 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění tuků a mléčných vý		1,000	21 129,76	21 129,76	
0	K	I10	Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610		1,000	4 913,62	4 913,62	
0	K	I11	Nářezový stroj, průměr nože 250mm, tlakový odlitek z hliníkové slitiny, šnekový převod, speciální antiadhezní úprava nože, řezný stůl uložen šikmo 425x525x380 0,2kW/230V		1,000	19 289,63	19 289,63	

D		J	Varna	1 327 720,73				
0	K	J1	Konvektomat elektrický, bojlerový generátor páry - bojlerový způsob vývinu páry (!!!), kapacita min. 11x GN 1/1, volba z režimů : horký vzduch 30 až 300°C, pára 30 až 130°C, příčné zásuvy - délka zásuvy max. 350mm!!!, regenerace pokrmů, nízkoteplotní vař		1,000	264 946,90	264 946,90	
0	K	J2	Podstavec pod konvektomat, celonerezové provedení, 2x sloupec zásuvů pro GN 1/1, plné kompatibilní s konvektomatem na poz. J1 dle konvektomatu		1,000	10 664,03	10 664,03	
0	K	J3	Elektrická multifunkční pánve, objem pánve 2x40 lt, kapacita vany 2x GN 1/1, rozměr dna 2x 375x580 mm, hloubka vany 220mm, užitná plocha 2x 22 dm2, pánve umožňuje vaření, intenzivní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, re		1,000	562 587,81	562 587,81	
0	K	J4	Příslušenství k multifunkční pánvi - rameno pro zvedání a spouštění košů		1,000	8 823,90	8 823,90	
0	K	J5	Příslušenství k multifunkční pánvi - varný koš		1,000	8 823,90	8 823,90	
0	K	J6	Příslušenství k multifunkční pánvi - fritovací koš		1,000	8 823,90	8 823,90	
0	K	J7	Příslušenství k multifunkční pánvi - špachtle		1,000	4 223,57	4 223,57	
0	K	J8	Příslušenství k multifunkční pánvi - rošt na dno pánve		2,000	3 303,51	6 607,02	
0	K	J9	Příslušenství k multifunkční pánvi - síto		1,000	4 223,57	4 223,57	
0	K	J10	Příslušenství k multifunkční pánvi - čistící houba SCOTCHBRICK na pánve		1,000	2 383,44	2 383,44	
0	K	J11	Pracovní stůl s policí, 1x plná police, nerezové provedení, zadní lem 800x850x900		1,000	8 938,90	8 938,90	
0	K	J12	Profesionální indukční sporák, provedení sporáku 4 plotýnkové, 4x čvercová zóna, každá zóna o výkonu 3,5kW, každá zóna o velikosti 230x230mm, vč. celonerezového podstavce - opláštěné oba boky podstavce a záda, 1x plná police, stejný vzhled jako ostatní		1,000	269 317,20	269 317,20	
0	K	J13	Neutrální pracovní plocha, nerezové provedení, vč. nerezového podstavce, stejný vzhled jako ostatní modulové prvky na poz. J12 a J14 800x700x900		1,000	22 854,88	22 854,88	
0	K	J14	Elektrický dvouplášťový kotel, nepřímý ohřev, objem 55 litrů, ovládání výkonu pomocí termostatu, nerezové provedení, nádoba kotle vyrobena z nerezové oceli AISI 316 se zesíleným dnem 20/10, stejný vzhled jako ostatní modulové prvky na poz. J12 a J13 800x700		1,000	134 527,73	134 527,73	
0	K	J15	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení do kanalizace 800x400		1,000	9 973,98	9 973,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D K			Porcování a rozvoz jíel				36 100,64	
0	K	K1	Pracovní stůl s policí, 1x plná police, nerezové provedení, zadní lem 1050x500x850		2,000	8 708,89	17 417,78	
0	K	K2	Nástěnná police jednopatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1050x350		1,000	12 504,15	12 504,15	
0	K	K3	Nástěnné nerezové umyvadlo s kolením ovládáním, nastavení teploty pomocí směšovacího ventilu, včetně zpětných klapek pod umyvadlem 400x400x230		1,000	6 178,71	6 178,71	
D L			Mytí provozního nádobí				71 919,70	
0	K	L1	Mycí stůl s lisovaným dřezem, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 800x500x375 mm, 1x otvor pro tlakovou sprchu, prolamovaná deska, zadní a levý lem, nerezové provedení 2000x700x850		1,000	22 509,86	22 509,86	
0	K	L2	Sprcha s baterií ze stolu a s napouštěcím ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 150x200x1100		1,000	6 178,71	6 178,71	
0	K	L3	Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610		1,000	4 913,62	4 913,62	
0	K	L4	Podlahová vpust', s protizápachovou uzávěrou k zalití do podlahy, vč. pochůzného podlahového vyjímatelného roštu, vývod pro připojení do kanalizace 300x300		1,000	6 523,73	6 523,73	
0	K	L5	Skladový regál, 4x plná police, tuhá, pevná, svařovaná konstrukce, nostnost jedné police min. 50 kg, celonerezové provedení, výškově stavitelné nožičky, DOMĚREK 2000x600x1800 DOMĚREK		1,000	15 609,37	15 609,37	
0	K	L6	Zmrazovací vlna pro myčku nádobí, konvektomat, provedení automatické s objemovým řízením - ne časovým !!!, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 10 lt, nastavení regenerace v rozsahu 0 až 99 m3		1,000	16 184,41	16 184,41	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 356 411,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 356 411,34	21,00%	494 846,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 851 257,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 356 411,34

HSV - Práce a dodávky HSV

2 356 411,34

1 - Zemní práce

422 316,97

5 - Komunikace pozemní

1 332 016,25

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

207 928,25

997 - Přesun sutě

343 856,99

998 - Přesun hmot

50 292,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 356 411,34

D HSV Práce a dodávky HSV

2 356 411,34

D 1 Zemní práce

422 316,97

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	30,000	57,50	1 725,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	113107164	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	170,000	103,51	17 596,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		stávající vozovka					
	VV		170,0		170,000			
	VV		Součet		170,000			
3	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	170,000	143,76	24 439,20	CS ÚRS 2020 02
4	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 200 m2	m2	462,000	51,75	23 908,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		stávající chodník					
	VV		462,0		462,000			
	VV		Součet		462,000			
5	K	113107242	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	462,000	97,76	45 165,12	CS ÚRS 2020 02
6	K	113154111	Frézování živičného krytu tl 30 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	462,000	57,50	26 565,00	CS ÚRS 2020 02
7	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	170,000	115,01	19 551,70	CS ÚRS 2020 02
8	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	120,000	138,01	16 561,20	CS ÚRS 2020 02
9	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	257,310	163,89	42 170,54	CS ÚRS 2020 02
	VV		odkopávky pro nové povrchy					
	VV		(377,0+75)*0,43		194,360			
	VV		19,0*0,30		5,700			
	VV		(226,0+3,0)*0,25		57,250			
	VV		Součet		257,310			
11	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	257,310	299,02	76 940,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečný výkopek na skládku					
	VV		257,31		257,310			
	VV		Součet		257,310			
12	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 286,550	13,80	17 754,39	CS ÚRS 2020 02
	VV		257,31*5 "Přepočtené koeficientem množství"		1 286,550			
13	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	411,696	253,02	104 167,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		257,310*1,60		411,696			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		411,696			
50	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	257,310	22,43	5 771,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečný výkopek na skládku					
	VV		257,31		257,310			
D	5		Komunikace pozemní				1 332 016,25	
14	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 120 mm 0/63	m2	462,000	141,46	65 354,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		oprava chodníku					
	VV		462,0		462,000			
15	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0/32	m2	1 053,000	172,51	181 653,03	CS ÚRS 2020 02
	VV		konstrukce vozoký+parkovací plocha					
	VV		(337,0+75,0)*2		824,000			
	VV		chodník					
	VV		226,0		226,000			
	VV		varovný pás					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		1 053,000			
16	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	19,000	230,02	4 370,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		chodníkový přejezd					
	VV		19,0		19,000			
	VV		Součet		19,000			
17	K	56487111R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl. 350 mm 0/63	m2	170,000	356,53	60 610,10	
	VV		oprava vozovky					
	VV		170,0		170,000			
	VV		Součet		170,000			
18	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	19,000	143,76	2 731,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		chodníkový přejezd					
	VV		19,0		19,000			
	VV		Součet		19,000			
19	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	170,000	431,28	73 317,60	CS ÚRS 2020 02
20	K	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š do 3 m	m2	462,000	561,24	259 292,88	CS ÚRS 2020 02
21	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	651,000	28,75	18 716,25	CS ÚRS 2020 02
	VV		obnova stáv. komunikací					
	VV		170,0+462,0		632,000			
	VV		chodníkový přejezd					
	VV		19,0		19,000			
	VV		Součet		651,000			
22	K	577123111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	462,000	264,52	122 208,24	CS ÚRS 2020 02
23	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	170,000	316,27	53 765,90	CS ÚRS 2020 02
24	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	19,000	575,04	10 925,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		chodníkový přejezd					
	VV		19,0		19,000			
	VV		Součet		19,000			
25	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	60,000	644,05	38 643,00	CS ÚRS 2020 02
26	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	61,200	603,79	36 951,95	CS ÚRS 2020 02
	VV		60*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		61,200			
27	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	3,000	322,02	966,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		varovný pás					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
28	M	59245019	dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní	m2	3,000	517,54	1 552,62	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	226,000	293,27	66 279,02	CS ÚRS 2020 02
	VV		chodník					
	VV		226,0		226,000			
	VV		Součet		226,000			
30	M	5924501R	dlažba zámková tl. 60 mm	m2	226,000	322,02	72 776,52	
31	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	75,000	293,27	21 995,25	CS ÚRS 2020 02
	VV		parkovací plocha					
	VV		75,0		75,000			
	VV		Součet		75,000			
32	M	5924509R	dlažba zámková tl. 80 mm	m2	75,000	356,53	26 739,75	
33	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	337,000	293,27	98 831,99	CS ÚRS 2020 02
	VV		vozovka					
	VV		337,0		337,000			
	VV		Součet		337,000			
34	M	5924509R	dlažba zámková tl. 80 mm	m2	337,000	339,27	114 333,99	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							207 928,25	
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	155,000	391,03	60 609,65	CS ÚRS 2020 02
36	M	59217034	obrubník betonový silniční 1000x150x300mm	m	155,000	189,76	29 412,80	CS ÚRS 2020 02
37	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,000	350,77	30 867,76	CS ÚRS 2020 02
38	M	59217016	obrubník betonový chodnikový 1000x80x250mm	m	88,000	126,51	11 132,88	CS ÚRS 2020 02
39	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	442,78	53 133,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		stávající obruba - 10% náhrada					
	VV		120,0		120,000			
	VV		Součet		120,000			
40	M	58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm	m	12,000	1 897,63	22 771,56	CS ÚRS 2020 02
D 997 Přesun sutě							343 856,99	
41	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	424,704	92,01	39 077,02	CS ÚRS 2020 02
	VV		435,954-11,25		424,704			
	VV		Součet		424,704			
42	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	5 945,856	9,20	54 701,88	CS ÚRS 2020 02
	VV		424,704*14 "Přepočtené koeficientem množství		5 945,856			
43	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	11,250	172,51	1 940,74	CS ÚRS 2020 02
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	157,500	9,20	1 449,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		11,25*14 "Přepočtené koeficientem množství		157,500			
45	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	435,954	109,26	47 632,33	CS ÚRS 2020 02
46	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	11,250	218,52	2 458,35	CS ÚRS 2020 02
47	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	192,124	661,30	127 051,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		37,40+101,64+35,574+17,51		192,124			
	VV		Součet		192,124			
48	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	232,580	299,02	69 546,07	CS ÚRS 2020 02
	VV		98,6+133,98		232,580			
	VV		Součet		232,580			
D 998 Přesun hmot							50 292,88	
49	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	291,536	172,51	50 292,88	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 05 - Venkovní kanalizace - přípojka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

289 569,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	289 569,00	21,00%	60 809,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

350 378,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 05 - Venkovní kanalizace - přípojka

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

289 569,00

HSV - Práce a dodávky HSV

258 694,34

1 - Zemní práce

50 823,31

8 - Trubní vedení

196 017,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 312,20

997 - Přesun sutě

1,28

998 - Přesun hmot

7 539,69

PSV - Práce a dodávky PSV

18 511,41

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 210,66

767 - Konstrukce zámečnické

2 300,75

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

12 363,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 05 - Venkovní kanalizace - přípojka

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

289 569,00

D HSV

Práce a dodávky HSV

258 694,34

D 1

Zemní práce

50 823,31

1	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	427,72	8 554,40	CS ÚRS 2020 02
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,000	507,65	1 015,30	CS ÚRS 2020 02
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,000	2 211,26	4 422,52	CS ÚRS 2020 02
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	2 134,20	12 805,20	CS ÚRS 2020 02
5	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000	2 189,06	2 189,06	CS ÚRS 2020 02
6	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000	566,41	566,41	CS ÚRS 2020 02
7	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	5,000	2 602,75	13 013,75	CS ÚRS 2020 02
8	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	5,000	686,37	3 431,85	CS ÚRS 2020 02
9	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000	34,62	692,40	CS ÚRS 2020 02
10	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000	18,86	377,20	CS ÚRS 2020 02
11	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	6,000	423,69	2 542,14	CS ÚRS 2020 02
12	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	6,000	202,18	1 213,08	CS ÚRS 2020 02

D 8

Trubní vedení

196 017,86

13	K	831263195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN 100 až 300	kus	1,000	1 185,16	1 185,16	CS ÚRS 2020 02
14	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200	m	11,500	3 866,57	44 465,56	CS ÚRS 2020 02
15	M	59710704	trouba kameninová glazovaná pouze uvnitř DN 200mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	11,673	831,51	9 706,22	CS ÚRS 2020 02
	vv		11,5*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		11,673			
	vv		Součet		11,673			
16	K	831372121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300	m	3,000	728,00	2 184,00	CS ÚRS 2020 02
17	M	59710707	trouba kameninová glazovaná DN 300mm L2,50m spojovací systém C Třída 240	m	3,045	2 241,85	6 826,43	CS ÚRS 2020 02
	vv		3*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		3,045			
	vv		Součet		3,045			
18	K	837371221	Montáž kameninových tvarovek odbočných s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	kus	1,000	561,35	561,35	CS ÚRS 2020 02
19	M	59711774	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 300/200 L60cm spojovací systém C/F tř.240/160	kus	1,000	2 688,54	2 688,54	CS ÚRS 2020 02
	vv		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			1,000			
20	K	850375921	Výřez nebo výsek na potrubí DN 300 při opravách	kus	1,000	8 739,92	8 739,92	CS ÚRS 2020 02
21	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	18 187,72	18 187,72	CS ÚRS 2020 02
22	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	1,000	16 321,72	16 321,72	CS ÚRS 2020 02
VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			1,000			
VV		Součet			1,000			
23	M	59224072	skruž betonová DN 1000x250 přechodová, 100x25x9 cm	kus	1,000	1 047,38	1 047,38	CS ÚRS 2020 02
VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			1,000			
VV		Součet			1,000			
24	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	2,000	4 076,12	8 152,24	CS ÚRS 2020 02
VV		1,97044334975369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			2,000			
VV		Součet			2,000			
25	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	1,000	2 324,66	2 324,66	CS ÚRS 2020 02
VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			1,000			
VV		Součet			1,000			
26	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	1,000	2 528,80	2 528,80	CS ÚRS 2020 02
VV		0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			1,000			
VV		Součet			1,000			
27	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	513,05	1 026,10	CS ÚRS 2020 02
VV		1,97044334975369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			2,000			
VV		Součet			2,000			
28	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	438,18	876,36	CS ÚRS 2020 02
VV		1,97044334975369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství			2,000			
VV		Součet			2,000			
29	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	68 163,34	68 163,34	CS ÚRS 2020 02
30	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	12,000	86,03	1 032,36	CS ÚRS 2020 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 312,20	
31	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	173,43	1 734,30	CS ÚRS 2020 02
32	K	977131210	Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	5,000	515,58	2 577,90	CS ÚRS 2020 02
D		997	Přesun sutě				1,28	
33	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,005	118,80	0,59	CS ÚRS 2020 02
34	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,005	138,35	0,69	CS ÚRS 2020 02
D		998	Přesun hmot				7 539,69	
35	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	8,795	617,71	5 432,76	CS ÚRS 2020 02
36	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	8,795	239,56	2 106,93	CS ÚRS 2020 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV				18 511,41	
D		721	Zdravoteknika - vnitřní kanalizace				16 210,66	
37	K	721110946	Potrubí kameninové výměna dílu DN 300	kus	1,000	1 954,68	1 954,68	CS ÚRS 2020 02
38	K	721110956	Potrubí kameninové vsazení odbočky DN 300	kus	1,000	9 295,18	9 295,18	CS ÚRS 2020 02
39	K	721110966	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 300	kus	2,000	1 816,67	3 633,34	CS ÚRS 2020 02
40	K	721110976	Potrubí kameninové krácení trub DN 300	kus	2,000	263,25	526,50	CS ÚRS 2020 02
41	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	12,000	43,24	518,88	CS ÚRS 2020 02
42	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,183	990,79	181,31	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,183	550,66	100,77	CS ÚRS 2020 02
D 767 Konstrukce zámečnické							2 300,75	
44	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	5,000	460,15	2 300,75	CS ÚRS 2020 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							12 363,25	
45	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	15,000	494,53	7 417,95	CS ÚRS 2020 02
46	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	10,000	494,53	4 945,30	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 05 - Venkovní kanalizace - přípojka

Soupis:

SO 05.1 - Venkovní kanalizace - přípojka - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

286 668,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	286 668,86	21,00%	60 200,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

346 869,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 05 - Venkovní kanalizace - přípojka

Soupis:

SO 05.1 - Venkovní kanalizace - přípojka - zemní práce

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

286 668,86

HSV - Práce a dodávky HSV

258 593,45

1 - Zemní práce

214 071,79

2 - Zakládání

601,83

5 - Komunikace pozemní

26 998,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 829,44

997 - Přesun sutě

7 629,37

998 - Přesun hmot

7 462,51

PSV - Práce a dodávky PSV

1 370,79

767 - Konstrukce zámečnické

1 370,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

26 704,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt: SO 05 - Venkovní kanalizace - přípojka

Soupis: SO 05.1 - Venkovní kanalizace - přípojka - zemní práce

Místo:

Zadavatel:ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Uchazeč:GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Datum:20.01.2021

Projektant:D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

286 668,86

DHSVPráce a dodávky HSV

258 593,45

D1Zemní práce

214 071,79

1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	12,750	218,17	2 781,67	CS ÚRS 2020 02
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	12,750	181,02	2 308,01	CS ÚRS 2020 02
3	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	12,750	137,09	1 747,90	CS ÚRS 2020 02
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	2,000	151,81	303,62	CS ÚRS 2020 02
5	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	8,000	427,72	3 421,76	CS ÚRS 2020 02
6	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	40,000	34,62	1 384,80	CS ÚRS 2020 02
7	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	40,000	18,86	754,40	CS ÚRS 2020 02
8	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000	423,69	8 473,80	CS ÚRS 2020 02
9	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000	202,18	4 043,60	CS ÚRS 2020 02
10	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	18,800	209,77	3 943,68	CS ÚRS 2020 02
12	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	63,480	648,30	41 154,08	CS ÚRS 2020 02
14	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	124,600	326,97	40 740,46	CS ÚRS 2020 02
15	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m	m2	124,600	172,86	21 538,36	CS ÚRS 2020 02
17	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	138,400	62,68	8 674,91	CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp VV 69,2*2					138,400			
47	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	13,080	375,39	4 910,10	CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládce VV 82,28-69,2					13,080			
48	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,400	27,37	1 790,00	CS ÚRS 2020 02
VV 13,08*5 'Přepočtené koeficientem množství					65,400			
18	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	82,280	348,01	28 634,26	CS ÚRS 2020 02
19	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	82,280	22,43	1 845,54	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	13,080	394,13	5 155,22	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina na skládce					
	VV		82,28-69,2		13,080			
20	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,200	165,84	11 476,13	CS ÚRS 2020 02
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	6,900	767,91	5 298,58	CS ÚRS 2020 02
22	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	13,800	761,24	10 505,11	CS ÚRS 2020 02
	VV		6,9*2 "Přepočtené koeficientem množství		13,800			
23	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000	123,98	2 479,60	CS ÚRS 2020 02
24	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	20,000	35,31	706,20	CS ÚRS 2020 02
D 2 Zakládání							601,83	
25	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	1,380	436,11	601,83	CS ÚRS 2020 02
D 5 Komunikace pozemní							26 998,51	
26	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	12,750	264,40	3 371,10	CS ÚRS 2020 02
27	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	12,750	742,15	9 462,41	CS ÚRS 2020 02
28	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	12,750	317,19	4 044,17	CS ÚRS 2020 02
29	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2	m2	12,750	21,28	271,32	CS ÚRS 2020 02
30	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	12,750	72,46	923,87	CS ÚRS 2020 02
31	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	12,750	10,01	127,63	CS ÚRS 2020 02
32	K	573312311	Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2	m2	12,750	173,43	2 211,23	CS ÚRS 2020 02
33	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	12,750	493,84	6 296,46	CS ÚRS 2020 02
34	K	578901112	Zdršňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	12,750	22,77	290,32	CS ÚRS 2020 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							1 829,44	
35	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	2,000	378,84	757,68	CS ÚRS 2020 02
36	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	m	2,000	330,53	661,06	CS ÚRS 2020 02
37	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	30,000	13,69	410,70	CS ÚRS 2020 02
D 997 Přesun sutě							7 629,37	
38	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	11,826	118,80	1 404,93	CS ÚRS 2020 02
39	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	11,826	138,35	1 636,13	CS ÚRS 2020 02
50	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,724	277,05	1 308,78	CS ÚRS 2020 02
51	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	2,805	649,57	1 822,04	CS ÚRS 2020 02
52	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	3,698	394,13	1 457,49	CS ÚRS 2020 02
D 998 Přesun hmot							7 462,51	
40	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	17,368	429,67	7 462,51	CS ÚRS 2020 02
D PSV Práce a dodávky PSV							1 370,79	
D 767 Konstrukce zámečnické							1 370,79	
41	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	3,000	387,35	1 162,05	CS ÚRS 2020 02
42	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	3,000	69,58	208,74	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					26 704,62
43	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	494,53	9 890,60	CS ÚRS 2020 02
44	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	20,000	494,53	9 890,60	CS ÚRS 2020 02
45	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	6,000	494,53	2 967,18	CS ÚRS 2020 02
46	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	8,000	494,53	3 956,24	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 06 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

929 605,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	929 605,83	21,00%	195 217,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 124 823,05

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 06 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

929 605,83

HSV - Práce a dodávky HSV

879 194,62

1 - Zemní práce

324 580,53

8 - Trubní vedení

490 337,29

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 656,70

997 - Přesun sutě

7,65

998 - Přesun hmot

61 612,45

PSV - Práce a dodávky PSV

21 946,51

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 633,21

767 - Konstrukce zámečnické

5 313,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

28 464,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 06 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

929 605,83

D HSV Práce a dodávky HSV

879 194,62

D 1 Zemní práce

324 580,53

1	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	427,72	12 831,60	CS ÚRS 2020 02
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	6,000	507,65	3 045,90	CS ÚRS 2020 02
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	6,000	2 211,26	13 267,56	CS ÚRS 2020 02
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	2 134,20	21 342,00	CS ÚRS 2020 02
5	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	5,000	2 189,06	10 945,30	CS ÚRS 2020 02
6	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	5,000	566,41	2 832,05	CS ÚRS 2020 02
7	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	25,000	2 602,75	65 068,75	CS ÚRS 2020 02
8	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	25,000	686,37	17 159,25	CS ÚRS 2020 02
9	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	100,000	34,62	3 462,00	CS ÚRS 2020 02
10	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	100,000	18,86	1 886,00	CS ÚRS 2020 02
11	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	276,000	423,69	116 938,44	CS ÚRS 2020 02
12	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	276,000	202,18	55 801,68	CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení

490 337,29

13	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	1,000	322,02	322,02	CS ÚRS 2020 02
14	M	28611530	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 200	kus	1,000	405,70	405,70	CS ÚRS 2020 02
15	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	14,000	289,82	4 057,48	CS ÚRS 2020 02
16	M	28611174	trubka kanalizační PVC DN 160x3000 mm SN 10	m	14,000	699,47	9 792,58	CS ÚRS 2020 02
17	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	124,000	322,02	39 930,48	CS ÚRS 2020 02
18	M	28611177	trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN 10	m	124,000	1 036,19	128 487,56	CS ÚRS 2020 02
19	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	7,000	12 880,91	90 166,37	CS ÚRS 2020 02
20	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100 x 78,5 x 15 cm	kus	7,000	13 400,63	93 804,41	CS ÚRS 2020 02
VV 6,89655172413793*1,015 "Přepočtené koeficientem množství					7,000			
VV Součet					7,000			
21	M	59224072	skruž betonová DN 1000x250 přechodová, 100x25x9 cm	kus	7,000	1 218,51	8 529,57	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,89655172413793*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		7,000			
	VV		Součet		7,000			
22	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	11,000	3 145,70	34 602,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		10,8374384236453*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		11,000			
	VV		Součet		11,000			
23	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	9,000	1 852,44	16 671,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		8,86699507389163*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		9,000			
	VV		Součet		9,000			
24	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	7,000	1 989,98	13 929,86	CS ÚRS 2020 02
	VV		6,89655172413793*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		7,000			
	VV		Součet		7,000			
25	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	14,000	544,22	7 619,08	CS ÚRS 2020 02
	VV		13,7931034482759*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		14,000			
	VV		Součet		14,000			
26	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	14,000	511,33	7 158,62	CS ÚRS 2020 02
	VV		13,7931034482759*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		14,000			
	VV		Součet		14,000			
27	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	29 527,90	29 527,90	CS ÚRS 2020 02
28	K	894812612	Výříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	2,000	483,03	966,06	CS ÚRS 2020 02
29	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	138,000	31,63	4 364,94	CS ÚRS 2020 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 656,70	
30	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	10,000	144,91	1 449,10	CS ÚRS 2020 02
31	K	977131210	Vrty dovrchní přiklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	5,000	241,52	1 207,60	CS ÚRS 2020 02
D 997			Přesun sutě				7,65	
32	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,005	966,07	4,83	CS ÚRS 2020 02
33	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,005	563,54	2,82	CS ÚRS 2020 02
D 998			Přesun hmot				61 612,45	
34	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	51,021	966,07	49 289,86	CS ÚRS 2020 02
35	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	51,021	241,52	12 322,59	CS ÚRS 2020 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				21 946,51	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				16 633,21	
36	K	721110964	Potrubí kameninové propojení potrubí DN 200	kus	16,000	647,21	10 355,36	CS ÚRS 2020 02
37	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	138,000	40,25	5 554,50	CS ÚRS 2020 02
38	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,599	966,07	578,68	CS ÚRS 2020 02
39	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,599	241,52	144,67	CS ÚRS 2020 02
D 767			Konstrukce zámečnické				5 313,30	
40	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	10,000	289,82	2 898,20	CS ÚRS 2020 02
41	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	10,000	209,31	2 093,10	CS ÚRS 2020 02
42	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,000	32,20	322,00	CS ÚRS 2020 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby				28 464,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	40,000	517,54	20 701,60	CS ÚRS 2020 02
44	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	15,000	517,54	7 763,10	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 06 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod

Soupis:

SO 06.1 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 163 167,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 163 167,42	21,00%	454 265,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 617 432,58

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 06 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod

Soupis:

SO 06.1 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 163 167,42

HSV - Práce a dodávky HSV

2 119 035,72

1 - Zemní práce

1 966 661,53

2 - Zakládání

12 969,91

998 - Přesun hmot

139 404,28

PSV - Práce a dodávky PSV

4 569,30

767 - Konstrukce zámečnické

4 569,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

39 562,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 06 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod

Soupis:

SO 06.1 - Venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 163 167,42

D HSV Práce a dodávky HSV

2 119 035,72

D 1 Zemní práce

1 966 661,53

1	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	60,000	427,72	25 663,20	CS ÚRS 2020 02
2	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	300,000	34,62	10 386,00	CS ÚRS 2020 02
3	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	300,000	18,86	5 658,00	CS ÚRS 2020 02
4	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	70,000	423,69	29 658,30	CS ÚRS 2020 02
5	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	70,000	202,18	14 152,60	CS ÚRS 2020 02
6	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	86,790	209,77	18 205,94	CS ÚRS 2020 02
8	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	699,550	648,30	453 518,27	CS ÚRS 2020 02
10	K	151101102	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	829,380	326,97	271 182,38	CS ÚRS 2020 02
11	K	151101112	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	829,380	172,86	143 366,63	CS ÚRS 2020 02
13	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	1 248,520	62,68	78 257,23	CS ÚRS 2020 02
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp (786,34-(132,34+29,74))*2					1 248,520			
30	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	162,080	375,39	60 843,21	CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku 786,34-624,26					162,080			
31	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	810,400	27,37	22 180,65	CS ÚRS 2020 02
VV 162,08*5 'Přepočtené koeficientem množství					810,400			
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	786,340	348,01	273 654,18	CS ÚRS 2020 02
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	786,340	22,43	17 637,61	CS ÚRS 2020 02
29	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	259,328	394,13	102 208,94	CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku (786,34-624,26)*1,6					259,328			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	624,260	165,84	103 527,28	CS ÚRS 2020 02
VV 786,34-(132,34+29,74)					624,260			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	132,340	767,91	101 625,21	CS ÚRS 2020 02
18	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	264,680	761,24	201 485,00	CS ÚRS 2020 02
VV					132,34*2 "Přepočtené koeficientem množství"	264,680		
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	210,000	123,98	26 035,80	CS ÚRS 2020 02
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	210,000	35,31	7 415,10	CS ÚRS 2020 02
D 2 Zakládání							12 969,91	
21	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	29,740	436,11	12 969,91	CS ÚRS 2020 02
D 998 Přesun hmot							139 404,28	
22	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	324,445	429,67	139 404,28	CS ÚRS 2020 02
D PSV Práce a dodávky PSV							4 569,30	
D 767 Konstrukce zámečnické							4 569,30	
23	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	10,000	387,35	3 873,50	CS ÚRS 2020 02
24	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	10,000	69,58	695,80	CS ÚRS 2020 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							39 562,40	
25	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	30,000	494,53	14 835,90	CS ÚRS 2020 02
26	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	16,000	494,53	7 912,48	CS ÚRS 2020 02
27	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	26,000	494,53	12 857,78	CS ÚRS 2020 02
28	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	8,000	494,53	3 956,24	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

Soupis:

SO 07.1 - Vodoměrná šachta

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

360 314,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	360 314,24	21,00%	75 665,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

435 980,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

Soupis:

SO 07.1 - Vodoměrná šachta

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

360 314,24

HSV - Práce a dodávky HSV

268 206,94

1 - Zemní práce

91 657,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce

105 436,75

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

20 293,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

50 805,60

997 - Přesun sutě

13,68

PSV - Práce a dodávky PSV

92 107,30

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

13 664,61

713 - Izolace tepelné

7 367,70

767 - Konstrukce zámečnické

71 074,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

Soupis:

SO 07.1 - Vodoměrná šachta

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

360 314,24

D HSV

Práce a dodávky HSV

268 206,94

D 1

Zemní práce

91 657,69

1	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	27,984	186,83	5 228,25	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.07.1.2					
	VV		(4,30*2,90+6,70*5,10)/2*2,40		55,968			
	VV		v hor. 3 ... 50%					
	VV		55,968*0,50		27,984			
3	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	27,984	281,94	7 889,81	CS ÚRS 2020 02
	VV		výpočet v hor. 3					
	VV		v hor. 4 ... 50%					
	VV		55,968*0,50		27,984			
	VV		Součet		27,984			
5	K	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	55,968	476,36	26 660,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		výkopek do 100m3 ... podíl svislého přemístění 100%					
	VV		55,968		55,968			
	VV		Součet		55,968			
6	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	76,962	62,10	4 779,34	CS ÚRS 2020 02
	VV		zemina na meziskládku a zpětný zásyp					
	VV		38,481*2		76,962			
	VV		Součet		76,962			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	17,487	375,39	6 564,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina					
	VV		55,968-38,481		17,487			
	VV		Součet		17,487			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	87,435	27,37	2 393,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		17,487*5 "Přepočtené koeficientem množství"		87,435			
9	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	55,968	348,01	19 477,42	CS ÚRS 2020 02
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	27,979	394,13	11 027,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		17,487*1,60		27,979			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		27,979			
45	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	55,968	22,43	1 255,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		55,968		55,968			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,481	165,84	6 381,69	CS ÚRS 2020 02
	VV		55,968 "výkopek celkem		55,968			
	VV		odečet					
	VV		-2,94 "podkladní mazanina		-2,940			
	VV		-(3,30*1,90*2,26+0,98*0,96*0,40)		-14,547			
	VV		Součet		38,481			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				105 436,75	
12	K	380311641	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl 150 mm	m3	0,392	4 094,29	1 604,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		spádový beton					
	VV		2,80*1,40*0,10		0,392			
	VV		Součet		0,392			
13	K	380326132	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl 300 mm	m3	5,776	5 290,37	30 557,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,80*3,20*0,20 "deska		1,152			
	VV		(1,80*3,20-0,60*0,60)*0,20 "strop		1,080			
	VV		(3,20+1,40)*2*1,80*0,20+((0,60+0,18*2)*0,20+(0,60*3+0,18*2)*0,18)*0,40 "stěny		3,544			
	VV		Součet		5,776			
14	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	43,672	805,06	35 158,58	CS ÚRS 2020 02
	VV		(3,20+1,80)*2*2,20+(0,18+0,20+0,60+0,60+0,18*2)*2*0,40		23,552			
	VV		(2,80+1,40)*2*1,80+0,60*4*0,60		16,560			
	VV		2,80*1,40-0,60*0,60		3,560			
	VV		Součet		43,672			
15	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	43,672	230,02	10 045,43	CS ÚRS 2020 02
16	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	0,751	37 377,63	28 070,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		5,776*0,130		0,751			
	VV		Součet		0,751			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 293,22	
17	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,241	6 887,83	1 659,97	CS ÚRS 2020 02
	VV		krycí beton - strop					
	VV		(3,20*1,80-0,96*0,98)*0,05		0,241			
	VV		Součet		0,241			
18	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,940	5 607,79	16 486,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		podkladní mazanina					
	VV		7,0*4,20*0,10		2,940			
	VV		Součet		2,940			
19	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,760	372,63	2 146,35	CS ÚRS 2020 02
	VV		krycí beton pod žlb deskou					
	VV		3,20*1,80		5,760			
	VV		Součet		5,760			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 805,60	
20	K	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně	m	10,000	977,57	9 775,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		(3,20+1,80)*2		10,000			
	VV		Součet		10,000			
21	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	m	13,880	989,07	13 728,29	CS ÚRS 2020 02
	VV		(3,20+1,80)*2		10,000			
	VV		(0,96+0,98)*2		3,880			
	VV		Součet		13,880			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	3,920	138,01	541,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,80*1,40		3,920			
	VV		Součet		3,920			
23	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže	kus	1,000	747,55	747,55	CS ÚRS 2020 02
24	M	552410R1	<i>poklop z tvárné litiny C 250 v rámu čtvercový uzamykatelný 600x600 mm včetně soupravy s klíčem</i>	kus	1,000	17 711,24	17 711,24	
25	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	0,400	2 242,66	897,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,20*2 "prostu litina		0,400			
	VV		Součet		0,400			
26	K	9853241R1	Nátěr betonové konstrukce krystalizační nátěrovou hmotou	m2	20,120	368,03	7 404,76	
	VV		příloha D.1.07.1.2					
	VV		(2,80+1,40)*2*1,8+1,40*2,8-0,60*0,60+0,60*4*0,60		20,120			
	VV		Součet		20,120			
D 997 Přesun sutě							13,68	
27	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,008	447,96	3,58	CS ÚRS 2020 02
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,008	314,55	2,52	CS ÚRS 2020 02
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,112	47,84	5,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,008*14 "Přepočtené koeficientem množství		0,112			
30	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,008	277,05	2,22	CS ÚRS 2020 02
D PSV Práce a dodávky PSV							92 107,30	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							13 664,61	
31	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	5,760	18,40	105,98	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,20*1,80		5,760			
	VV		Součet		5,760			
32	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,002	56 123,94	112,25	CS ÚRS 2020 02
	VV		5,76*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,002			
33	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	12,552	27,60	346,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		(3,20+1,80)*2,20+(0,96+0,98)*2*0,40		12,552			
	VV		Součet		12,552			
34	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	t	0,004	56 123,94	224,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		12,552*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,004			
35	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	11,520	123,06	1 417,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		2x pás SBS					
	VV		3,20*1,80*2		11,520			
	VV		Součet		11,520			
36	M	6285500R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm</i>	m2	13,248	177,11	2 346,35	
	VV		11,52*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		13,248			
37	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	25,104	134,56	3 377,99	CS ÚRS 2020 02
	VV		2x pás SBS					
	VV		((3,20+1,80)*2,20+(0,96+0,98)*2*0,40)*2		25,104			
	VV		Součet		25,104			
38	M	6285500R	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm</i>	m2	30,125	177,11	5 335,44	
	VV		25,104*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		30,125			
39	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,000	132,67	398,01	CS ÚRS 2020 02
D 713 Izolace tepelné							7 367,70	
40	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12,552	195,51	2 454,04	CS ÚRS 2020 02
	VV		ochrana izolace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(3,20+1,80)*2,20+(0,96+0,98)*2*0,40		12,552			
		VV	Součet		12,552			
41	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	13,180	356,53	4 699,07	CS ÚRS 2020 02
		VV	12,552*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		13,180			
42	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	3,000	71,53	214,59	CS ÚRS 2020 02
	D	767	Konstrukce zámečnické				71 074,99	
43	K	7678610R1	D+M žebřík nerez dl. 2,10m včetně kotvení kotevního materiálu	kus	2,000	34 502,42	69 004,84	
44	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000	690,05	2 070,15	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

Soupis:

SO 07.2 - Venkovní vodovod - přípojka - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

170 248,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	170 248,99	21,00%	35 752,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

206 001,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

Soupis:

SO 07.2 - Venkovní vodovod - přípojka - zemní práce

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

170 248,99

HSV - Práce a dodávky HSV

142 173,58

1 - Zemní práce

87 432,08

2 - Zakládání

680,33

5 - Komunikace pozemní

35 574,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 474,76

997 - Přesun sutě

10 064,15

998 - Přesun hmot

6 947,76

PSV - Práce a dodávky PSV

1 370,79

767 - Konstrukce zámečnické

1 370,79

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

26 704,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

Soupis:

SO 07.2 - Venkovní vodovod - přípojka - zemní práce

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

170 248,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

142 173,58

D 1

Zemní práce

87 432,08

1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	16,800	218,17	3 665,26	CS ÚRS 2020 02
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně	m2	16,800	181,02	3 041,14	CS ÚRS 2020 02
3	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm ručně	m2	16,800	137,09	2 303,11	CS ÚRS 2020 02
4	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	1,500	151,81	227,72	CS ÚRS 2020 02
5	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	6,000	427,72	2 566,32	CS ÚRS 2020 02
6	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	40,000	34,62	1 384,80	CS ÚRS 2020 02
7	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	40,000	18,86	754,40	CS ÚRS 2020 02
8	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000	423,69	8 473,80	CS ÚRS 2020 02
9	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000	202,18	4 043,60	CS ÚRS 2020 02
10	K	132251252	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	28,080	648,30	18 204,26	CS ÚRS 2020 02
13	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	40,400	62,68	2 532,27	CS ÚRS 2020 02
VV		zemina na meziskládku a zpětný zásyp						
VV		20,2*2			40,400			
43	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	7,880	375,39	2 958,07	CS ÚRS 2020 02
VV		přebytečná zemina na skládku						
VV		28,08-20,2			7,880			
44	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	39,400	27,37	1 078,38	CS ÚRS 2020 02
VV		7,88*5 *Přepočtené koeficientem množství			39,400			
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	28,080	348,01	9 772,12	CS ÚRS 2020 02
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	28,080	22,43	629,83	CS ÚRS 2020 02
45	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	12,608	394,13	4 969,19	CS ÚRS 2020 02
VV		přebytečná zemina na skládku						
VV		(28,08-20,2)*1,6			12,608			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,200	165,84	3 349,97	CS ÚRS 2020 02
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítlem, uloženou do 3 m	m3	6,240	767,91	4 791,76	CS ÚRS 2020 02
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	12,480	761,24	9 500,28	CS ÚRS 2020 02
VV		6,24*2 "Přepočtené koeficientem množství			12,480			
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	20,000	123,98	2 479,60	CS ÚRS 2020 02
20	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	20,000	35,31	706,20	CS ÚRS 2020 02
D		2	Zakládání					
21	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	1,560	436,11	680,33	CS ÚRS 2020 02
D		5	Komunikace pozemní					
22	K	564752111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 150 mm	m2	16,800	264,40	4 441,92	CS ÚRS 2020 02
23	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	16,800	742,15	12 468,12	CS ÚRS 2020 02
24	K	565211111	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 150 mm	m2	16,800	317,19	5 328,79	CS ÚRS 2020 02
25	K	571904111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 20 kg/m2	m2	16,800	21,28	357,50	CS ÚRS 2020 02
26	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	16,800	72,46	1 217,33	CS ÚRS 2020 02
27	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	16,800	10,01	168,17	CS ÚRS 2020 02
28	K	573312311	Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2	m2	16,800	173,43	2 913,62	CS ÚRS 2020 02
29	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,800	493,84	8 296,51	CS ÚRS 2020 02
30	K	578901112	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	16,800	22,77	382,54	CS ÚRS 2020 02
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
31	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,500	378,84	568,26	CS ÚRS 2020 02
32	M	59217021	obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm	m	1,500	330,53	495,80	CS ÚRS 2020 02
33	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	30,000	13,69	410,70	CS ÚRS 2020 02
D		997	Přesun sutě					
34	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	15,063	118,80	1 789,48	CS ÚRS 2020 02
35	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	15,063	138,35	2 083,97	CS ÚRS 2020 02
46	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,895	277,05	1 633,21	CS ÚRS 2020 02
47	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	3,696	649,57	2 400,81	CS ÚRS 2020 02
48	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,472	394,13	2 156,68	CS ÚRS 2020 02
D		998	Přesun hmot					
36	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	16,170	429,67	6 947,76	CS ÚRS 2020 02
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		767	Konstrukce zámečnické					
37	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	3,000	387,35	1 162,05	CS ÚRS 2020 02
38	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	3,000	69,58	208,74	CS ÚRS 2020 02
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					
39	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	494,53	9 890,60	CS ÚRS 2020 02
40	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	20,000	494,53	9 890,60	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	6,000	494,53	2 967,18	CS ÚRS 2020 02
42	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	8,000	494,53	3 956,24	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

Soupis:

SO 07.3 - Venkovní vodovod - přípojka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

247 019,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	247 019,89	21,00%	51 874,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

298 894,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

Soupis:

SO 07.3 - Venkovní vodovod - přípojka

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

247 019,89

HSV - Práce a dodávky HSV

182 083,04

1 - Zemní práce

50 823,31

8 - Trubní vedení

119 284,54

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

11 472,91

997 - Přesun sutě

0,78

998 - Přesun hmot

501,50

PSV - Práce a dodávky PSV

55 414,16

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

36 408,30

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

4 278,30

744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných

179,08

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

172,50

767 - Konstrukce zámečnické

14 375,98

M - Práce a dodávky M

3 484,74

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

3 484,74

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 037,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka

Soupis:

SO 07.3 - Venkovní vodovod - přípojka

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

247 019,89

D HSV

Práce a dodávky HSV

182 083,04

D 1

Zemní práce

50 823,31

1	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	20,000	427,72	8 554,40	CS ÚRS 2020 02
2	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	2,000	507,65	1 015,30	CS ÚRS 2020 02
3	K	119001405	Dočasné zajištění potrubí z PE DN do 200 mm	m	2,000	2 211,26	4 422,52	CS ÚRS 2020 02
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	2 134,20	12 805,20	CS ÚRS 2020 02
5	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000	2 189,06	2 189,06	CS ÚRS 2020 02
6	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000	566,41	566,41	CS ÚRS 2020 02
7	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	5,000	2 602,75	13 013,75	CS ÚRS 2020 02
8	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	5,000	686,37	3 431,85	CS ÚRS 2020 02
9	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000	34,62	692,40	CS ÚRS 2020 02
10	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000	18,86	377,20	CS ÚRS 2020 02
11	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	6,000	423,69	2 542,14	CS ÚRS 2020 02
12	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	6,000	202,18	1 213,08	CS ÚRS 2020 02

D 8

Trubní vedení

119 284,54

13	K	857241131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 80	kus	10,000	745,25	7 452,50	CS ÚRS 2020 02
14	M	552536580R01	příruba závitová z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 50 mm/1"	kus	2,000	830,47	1 660,94	
15	M	552536600R01	příruba závitová z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm X DN 80 mm/21/2"	kus	1,000	1 288,44	1 288,44	
16	M	551287040	kompensátor pryžový BRA.F8.500 DN 80	kus	1,000	2 640,36	2 640,36	CS ÚRS 2014 01
17	M	422657700R01	filtr přírubový DN50x230 mm	kus	1,000	5 940,05	5 940,05	
18	M	552532140	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 50 mm délka 150 mm	kus	1,000	3 064,97	3 064,97	CS ÚRS 2014 01
19	M	552532160	trouba přírubová litinová práškový epoxid tl.250µm FF DN 50 mm délka 250 mm	kus	1,000	3 524,42	3 524,42	CS ÚRS 2014 01
20	M	552536080	přechod přírubový,práškový epoxid, tl.250µm FFR-kus litinový délka 200 mm DN 80/50 mm	kus	2,000	2 656,11	5 312,22	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	857244121	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	2,000	775,50	1 551,00	CS ÚRS 2020 02
22	M	552535080	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid, tl.250µm T-kus DN 80/50 mm</i>	kus	2,000	3 365,83	6 731,66	CS ÚRS 2014 01
23	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	17,000	82,46	1 401,82	CS ÚRS 2020 02
24	M	28613530	<i>potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m</i>	m	17,000	359,40	6 109,80	CS ÚRS 2020 02
25	K	877241113	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000	161,93	971,58	CS ÚRS 2020 02
26	M	55253892	<i>tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 80 L130mm</i>	kus	3,000	3 035,29	9 105,87	CS ÚRS 2020 02
27	M	28615974	<i>elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm</i>	kus	3,000	221,97	665,91	CS ÚRS 2020 02
28	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky potrubí PE	kus	1,000	246,23	246,23	CS ÚRS 2020 02
29	K	879231191	Příplatek za práce sklon při montáži jakéhokoli vodovodního potrubí DN 40 až 550	m	17,000	149,74	2 545,58	CS ÚRS 2020 02
30	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	1 093,50	2 187,00	CS ÚRS 2020 02
31	M	422211160	<i>šoupátko s přírubami, voda, kat.č.: 4000E2 DN 80 mm PN 16</i>	kus	2,000	9 899,78	19 799,56	CS ÚRS 2014 01
32	K	891241112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	1,000	1 050,25	1 050,25	CS ÚRS 2020 02
33	M	42221303	<i>šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm</i>	kus	1,000	9 511,74	9 511,74	CS ÚRS 2020 02
34	K	891245321	Montáž zpětných klapek DN 80	kus	1,000	585,05	585,05	CS ÚRS 2020 02
35	M	551280530R01	<i>klapka zpětná přírubová DN 80</i>	kus	1,000	8 038,95	8 038,95	
36	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	3,500	30,25	105,88	CS ÚRS 2020 02
37	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	17,000	28,87	490,79	CS ÚRS 2020 02
38	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	3,500	136,17	476,60	CS ÚRS 2014 01
39	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	17,000	145,03	2 465,51	CS ÚRS 2020 02
40	K	892273932	Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 při opravách	m	100,000	137,89	13 789,00	CS ÚRS 2020 02
41	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	17,000	33,58	570,86	CS ÚRS 2020 02

D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 472,91				
42	K	953941621	Osazování konzol ve zdivu betonovém	kus	4,000	475,90	1 903,60	CS ÚRS 2020 02
43	M	423928870	<i>konzola lištová 41/41/2,5 - 570</i>	kus	4,000	163,54	654,16	CS ÚRS 2014 01
44	K	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	600,34	4 802,72	CS ÚRS 2020 02
45	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	5,000	742,15	3 710,75	CS ÚRS 2020 02
46	K	977131210	Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,500	160,67	401,68	CS ÚRS 2020 02

D		997	Přesun sutě	0,78				
47	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,003	118,80	0,36	CS ÚRS 2020 02
48	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,003	138,35	0,42	CS ÚRS 2020 02

D		998	Přesun hmot	501,50				
49	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,585	617,71	361,36	CS ÚRS 2020 02
50	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,585	239,56	140,14	CS ÚRS 2020 02

D		PSV	Práce a dodávky PSV	55 414,16				
---	--	-----	---------------------	-----------	--	--	--	--

D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	36 408,30				
51	K	722110114	Potrubí vodovodní litinové přírubové tlakové DN 80	m	1,000	16 259,84	16 259,84	CS ÚRS 2020 02
52	K	722110925	Potrubí litinové propojení přírubového potrubí DN 100	kus	1,000	1 292,00	1 292,00	CS ÚRS 2020 02
53	K	722181127	Objímka do DN 100 mm	kus	4,000	1 971,93	7 887,72	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	722181244	Tepelně izolační trubice z PE tl do 20 mm DN do 92 mm	m	4,000	319,49	1 277,96	CS ÚRS 2020 02
55	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	109,95	219,90	CS ÚRS 2020 02
56	K	722212330	T klíč k šoupátku se zemní soupravou pro všechny rozměry	kus	1,000	671,88	671,88	CS ÚRS 2020 02
57	K	722219191	Montáž zemních souprav ostatní typ	kus	1,000	73,84	73,84	CS ÚRS 2020 02
58	M	42291067	souprava zemní pro šoupátka DN 65-80mm Rd 1,25m	kus	2,000	1 647,38	3 294,76	CS ÚRS 2020 02
59	M	56230640	deska podkladová uličního poklopu	kus	1,000	564,80	564,80	CS ÚRS 2020 02
60	M	42291452	poklop litinový DN 80	kus	1,000	2 929,83	2 929,83	CS ÚRS 2020 02
61	K	722224115	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	314,55	629,10	CS ÚRS 2020 02
62	M	319427040	redukce mosaz 1" x 1/2"	kus	2,000	91,66	183,32	CS ÚRS 2014 01
63	K	722260902	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	1,000	728,81	728,81	CS ÚRS 2020 02
64	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,127	940,65	119,46	CS ÚRS 2020 02
65	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,127	940,65	119,46	CS ÚRS 2020 02
66	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,127	612,65	77,81	CS ÚRS 2020 02
67	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,127	612,65	77,81	CS ÚRS 2020 02

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 4 278,30

68	K	740991100	Celková prohlídka a revize el. rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 278,30	4 278,30	
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	--

D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných 179,08

69	K	744422110	Montáž kabel Cu sk.1 do 1kV do 0,40kg trubka nebo lišta zatažená	m	4,000	19,32	77,28	
70	M	196411420R01	dráty H07V-K- (CY 10,00 mm) ZŽ	m	4,000	25,45	101,80	

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 172,50

71	K	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	2,000	48,30	96,60	CS ÚRS 2020 02
72	M	354305910R01	svorka AB ochranného pospojení vč. pásku Cu	kus	2,000	37,95	75,90	

D 767 Konstrukce zámečnické 14 375,98

73	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	6,000	138,01	828,06	CS ÚRS 2020 02
74	M	48455984R01	konzole stěnová nebo závěsná C-nosník, konzoly, spojovací materiál-sestavy	pár	6,000	805,06	4 830,36	
75	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	4,000	138,01	552,04	CS ÚRS 2020 02
76	M	423928880	konzola lištová 41/41/2,5 - 820 otvor 13x18 mm	kus	4,000	690,05	2 760,20	CS ÚRS 2014 01
77	M	423928830	objímka stabil D pro konzoli SFK s gumou 6" 156-162 M12x35	kus	4,000	172,51	690,04	CS ÚRS 2014 01
78	M	423929220	vrut závěsný M 8 x 80	kus	8,000	57,50	460,00	CS ÚRS 2014 01
79	M	423929410	šroub listový M 8 x 40	kus	4,000	57,50	230,00	CS ÚRS 2014 01
80	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,020	86 256,06	1 725,12	CS ÚRS 2020 02
81	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020	115 008,08	2 300,16	CS ÚRS 2020 02

D M Práce a dodávky M 3 484,74

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 3 484,74

82	K	580103001	Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	1,000	1 150,08	1 150,08	CS ÚRS 2020 02
83	K	580106011	Měření celkového nebo ochranného vodiče	měření	1,000	2 208,16	2 208,16	CS ÚRS 2020 02
84	K	580107015	Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění	kus	2,000	63,25	126,50	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
							6 037,95	
85	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	10,000	402,53	4 025,30	CS ÚRS 2020 02
86	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	5,000	402,53	2 012,65	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 08 - Venkovní vodovod - areálový rozvod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

402 868,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	402 868,24	21,00%	84 602,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

487 470,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 08 - Venkovní vodovod - areálový rozvod

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

402 868,24

HSV - Práce a dodávky HSV

370 117,85

1 - Zemní práce

132 595,62

8 - Trubní vedení

230 719,71

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 124,06

997 - Přesun sutě

0,78

998 - Přesun hmot

1 677,68

PSV - Práce a dodávky PSV

31 715,31

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 392,76

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

24 714,11

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2 530,18

767 - Konstrukce zámečnické

78,26

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 035,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 08 - Venkovní vodovod - areálový rozvod

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

402 868,24

D HSV Práce a dodávky HSV

370 117,85

D 1 Zemní práce

132 595,62

1	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	427,72	4 277,20	CS ÚRS 2020 02
2	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	2 134,20	12 805,20	CS ÚRS 2020 02
3	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	6,000	541,23	3 247,38	CS ÚRS 2020 02
4	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	6,000	846,46	5 078,76	CS ÚRS 2020 02
5	K	119002121	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	4,000	2 189,06	8 756,24	CS ÚRS 2020 02
6	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	4,000	566,41	2 265,64	CS ÚRS 2020 02
7	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení	m2	20,000	2 602,75	52 055,00	CS ÚRS 2020 02
8	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění	m2	20,000	686,37	13 727,40	CS ÚRS 2020 02
9	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	100,000	34,62	3 462,00	CS ÚRS 2020 02
10	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	100,000	18,86	1 886,00	CS ÚRS 2020 02
11	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	40,000	423,69	16 947,60	CS ÚRS 2020 02
12	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	40,000	202,18	8 087,20	CS ÚRS 2020 02

D 8 Trubní vedení

230 719,71

13	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	71,000	241,52	17 147,92	CS ÚRS 2020 02
14	M	28613109	potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 25x2,3mm	m	20,000	69,90	1 398,00	CS ÚRS 2020 02
15	M	28613524	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0 dl 12m	m	51,000	364,41	18 584,91	CS ÚRS 2020 02
16	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	116,000	289,82	33 619,12	CS ÚRS 2020 02
17	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	116,000	709,88	82 346,08	CS ÚRS 2020 02
18	K	877241113	Montáž tvarovek na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	6,000	402,53	2 415,18	CS ÚRS 2020 02
19	M	55253892	tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 80 L130mm	kus	2,000	2 152,95	4 305,90	CS ÚRS 2020 02
20	M	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	4,000	560,20	2 240,80	CS ÚRS 2020 02
21	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	167,000	24,15	4 033,05	CS ÚRS 2020 02
22	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	116,000	28,98	3 361,68	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	894812357	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení B125 s teleskopickým adaptérem	kus	2,000	27 992,43	55 984,86	CS ÚRS 2020 02
24	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	167,000	31,63	5 282,21	CS ÚRS 2020 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 124,06	
25	K	953945122	Kotvy mechanické M 10 dl 110 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	8,000	600,34	4 802,72	CS ÚRS 2020 02
26	K	977131210	Vrty dovrchní přiklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	160,67	321,34	CS ÚRS 2020 02
D 997			Přesun sutě				0,78	
27	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,003	118,80	0,36	CS ÚRS 2020 02
28	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,003	138,35	0,42	CS ÚRS 2020 02
D 998			Přesun hmot				1 677,68	
29	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	1,957	617,71	1 208,86	CS ÚRS 2020 02
30	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	1,957	239,56	468,82	CS ÚRS 2020 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				31 715,31	
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				4 392,76	
31	K	722110912	Potrubí litinové přetěsnění přírubového spoje do DN 80	kus	1,000	515,24	515,24	CS ÚRS 2020 02
32	K	722110924	Potrubí litinové propojení přírubového potrubí do DN 80	kus	1,000	466,93	466,93	CS ÚRS 2020 02
33	K	722140104	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 25	m	1,500	1 334,28	2 001,42	CS ÚRS 2020 02
34	K	722181127	Objímka do DN 100 mm	kus	2,000	138,01	276,02	CS ÚRS 2020 02
35	K	722224115	Kohout závitový plnicí nebo vypouštěcí PN 10 G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	270,70	270,70	CS ÚRS 2020 02
36	K	722224152	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 1/2 - 3/4"	kus	1,000	374,70	374,70	CS ÚRS 2020 02
37	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	1,000	475,67	475,67	CS ÚRS 2020 02
38	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,005	966,07	4,83	CS ÚRS 2020 02
39	K	998722103	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,005	966,07	4,83	CS ÚRS 2020 02
40	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	241,52	1,21	CS ÚRS 2020 02
41	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,005	241,52	1,21	CS ÚRS 2020 02
D 724			Zdravotechnika - strojní vybavení				24 714,11	
42	K	724149102	Montáž čerpadla vodovodního bez potrubí a příslušenství	kus	1,000	2 415,17	2 415,17	CS ÚRS 2020 02
43	M	42610390	čerpadlo ponorné kalové Hmax 10m Qmax 11l/s 230V	kus	1,000	21 391,50	21 391,50	CS ÚRS 2020 02
44	M	28612145	hadice z měkčeného PVC pro vodu, kapaliny, vzduch D 19/26 mm s koncovkami	m	10,000	86,88	868,80	CS ÚRS 2020 02
45	K	998724103	Přesun hmot tonážní pro strojní vybavení v objektech v do 24 m	t	0,032	966,07	30,91	CS ÚRS 2020 02
46	K	998724181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 724 prováděný bez použití mechanizace	t	0,032	241,52	7,73	CS ÚRS 2020 02
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				2 530,18	
47	K	741136351	Dodávka prodlužovacího kabelu na bubnu 30m	kus	2,000	172,51	345,02	CS ÚRS 2020 02
48	M	35822923	kabel prodlužovací 30 m k motorovým pohonům	kus	2,000	1 092,58	2 185,16	CS ÚRS 2020 02
D 767			Konstrukce zámečnické				78,26	
49	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	1,000	32,20	32,20	CS ÚRS 2020 02
50	M	48455984R01	konzole stěnová nebo závěsná C-nosník, konzoly, spojovací materiál-sestavy	pár	1,000	44,85	44,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,001	966,07	0,97	CS ÚRS 2020 02
52	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,001	241,52	0,24	CS ÚRS 2020 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 035,08	
53	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	2,000	517,54	1 035,08	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 08 - Venkovní vodovod - areálový rozvod

Soupis:

SO 08.1 - Venkovní vodovod - areálový rozvod - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

434 313,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	434 313,94	21,00%	91 205,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

525 519,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 08 - Venkovní vodovod - areálový rozvod

Soupis:

SO 08.1 - Venkovní vodovod - areálový rozvod - zemní práce

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

434 313,94

HSV - Práce a dodávky HSV

424 423,34

1 - Zemní práce

379 956,63

2 - Zakládání

5 015,27

998 - Přesun hmot

39 451,44

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

9 890,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt: SO 08 - Venkovní vodovod - areálový rozvod

Soupis: SO 08.1 - Venkovní vodovod - areálový rozvod - zemní práce

Místo: Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

434 313,94

D HSV Práce a dodávky HSV

424 423,34

D 1 Zemní práce

379 956,63

1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	80,000	34,62	2 769,60	CS ÚRS 2020 02
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	80,000	18,86	1 508,80	CS ÚRS 2020 02
3	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	30,000	423,69	12 710,70	CS ÚRS 2020 02
4	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,000	202,18	6 065,40	CS ÚRS 2020 02
5	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	172,500	648,30	111 831,75	CS ÚRS 2020 02
8	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	253,000	62,68	15 858,04	CS ÚRS 2020 02
VV VV					zemina na meziskládku a zpětný zásyp 126,5*2			
					253,000			
20	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	46,000	375,39	17 267,94	CS ÚRS 2020 02
VV VV					přebytečná zemina na skládku 172,5-126,5			
					46,000			
21	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	230,000	27,37	6 295,10	CS ÚRS 2020 02
VV					46*5 "Přepočtené koeficientem množství			
					230,000			
9	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	172,500	348,01	60 031,73	CS ÚRS 2020 02
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	172,500	22,43	3 869,18	CS ÚRS 2020 02
22	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	73,600	394,13	29 007,97	CS ÚRS 2020 02
VV VV					přebytečná zemina na skládku (172,5-126,5)*1,6			
					73,600			
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	126,500	165,84	20 978,76	CS ÚRS 2020 02
12	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítlem, uloženou do 3 m	m3	34,500	767,91	26 492,90	CS ÚRS 2020 02
13	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	69,000	761,24	52 525,56	CS ÚRS 2020 02
VV					34,5*2 "Přepočtené koeficientem množství			
					69,000			
14	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	80,000	123,98	9 918,40	CS ÚRS 2020 02
15	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	80,000	35,31	2 824,80	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání	5 015,27				
16	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	11,500	436,11	5 015,27	CS ÚRS 2020 02
D 998			Přesun hmot	39 451,44				
17	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	91,818	429,67	39 451,44	CS ÚRS 2020 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	9 890,60				
18	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	10,000	494,53	4 945,30	CS ÚRS 2020 02
19	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	10,000	494,53	4 945,30	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 11 - Silnoproud areálové rozvody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

416 717,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	416 717,91	21,00%	87 510,76
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

504 228,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 11 - Silnoprůd areálové rozvody

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

416 717,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 11 - Silnoproud areálové rozvody

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

416 717,91

0	M	001	ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ RE Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 43/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívod spodem a vývody spodem, rozměry: 810x1605x250mm, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, osazen fakturačním	ks	1,000	110 367,61	110 367,61	
0	M	002	1-CYKY-J 3x240+120mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	35,000	1 674,24	58 598,40	
0	M	003	1-AYKY-J 3x185+95mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	135,000	329,83	44 527,05	
0	M	004	1-AYKY-J 3x120+70mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	85,000	222,69	18 928,65	
0	M	005	1-CYKY-J 5x6mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	45,000	91,70	4 126,50	
0	M	006	1-CYKY-J 3x6mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá	m	50,000	64,56	3 228,00	
0	M	007	1-CYKY-J 3x4mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá	m	70,000	46,95	3 286,50	
0	M	008	UKONČENÍ KABELŮ Ukončení kabelů (kabelová oka, návlečky, izolace, atd.) - komplet	ks	1,000	2 924,94	2 924,94	
0	M	009	ZNAČENÍ KABELŮ Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového	ks	12,000	11,21	134,52	
0	M	010	SPOJKA PRO KABEL AYKY 3x185+95mm2 Smršťovací soubor s Al lisovacími spojkami pro kabel AYKY 3x185+95, lisovací spojovače, teplem smršťitelný, přímá spojka	ks	1,000	1 494,55	1 494,55	
0	M	011	OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 110 Ohebná dvouplášťová kurugovaná chránička, vnější průměr 110mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, -45 - +60°C	m	28,000	82,56	2 311,68	
0	M	012	OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 50 Ohebná dvouplášťová kurugovaná chránička, vnější průměr 50mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, -45 - +60°C	m	5,000	44,91	224,55	
0	M	013	SPOJKA OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČKY PRŮMĚRU 110 Nasouvací spojka dvouplášťové kurugované chráničky vnějšího průměru 110mm	ks	4,000	97,22	388,88	
0	M	015	ZEMNÍČÍ PÁSEK Zemníčí pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. svorek pro spojení dvou pásků, ochrany spojů proti korozi	m	180,000	73,12	13 161,60	
0	M	016	SPOJOVACÍ SVORKA SR Spojovací svorka pro spojení pásek/vodič, pásek/pásek, pozinkovaná	ks	20,000	62,40	1 248,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	017	OCHRANA PROTI KOROZI Ochrana podzemních částí a spojů uzemnění proti korozi	m2	1,000	309,56	309,56	
0	M	018	VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 40cm, HLOUBKY 60cm Výkop ve volném terénu šířky 400mm, hloubky 600mm, vč. pískového lože pro kabely, položení kabelů, zapískování, uložení zemního pásu, výstražné fólie, záhozu a hutnění terénu, komplet	m	165,000	345,14	56 948,10	
0	M	019	VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 60cm, HLOUBKY 110cm Výkop pod komunikacemi šířky 600mm, hloubky 1100mm, vč. položení chráničů, obetonování, protažení kabelů, protažení zemního pásu, výstražné fólie, záhozu a hutnění terénu, komplet	m	20,000	817,03	16 340,60	
0	M	020	ODKOPÁNÍ KABELU Nalezení stávajícího smotaného kabelu pod terénem z předchozí etapy výstavby, ruční odkopání, vytažení, očištění, komplet	ks	1,000	4 874,89	4 874,89	
0	M	021	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, hmoždinky, příchytka, atd - komplet	ks	1,000	974,98	974,98	
0	M	022	OSTATNÍ Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, odstranění vad a nedodělků, atd.	hod.	8,000	341,24	2 729,92	
0	M	023	LIKVIDACE Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet	ks	1,000	2 924,94	2 924,94	
0	M	024	ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o shodě, certifikáty, atd.	hod.	6,000	536,24	3 217,44	
0	K	027	MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů	ks	1,000	63 446,05	63 446,05	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 13 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

245 479,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	245 479,94	21,00%	51 550,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

297 030,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 13 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

245 479,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 13 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

245 479,94

0	M	001	STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO venkovní kryté stožárové LED svítidlo 30W, IP65, hliníkový kryt s vysokou odolností proti korozi, práškově lakovaný šedou barvou, integrovaný předřadník, transparentní sklo, 517 x 220 x 117 mm, 4000K, 3400lm, vyzařovací úhel 145x85°, Ra	ks	6,000	17 574,93	105 449,58	
0	M	002	STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ osvětlovací stožár bezpaticový sadový, hliníkový, žárově pozinkovaný dle normy DIN EN ISO 1461, spodní část dřívku nad zemí opatřena otvorem s dvířky pro montáž elektropříslušenství, ve spodní části dřívku pro vetknutí otvor pro p	ks	6,000	7 436,11	44 616,66	
0	M	003	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE stožárová svorkovnice pro montáž do bezpaticových sadových stožárů a sloupků oplocení, připojení jednoho svítidla, smyčková, soustava TN-S, svorky pro připojení vodičů do průřezu 16mm ² , pro připojení max. dvou kabelů 5J, vč. pojist	ks	5,000	701,13	3 505,65	
0	M	004	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE stožárová svorkovnice pro montáž do bezpaticových sadových stožárů a sloupků oplocení, připojení jednoho svítidla, odbočná, soustava TN-S, svorky pro připojení vodičů do průřezu 16mm ² , pro připojení třech kabelů 5J, vč. pojistkového	ks	1,000	701,13	701,13	
0	M	005	1-CYKY-J 5x10mm ² Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	120,000	141,17	16 940,40	
0	M	006	1-CYKY-J 3x1,5mm ² Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá	m	30,000	28,48	854,40	
0	M	007	UKONČENÍ KABELŮ Ukončení kabelů (kabelová oka, návlečky, izolace, atd.) - komplet	ks	1,000	2 077,42	2 077,42	
0	M	008	ZNAČENÍ KABELŮ Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového	ks	13,000	11,95	155,35	
0	M	009	OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 110 Ohebná dvouplášťová kurugovaná chránička, vnější průměr 110mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, -45 - +60°C	m	10,000	87,96	879,60	
0	M	010	SPOJKA OHEBNÉ DVOUPLÁŠŤOVÉ KORUGOVANÉ CHRÁNIČKY PRŮMĚRU 110 Nasouvací spojka dvouplášťové kurugované chráničky vnějšího průměru 110mm	ks	1,000	103,58	103,58	
0	M	011	ZEMNÍ PÁSEK Zemnicí pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. svorek pro spojení dvou pásků, ochrany spoju proti korozi	m	65,000	77,90	5 063,50	
0	M	012	ZEMNÍ DRÁT Zemnicí drát FeZn průměru 10mm, pozinkovaný, potažený PVC	m	12,000	134,40	1 612,80	
0	M	013	SPOJOVACÍ SVORKA SR Spojovací svorka pro spojení pásek/vodič, pásek/pásek, pozinkovaná	ks	20,000	66,48	1 329,60	
0	M	014	OCHRANA PROTI KOROZI Ochrana podzemních částí a spoju uzemnění proti korozi	m ²	0,500	329,79	164,90	
0	M	015	PŘIPOJOVACÍ SVORKA SP FeZn Připojovací svorka SP, FeZn	ks	6,000	58,48	350,88	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	016	VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 40cm, HLOUBKY 60cm Výkop ve volném terénu šířky 400mm, hloubky 600mm, vč. pískového lože pro kabely, položení kabelů, zapískování, uložení zemního pásu, výstražné fólie, záhozu a hutnění terénu, komplet	m	65,000	367,70	23 900,50	
0	M	017	VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 60cm, HLOUBKY 110cm Výkop pod komunikacemi šířky 600mm, hloubky 1100mm, vč. položení chrániček, obetonování, protažení kabelů, protažení zemního pásu, výstražné fólie, záhozu a hutnění terénu, komplet	m	10,000	870,44	8 704,40	
0	M	018	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, hmoždinky, přichytky, atd - komplet	ks	1,000	519,35	519,35	
0	M	019	OSTATNÍ Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, odstranění vad a nedodělků, atd.	hod.	4,000	363,55	1 454,20	
0	M	020	LIKVIDACE Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet	ks	1,000	1 038,71	1 038,71	
0	M	021	ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o shodě, certifikáty, atd.	hod.	4,000	571,29	2 285,16	
0	K	024	MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů	ks	1,000	23 772,17	23 772,17	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 14 - Sadovnické úpravy

Soupis:

SO 14.1 - Sadovnické úpravy - ošetření ponechaných dřevin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 405,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 405,49	21,00%	7 225,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

41 630,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 14 - Sadovnické úpravy

Soupis:

SO 14.1 - Sadovnické úpravy - ošetření ponechaných dřevin

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 405,49

HSV - Práce a dodávky HSV

34 405,49

1 - Zemní práce - ošetření - řezy ponechaných dřevin

34 405,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 14 - Sadovnické úpravy

Soupis:

SO 14.1 - Sadovnické úpravy - ošetření ponechaných dřevin

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

34 405,49

D HSV

Práce a dodávky HSV

34 405,49

D 1

Zemní práce - ošetření - řezy ponechaných dřevin

34 405,49

1	K	R-položka	Volně rostoucí živý plot: Symphoricarpos alba - pámelník bílý Forsythia intermedia - zlatice prostřední Philadelphus coronarius - pustoryl věncový Sambucus nigra - bez černý - celková plocha 12 m2 - zmazení	ks	1,000	4 025,28	4 025,28	
2	K	R2-položka	Namulčování plochy drčenou kůrou ve vrstvě 100 mm vč. specifikace kůry	ks	1,000	2 127,65	2 127,65	
3	K	184852234	Acer platanoides - javor mléč plocha koruny 52m2 - zdravotní řez	ks	1,000	2 921,21	2 921,21	
4	K	R-položka.1	Frangula alnus - krušina olšová plocha koruny 14m2 - zdravotní řez	ks	1,000	1 472,10	1 472,10	
5	K	184852234.1	Quercus robur - dub letní plocha koruny 40m2 - zdravotní řez	ks	1,000	2 921,21	2 921,21	
6	K	184852235	Acer platanoides - javor mléč plocha koruny 63m2 - zdravotní řez	ks	1,000	4 393,31	4 393,31	
7	K	184852913	Acer platanoides - javor mléč plocha koruny 88m2 - zdravotní řez	ks	1,000	4 496,82	4 496,82	
8	K	184806153	Cornus sanguinea - svída krvavá plocha průklest	ks	1,000	56,01	56,01	
9	K	184806152	Lonicera tatarica - zimolez tatarský plocha 18m2 - průklest	ks	1,000	182,86	182,86	
10	K	184852237	- zdravotní řez+lokální řez směrem k překážce	ks	1,000	654,40	654,40	
11	K	184806152.1	Forsythia intermedia - zlatice prostřední plocha 13m2 - průklest	ks	1,000	182,86	182,86	
12	K	R-položka.2	Volně rostoucí živý plot: Philadelphus coronarius - pustoryl věnc. Symphoricarpos alba - pámelník bílý Sambucus nigra - bez černý - celková plocha 28m2 - zmlazovací řez	ks	1,000	8 050,57	8 050,57	
13	K	184852237.1	Robina pseudoacacia - trnovník akát - zdravotní řez	ks	1,000	2 921,21	2 921,21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 14 - Sadovnické úpravy

Soupis:

SO 14.2 - Výsadba a rozvojová péče

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 111 623,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 111 623,41	21,00%	233 440,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 345 064,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 14 - Sadovnické úpravy

Soupis:

SO 14.2 - Výsadba a rozvojová péče

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 111 623,41

HSV - Práce a dodávky HSV

1 111 623,41

1 - Zemní práce - výsadba a rozvojová péče	79 718,14
Výsadba stromů - Výsadba stromů	19 956,18
D1 - LISTNATÉ STROMY ALEJOVÉ, obvod km. 14-16cm, bal 500-600mm	37 964,72
D3 - OSTATNÍ MATERIÁL	10 288,99
Výsadba větších výpě - Výsadba větších výpěstků keřů	18 048,37
D5 - Listnatý keř, kont. 80-100, 100-150 cm, 7 l a více	4 447,92
D3 - OSTATNÍ MATERIÁL	5 086,99
Výsadba pokryvných d - Výsadba pokryvných dřevin a menších výpěstků listnatých keřů	65 337,46
D7 - Listnaté keře kont., 20-30, 40-60	7 952,82
D3 - OSTATNÍ MATERIÁL	18 795,79
Výsadba trvalkových - Výsadba trvalkových záhonů	10 771,30
D8 - TRVALKY k 9 a větší	3 726,24
D3 - OSTATNÍ MATERIÁL	1 336,18
Trávník hřišťový a p - Trávník hřišťový a parkový založený výsevem	77 625,19
Rozvojová péče - prv - Rozvojová péče - první vegetační období	160 538,96
Alejoyé stromy - Alejoyé stromy	10 361,45
Keřové skupiny nové - Keřové skupiny nové	136 719,88
Keřové skupiny stáva - Keřové skupiny stávající u předního plotu	9 271,56
Trvalky - Trvalky	4 186,07

Rozvojová péče - dru - Rozvojová péče - druhé vegetační období	164 650,76
Alekové stromy - Alekové stromy	10 361,45
Keřové skupiny nové - Keřové skupiny nové	140 618,38
Keřové skupiny stáva - Keřové skupiny stávající u předního plotu	9 271,56
Trvalky - Trvalky	4 399,37
Rozvojová péče - tře - Rozvojová péče - třetí vegetační období	188 282,10
Alekové stromy - Alekové stromy	37 891,29
Keřové skupiny nové - Keřové skupiny nové	136 719,88
Keřové skupiny stáva - Keřové skupiny stávající u předního plotu	9 271,56
Trvalky - Trvalky	4 399,37
Rozvojová péče - čtv - Rozvojová péče - čtvrté vegetační období	159 523,14
Alekové stromy - Alekové stromy	9 372,88
Keřové skupiny nové - Keřové skupiny nové	136 719,88
Keřové skupiny stáva - Keřové skupiny stávající u předního plotu	9 271,56
Trvalky - Trvalky	4 158,82
Rozvojová péče - pát - Rozvojová péče - páté vegetační období	118 918,10
Alekové stromy - Alekové stromy	8 731,40
Keřové skupiny nové - Keřové skupiny nové	96 756,32
Keřové skupiny stáva - Keřové skupiny stávající u předního plotu	9 271,56
Trvalky - Trvalky	4 158,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 14 - Sadovnické úpravy

Soupis:

SO 14.2 - Výsadba a rozvojová péče

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 111 623,41

D HSV Práce a dodávky HSV

1 111 623,41

D 1 Zemní práce - výsadba a rozvojová péče

79 718,14

1	K	R položka	Příprava půdy v rovině nebo svahu do 1:5, tj. chemické odplevelení totálním herbicidem, odstranění stařiny - plevelu, rozrušení půdy do hloubky 50-150 mm (rotavátorování, nakopání) plošná úprava nerovností 50-100mm plochy jednotlivě do 500 m2, vláčení – u	m2	1 204,000	53,72	64 678,88	
2	K	R položka.1	Příprava půdy na svahu od 1:5 do 1:2, tj. chemické odplevelení totálním herbicidem, odstranění stařiny - plevelu, rozrušení půdy do hloubky 50-150 mm (nakopání) plošná úprava nerovností 50-100mm plochy jednotlivě do 500 m2, uhrabání	m3	175,000	83,27	14 572,25	
3	K	Pol63	Totální herbicid, např. Roundup Bioaktiv, v množství 50 ml /l vody/ 100 m2	m3	0,690	676,82	467,01	

D Výsadba stromů Výsadba stromů

19 956,18

4	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1m3	ks	6,000	1 449,10	8 694,60	CS ÚRS 2020 02
5	K	R - položka	Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletového hnojiva	ks	6,000	174,81	1 048,86	
6	K	184102115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu přes 500 do 600mm	ks	6,000	531,34	3 188,04	CS ÚRS 2020 02
7	K	R - položka.1	Řez stromů při výsadbě	ks	6,000	165,61	993,66	
8	K	184215133	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, při prům. kůlů do 100mm při délce kůlů přes 2 do 3m	ks	6,000	296,72	1 780,32	CS ÚRS 2020 02
9	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solit. dřevin v rov nebo svahu do 1:5, o prům. mísy do 1m	ks	6,000	79,01	474,06	CS ÚRS 2020 02
10	K	R-položka	Ochrana kmene proti poškození teplotními vlivy nátěrem	ks	6,000	588,84	3 533,04	
11	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	40,60	243,60	CS ÚRS 2020 02

D D1 LISTNATÉ STROMY ALEJOVÉ, obvod km. 14-16cm, bal 500-600mm

37 964,72

12	K	Pol64	Carpinus betulus - habr obecný	ks	2,000	5 755,00	11 510,00	
13	K	Pol75	Prunus padus Colorata - střemcha obecná	ks	1,000	8 587,65	8 587,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	Pol76	Tilia cordata Rancho - lípa malolistá	ks	1,000	4 464,61	4 464,61	
15	K	Pol81	Qurecus robur - dub letní	ks	1,000	5 755,00	5 755,00	
16	K	Pol82	Qurecus robur Fastigiata - dub letní (zavětvený až k zemi)	ks	1,000	7 647,46	7 647,46	

D		D3	OSTATNÍ MATERIÁL	10 288,99				
17	K	Pol83	Zahradnický kompost v dávce 100 l /rostlina	m3	0,600	1 184,58	710,75	
18	K	Pol84	Půdní kondicioner 0,5 kg/jamka (např. Terracottem)	kg	3,000	442,78	1 328,34	
19	K	Pol85	Plné kombinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 150 g / strom	kg	0,900	224,27	201,84	
20	K	Pol86	Kůl frézovaný se špicí 7/250	ks	18,000	284,07	5 113,26	
21	K	Pol87	Příčka 6/60	ks	18,000	40,60	730,80	
22	K	Pol88	Úvazek plochý š. 3 cm, 3 m/strom	m	18,000	20,01	360,18	
23	K	Pol89	Ochranný nátěr proti poškození kmenů teplotními vlivy (např. Arboflex cca 180 g/strom, cena vč. základ. nátěru LX - 60)	kg	1,080	1 109,83	1 198,62	
24	K	Pol90	Voda pro závlivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 100 l/ks	m3	0,600	126,51	75,91	
25	K	Pol91	Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm	m3	0,600	948,82	569,29	

D		Výsadba větších		Výsadba větších výpěstků keřů		18 048,37		
26	K	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu do 1:5 objemu od 0,02 do 0,05 m3	ks	20,000	77,86	1 557,20	CS ÚRS 2020 02
27	K	R - položka.2	Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletového hnojiva	ks	20,000	59,80	1 196,00	
28	K	184102112	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rov. nebo svahu do 1:5 při prům. balu od 200 do 300mm	ks	20,000	90,74	1 814,80	CS ÚRS 2020 02
29	K	R - položka.3	Střih keře při výsadbě	ks	20,000	74,18	1 483,60	
30	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solit. dřevin v rov nebo svahu do 1:5, o prům. mísy do 1m	ks	16,000	79,01	1 264,16	CS ÚRS 2020 02
31	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5	m2	29,500	40,60	1 197,70	CS ÚRS 2020 02

D		D5	Listnatý keř, kont. 80-100, 100-150 cm, 7 l a více	4 447,92				
32	K	Pol92	Cornus mas - dřín obecný - kmínek 80cm a výše	ks	1,000	209,89	209,89	
33	K	Pol93	Corylus avellana - líska obecná v ODRŮDÁCH 80-100 cm	ks	3,000	258,77	776,31	
34	K	Pol94	Hibiscus syriacus Blue Bird - ibišek syrský - kmínek 80cm a více	ks	1,000	376,65	376,65	
35	K	Pol95	Philadelphus coronarius - pustoryl věncový 80-100 cm	ks	5,000	150,09	750,45	
36	K	Pol96	Physocarpus opulifolius Diablo - tavola kalinolistá 100-150	ks	2,000	316,27	632,54	
37	K	Pol97	Viburnum opulus - kalina obecná 80-100	ks	8,000	212,76	1 702,08	

D		D3	OSTATNÍ MATERIÁL	5 086,99				
38	K	Pol98	Zahradnický kompost v dávce 20 l /rostlina	m3	0,400	1 184,58	473,83	
39	K	Pol99	Půdní kondicioner 0,1kg/jamka (např. Terracottem)	kg	2,000	442,78	885,56	
40	K	Pol100	Plné kombinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 80 g / keř	kg	1,600	224,27	358,83	
41	K	Pol91	Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm	m3	2,950	948,82	2 799,02	
42	K	Pol101	Kůl frézovaný se špicí 4/150	ks	2,000	249,57	499,14	
43	K	Pol102	Úvazek plochý š. 2 cm, 0,5 m / dřevina	m	1,000	20,01	20,01	
44	K	Pol103	Voda pro závlivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 20 l/ks	m3	0,400	126,51	50,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D			Výsadba pokryvr Výsadba pokryvných dřevin a menších výpěstků listnatých keřů	65 337,46				
45	K	183111214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu 1:5 objemu od 0,01 do 0,02m3	ks	145,000	55,32	8 021,40	CS ÚRS 2020 02
46	K	R - položka.2.1	Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletového hnojiva	ks	145,000	59,80	8 671,00	
47	K	184102111	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rov. nebo svahu do 1:5 při prům. balu od 100 do 200mm	ks	145,000	53,59	7 770,55	CS ÚRS 2020 02
48	K	R - položka.3.1	Střih keře při výsadbě	ks	145,000	74,18	10 756,10	
49	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5	m2	83,000	40,60	3 369,80	CS ÚRS 2020 02
D			D7 Listnaté keře kont., 20-30, 40-60	7 952,82				
50	K	Pol104	Cornus alba Spaethii - svída bílá 40-60cm	ks	22,000	34,50	759,00	
51	K	Pol105	Philadelphus lemoinei Erectus - pustoryl 40-60cm	ks	42,000	60,38	2 535,96	
52	K	Pol106	Spiraea bumalda Anthony Waterer - tavolník nízký 40-60cm	ks	36,000	60,38	2 173,68	
53	K	Pol107	Spiraea japonica Little Princess - tavolník japonský 20-30cm	ks	9,000	34,50	310,50	
54	K	Pol108	Spiraea cinerea Grefsheim - tavolník popelavý 40-60cm	ks	36,000	60,38	2 173,68	
D			D3 OSTATNÍ MATERIÁL	18 795,79				
55	K	Pol109	Zahradnický kompost v dávce 2 l/rostlina	m3	0,290	1 184,58	343,53	
56	K	Pol110	Půdní kondicioner 0,05 kg/jamka (např. Terracottem)	kg	7,250	442,78	3 210,16	
57	K	Pol111	Plné kombinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 40 g / keř	kg	5,800	224,27	1 300,77	
58	K	Pol91	Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm	m3	14,500	948,82	13 757,89	
59	K	Pol112	Voda pro závlivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 10 l/ks	m3	1,450	126,51	183,44	
D			Výsadba trvalko Výsadba trvalkových záhonů	10 771,30				
60	K	183111213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu 1:5 objemu do 0,01m3	ks	48,000	34,39	1 650,72	CS ÚRS 2020 02
61	K	R - položka.2.2	Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletového hnojiva	ks	48,000	59,80	2 870,40	
62	K	183211322	Výsadba květin hrnkovaných přes 80 do 120mm do předem připravené půdy se zalitím	ks	48,000	19,67	944,16	CS ÚRS 2020 02
63	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5	m2	6,000	40,60	243,60	CS ÚRS 2020 02
D			D8 TRVALKY k 9 a větší	3 726,24				
64	K	Pol113	Salvia nemorosa Mainacht - šalvěj hajní	ks	48,000	77,63	3 726,24	
D			D3 OSTATNÍ MATERIÁL	1 336,18				
66	K	Pol115	Zahradnický kompost v dávce 1 l/rostlina	m3	0,050	1 184,58	59,23	
67	K	Pol116	Půdní kondicioner 0,025 kg/jamka (např. Terracottem)	kg	1,200	442,78	531,34	
68	K	Pol111	Plné kombinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 40 g / keř	kg	1,920	224,27	430,60	
69	K	Pol117	Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 50 mm	m3	0,300	948,82	284,65	
70	K	Pol118	Voda pro závlivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 5 l/ks	m3	0,240	126,51	30,36	
D			Trávník hřišťový Trávník hřišťový a parkový založený výsevem	77 625,19				
71	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 080,000	20,93	22 604,40	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
72	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	175,000	30,82	5 393,50	CS ÚRS 2020 02
73	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině a svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,054	6 980,99	376,97	CS ÚRS 2020 02
74	K	185802123	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu od 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko	t	0,009	13 915,98	125,24	CS ÚRS 2020 02
75	K	184911312	Položení mulčovací textilie ve svahu do 1:2	m2	175,000	71,65	12 538,75	CS ÚRS 2020 02
76	K	185804312	Zalítí plochy jednotlivě přes 20 m2 (14 x 10 l /m2)	m3	24,510	134,56	3 298,07	CS ÚRS 2020 02
77	K	Pol119	Travní směs hřišťová 25 g/m2	kg	27,000	262,22	7 079,94	
78	K	Pol120	Travní směs parková 25 g/m2	kg	4,000	212,76	851,04	
79	K	Pol121	Plné kombinované hnojivo, např. NPK	kg	62,750	55,66	3 492,67	
80	K	Pol122	Kokosová geotextilie 700g/m2 např. Geomanet K700 EKO (x 1,2 koeficient prostřihu a překrytí)	m2	210,000	67,06	14 082,60	
81	K	Pol123	Ocelová kotvící skoba 20 cm např. Geopin steel 20 cm, 5 ks/ m2	ks	875,000	5,35	4 681,25	
82	K	Pol124	Voda pro závlivu (cena vodné + stočné Praha 2019) 10 l/m2 14x	m3	24,510	126,51	3 100,76	

D Rozvojová péče Rozvojová péče - první vegetační období 160 538,96

D Alejové stromy Alejové stromy 10 361,45

83	K	R-položka.1	Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	6,000	652,10	3 912,60	
84	K	R-položka.2	Kontrola úvazků a kůlů vč. případné výměny poškozených kůlů	ks	6,000	210,46	1 262,76	
85	K	R-položka.3	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 80l/strom	m3	3,840	668,20	2 565,89	
86	K	R-položka.4	Odplevelení a úprava kořenové mísy	ks	18,000	94,08	1 693,44	
87	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	6,000	154,46	926,76	

D Keřové skupiny r Keřové skupiny nové 136 719,88

88	K	R-položka.6	Udržovací a výchovný řez keřů	ks	165,000	371,48	61 294,20	
89	K	R-položka.7	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 50l/m2	m3	45,040	668,20	30 095,73	
90	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	339,000	82,23	27 875,97	
91	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	113,000	154,46	17 453,98	

D Keřové skupiny s Keřové skupiny stávající u předního plotu 9 271,56

92	K	R-položka.9	Udržovací a výchovný řez keřů	m2	12,000	371,48	4 457,76	
93	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	36,000	82,23	2 960,28	
94	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	12,000	154,46	1 853,52	

D Trvalky Trvalky 4 186,07

95	K	R-položka.10	Odstranění odkvetlých květenství a odstranění nadzemních částí před zimou	ks	96,000	8,51	816,96	
96	K	R-položka.11	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 30l/m2	m3	1,440	668,20	962,21	
97	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	18,000	82,23	1 480,14	
98	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	6,000	154,46	926,76	

D Rozvojová péče Rozvojová péče - druhé vegetační období 164 650,76

D Alejové stromy Alejové stromy 10 361,45

99	K	R-položka.1	Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	6,000	652,10	3 912,60	
100	K	R-položka.2	Kontrola úvazků a kůlů vč. případné výměny poškozených kůlů	ks	6,000	210,46	1 262,76	
101	K	R-položka.3	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 80l/strom	m3	3,840	668,20	2 565,89	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
102	K	R-položka.4	Odplevelení a úprava kořenové mísy	ks	18,000	94,08	1 693,44	
103	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	6,000	154,46	926,76	
D Keřové skupiny r Keřové skupiny nové							140 618,38	
104	K	R-položka.6	Udržovací a výchovný řez keřů	ks	165,000	371,48	61 294,20	
105	K	R-položka.7	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 50l/m2	m3	45,040	668,20	30 095,73	
106	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	339,000	93,73	31 774,47	
107	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	113,000	154,46	17 453,98	
D Keřové skupiny s Keřové skupiny stávající u předního plotu							9 271,56	
108	K	R-položka.9	Udržovací a výchovný řez keřů	m2	12,000	371,48	4 457,76	
109	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	36,000	82,23	2 960,28	
110	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	12,000	154,46	1 853,52	
D Trvalky Trvalky							4 399,37	
111	K	R-položka.10	Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou	ks	96,000	8,51	816,96	
112	K	R-položka.11	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 30l/m2	m3	1,440	668,20	962,21	
113	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	18,000	94,08	1 693,44	
114	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	6,000	154,46	926,76	
D Rozvojová péče Rozvojová péče - třetí vegetační období							188 282,10	
D Alejové stromy Alejové stromy							37 891,29	
115	K	R-položka.1	Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	6,000	652,10	3 912,60	
116	K	R-položka.2	Kontrola úvazků a kúlů vč. případné výměny poškozených kúlů	ks	6,000	210,46	1 262,76	
117	K	R-položka.3	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 80l/strom	m3	45,040	668,20	30 095,73	
118	K	R-položka.4	Odplevelení a úprava kořenové mísy	ks	18,000	94,08	1 693,44	
119	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	6,000	154,46	926,76	
D Keřové skupiny r Keřové skupiny nové							136 719,88	
120	K	R-položka.6	Udržovací a výchovný řez keřů	ks	165,000	371,48	61 294,20	
121	K	R-položka.7	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 50l/m2	m3	45,040	668,20	30 095,73	
122	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	339,000	82,23	27 875,97	
123	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	113,000	154,46	17 453,98	
D Keřové skupiny s Keřové skupiny stávající u předního plotu							9 271,56	
124	K	R-položka.9	Udržovací a výchovný řez keřů	m2	12,000	371,48	4 457,76	
125	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	36,000	82,23	2 960,28	
126	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	12,000	154,46	1 853,52	
D Trvalky Trvalky							4 399,37	
127	K	R-položka.10	Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou	ks	96,000	8,51	816,96	
128	K	R-položka.11	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 30l/m2	m3	1,440	668,20	962,21	
129	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	18,000	94,08	1 693,44	
130	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	6,000	154,46	926,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D Rozvojová péče Rozvojová péče - čtvrté vegetační období							159 523,14	
D Alejové stromy Alejové stromy							9 372,88	
131	K	R-položka.1	Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	6,000	652,10	3 912,60	
132	K	R-položka.12	Odstranění kotvení	ks	6,000	54,05	324,30	
133	K	R-položka.13	Instalace a dodávka plastové děrované ochrany před poškozením báze kmene vyžínačem (např.TreeProtector - chránička)	ks	6,000	98,56	591,36	
134	K	R-položka.3	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 80l/strom	m3	2,880	668,20	1 924,42	
135	K	R-položka.4	Odplevelení a úprava kořenové mísy	ks	18,000	94,08	1 693,44	
136	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	6,000	154,46	926,76	
D Keřové skupiny r Keřové skupiny nové							136 719,88	
137	K	R-položka.6	Udržovací a výchovný řez keřů	ks	165,000	371,48	61 294,20	
138	K	R-položka.7	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 50l/m2	m3	45,040	668,20	30 095,73	
139	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	339,000	82,23	27 875,97	
140	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	113,000	154,46	17 453,98	
D Keřové skupiny s Keřové skupiny stávající u předního plotu							9 271,56	
141	K	R-položka.9	Udržovací a výchovný řez keřů	m2	12,000	371,48	4 457,76	
142	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	36,000	82,23	2 960,28	
143	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	12,000	154,46	1 853,52	
D Trvalky Trvalky							4 158,82	
144	K	R-položka.10	Odstranění odkvetlých květenství a odstranění nadzemních částí před zimou	ks	96,000	8,51	816,96	
145	K	R-položka.11	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 30l/m2	m3	1,080	668,20	721,66	
146	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	18,000	94,08	1 693,44	
147	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	6,000	154,46	926,76	
D Rozvojová péče Rozvojová péče - páté vegetační období							118 918,10	
D Alejové stromy Alejové stromy							8 731,40	
148	K	R-položka.1	Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	6,000	652,10	3 912,60	
149	K	R-položka.12	Odstranění kotvení	ks	6,000	54,05	324,30	
150	K	R-položka.13	Instalace a dodávka plastové děrované ochrany před poškozením báze kmene vyžínačem (např.TreeProtector - chránička)	ks	6,000	98,56	591,36	
151	K	R-položka.3	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 80l/strom	m3	1,920	668,20	1 282,94	
152	K	R-položka.4	Odplevelení a úprava kořenové mísy	ks	18,000	94,08	1 693,44	
153	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	6,000	154,46	926,76	
D Keřové skupiny r Keřové skupiny nové							96 756,32	
154	K	R-položka.6	Udržovací a výchovný řez keřů	ks	165,000	371,48	61 294,20	
155	K	R-položka.7	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 50l/m2	m3	22,520	668,20	15 047,86	
156	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	36,000	82,23	2 960,28	
157	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	113,000	154,46	17 453,98	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D Keřové skupiny s Keřové skupiny stávající u předního plotu							9 271,56	
158	K	R-položka.9	Udržovací a výchovný řez keřů	m2	12,000	371,48	4 457,76	
159	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	36,000	82,23	2 960,28	
160	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	12,000	154,46	1 853,52	
D Trvalky Trvalky							4 158,82	
161	K	R-položka.10	Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou	ks	96,000	8,51	816,96	
162	K	R-položka.11	Zalití rostlin vč. ceny vody - 30l/m2	m3	1,080	668,20	721,66	
163	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	18,000	94,08	1 693,44	
164	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	6,000	154,46	926,76	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 15 - Oplocení a terenní úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 918 194,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 918 194,91	21,00%	402 820,93
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 321 015,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 15 - Oplocení a terenní úpravy

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 918 194,91

HSV - Práce a dodávky HSV

1 833 408,91

1 - Zemní práce	137 149,42
-----------------	------------

2 - Zakládání	11 022,44
---------------	-----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	424 846,88
-----------------------------------	------------

4 - Vodorovné konstrukce	4 151,97
--------------------------	----------

5 - Komunikace pozemní	263 382,27
------------------------	------------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	947 900,33
---	------------

997 - Přesun sutě	12 775,45
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	32 180,15
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

84 786,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	466,71
---	--------

764 - Konstrukce klempířské	2 633,34
-----------------------------	----------

766 - Konstrukce truhlářské	474,51
-----------------------------	--------

783 - Dokončovací práce - nátěry	81 211,44
----------------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 15 - Oplocení a terenní úpravy

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 918 194,91

D HSV Práce a dodávky HSV

1 833 408,91

D 1 Zemní práce

137 149,42

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	89,700	283,30	25 412,01	CS ÚRS 2020 02
	VV		dopadové plochy (22,0+2,0+21,0+12,0)*0,30		17,100			
	VV		hřiště					
	VV		242,0*0,30		72,600			
	VV		Součet		89,700			
3	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,794	578,01	1 614,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		pilíř elektrorozvaděče (0,60*2,80+1,0*3,40)/2*1,10		2,794			
	VV		Součet		2,794			
5	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,709	2 136,77	1 514,97	CS ÚRS 2020 02
	VV		betonová patka sloupku 0,15*0,15*0,70*45,0		0,709			
	VV		Součet		0,709			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	93,203	375,39	34 987,47	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina na skládce					
	VV		89,7+2,794+0,709		93,203			
	VV		Součet		93,203			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	466,015	27,37	12 754,83	CS ÚRS 2020 02
	VV		93,203*5 "Přepočtené koeficientem množství		466,015			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	149,125	394,13	58 774,64	CS ÚRS 2020 02
	VV		93,203*1,60		149,125			
	VV		Součet		149,125			
71	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	93,203	22,43	2 090,54	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina na skládce					
	VV		89,7+2,794+0,709		93,203			
	D	2	Zakládání				11 022,44	
10	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	1,265	4 025,28	5 091,98	CS ÚRS 2020 02
	VV		základ elektropilíře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,45*2,555*1,10		1,265			
	VV		Součet		1,265			
11	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	6,611	690,05	4 561,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		základ elektropilíře					
	VV		(0,45+2,555)*2*1,10		6,611			
	VV		Součet		6,611			
12	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	6,611	207,01	1 368,54	CS ÚRS 2020 02
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				424 846,88	
13	K	331231334	Zdivo pilířů z cihel lícových plných dl 240 mm na MVC (cihla VPC mrazuvzdorná NF 240x115x71 mm)	m3	1,789	35 882,52	64 193,83	CS ÚRS 2020 02
	VV		pilíř pro rozvaděč					
	VV		2,555*0,45*2,055-(0,81*1,605+0,65*0,94)*0,30		1,789			
	VV		Součet		1,789			
14	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním beton C30/37	kus	45,000	451,41	20 313,45	CS ÚRS 2020 02
	VV		45,0		45,000			
	VV		Součet		45,000			
15	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a lakovaný 2500/38x1,5mm	kus	45,000	359,98	16 199,10	CS ÚRS 2020 02
16	M	55342270	vzpěra plotová 48x1,5mm lakovaná včetně krytky s uchem 1500mm	kus	24,000	417,48	10 019,52	CS ÚRS 2020 02
17	K	3481011R1	D+M branka 1000x2000 mm žárový pozink na ocelové sloupky	kus	1,000	17 711,24	17 711,24	
18	K	3481011R2	D+M hlavní branka 1000x2000 m včetně plotových polí 1860x1450, žárový pozink	kpl	1,000	28 464,50	28 464,50	
19	K	3481012R1	D+M vjezdová otočná brána 4200x2000 mm s elektrickým pohonem	kus	1,000	109 717,71	109 717,71	
	VV		pohon otočné brány do 4 m na 2 kř., max. 400 kg					
	VV		ovladač HS 4 BS ref.v. Rota Matic /P2					
	VV		2x automatický pohon					
	VV		1x řídicí centrála					
	VV		1x čtyřkanálový dálkový ovladač HS4 BS					
	VV		1x integrovaný přijímač 868, 3 BS MHz					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
20	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	44,000	276,02	12 144,88	CS ÚRS 2020 02
	VV		44,0		44,000			
	VV		Součet		44,000			
21	M	5923312R	deska plotová betonová 2950x50x290mm	kus	44,000	832,66	36 637,04	
22	K	3481711R1	D+M nové oplocení 1,34+2x2,07x1400 mm, žárový pozink	kpl	1,000	33 110,83	33 110,83	
23	K	348273902	Držák plotových polí průběžný dl 300 mm vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	88,000	169,06	14 877,28	CS ÚRS 2020 02
24	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	125,000	163,31	20 413,75	CS ÚRS 2020 02
25	M	31324810	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	125,000	328,35	41 043,75	CS ÚRS 2020 02
D 4			Vodorovné konstrukce				4 151,97	
27	K	411321313	Stropy deskové ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,128	4 370,31	559,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		pilíř pro rozvaděč					
	VV		stropní deska ve spádu 3%					
	VV		2,555*0,50*0,10		0,128			
	VV		Součet		0,128			
28	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,889	1 150,08	2 172,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		pilíř pro rozvaděč					
	VV		stropní deska ve spádu 3%					
	VV		(2,555+0,50)*2*0,10+2,555*0,50		1,889			
	VV		Součet		1,889			
29	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	1,889	287,52	543,13	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	0,525	287,52	150,95	CS ÚRS 2020 02
	VV		pilíř pro rozvaděč					
	VV		stropní deska ve spádu 3%					
	VV		(0,81+0,94)*0,30		0,525			
	VV		Součet		0,525			
31	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	0,525	172,51	90,57	CS ÚRS 2020 02
32	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,017	37 377,63	635,42	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130 kg/m3					
	VV		0,128*0,130		0,017			
	VV		Součet		0,017			
D 5 Komunikace pozemní							263 382,27	
33	K	564801111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm fr 0-4	m2	75,200	70,50	5 301,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		dopadové plochy					
	VV		24,20+18,0+21,0+12,0		75,200			
	VV		Součet		75,200			
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm fr 0-32	m2	75,200	506,04	38 054,21	CS ÚRS 2020 02
35	K	5792313R1	Ručně litý pryžový povrch stabilizační EPDM tl. 35mm horní vrstva probarvená ve hmotě	m2	75,200	2 000,62	150 446,62	
36	K	5891161R1	Pískové hřiště	m2	242,000	287,52	69 579,84	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							947 900,33	
37	K	91623211R	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrušníků do betonového lože výšky 25 mm (pryžový obrušník)	m	167,000	943,07	157 492,69	
	VV		hřiště					
	VV		167,0		167,000			
	VV		Součet		167,000			
38	K	9162391R1	D+M herní prvek - skluzavka zabudovaná do svahu dřevo a nerez š. 1,3 m, dl. 3,10 m, v. 2,20 m	kus	1,000	80 172,48	80 172,48	
39	K	9162391R2	D+M herní prvek - domeček dřevěný 1,30x1,90x2,20 m	kus	1,000	110 833,63	110 833,63	
40	K	9162391R3	D+M herní prvek - pružinová houpačka 1,0x0,24x0,9 m	kus	3,000	28 027,81	84 083,43	
41	K	9162391R4	D+M herní prvek - pískoviště otevřené šestiboké 3,0x2,60 m, v. 0,30 m se zakrývacím prvkem	kus	2,000	47 383,67	94 767,34	
42	K	9162391R5	D+M herní prvek - loď dřevěná s plastovou skluzavkou 7,50x2,60 m, v. 4,0 m	kus	1,000	235 996,93	235 996,93	
43	K	9162391R6	D+M herní prvek - mlhoviště sprcha s květy na stonku nerez a komaxit 0,90x0,49x1,70 m	kus	1,000	49 419,32	49 419,32	
44	K	9162391R7	D+M herní prvek - demontovatelná terasa - modřínové palubky ošetřené odolnou lazurou, ocelová jeklová konstrukce, podkladní betonové dlaždice	kpl	1,000	47 153,31	47 153,31	
45	K	9360010R1	D+M vyvýšené záhony čtvercové dřevěné 435x1300x1300 mm	kus	2,000	10 350,73	20 701,46	
46	K	9361042R1	D+M odpadkový koš na tříděný odpad 3x 65l, dřevo, kovové části žárový pozink. 960x390 mm	kus	2,000	9 775,69	19 551,38	
47	K	9361042R2	D+M odpadkový koš na běžný odpad kulatý, dřevo, objem 35l, průměr 330 mm, v. 900 mm	kus	2,000	4 715,33	9 430,66	
48	K	9361241R1	D+M dětská lavička zabudovaná s opěrkou zad 1750x270x520 mm	kus	4,000	4 485,32	17 941,28	
49	K	936174311	Montáž stojanu na kola pro 5 kol kotevními šrouby na pevný podklad	kus	2,000	1 437,60	2 875,20	CS ÚRS 2020 02
50	M	74910151	stojan na kola na 5 kol jednostranný, kov 570x1750x500mm	kus	2,000	8 740,61	17 481,22	CS ÚRS 2020 02
D 997 Přesun sutě							12 775,45	
51	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	7,475	447,96	3 348,50	CS ÚRS 2020 02
52	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,475	314,55	2 351,26	CS ÚRS 2020 02
53	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	104,650	47,84	5 006,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		7,475*14 "Přepočtené koeficientem množství		104,650			
54	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	7,475	276,82	2 069,23	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				32 180,15	
55	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m	t	104,288	308,57	32 180,15	CS ÚRS 2020 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				84 786,00	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				466,71	
56	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1,150	18,40	21,16	CS ÚRS 2020 02
	VV		základ elektropilíře					
	VV		0,45*2,555		1,150			
	VV		Součet		1,150			
57	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,001	56 123,94	56,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,33333333333333*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,001			
58	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1,150	123,06	141,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		základ elektropilíře					
	VV		0,45*2,555		1,150			
	VV		Součet		1,150			
59	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	1,323	177,11	234,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		1,15*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		1,323			
60	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,000	4,53	13,59	CS ÚRS 2020 02
D 764			Konstrukce klempířské				2 633,34	
61	K	764111641	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu do 30°	m2	1,482	1 725,12	2 556,63	CS ÚRS 2020 02
	VV		2,60*0,57		1,482			
	VV		Součet		1,482			
62	K	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	3,000	25,57	76,71	CS ÚRS 2020 02
D 766			Konstrukce truhlářské				474,51	
63	K	7666607R1	D+M systém generální klíče - vložka a zámek FAB 300/FAB 300 HD + 2x klíč	kus	1,000	460,68	460,68	
	VV		• vhodné pro projekty středního rozsahu					
	VV		• zabezpečení splňující požadavky					
	VV		pro RC3 podle ENV 1627 nebo NBÚ SS4=2					
	VV		• systémy chráněné patentem					
	VV		• vysoká úroveň zabezpečení					
	VV		• rozsáhlá rozměrová řada					
	VV		• široká nabídka kompatibilních zámků					
	VV		• výroba klíče ve výrobním závodě pouze se					
	VV		souhlasem majitele					
	VV		POPIS VÝROBKU					
	VV		• 5ti stavítkový uzamykací systém					
	VV		• přidavné kódování na hřbetu klíče-HD					
	VV		• mosazné těleso i bubínek					
	VV		• spojka úplná nesymetrická					
	VV		PROVEDENÍ VÝROBKU					
	VV		• standardní povrchová úprava:					
	VV		– leštěná mosaz					
	VV		– saténový nikl, označení „Ns“					
	VV		• oboustranná cylindrická vložka:					
	VV		– označení „FAB 300 nebo FAB 300HD“					
	VV		– rozměr od 30+30 mm					
	VV		– další rozměry odstupňované po 5mm					
	VV		• knoflíková cylindrická vložka:					
	VV		– označení „FAB 302 nebo FAB 302HD“					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		– rozměr od 30+30mm					
	VV		– standardně osazen černý plastový					
	VV		knoflík 22mm					
	VV		– další rozměry odstupňované po 5 mm					
	VV		• jednostranná cylindrická vložka:					
	VV		– označení „FAB 301 nebo FAB 301HD“					
	VV		– standardně nastavitelný zub „Z“					
	VV		– rozměr od 30+10mm					
	VV		– další rozměry odstupňované po 5mm					
	VV		RC3, dle ČSN EN 1627:2012 Uzamykací systém typ 2. Dle požadavku NBÚ					
	VV		v souladu se zákonem č. 412/205 sb.					
	VV		Systémy generálního klíče FAB 300/ FAB 300 HD					
	VV		Klíč FAB 300HD					
	VV		DOPLŇKY					
	VV		• zvýšená ochrana proti odvrtání,					
	VV		označení „B“					
	VV		• prostupová spojka, označení „P“					
	VV		• ozubené kolo, 10 zubů („K10“)					
	VV		nebo 12 zubů („K12“)					
	VV		• malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“					
	VV		nebo velký kovový knoflík 30 mm,					
	VV		označení „VK“					
	VV		KLÍČE					
	VV		• polotovary klíče FAB 300HD					
	VV		• patentově chráněná technologie					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
64	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,000	4,61	13,83	CS ÚRS 2020 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry	81 211,44				
65	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	156,600	34,50	5 402,70	CS ÚRS 2020 02
66	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	156,600	34,50	5 402,70	CS ÚRS 2020 02
67	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	156,600	9,20	1 440,72	CS ÚRS 2020 02
68	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	156,600	71,31	11 167,15	CS ÚRS 2020 02
	VV		nátěr stávajícího oplocení					
	VV		52,20*1,50*2		156,600			
	VV		Součet		156,600			
69	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	191,799	138,01	26 470,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		stávající oplocení					
	VV		156,60		156,600			
	VV		vjezdová brána					
	VV		4,20*2,0*1,50		12,600			
	VV		branky					
	VV		1,0*2,0*1,50		3,000			
	VV		plotová pole					
	VV		(1,86*1,45*2+(1,34+2,07*2)*1,40)*1,50		19,599			
	VV		Součet		191,799			
70	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (nátěr dle stávajícího ve třech odstínech RAL- žlutá, zelená, oranžová.)	m2	226,998	138,01	31 327,99	CS ÚRS 2020 02
	VV		stávající oplocení					
	VV		156,60		156,600			
	VV		2x nátěr					
	VV		vjezdová brána					
	VV		4,20*2,0*1,50*2		25,200			
	VV		branky					
	VV		1,0*2,0*1,50*2		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			plotová pole					
VV			(1,86*1,45*2+(1,34+2,07*2)*1,40)*1,50*2		39,198			
VV			Součet		226,998			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 16 - Retenční nádrž

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 884 738,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 884 738,47	21,00%	395 795,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 280 533,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 16 - Retenční nádrž

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 884 738,47

HSV - Práce a dodávky HSV

1 767 730,31

1 - Zemní práce	752 355,35
-----------------	------------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	765 875,51
-----------------------------------	------------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	48 227,97
--	-----------

8 - Trubní vedení	45 818,74
-------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 713,89
---	-----------

997 - Přesun sutě	129,91
-------------------	--------

998 - Přesun hmot	62 608,94
-------------------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

117 008,16

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 874,69
---	-----------

712 - Povlakové krytiny	23 033,82
-------------------------	-----------

713 - Izolace tepelné	47 562,17
-----------------------	-----------

767 - Konstrukce zámečnické	35 537,48
-----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 16 - Retenční nádrž

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 884 738,47

D HSV Práce a dodávky HSV

1 767 730,31

D 1 Zemní práce

752 355,35

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	176,231	171,76	30 269,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.16.4					
	VV		3,10*12,10*0,25+(16,80*8,0+13,40*3,10)/2*3,90		352,461			
	VV		Mezisoučet		352,461			
	VV		v hor. 3 ... 50%					
	VV		352,461*0,50		176,231			
3	K	131351104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 500 m3 strojně	m3	176,231	254,57	44 863,13	CS ÚRS 2020 02
	VV		výpočet v hor. 3					
	VV		v hor. 4 ... 50%					
	VV		352,461*0,50		176,231			
	VV		Součet		176,231			
6	K	162351123	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	515,244	62,68	32 295,49	CS ÚRS 2020 02
	VV		zemina na meziskládku a zpětný zásyp					
	VV		257,622*2		515,244			
	VV		Součet		515,244			
7	K	162751137	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	94,839	375,39	35 601,61	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina na skládku					
	VV		352,461-257,622		94,839			
	VV		Součet		94,839			
8	K	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	474,195	27,37	12 978,72	CS ÚRS 2020 02
	VV		94,839*5 "Přepočtené koeficientem množství"		474,195			
9	K	167151112	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3	m3	515,244	943,07	485 911,16	CS ÚRS 2020 02
10	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	151,742	394,13	59 806,07	CS ÚRS 2020 02
	VV		94,839*1,60		151,742			
	VV		Součet		151,742			
54	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	352,461	22,43	7 905,70	CS ÚRS 2020 02
11	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	257,622	165,84	42 724,03	CS ÚRS 2020 02
	VV		352,461 "výkopek celkem		352,461			
	VV		odečet nádrže					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-(12,10*3,2*2,35+3,14*0,65*0,65*1,45*2)		-94,839			
	VV		Součet		257,622			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				765 875,51	
12	K	380321662	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm	m3	68,106	4 393,31	299 210,77	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.16.4					
	VV		3,00*12,0*0,20 "dno		7,200			
	VV		3,0*12,0*0,20-3,14*0,5*0,5*0,20*2 "strop		6,886			
	VV		(12,0+2,60)*2*1,85 "stěny		54,020			
	VV		Součet		68,106			
13	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	145,630	690,05	100 491,98	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.16.4					
	VV		2,60*11,60-3,14*0,5*0,5*2		28,590			
	VV		(3,0+12,0)*2*2,15+(2,60+11,60)*2*1,85		117,040			
	VV		Součet		145,630			
14	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	145,630	230,02	33 497,81	CS ÚRS 2020 02
15	K	380356221	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených zřízení	m2	1,256	1 150,08	1 444,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		otvor vstupu do nádrže					
	VV		3,14*1,00*0,20*2		1,256			
	VV		Součet		1,256			
16	K	380356222	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených odstranění	m2	1,256	230,02	288,91	CS ÚRS 2020 02
17	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	8,854	37 377,63	330 941,54	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		68,106*0,130		8,854			
	VV		Součet		8,854			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 227,97	
18	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,948	6 887,83	27 193,15	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.16.4					
	VV		spádový beton tl. 40-100mm - strop					
	VV		(3,10*12,10-3,14*0,65*0,65*2)*(0,04+0,10)/2		2,440			
	VV		spádový beton dno tlm 50 mm					
	VV		11,60*2,60*0,05		1,508			
	VV		Součet		3,948			
19	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,751	5 607,79	21 034,82	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.16.4					
	VV		podkladní beton					
	VV		3,10*12,10*0,10		3,751			
	VV		Součet		3,751			
D	8		Trubní vedení				45 818,74	
20	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	2 415,17	9 660,68	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha S.1.16.4					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
21	M	59224162	skruž kanalizační 100 x 100 x 12 cm	kus	2,020	3 145,70	6 354,31	CS ÚRS 2020 02
	VV		2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		2,020			
22	M	59224160	skruž kanalizační 100 x 25 x 12 cm	kus	2,020	1 218,51	2 461,39	CS ÚRS 2020 02
	VV		2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		2,020			
23	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	2 415,17	4 830,34	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha S.1.16.4					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm	kus	2,020	1 989,98	4 019,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		2*1,01 "Přepočtené koeficientem množství		2,020			
25	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	1 610,11	3 220,22	CS ÚRS 2020 02
26	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 uzamykatelný včetně soupravy klíče	kus	2,000	6 909,63	13 819,26	CS ÚRS 2020 02
27	K	89962013R	Obetonování plastové šachty betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,109	6 440,45	702,01	
	VV		obetonování vstupu					
	VV		3,14*1,30/6*0,40*0,20*2		0,109			
	VV		Součet		0,109			
28	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevřený výkop	m2	0,544	1 380,10	750,77	CS ÚRS 2020 02
	VV		obetonování vstupu					
	VV		3,14*1,30/6*0,40*2		0,544			
	VV		Součet		0,544			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 713,89	
29	K	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně	m	30,000	747,55	22 426,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		retenční nádrž					
	VV		(12,0+3,0)*2		30,000			
	VV		Součet		30,000			
30	K	933901111	Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3	m3	54,288	69,00	3 745,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		11,60*2,60*1,80		54,288			
	VV		Součet		54,288			
31	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	54,288	43,70	2 372,39	CS ÚRS 2020 02
32	K	952903112	Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	30,160	138,01	4 162,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		11,60*2,60		30,160			
	VV		Součet		30,160			
33	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,600	3 047,71	1 828,63	CS ÚRS 2020 02
	VV		přepad, odtok a přítok					
	VV		0,20*3		0,600			
	VV		Součet		0,600			
34	K	9853241R1	Nátěr betonové konstrukce krystalizační nátěrovou hmotou	m2	84,310	690,05	58 178,12	
	VV		příloha D.1.16.4					
	VV		(2,60+11,60)*1,80+11,60*2,60*2-3,14*0,50*0,50*2		84,310			
	VV		Součet		84,310			
D 997			Přesun sutě				129,91	
35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,076	447,96	34,04	CS ÚRS 2020 02
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,076	314,55	23,91	CS ÚRS 2020 02
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,064	47,84	50,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		0,076*14 "Přepočtené koeficientem množství		1,064			
38	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,076	277,05	21,06	CS ÚRS 2020 02
D 998			Přesun hmot				62 608,94	
39	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	204,424	306,27	62 608,94	CS ÚRS 2020 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				117 008,16	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 874,69	
40	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	83,912	40,25	3 377,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.16.4					
	VV		separační fólie PVC					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(12,10+3,10)*2*2,25		68,400			
		VV	3,14*1,30*1,90*2		15,512			
		VV	Součet		83,912			
41	M	2832305R	<i>folie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1,5mm</i>	m2	100,694	71,31	7 180,49	
		VV	83,912*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		100,694			
42	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	3,000	105,58	316,74	CS ÚRS 2020 02
D 712			Povlakové krytiny				23 033,82	
43	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	34,857	313,97	10 944,05	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.16.4					
		VV	separační folie PVC					
		VV	12,10*3,10-3,14*0,65*0,65*2		34,857			
		VV	Součet		34,857			
44	M	2832201R	<i>folie hydroizolační mPVC tl 1,5mm</i>	m2	40,086	182,86	7 330,13	
		VV	34,857*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		40,086			
45	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	34,857	27,60	962,05	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.16.4					
		VV	12,10*3,10-3,14*0,65*0,65*2		34,857			
		VV	Součet		34,857			
46	M	69311199	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2</i>	m2	40,086	23,00	921,98	CS ÚRS 2020 02
		VV	34,857*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		40,086			
47	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	34,857	36,80	1 282,74	CS ÚRS 2020 02
48	M	69311199	<i>geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2</i>	m2	40,086	23,00	921,98	CS ÚRS 2020 02
		VV	34,857*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		40,086			
49	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	3,000	223,63	670,89	CS ÚRS 2020 02
D 713			Izolace tepelné				47 562,17	
50	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	83,462	195,51	16 317,66	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.16.4					
		VV	(12,10+3,0)*2*2,25		67,950			
		VV	3,14*1,30*1,90*2		15,512			
		VV	Součet		83,462			
51	M	28376379	<i>deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm</i>	m2	87,635	356,53	31 244,51	CS ÚRS 2020 02
		VV	83,462*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		87,635			
D 767			Konstrukce zámečnické				35 537,48	
52	K	7678610R1	D+M žebřík nerez dl. 3,20m včtrně kotvení kotevního materiálu	kus	2,000	17 251,21	34 502,42	
53	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000	345,02	1 035,06	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 16 - Retenční nádrž

Soupis:

SO 16.2 - ZTI zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 967,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	27 967,97	21,00%	5 873,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

33 841,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 16 - Retenční nádrž

Soupis:

SO 16.2 - ZTI zemní práce

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

27 967,97

HSV - Práce a dodávky HSV

22 528,14

1 - Zemní práce

20 458,85

2 - Zakládání

697,78

998 - Přesun hmot

1 371,51

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 439,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 16 - Retenční nádrž

Soupis:

SO 16.2 - ZTI zemní práce

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

27 967,97

D HSV Práce a dodávky HSV

22 528,14

D 1 Zemní práce

20 458,85

1	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	427,72	4 277,20	CS ÚRS 2020 02
2	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000	34,62	692,40	CS ÚRS 2020 02
3	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000	18,86	377,20	CS ÚRS 2020 02
4	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	5,000	423,69	2 118,45	CS ÚRS 2020 02
5	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	5,000	202,18	1 010,90	CS ÚRS 2020 02
6	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,700	209,77	776,15	CS ÚRS 2020 02
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	14,800	326,97	4 839,16	CS ÚRS 2020 02
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	14,800	172,86	2 558,33	CS ÚRS 2020 02
11	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,700	62,68	231,92	CS ÚRS 2020 02
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3,700	348,01	1 287,64	CS ÚRS 2020 02
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,700	22,43	82,99	CS ÚRS 2020 02
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,700	165,84	613,61	CS ÚRS 2020 02
15	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	10,000	123,98	1 239,80	CS ÚRS 2020 02
16	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	10,000	35,31	353,10	CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání

697,78

17	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	1,600	436,11	697,78	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

D 998 Přesun hmot

1 371,51

18	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	3,192	429,67	1 371,51	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	5 439,83				
19	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000	494,53	2 472,65	CS ÚRS 2020 02
20	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	3,000	494,53	1 483,59	CS ÚRS 2020 02
21	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	3,000	494,53	1 483,59	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 16 - Retenční nádrž

Soupis:

SO 16.3 - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

153 156,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	153 156,83	21,00%	32 162,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

185 319,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 16 - Retenční nádrž

Soupis:

SO 16.3 - ZTI

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

153 156,83

HSV - Práce a dodávky HSV

66 789,04

8 - Trubní vedení

54 208,79

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 428,40

997 - Přesun sutě

0,22

998 - Přesun hmot

11 151,63

PSV - Práce a dodávky PSV

57 903,09

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

201,25

767 - Konstrukce zámečnické

57 701,84

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

28 464,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt: SO 16 - Retenční nádrž

Soupis: SO 16.3 - ZTI

Místo: Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							153 156,83	
D HSV Práce a dodávky HSV							66 789,04	
D 8 Trubní vedení							54 208,79	
1	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	5,000	322,02	1 610,10	CS ÚRS 2020 02
2	M	28611177	trubka kanalizační PVC DN 200x3000 mm SN 10	m	5,000	1 036,19	5 180,95	CS ÚRS 2020 02
3	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	1,000	12 880,91	12 880,91	CS ÚRS 2020 02
4	M	59224029	dno betonové šachtové betonové dno 100 x 78,5 x 15 cm	kus	1,000	13 400,63	13 400,63	CS ÚRS 2020 02
VV					0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,000	
VV					Součet		1,000	
5	M	59224002	dílec betonový pro vstupní šachty 100x100x9 cm	kus	1,000	2 768,93	2 768,93	CS ÚRS 2020 02
VV					0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,000	
VV					Součet		1,000	
6	M	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	3,000	3 145,70	9 437,10	CS ÚRS 2020 02
VV					2,95566502463054*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		3,000	
VV					Součet		3,000	
7	M	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	2,000	1 852,44	3 704,88	CS ÚRS 2020 02
VV					1,97044334975369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,000	
VV					Součet		2,000	
8	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsové plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	1,000	1 989,98	1 989,98	CS ÚRS 2020 02
VV					0,985221674876847*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		1,000	
VV					Součet		1,000	
9	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	2,000	544,22	1 088,44	CS ÚRS 2020 02
VV					1,97044334975369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,000	
VV					Součet		2,000	
10	M	59224176	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm	kus	2,000	511,33	1 022,66	CS ÚRS 2020 02
VV					1,97044334975369*1,015 "Přepočtené koeficientem množství		2,000	
VV					Součet		2,000	
11	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	2,000	483,03	966,06	CS ÚRS 2020 02
12	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	5,000	31,63	158,15	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
							1 428,40	
13	K	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	138,01	828,06	CS ÚRS 2020 02
14	K	977131210	Vrty dovrchní přiklepovými vrtáky D do 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	1,000	600,34	600,34	CS ÚRS 2020 02
D 997			Přesun sutě					
							0,22	
15	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,001	103,51	0,10	CS ÚRS 2020 02
16	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,001	115,01	0,12	CS ÚRS 2020 02
D 998			Přesun hmot					
							11 151,63	
17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	9,414	977,57	9 202,84	CS ÚRS 2020 02
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	9,414	207,01	1 948,79	CS ÚRS 2020 02
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							57 903,09	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
							201,25	
19	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	5,000	40,25	201,25	CS ÚRS 2020 02
D 767			Konstrukce zámečnické					
							57 701,84	
20	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	3,000	289,82	869,46	CS ÚRS 2020 02
21	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	3,000	209,31	627,93	CS ÚRS 2020 02
22	K	767995R01	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kus	1,000	4 025,28	4 025,28	
23	M	42221507R01	vírový ventil těsnicí CEV 250 s bezpečnostním přepadem Mosbaek	kus	1,000	52 179,17	52 179,17	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
							28 464,70	
24	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	40,000	517,54	20 701,60	CS ÚRS 2020 02
25	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	15,000	517,54	7 763,10	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 17 - Lapák tuku

Soupis:

SO 17.1 - ZTI - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 939,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 939,64	21,00%	15 947,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

91 886,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 17 - Lapák tuku

Soupis:

SO 17.1 - ZTI - zemní práce

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 939,64

HSV - Práce a dodávky HSV

70 499,81

1 - Zemní práce

66 227,01

2 - Zakládání

331,44

998 - Přesun hmot

3 941,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 439,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt: SO 17 - Lapák tuku

Soupis: SO 17.1 - ZTI - zemní práce

Místo: Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							75 939,64	
D HSV Práce a dodávky HSV							70 499,81	
D 1 Zemní práce							66 227,01	
1	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	10,000	427,72	4 277,20	CS ÚRS 2020 02
2	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	30,000	34,62	1 038,60	CS ÚRS 2020 02
3	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,000	18,86	565,80	CS ÚRS 2020 02
4	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000	423,69	4 236,90	CS ÚRS 2020 02
5	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000	202,18	2 021,80	CS ÚRS 2020 02
6	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,790	209,77	3 102,50	CS ÚRS 2020 02
8	K	132251251	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	12,240	648,30	7 935,19	CS ÚRS 2020 02
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	11,600	326,97	3 792,85	CS ÚRS 2020 02
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	11,600	172,86	2 005,18	CS ÚRS 2020 02
13	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,030	62,68	1 694,24	CS ÚRS 2020 02
26	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	6,080	375,39	2 282,37	CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku								
VV 27,03-20,95					6,080			
27	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	30,400	27,37	832,05	CS ÚRS 2020 02
VV 6,08*5 *Přepočtené koeficientem množství					30,400			
14	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	27,030	348,01	9 406,71	CS ÚRS 2020 02
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,030	22,43	606,28	CS ÚRS 2020 02
28	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	9,728	394,13	3 834,10	CS ÚRS 2020 02
VV přebytečná zemina na skládku								
VV (27,03-20,95)*1,6					9,728			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	20,950	165,84	3 474,35	CS ÚRS 2020 02
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	3,820	767,91	2 933,42	CS ÚRS 2020 02
18	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	7,640	761,24	5 815,87	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	3,82*2 "Přepočtené koeficientem množství		7,640			
		VV	Součet		7,640			
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	40,000	123,98	4 959,20	CS ÚRS 2020 02
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	40,000	35,31	1 412,40	CS ÚRS 2020 02
D 2 Zakládání							331,44	
21	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	0,760	436,11	331,44	CS ÚRS 2020 02
D 998 Přesun hmot							3 941,36	
22	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	9,173	429,67	3 941,36	CS ÚRS 2020 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							5 439,83	
23	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	5,000	494,53	2 472,65	CS ÚRS 2020 02
24	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	3,000	494,53	1 483,59	CS ÚRS 2020 02
25	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	3,000	494,53	1 483,59	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 17 - Lapák tuku

Soupis:

SO 17.2 - ZTI - lapák tuků

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

232 663,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	232 663,52	21,00%	48 859,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

281 522,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 17 - Lapák tuku

Soupis:

SO 17.2 - ZTI - lapák tuků

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

232 663,52

HSV - Práce a dodávky HSV

184 543,46

1 - Zemní práce

7 863,10

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 854,83

8 - Trubní vedení

159 984,92

998 - Přesun hmot

11 840,61

PSV - Práce a dodávky PSV

40 702,11

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

362,25

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

34 589,46

741 - Elektroinstalace - silnoproud

5 750,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 417,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 17 - Lapák tuku

Soupis:

SO 17.2 - ZTI - lapák tuků

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

232 663,52

D HSV Práce a dodávky HSV

184 543,46

D 1 Zemní práce

7 863,10

1	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	30,000	34,62	1 038,60	CS ÚRS 2020 02
2	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	30,000	18,86	565,80	CS ÚRS 2020 02
3	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000	423,69	4 236,90	CS ÚRS 2020 02
4	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000	202,18	2 021,80	CS ÚRS 2020 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

4 854,83

5	K	386120104	Montáž odlučovače ropných látek železobetonového průtoku 15 l/s	kus	1,000	1 810,34	1 810,34	CS ÚRS 2020 02
6	M	59431150R01	odlučovač tuků, NS4, Lipmax -P-DA,tř.zatížení D400, včetně přípojky pro odběr vzorků	kus	1,000	1 398,84	1 398,84	
7	M	59431150R02	zařízení pro měření tukové vrstvy	kus	1,000	1 645,65	1 645,65	

D 8 Trubní vedení

159 984,92

8	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm	m	6,000	241,52	1 449,12	CS ÚRS 2020 02
9	M	28613595	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m	m	6,000	122,90	737,40	CS ÚRS 2019 01
10	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN do 160	m	9,000	289,82	2 608,38	CS ÚRS 2020 02
11	M	28611174	trubka kanalizační PVC DN 125x3000 mm SN 10	m	9,000	699,47	6 295,23	CS ÚRS 2020 02
12	K	894411121	Zřízení dílců šachet kanalizačních z betonových dílců	kus	1,000	12 880,91	12 880,91	CS ÚRS 2020 02
13	M	59225821	deska betonová roznášecí 10-180 celokruhová/ 1-2/dílná	kus	1,000	5 232,87	5 232,87	CS ÚRS 2020 02
14	K	894812201R01	Revizní šachta pro odběr vzorků z PP DN 425/150 Lipumax-P včetně roznášecí betonové desky, prodlužovací nástavec	kus	1,000	100 287,05	100 287,05	
15	K	894812377	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptérem	kus	1,000	29 527,90	29 527,90	CS ÚRS 2020 02
16	K	894812612	Vyříznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 160	kus	2,000	483,03	966,06	CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot

11 840,61

17	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	13,812	617,71	8 531,81	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	13,812	239,56	3 308,80	CS ÚRS 2020 02
D PSV			Práce a dodávky PSV	40 702,11				
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	362,25				
19	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	9,000	40,25	362,25	CS ÚRS 2020 02
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod	34 589,46				
20	K	722140108	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním DN 65	m	6,000	5 505,57	33 033,42	CS ÚRS 2020 02
21	M	44981258	spojka požární tlaková hadicová B75 AI	kus	1,000	575,50	575,50	CS ÚRS 2020 02
22	M	44981515	víčko zaslepovací B75 AI	kus	1,000	286,83	286,83	CS ÚRS 2020 02
23	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřítokový vnitřní závit	kus	2,000	332,97	665,94	CS ÚRS 2020 02
24	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,023	966,07	22,22	CS ÚRS 2020 02
25	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,023	241,52	5,55	CS ÚRS 2020 02
D 741			Elektroinstalace - silnoproud	5 750,40				
26	K	741110403	Montáž hadice ochranná kovová s nasunutím do krabic D přes 50 do 75 mm uložená volně	m	10,000	172,51	1 725,10	CS ÚRS 2020 02
27	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 41/50 mm, HDPE+LDPE	m	10,000	402,53	4 025,30	CS ÚRS 2020 02
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby	7 417,95				
28	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	5,000	494,53	2 472,65	CS ÚRS 2020 02
29	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	10,000	494,53	4 945,30	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 18 - Opěrná zeď 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

996 451,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	996 451,92	21,00%	209 254,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 205 706,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 18 - Opěrná zeď 1

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

996 451,92

HSV - Práce a dodávky HSV

789 149,86

1 - Zemní práce

236 977,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce

519 585,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

19 026,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 649,79

998 - Přesun hmot

6 910,23

PSV - Práce a dodávky PSV

207 302,06

767 - Konstrukce zámečnické

207 302,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 18 - Opěrná zeď 1

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

996 451,92

D HSV Práce a dodávky HSV

789 149,86

D 1 Zemní práce

236 977,73

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	168,066	171,76	28 867,02	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.15.3					
	VV		(2,30*(14,90+10,0+3,14*2,701*2/4)+2,55*(16,0+10,80+3,14*6,0/4))/2*1,20		88,424			
	VV		(2,55*(16,0+10,80+3,14*6,0/4)+1,80*(16,80+10,80+3,14*6/4))/2*1,15		79,642			
	VV		Součet		168,066			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	268,362	62,68	16 820,93	CS ÚRS 2020 02
	VV		zemina na meziskládku a zpětný zásyp					
	VV		134,181*2		268,362			
	VV		Součet		268,362			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	33,885	375,39	12 720,09	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina na skládku					
	VV		168,066-134,181		33,885			
	VV		Součet		33,885			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	169,425	27,37	4 637,16	CS ÚRS 2020 02
	VV		33,885*5 "Přepočtené koeficientem množství		169,425			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	134,181	943,07	126 542,08	CS ÚRS 2020 02
	VV		zemina na zpětný zásyp					
	VV		134,181		134,181			
	VV		Součet		134,181			
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	54,216	394,13	21 368,15	CS ÚRS 2020 02
	VV		33,885*1,60		54,216			
	VV		Součet		54,216			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	168,066	22,43	3 769,72	CS ÚRS 2020 02
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	134,181	165,84	22 252,58	CS ÚRS 2020 02
	VV		168,066 "výkopek celkem		168,066			
	VV		odečet					
	VV		-4,754 "podkladní mazanina		-4,754			
	VV		opěrná zeď					
	VV		-(16,30+9,20+3,14*5,402/4)*1,40*0,30		-12,491			
	VV		-(5,30*1,50+2,50*1,70+2,50*1,9+2,50*2,10+(2,40+4,15)*2,30+2,50*2,10+2,50*1,90+2,60*1,655+2,60*1,50)*0,30		-16,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				134,181	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				519 585,27	
10	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XF1, XA2, XC2	m3	30,496	4 025,28	122 754,94	CS ÚRS 2020 02
	VV		(16,30+9,20+3,14*5,402/4)*1,40*0,30		12,491			
	VV		(5,30*1,65+2,50*1,85+2,50*2,05+2,50*2,25+(2,40+4,15)*2,45+2,50*2,25+2,50*2,05+2,60*1,85+2,60*1,65)*0,30		18,005			
	VV		Součet		30,496			
11	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	205,139	862,56	176 944,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		(16,30+9,20+3,14*5,402/4)*1,40*2+1,40*0,30*2		84,114			
	VV		(5,30*1,65+2,50*1,85+2,50*2,05+2,50*2,25+(2,40+4,15)*2,45+2,50*2,25+2,50*2,05+2,60*1,85+2,60*1,65)*2+0,30*1,65*2		121,025			
	VV		Součet		205,139			
12	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	205,139	349,62	71 720,70	CS ÚRS 2020 02
13	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	3,964	37 377,63	148 164,93	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		30,496*0,130		3,964			
	VV		Součet		3,964			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				19 026,84	
14	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,754	4 002,28	19 026,84	CS ÚRS 2020 02
	VV		podkladní beton					
	VV		(16,50+10,80+3,14*5,60/4)*1,50*0,10		4,754			
	VV		Součet		4,754			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				6 649,79	
15	K	9361791R1	D+M trubky PVC DN 100 osazené při betonování zdi	m	9,800	678,55	6 649,79	
	VV		odvodnění zdi					
	VV		0,35*28		9,800			
	VV		Součet		9,800			
	D	998	Přesun hmot				6 910,23	
16	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	15,367	449,68	6 910,23	CS ÚRS 2020 02
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				207 302,06	
	D	767	Konstrukce zámečnické				207 302,06	
17	K	7671611R1	D+M ocelové zábradlí žárově pozinkováno včetně madla a povrchové úpravy	kpl	1,000	201 264,14	201 264,14	
	VV		příloha D.1.18.2					
	VV		celk. hm. 570,61kg					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
18	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000	2 012,64	6 037,92	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 19 - Altán

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 139 782,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 139 782,08	21,00%	239 354,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 379 136,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 19 - Altán

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 139 782,08

HSV - Práce a dodávky HSV

559 372,52

1 - Zemní práce

42 823,17

2 - Zakládání

74 182,50

3 - Svislé a kompletní konstrukce

140 922,37

4 - Vodorovné konstrukce

165 331,46

5 - Komunikace pozemní

5 710,21

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 461,77

998 - Přesun hmot

113 941,04

PSV - Práce a dodávky PSV

580 409,56

712 - Povlakové krytiny

12 455,54

762 - Konstrukce tesařské

269 160,86

764 - Konstrukce klempířské

77 080,76

766 - Konstrukce truhlářské

193 792,92

783 - Dokončovací práce - nátěry

27 919,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 19 - Altán

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 139 782,08

D HSV Práce a dodávky HSV

559 372,52

D 1 Zemní práce

42 823,17

1	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	17,000	283,30	4 816,10	CS ÚRS 2020 02
	vv		příloha D.1.19.02					
	vv		8,50*5,0*0,40		17,000			
	vv		Součet		17,000			
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	8,775	419,32	3 679,53	CS ÚRS 2020 02
	vv		příloha D.1.19.02					
	vv		rýha pro základový pás					
	vv		9,0*1,50*0,65		8,775			
	vv		Součet		8,775			
5	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,300	2 136,65	2 777,65	CS ÚRS 2020 02
	vv		příloha D.1.19.02					
	vv		základové patky					
	vv		1,0*1,0*0,65*2		1,300			
	vv		Součet		1,300			
7	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,075	375,39	10 163,68	CS ÚRS 2020 02
	vv		přebytečná zemina na skládce					
	vv		17,0+8,775+1,30		27,075			
	vv		Součet		27,075			
8	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	135,375	27,37	3 705,21	CS ÚRS 2020 02
	vv		27,075*5 "Přepočtené koeficientem množství		135,375			
9	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	43,320	394,13	17 073,71	CS ÚRS 2020 02
	vv		27,075*1,60		43,320			
	vv		Součet		43,320			
58	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	27,075	22,43	607,29	CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání

74 182,50

10	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XC2, XF1, XA2	m3	6,986	3 841,27	26 835,11	CS ÚRS 2020 02
	vv		betonování přímo do výkopu + 3,5%					
	vv		9,0*1,50*0,50*1,035		6,986			
	vv		Součet		6,986			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,908	37 377,63	33 938,89	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		6,986*0,130		0,908			
	VV		Součet		0,908			
12	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,939	4 025,28	3 779,74	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.19.02					
	VV		betonováno přímo do výkopu +3,5%					
	VV		0,40*0,40*0,80*6*1,035		0,795			
	VV		0,40*0,40*0,15*6		0,144			
	VV		Součet		0,939			
13	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 XC2, XF1, XA2	m3	1,035	4 427,81	4 582,78	CS ÚRS 2020 02
	VV		betonování přímo do výkopu + 3,5%					
	VV		1,0*1,0*0,50*2*1,035		1,035			
	VV		Součet		1,035			
14	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,135	37 377,63	5 045,98	CS ÚRS 2020 02
	VV		pnožství výztuže 130kg/m3					
	VV		1,035*0,130		0,135			
	VV		Součet		0,135			
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							140 922,37	
15	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	4,141	4 082,79	16 906,83	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.19.02					
	VV		8,70*2,38*0,20		4,141			
	VV		Součet		4,141			
16	K	311351411	Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m	m2	42,364	1 610,11	68 210,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.19.02					
	VV		(8,70+0,20)*2,38*2		42,364			
	VV		Součet		42,364			
17	K	311351412	Odstranění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m	m2	42,364	460,03	19 488,71	CS ÚRS 2020 02
18	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,538	37 377,63	20 109,16	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		4,141*0,130		0,538			
	VV		Součet		0,538			
19	K	330321611	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže XC2, XF1, XA2	m3	0,505	5 750,40	2 903,95	CS ÚRS 2020 02
	VV		žlb sloupy na betonových patkách					
	VV		3,14*0,15*0,15*3,572*2		0,505			
	VV		Součet		0,505			
20	K	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m	m2	6,730	1 380,10	9 288,07	CS ÚRS 2020 02
	VV		žlb sloupy na betonových patkách					
	VV		3,14*0,30*3,572*2		6,730			
	VV		Součet		6,730			
21	K	332351116	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m	m2	6,730	230,02	1 548,03	CS ÚRS 2020 02
22	K	332361821	Výztuž sloupů obých betonářskou ocelí 10 505	t	0,066	37 377,63	2 466,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		0,505*0,130		0,066			
	VV		Součet		0,066			
D 4 Vodorovné konstrukce							165 331,46	
23	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 XC2, XF1, XA2	m3	11,970	4 094,29	49 008,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.19.02					
	VV		strop					
	VV		34,20*0,35		11,970			
	VV		Součet		11,970			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	411351021	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	43,090	805,06	34 690,04	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.19.02					
	VV		strop					
	VV		34,20+(8,50+4,20)*2*0,35		43,090			
	VV		Součet		43,090			
25	K	411351022	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce	m2	43,090	207,01	8 920,06	CS ÚRS 2020 02
26	K	411354315	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	34,200	287,52	9 833,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.19.02					
	VV		strop					
	VV		34,20		34,200			
	VV		Součet		34,200			
27	K	411354316	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm	m2	34,200	138,01	4 719,94	CS ÚRS 2020 02
28	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	1,556	37 377,63	58 159,59	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		11,97*0,130		1,556			
	VV		Součet		1,556			
D 5 Komunikace pozemní							5 710,21	
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	81,400	70,15	5 710,21	CS ÚRS 2020 02
	VV		podsypan pod pódium					
	VV		5,0*8,50-9,0*0,20 = 40,70					
	VV		40,70 "fr 0/32		40,700			
	VV		40,70 "fr 0/63		40,700			
	VV		Součet		81,400			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							16 461,77	
30	K	916231213	Osazení chodníkového obručníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého bet. C16/20 XF1	m	27,000	411,61	11 113,47	CS ÚRS 2020 02
	VV		lemování pódia					
	VV		(5,0+8,50)*2		27,000			
	VV		Součet		27,000			
31	M	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm	m	27,000	82,00	2 214,00	CS ÚRS 2020 02
32	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	58,860	53,25	3 134,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		pod pódium					
	VV		5,0*8,50-9,0*0,20		40,700			
	VV		(5,0+8,50)*2*0,40+(9,0+0,20)*2*0,40		18,160			
	VV		Součet		58,860			
D 998 Přesun hmot							113 941,04	
33	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	70,766	1 610,11	113 941,04	CS ÚRS 2020 02
D PSV Práce a dodávky PSV							580 409,56	
D 712 Povlakové krytiny							12 455,54	
34	K	712311111	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena suspenzí asfaltovou	m2	34,200	18,40	629,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		střeška objektu					
	VV		příloha D.1.19.02					
	VV		strop					
	VV		34,20		34,200			
	VV		Součet		34,200			
35	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	5,130	56,35	289,08	CS ÚRS 2020 02
	VV		34,2*0,15 "Přepočtené koeficientem množství		5,130			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	34,200	123,06	4 208,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		střecha objektu					
	VV		příloha D.1.19.02					
	VV		strop					
	VV		34,20		34,200			
	VV		Součet		34,200			
37	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm	m2	39,330	177,11	6 965,74	
	VV		34,2*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		39,330			
38	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	3,000	120,93	362,79	CS ÚRS 2020 02
D 762			Konstrukce tesařské		269 160,86			
39	K	76236131R	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky (atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 18 mm	m2	34,200	690,05	23 599,71	
	VV		34,20		34,200			
	VV		Součet		34,200			
40	K	762951003	Montáž podkladního roštu terasy z plných profilů osově vzdálenosti podpěrpřes 420 do 550 mm	m2	42,500	155,26	6 598,55	CS ÚRS 2020 02
	VV		pódium					
	VV		5,0*8,50		42,500			
	VV		Součet		42,500			
41	M	605121R1	hranol dubový 100x100 mm	m3	0,850	9 200,65	7 820,55	
	VV		8,50*10*0,10*0,10		0,850			
	VV		Součet		0,850			
42	K	762952013	Montáž teras z prken š do 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy	m2	42,500	408,28	17 351,90	CS ÚRS 2020 02
43	M	6119815R	prkno terasové dubové jednostranně jemně drážkované tl. 30 mm	m2	45,900	3 047,71	139 889,89	
	VV		42,5*1,08 "Přepočtené koeficientem množství		45,900			
44	K	762953002	Nátěr dřevěných teras olejový dvojnásobný s očištěním	m2	42,500	147,21	6 256,43	CS ÚRS 2020 02
	VV		pódium					
	VV		5,0*8,50		42,500			
	VV		Součet		42,500			
45	K	76296011R1	D+M podpěra stropu z dřevěného kmene pr. 300 mm, odkorněný kmen napuštěný olejem na ocelových závrtných tyčís patkou včetně kotvení pozinkovanými L profilyvčetně 4 chemických kotev do železobetonu	kpl	1,000	59 804,20	59 804,20	
	VV		příloha D.1.19.02					
	VV		dřevěný kmen: 3500 mm 1ks, 3100 mm 1ks					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
46	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	3,000	2 613,21	7 839,63	CS ÚRS 2020 02
D 764			Konstrukce klempířské		77 080,76			
47	K	76414140R	Krytina střechy falcovaná z TiZn předzvětralého plechu sklonu do 30°	m2	34,200	1 725,12	58 999,10	
48	K	764242434	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého plechu rš 330 mm	m	27,000	586,54	15 836,58	CS ÚRS 2020 02
49	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	748,36	2 245,08	CS ÚRS 2020 02
D 766			Konstrukce truhlářské		193 792,92			
50	K	766412223	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami modřínovými š do 100 mm	m2	42,364	520,99	22 071,22	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.19.02					
	VV		(8,70+0,20)*2,38*2		42,364			
	VV		Součet		42,364			
51	M	6119115R	palubky obkladové modřín profil klasický 20x90mm jakost A/B	m2	46,600	2 840,70	132 376,62	
	VV		42,364*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		46,600			
52	K	766417211	Montáž obložení stěn podkladového roštu	m	89,000	328,92	29 273,88	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.19.02					
	VV		(8,70+0,20)*5,0*2		89,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		89,000			
53	M	60514114	řezivo jehličnaté lat' impregnovaná dl 4 m (40x60 mm)	m3	0,235	18 837,17	4 426,73	CS ÚRS 2020 02
VV			89,000*0,04*0,06*1,10		0,235			
VV			Součet		0,235			
54	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,000	1 881,49	5 644,47	CS ÚRS 2020 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry				27 919,48	
55	K	783218111	Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí (tvrdá lazura)	m2	42,364	207,01	8 769,77	CS ÚRS 2020 02
VV			příloha D.1.19.02					
VV			(8,70+0,20)*2,38*2		42,364			
VV			Součet		42,364			
56	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,486	138,01	1 309,16	CS ÚRS 2020 02
VV			příloha D.1.19.02					
VV			3,14*0,159*19		9,486			
VV			Součet		9,486			
57	K	78394715R	Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonového podhledu	m2	43,090	414,03	17 840,55	
VV			střecha objektu - barva žlutá RAL 1018					
VV			příloha D.1.19.02					
VV			strop					
VV			34,20+(8,50+4,20)*2*0,35		43,090			
VV			Součet		43,090			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 20 - Slaboproudé areálové rozvody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

210 276,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	210 276,28	21,00%	44 158,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

254 434,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 20 - Slaboproudé areálové rozvody

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

210 276,28

1. - Metalické rozvody - propojení Hospodářský pavilon + Jesle

210 276,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 20 - Slaboproudé areálové rozvody

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

210 276,28

D	1.	Metalické rozvody - propojení Hospodářský pavilon + Jesle					210 276,28	
0	K	1.1	IP dveřní komunikátor s klávesnicí ve verzi pro VoIP síť, spínač na ovládání elektrického zámku	ks	2,000	23 323,96	46 647,92	
0	K	1.2	Vytýčení trasy kabelového vedení z místa napojení v úrovni (KR345/1/1+IP Intercom)	kpl	1,000	1 955,14	1 955,14	
0	K	1.3	Hloubení kabel. rýhy š.35 cm, hl. 70 cm,	m	200,000	167,91	33 582,00	
0	K	1.4	Zřízení kabel. lože, cihla napříč	m	200,000	113,86	22 772,00	
0	K	1.5	Zakrytí kabelu folii PVC 22 cm	m	400,000	11,50	4 600,00	
0	K	1.6	Zához rýhy š. 35 cm, hl. 70 cm	m	200,000	72,46	14 492,00	
0	K	1.7	Odvoz zeminy do 1 km	m3	49,000	517,54	25 359,46	
0	K	1.8	Provizorní úprava terénu	m2	70,000	28,75	2 012,50	
0	K	1.9	Hutnění zeminy do 20 cm	m2	40,000	40,25	1 610,00	
0	K	1.10	Označení kabelového vedení	ks	4,000	11,50	46,00	
0	K	1.11	Kabel TCEPKPFLE 5XN0,4	m	120,000	37,07	4 448,40	
0	K	1.12	Kabel UTP 4x2x0,5, kat. 5e (venkovní provedení)	m	100,000	8,22	822,00	
0	K	1.13	Instalace kabelu	m	100,000	19,32	1 932,00	
0	K	1.14	Trubka HDPE 40/33	m	200,000	66,13	13 226,00	
0	K	1.15	Rozvodná skříň MRK10 na omítku včetně zemnicí svorky	ks	2,000	1 344,21	2 688,42	
0	K	1.16	Trubka pevná pr.30 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu	m	80,000	186,38	14 910,40	
0	K	1.17	PVC lišta vkladací LV 40x40	m	80,000	108,99	8 719,20	
0	K	1.18	Svorkovnice zářezové rozpojovací SID-C 10 párů	ks	4,000	329,84	1 319,36	
0	K	1.19	Kabelová šachta plastová 500x500x500mm pro přechodné zakončení kabelu do objektu Jeslí	ks	1,000	3 383,08	3 383,08	
0	K	1.20	Montážní práce, instalace kabelů, stavební přípomocné práce	kpl	1,000	5 750,40	5 750,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 050 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 050 000,00	21,00%	1 270 500,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 320 500,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 050 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 050 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 300 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 600 000,00

VRN6 - Územní vlivy

150 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 050 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

6 050 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

3 300 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	3 300 000,00	3 300 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--------------	--------------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

2 600 000,00

2	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	2 600 000,00	2 600 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--------------	--------------	----------------

D VRN6 Územní vlivy

150 000,00

3	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	150 000,00	150 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--------------	----	-------	------------	------------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

ON - ON

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 145 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 145 000,00	21,00%	450 450,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 595 450,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

ON - ON

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 145 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 145 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 168 800,00

VRN4 - Inženýrská činnost

900 600,00

VRN7 - Provozní vlivy

27 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

48 600,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

ON - ON

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 145 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

2 145 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 168 800,00

1	K	012002001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	Kč	1,000	204 000,00	204 000,00	
2	K	012002002	Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí	Kč	1,000	28 800,00	28 800,00	
3	K	013203001	Náklady na vypracování výrobní (dílenské dokumentace)	Kč	1,000	126 000,00	126 000,00	
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření realizované stavby	Kč	1,000	810 000,00	810 000,00	CS ÚRS 2020 02

D VRN4 Inženýrská činnost

900 600,00

5	K	041103001	Inženýrská činnost	Kč	1,000	90 000,00	90 000,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	216 000,00	216 000,00	CS ÚRS 2020 02
7	K	042903000	Náklady na zpracování a vyhotovení provozního řádu a havarijního plánu	Kč	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2020 02
8	K	043194000	Individuální a komplexní vyzkoušení	Kč	1,000	114 000,00	114 000,00	CS ÚRS 2020 02
9	K	044003000	Náklady na měření a revize	Kč	1,000	57 600,00	57 600,00	CS ÚRS 2020 02
10	K	045203000	Kompletační činnost a koordinační činnost dodavatele	Kč	1,000	372 000,00	372 000,00	CS ÚRS 2020 02
11	K	049303001	Doklady požadované k převzetí díla	Kč	1,000	21 000,00	21 000,00	CS ÚRS 2019 01

D VRN7 Provozní vlivy

27 000,00

12	K	072103011	Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace stavby	Kč	1,000	27 000,00	27 000,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

48 600,00

13	K	091003001	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti	Kč	1,000	9 000,00	9 000,00	
14	K	091704001	Označení stavby - informační tabule 1,60x1,00 m	Kč	1,000	15 000,00	15 000,00	
15	K	092203000	Zaškolení obsluhy	Kč	1,000	24 600,00	24 600,00	CS ÚRS 2020 02

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08_2020_n

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

58 068 647,24

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	58 068 647,24	12 194 415,92
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

70 263 063,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08_2020_n

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Místo: Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		58 068 647,24	70 263 063,16
SO 21	Příprava území	733 678,51	887 751,00
SO 22	Demolice stávající MŠ	3 470 315,02	4 199 081,17
SO 23	Pavilon B	40 835 084,54	49 410 452,29
SO 23.1	ASŘ	31 912 931,04	38 614 646,56
SO 23.2	ZTI	2 704 023,22	3 271 868,10
SO 23.2.1	ZTI - zemní práce	676 584,03	818 666,68
SO 23.3	UT	1 123 888,10	1 359 904,60
SO 23.4	VZT	1 037 139,48	1 254 938,77
SO 23.5	Slaboproud	791 975,55	958 290,42
SO 23.6	Silnoproud	1 711 199,08	2 070 550,89
SO 23.7	MaR	271 540,65	328 564,19
SO 23.8	Gastro	605 803,39	733 022,10
SO 24	Komunikace a zpevněné plochy	404 411,58	489 338,01
SO 25	ZTI - venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce	924 853,08	1 119 072,23
SO 26	Opěrná zeď 2	894 070,03	1 081 824,74
SO 29	Veřejné osvětlení	128 263,20	155 198,47
SO 30	Sadovnické úpravy	1 769 614,09	2 141 233,05

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
SO 30.1	Sadovnické úpravy - ošetření - řezy ponechaných dřevin	11 803,61	14 282,37
SO 30.2	Sadovnické úpravy - výsadba a rozvojová péče	1 757 810,48	2 126 950,68
SO 31	Oplocení a terenní úpravy	1 278 357,19	1 546 812,20
VRN	VRN	6 200 000,00	7 502 000,00
ON	ON	1 430 000,00	1 730 300,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 21 - Příprava území

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

733 678,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	733 678,51	21,00%	154 072,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

887 751,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 21 - Příprava území

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

733 678,51

HSV - Práce a dodávky HSV

733 678,51

1 - Zemní práce

733 678,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 21 - Příprava území

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

733 678,51

D HSV

Práce a dodávky HSV

733 678,51

D 1

Zemní práce

733 678,51

1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně	m2	174,000	52,10	9 065,40	CS ÚRS 2020 02
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm	kus	12,000	177,11	2 125,32	CS ÚRS 2020 02
3	K	112101121	Odstranění stromů jehličnatých s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 100 do 300 mm se složením na hromady do 50 m nebo s naložením	ks	3,000	101,44	304,32	CS ÚRS 2020 02
4	K	112101122	Odstranění stromů jehličnatých s odřezáním kmene a s odvětvením, průměru kmene přes 300 do 400 mm se složením na hromady do 50 m nebo s naložením	ks	2,000	198,96	397,92	CS ÚRS 2020 02
5	K	112201111	Odstranění pařezů průměru do 200 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	11,000	563,54	6 198,94	CS ÚRS 2020 02
6	K	112201112	Odstranění pařezů průměru do 300 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	4,000	1 114,43	4 457,72	CS ÚRS 2020 02
7	K	112201113	Odstranění pařezů průměru do 400 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	6,000	2 921,21	17 527,26	CS ÚRS 2020 02
8	K	112201114	Odstranění pařezů průměru do 500 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	1,000	4 347,31	4 347,31	CS ÚRS 2020 02
9	K	112201115	Odstranění pařezů průměru do 600 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	1,000	5 198,37	5 198,37	CS ÚRS 2020 02
10	K	112201116	Odstranění pařezů průměru do 700 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	1,000	7 096,00	7 096,00	CS ÚRS 2020 02
11	K	112201117	Odstranění pařezů průměru do 900 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypáním jámy	ks	1,000	9 499,67	9 499,67	CS ÚRS 2020 02
12	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	646,000	272,57	176 080,22	CS ÚRS 2020 02
VV		příloha D.1.21.01						
VV		646,0		646,000				
13	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	3,000	54,51	163,53	CS ÚRS 2020 02
14	K	162201406	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 500 mm	kus	2,000	212,76	425,52	CS ÚRS 2020 02
15	K	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 500 mm	kus	7,000	419,78	2 938,46	CS ÚRS 2020 02
16	K	162201423	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 700 mm	kus	2,000	741,80	1 483,60	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm	kus	12,000	65,67	788,04	CS ÚRS 2020 02
18	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	15,000	143,88	2 158,20	CS ÚRS 2020 02
19	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm	kus	1,000	917,76	917,76	CS ÚRS 2020 02
20	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	174,000	70,04	12 186,96	CS ÚRS 2020 02
30	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	48,000	92,01	4 416,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		12*4		48,000			
35	K	162301941	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km	kus	12,000	92,01	1 104,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		3*4		12,000			
36	K	162301942	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 500 mm ZKD 1 km	kus	8,000	92,01	736,08	CS ÚRS 2020 02
	VV		2*4		8,000			
31	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	60,000	115,01	6 900,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		15*4		60,000			
33	K	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 1 km	kus	28,000	115,01	3 220,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		7*4		28,000			
34	K	162301973	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 1 km	kus	8,000	126,51	1 012,08	CS ÚRS 2020 02
	VV		2*4		8,000			
32	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 1 km	kus	4,000	126,51	506,04	CS ÚRS 2020 02
	VV		1*4		4,000			
21	K	171201201	Uložení sypaniny (ornice) na meziskládku	m3	129,200	19,67	2 541,36	CS ÚRS 2020 02
22	K	184813212	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm	m	128,000	230,02	29 442,56	CS ÚRS 2020 02
23	K	184813252	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 2000 mm	m	128,000	70,84	9 067,52	CS ÚRS 2020 02
24	K	R-položka	Vodorovné přemístění pařezů o prům. pařezu větší než 900 mm na vzdálenost do 5000m s naložením, složením a dopravou	ks	8,000	993,67	7 949,36	
25	K	R-položka.1	Cena za uložení odpadu - větve	t	2,000	517,54	1 035,08	
26	K	R-položka.2	Cena za uložení odpadu - pařezy, kořeny	t	3,000	517,54	1 552,62	
27	K	R-položka.3	Vyvázání spodních větví, bandážování a řez stromů pro vytvoření průjezdního profilu nebo směrem k překážce, dle aktuálního stavu stromu a možností - stromy č. 56, 78, 106 včetně případného naložení, odvozu, složení a skládkovného do vzdálenosti do 5 km	ks	131,000	1 934,44	253 411,64	
28	K	R-položka.4	Ochrana kořenové zóny stromů v místě pojezdu techniky - geotextilie, vrstva 150mm hrubého písku, dřevěné fošny nebo betonové panely	m2	3,000	477,28	1 431,84	
29	K	R-položka.5	Odstranění vyvázání spodních větví a bandážování včetně případného naložení, odvozu, složení a skládkovného do vzdálenosti do 5 km	ks	131,000	1 114,43	145 990,33	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 22 - Demolice stávající MŠ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 470 315,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 470 315,02	21,00%	728 766,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 199 081,17

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 22 - Demolice stávající MŠ

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 470 315,02

HSV - Práce a dodávky HSV

3 447 313,41

1 - Zemní práce

47 634,51

8 - Trubní vedení

43 479,26

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

838 230,50

989 - Práce spojené s bouráním konstrukcí obsahující azbest

713 051,25

997 - Přesun sutě

1 804 917,89

M - Práce a dodávky M

23 001,61

21-M - Elektromontáže

5 750,40

23-M - Montáže potrubí

17 251,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 22 - Demolice stávající MŠ

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 470 315,02

D HSV Práce a dodávky HSV

3 447 313,41

D 1 Zemní práce

47 634,51

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	46,000	22,03	1 013,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		46,0 "terasa		46,000			
	VV		Součet		46,000			
2	K	113106142	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2	m2	248,000	18,40	4 563,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		105,0 "chodník		105,000			
	VV		143,0 "terasa		143,000			
	VV		Součet		248,000			
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	268,000	50,87	13 633,16	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		60,0 "betonová plocha		60,000			
	VV		105,0 "chodník		105,000			
	VV		103,0 "asfaltový chodník		103,000			
	VV		Součet		268,000			
4	K	113107172	Odstranění podkladu z betonu prostého do tl 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	60,000	303,47	18 208,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		60,0 "betonová plocha		60,000			
	VV		Součet		60,000			
5	K	113107183	Odstranění podkladu živичného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	103,000	99,19	10 216,57	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		103,0 "asfaltový chodník		103,000			
	VV		Součet		103,000			
	D	8	Trubní vedení				43 479,26	
6	K	850391811	Bourání stávajícího potrubí z trub litinových DN přes 250 do 400	m	14,000	230,46	3 226,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		14,0 "horkovod		14,000			
	VV		Součet		14,000			
7	K	8503919R1	Zakončení horkovodu na řadu teplovodu	kpl	1,000	5 750,40	5 750,40	
	VV		příloha D.1.22.2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	8572619R1	Zaslepení přípojky vody (popř. ukončení armaturou - uzávěrem)	kus	1,000	17 251,21	17 251,21	
9	K	8572619R2	Zaslepení přípojky kanalizace (popř. ukončení armaturou - uzávěrem)	kus	1,000	17 251,21	17 251,21	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				838 230,50	
10	K	9361790R1	Demontáž herních prvků, odvoz a likvidace	kpl	1,000	23 001,62	23 001,62	
	VV		příloha TZ					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
11	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	10,072	5 337,58	53 760,11	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		40,0*0,20+3,14*5,50*0,40*0,30		10,072			
	VV		Součet		10,072			
12	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	27,000	324,02	8 748,54	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		stávající oplocení					
	VV		27,0		27,000			
	VV		Součet		27,000			
13	K	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	67,000	63,84	4 277,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		stávající oplocení					
	VV		67,0		67,000			
	VV		Součet		67,000			
14	K	969031111	Vybourání vnitřního ocelového potrubí do DN 50	m	39,000	68,68	2 678,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		20,0 "vodovodní přípojka		20,000			
	VV		19,0 "přípojka plynu		19,000			
	VV		Součet		39,000			
15	K	969011113	Vybourání vnitřního kameninového potrubí do DN 300	m	40,000	236,38	9 455,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.22.2					
	VV		40,0 "přípojka kanalizace		40,000			
	VV		Součet		40,000			
16	K	98101111R	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním s místně doplněným zdívem a kamennou podezdívkou	m3	4 993,306	109,26	545 568,61	
	VV		příloha TZ str. 2					
	VV		31,07*28,195*5,70		4 993,306			
	VV		Součet		4 993,306			
17	K	981011415	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 30 % postupným rozebíráním	m3	542,120	178,26	96 638,31	CS ÚRS 2020 02
	VV		suterén					
	VV		(27,015*5,28+2,12*18,60+1,70*6,79)*2,80		542,120			
	VV		Součet		542,120			
18	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním	m3	56,956	1 092,58	62 228,99	CS ÚRS 2020 02
	VV		opěrná zeď					
	VV		(12,62+12,40+1,50+1,945+15,50+1,70+1,80)*2,27*0,50		53,873			
	VV		2,36*0,30*0,20*2		0,283			
	VV		1,40*2,0*(0,80+1,20)/2		2,800			
	VV		Součet		56,956			
19	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním	m3	36,952	862,56	31 873,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		základy					
	VV		(29,015+4,28+9,54+3,90+2,12+7,045+1,185*2+8,40+7,0+6,70++6,99+6,70+1,0)*0,60*0,60		34,222			
	VV		1,40*1,30*1,50		2,730			
	VV		Součet		36,952			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 989			Práce spojené s bouráním konstrukcí obsahující azbest	713 051,25				
20	K	98911	Zpracování hlášení prací z azbestem dle paltné legislativy	Kč	1,000	115,01	115,01	
21	K	98912	Lešení a zakrytí - vybudování kontrolního pásma	Kč	1,000	19 321,36	19 321,36	
22	K	98913	Vytvoření čisté a špinavé šatny a vybudování materiálových propustí	Kč	1,000	25 761,81	25 761,81	
23	K	98914	Penetrace a sanace azbestových materiálů - ankapsulační postřik	Kč	1,000	46 578,27	46 578,27	
24	K	98915	Demontáž a zabalení azbestových matariálů	Kč	1,000	322 482,66	322 482,66	
25	K	98916	Sanace (vysátí prachu) a dekontaminace prostoru	Kč	1,000	11 385,80	11 385,80	
26	K	98917	Činnost odsavače	Kč	1,000	15 503,09	15 503,09	
27	K	98918	Kontrolní měření po dobu realizace	Kč	1,000	14 261,00	14 261,00	
28	K	98919	Výstupní měření akreditovanou laboratoří prokazující likvidaci azbestového nebezpečí	Kč	1,000	14 261,00	14 261,00	
29	K	98920	Odvoz a skládka azbestového odpadu	Kč	1,000	37 078,61	37 078,61	
30	K	98921	Ochranné pomůcky	Kč	1,000	188 551,09	188 551,09	
31	K	98922	Odvoz a ukládka ostatního odpadu	Kč	1,000	12 001,15	12 001,15	
32	K	98923	Zrušení kontrolovaného pásma	Kč	1,000	4 830,34	4 830,34	
33	K	98924	Závěrečná zpráva	Kč	1,000	920,06	920,06	
D 997			Přesun sutě	1 804 917,89				
34	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 891,637	148,19	280 321,69	CS ÚRS 2020 02
35	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26 482,918	10,61	280 983,76	CS ÚRS 2020 02
VV			1891,637*14 "Přepočtené koeficientem množství	26 482,918				
36	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	195,538	218,52	42 728,96	CS ÚRS 2020 02
VV			81,294+37,50+1,774+11,73+63,24	195,538				
VV			Součet	195,538				
37	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	285,037	299,02	85 231,76	CS ÚRS 2020 02
VV			137,264+24,173+123,60	285,037				
VV			Součet	285,037				
38	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	539,128	391,03	210 815,22	CS ÚRS 2020 02
VV			185,408+350,0+3,72	539,128				
VV			Součet	539,128				
39	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	758,514	1 138,58	863 628,87	CS ÚRS 2020 02
VV			1108,514-350,0	758,514				
VV			Součet	758,514				
40	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	32,548	552,04	17 967,80	CS ÚRS 2020 02
VV			32,548	32,548				
VV			Součet	32,548				
41	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	77,720	299,02	23 239,83	CS ÚRS 2020 02
VV			77,72	77,720				
VV			Součet	77,720				
D M			Práce a dodávky M	23 001,61				
D 21-M			Elektromontáže	5 750,40				
42	K	21006200R1	Odpojení silnoprůdu ve spolupráci s PRE	kpl	1,000	5 750,40	5 750,40	
D 23-M			Montáže potrubí	17 251,21				
43	K	2302209R1	Zaslepení plynovodní přípojky (popř. ukončení armaturou - uzávěrem)	kus	1,000	17 251,21	17 251,21	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.1 - ASŘ

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 912 931,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 912 931,04	21,00%	6 701 715,52
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

38 614 646,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.1 - ASŘ

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 912 931,04

HSV - Práce a dodávky HSV

16 859 643,09

1 - Zemní práce

1 410 170,89

2 - Zakládání

1 388 533,45

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 531 477,29

4 - Vodorovné konstrukce

2 424 456,69

5 - Komunikace pozemní

8 436,55

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

7 492 670,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

741 983,36

997 - Přesun sutě

31 205,51

998 - Přesun hmot

830 708,90

PSV - Práce a dodávky PSV

14 482 847,86

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

696 897,13

712 - Povlakové krytiny

271 846,61

713 - Izolace tepelné

800 390,14

714 - Akustická a protiotřesová opatření

56 359,17

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

132 083,93

762 - Konstrukce tesařské

86 593,04

763 - Konstrukce suché výstavby	1 195 560,00
764 - Konstrukce klempířské	452 945,86
766 - Konstrukce truhlářské	6 761 436,19
767 - Konstrukce zámečnické	1 516 177,99
771 - Podlahy z dlaždic	774 916,60
776 - Podlahy povlakové	584 637,42
781 - Dokončovací práce - obklady	622 346,74
783 - Dokončovací práce - nátěry	67 521,06
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	96 255,07
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	366 880,91
M - Práce a dodávky M	570 440,09
33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh	570 440,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.1 - ASŘ

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 912 931,04

D HSV Práce a dodávky HSV

16 859 643,09

D 1 Zemní práce

1 410 170,89

1	K	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	382,212	241,62	92 350,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.3					
	VV		(3,56*2+12,375*2+44,98+8,305)*1,0*1,0-0,30*2,29*1,0		84,468			
	VV		(38,195+3,405+3,38)*0,60*1,0		26,988			
	VV		(4,83*4+6,425*2)*0,55*1,0		17,694			
	VV		(15,925+0,55)*2*0,75*10		247,125			
	VV		3,10*0,55*0,60		1,023			
	VV		1,175*0,60*1,20+1,25*0,60*1,20*2+2,10*0,90*1,20		4,914			
	VV		Součet		382,212			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	382,212	375,39	143 478,56	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina na skládku					
	VV		382,212		382,212			
	VV		Součet		382,212			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 911,060	27,37	52 305,71	CS ÚRS 2020 02
	VV		382,212*5 "Přepočtené koeficientem množství		1 911,060			
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	611,539	394,13	241 025,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		382,212*1,6		611,539			
	VV		Součet		611,539			
377	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	382,212	22,43	8 573,02	CS ÚRS 2020 02
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	516,749	165,84	85 697,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		zásyp štěrkopískem hutněným po vrstvách - vzniklý prostor pod základy bouraného objektu					
	VV		(36,0+6,67*8,99+7,045*7,35+8,345*5,23)*2,70		516,749			
	VV		Součet		516,749			
7	M	58331200	štěrkopísek netříděný zásypový	t	1 033,498	761,24	786 740,02	CS ÚRS 2020 02
	VV		516,749*2 "Přepočtené koeficientem množství		1 033,498			

D 2 Zakládání

1 388 533,45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z netříděného štěrkopísku	m3	501,947	436,11	218 904,11	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.02					
	VV		(2,28+0,075*2)*(4,83+0,30+0,10)*1,0		12,709			
	VV		(2,28+0,075+0,10)*(4,83+0,30+0,10)*1,0		12,840			
	VV		(38,22+0,075+0,10)*(3,73+0,30+0,10)*1,0		158,571			
	VV		(15,925+0,075+0,30)*(6,425+0,30+0,175)*2*1,0		224,940			
	VV		(12,375+0,30+0,075)*(7,53+0,30*2)*1,0-3,0*0,55*1,0		102,008			
	VV		odečet					
	VV		-2,09*2,405*1,0		-5,026			
	VV		-(1,25*0,60*2+1,175*0,60+2,10*0,90)*1,0		-4,095			
	VV		Součet		501,947			
9	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	1,005	5 175,36	5 201,24	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.3					
	VV		dno výtahové šachty					
	VV		2,405*2,09*0,20		1,005			
	VV		Součet		1,005			
10	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,380	690,05	952,27	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.3					
	VV		dno výtahové šachty					
	VV		(2,405*2+2,09)*0,20		1,380			
	VV		Součet		1,380			
11	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,380	207,01	285,67	CS ÚRS 2020 02
12	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,131	37 377,63	4 896,47	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		1,005*0,130		0,131			
	VV		Součet		0,131			
13	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	67,481	3 438,74	232 049,61	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.3					
	VV		(3,56*2+12,375*2+44,98+8,305)*1,0*0,40-0,30*2,29*0,40		33,787			
	VV		(38,195+3,405+3,38)*0,60*0,40		10,795			
	VV		(4,83*4+6,425*2)*0,55*0,40		7,077			
	VV		(15,925+0,55)*2*0,75*0,40		9,885			
	VV		3,10*0,55*0,60		1,023			
	VV		1,175*0,60*1,20+1,25*0,60*1,20*2+2,10*0,90*1,20		4,914			
	VV		Součet		67,481			
14	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	173,132	690,05	119 469,74	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.3					
	VV		(3,405+1,10+38,195+1,1+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+6,425+0,75+15,925+0,55+5,75*2+3,56*2+1,0*2+3,56*2+8,305+15,925+0,55+6,425+0,75+1,25+4,83+1,0+0,60)*0,40		58,354			
	VV		((4,83+2,28)*4+(38,195+3,73)*2+(15,925+6,425)*4+3,10*2+0,55+12,375*2+8,305)*0,40		96,598			
	VV		(1,25*2+0,60)*1,20*2+(1,175*2+0,60)*1,20+(2,10+0,90)*2*1,20		18,180			
	VV		Součet		173,132			
15	K	274351122	Odstranění bednění základových pasů rovného	m2	173,132	207,01	35 840,06	CS ÚRS 2020 02
16	K	275321611	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	6,630	37 377,63	247 813,69	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.3					
	VV		patky					
	VV		2,60*1,70*0,50*3		6,630			
	VV		Součet		6,630			
17	K	275351121	Zřízení bednění základových patek	m2	12,900	690,05	8 901,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.3					
	VV		patky					
	VV		(2,60+1,7)*2*0,50*3		12,900			
	VV		Součet		12,900			
18	K	275351122	Odstranění bednění základových patek	m2	12,900	172,51	2 225,38	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,862	37 377,63	32 219,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		6,63*0,130		0,862			
	VV		Součet		0,862			
20	K	279113145	Základová zeď tl do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	158,764	2 139,15	339 620,01	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.03					
	VV		((38,195+0,075+0,10)*2+(4,83+0,10+0,30+2,28+0,075*2)*2*2)*0,80		85,904			
	VV		((6,425+0,30+0,175)*2+(15,925+0,075+0,30))*2*0,80		48,160			
	VV		((3,56+5,75+0,175)*2+8,305+0,30*2)*0,80		22,300			
	VV		3,0*0,80		2,400			
	VV		Součet		158,764			
21	K	279321348	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	1,606	5 175,36	8 311,63	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(1,65+2,405)*2*0,22*0,90		1,606			
	VV		Součet		1,606			
22	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	6,210	690,05	4 285,21	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		stěny výtahové šachty					
	VV		(2,09+2,405*2)*0,90		6,210			
	VV		Součet		6,210			
23	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	6,210	172,51	1 071,29	CS ÚRS 2020 02
24	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	3,384	37 377,63	126 485,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		množství výztuže 20kg/m3					
	VV		158,764*0,020		3,175			
	VV		stěny výtahové šachty - množství výztuže 130kg/m3					
	VV		1,606*0,130		0,209			
	VV		Součet		3,384			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				2 531 477,29	
25	K	311113141	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	24,540	1 033,92	25 372,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.4.5					
	VV		spojovací lávka "B" - atika					
	VV		30,675*0,40*2		24,540			
	VV		Součet		24,540			
26	K	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	136,229	1 242,09	169 208,68	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.4.5					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,40+1,65)*2*7,34-1,18*2,22*2		54,215			
	VV		spojovací lávka "B"					
	VV		30,675*1,90*2-0,80*0,80*10*2-1,06*0,80*23-1,06*1,06*2		82,014			
	VV		Součet		136,229			
27	K	311113144	Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,780	1 713,62	6 477,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.04					
	VV		1.NP					
	VV		u schodiště mč. 1.01					
	VV		0,60*3,15*2		3,780			
	VV		Součet		3,780			
28	K	311234011	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 175 mm	m2	103,973	954,57	99 249,51	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.4					
	VV		1.NP					
	VV		(0,90*2+4,20*2)*3,45 "1.08,09,10,12		35,190			
	VV		(2,785+2,305)*3,45 "1.18,19/20		17,561			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		(0,90*2+4,20*2)*3,35 "2.08,09,10,12		34,170			
	VV		(2,785+2,305)*3,35 "2.18,19/20		17,052			
	VV		Součet		103,973			
29	K	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm	m2	130,188	1 081,08	140 743,64	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.6					
	VV		atika					
	VV		(38,02+3,58*2+1,10+5,98+1,25+7,30+17,10+9,31+8,88+9,31+17,10+7,30+1,25+5,98)*0,95		130,188			
	VV		Součet		130,188			
30	K	311234061	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 300 mm	m2	333,912	1 437,60	480 031,89	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.4,5					
	VV		1.NP					
	VV		(4,20*2+38,02+0,175*2+1,55*2+7,0*2+3,18+0,115)*3,10		208,212			
	VV		odečet					
	VV		-(1,25*2,15*8+1,10*1,25*5+0,84*1,84*2+1,25*2,15*4)		-42,216			
	VV		2.NP					
	VV		(4,20*2+38,02+0,175*2+1,55*2+7,0*2+3,18+0,115)*3,10		208,212			
	VV		0,60*3,20		1,920			
	VV		odečet					
	VV		-(1,25*2,15*8+1,10*1,25*5+0,84*1,84*2+1,25*2,15*4)		-42,216			
	VV		Součet		333,912			
31	K	31123409R	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných přes P10 do P15 na maltu M5 tl 365 mm	m2	585,907	1 587,11	929 898,86	
	VV		příloha D.1.23.1.4,5					
	VV		(38,02+0,175*2+(3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*2)*(3,10+3,00)		770,064			
	VV		odečet otvorů					
	VV		-(0,75*2,1*4+2,25*0,75*5+1,50*0,75*4+1,2*2,40*2+2,25*2,50*4*2+0,75*2,50*2*2+1,0*1,70+5,0*2,40)		-91,198			
	VV		-(0,75*2,10*8+2,25*0,75*5+1,50*0,75*4+0,75*2,10*2+2,25*2,50*4*2+0,75*2,50*2*2+1,545*2,15+1,0*1,70+2,25*1,50*2)		-92,959			
	VV		Součet		585,907			
32	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,291	37 377,63	123 009,78	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice výtahová šachta					
	VV		54,215*0,020		1,084			
	VV		množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice u schodiště					
	VV		3,78*0,02		0,076			
	VV		množství výztuže 20kg/m2 - spojovací lávka "B"					
	VV		82,014*0,02		1,640			
	VV		24,54*0,02		0,491			
	VV		Součet		3,291			
33	K	317168013	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1500 mm	kus	2,000	460,03	920,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.23.1.38					
	VV		2,0 "P14		2,000			
	VV		Součet		2,000			
34	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	44,000	483,03	21 253,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.23.1.37					
	VV		4,0*3 "P3		12,000			
	VV		4,0*8 "P6		32,000			
	VV		Součet		44,000			
35	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	12,000	506,04	6 072,48	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.02.1.38					
	VV		4,0*3 "P9		12,000			
	VV		Součet		12,000			
36	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	144,000	529,04	76 181,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.23.1.38					
	VV		4,0*34 "P1		136,000			
	VV		4,0*2 "P15		8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet				144,000	
37	K	317168054	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm	kus	16,000	621,04	9 936,64	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.02.1.37					
	VV		4,0*4 "P16				16,000	
	VV		Součet				16,000	
38	K	317168055	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2000 mm	kus	4,000	862,56	3 450,24	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.23.1.38					
	VV		4,0*1 "P7				4,000	
	VV		Součet				4,000	
39	K	317168057	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm	kus	4,000	1 092,58	4 370,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.23.1.38					
	VV		4,0*1 "P17				4,000	
	VV		Součet				4,000	
40	K	317168058	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2750 mm	kus	40,000	1 265,09	50 603,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.23.1.38					
	VV		4,0*10 "P8				40,000	
	VV		Součet				40,000	
41	K	317168448	Překlad keramický vysoký spřažený v 238 mm š 300 mm dl 5500 mm	kus	1,000	5 175,36	5 175,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.23.1.38					
	VV		1,0 "P18				1,000	
	VV		Součet				1,000	
42	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,132	17 251,21	2 277,16	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.02.1.37					
	VV		66,0*2/1000 "P12 - 4x100 dl. 1800 mm				0,132	
	VV		Součet				0,132	
43	M	13010712	ocel profilová IPN 100 jakost 11 375	t	0,132	48 303,39	6 376,05	CS ÚRS 2020 02
44	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,139	17 251,21	2 397,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.02.1.37					
	VV		110,0/1000 "P13- 1xU140 dl. 6260 mm				0,110	
	VV		výtahová šachta - montážní nosník I140					
	VV		2,050*14,30/1000				0,029	
	VV		Součet				0,139	
45	M	13010914	ocel profilová UE 140 jakost 11 375	t	0,110	48 303,39	5 313,37	CS ÚRS 2020 02
46	M	13010746	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375	t	0,029	48 303,39	1 400,80	CS ÚRS 2020 02
47	K	317941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší	t	0,730	17 251,21	12 593,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.04					
	VV		u schodiště mč. 1.01					
	VV		(4,25+1,50)*127,0/1000 "HE B 320				0,730	
	VV		Součet				0,730	
48	M	13011008	ocel profilová HE-B 320 jakost 11 375	t	0,730	48 303,39	35 261,47	CS ÚRS 2020 02
49	K	317998112	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 70 mm	m	5,500	69,00	379,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.23.1.38					
	VV		5,50*1				5,500	
	VV		Součet				5,500	
50	K	317998114	Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 90 mm	m	53,750	80,51	4 327,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D1.23.1.38					
	VV		1,0*8+2,0*1+2,75*10+1,25*3+1,50*2+1,75*4+2,50*1				53,750	
	VV		Součet				53,750	
51	K	342244111	Příčka z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm	m2	403,214	730,30	294 467,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.4,5					
	VV		1.NP					
	VV		(4,20*8+3,33*2+1,40)*3,45-0,80*2,0*4-0,70*2,0*3 "1.06-1.14				133,127	
	VV		(2,215+1,45+2,565+1,45+2,565+1,65+1,35+2,90+1,30+2,45+3,80)*3,45-0,90*2,0*3-0,80*2,0*2-0,70*2,0 "1.02-1.20				71,748	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2.NP					
	VV		(4,20*8+3,33*2+1,40)*3,35-0,80*2,0*4-0,70*2,0*3 "2.06-1.14		128,961			
	VV		(2,215+1,45+2,565+1,45+2,565+1,65+1,35+2,90+1,30+2,45+3,80)*3,35-0,90*2,0*3-0,80*2,0*2-0,70*2,0 "2.02-2.20		69,378			
	VV		Součet		403,214			
52	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	5,790	920,06	5 327,15	CS ÚRS 2020 02
	VV		"překlad P12" 1,80*0,10*2		0,360			
	VV		"překlad P13" 6,25*0,14*2		1,750			
	VV		"HE B 320" (4,25+1,50)*0,32*2		3,680			
	VV		Součet		5,790			
53	K	346271113	Přizdívky z cihel betonových tl 65 mm	m2	6,745	460,03	3 102,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,09+2,505*2)*0,95		6,745			
	VV		Součet		6,745			
54	K	346271129	Příplatek k přizdívám za ochranu izolace zaléváním maltou	m2	6,555	195,51	1 281,57	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,09+2,405*2)*0,95		6,555			
	VV		Součet		6,555			
55	K	346481111	Zaplentování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stěnách rabicovým pletivem	m2	7,929	632,54	5 015,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		"překlad P12" 1,80*(0,10*2+0,20)		0,720			
	VV		"překlad P13" 6,26*(0,14*2+0,10)		2,379			
	VV		"HE B 320" (4,25+1,50)*(0,32*2+0,20)		4,830			
	VV		Součet		7,929			
D 4			Vodorovné konstrukce				2 424 456,69	
58	K	411133902	Montáž stropních panelů z betonu předpjatého bez závěsných háků hmotnosti do 3 t budova v do 18 m	kus	159,000	1 207,58	192 005,22	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		24+4+30+2+1+7+2+1+1+1+2+1		76,000			
	VV		2.NP					
	VV		24+4+30+2+1+11+1+2+4+2+2		83,000			
	VV		Součet		159,000			
59	M	593468R1	panel stropní předpjatý Spirrol HCE 250-0/6	m	203,000	1 322,59	268 485,77	
	VV		7,25*24 "panel S1 - 1200x7250x2500		174,000			
	VV		7,25*4 "panel S2 - 1010x7250x250		29,000			
	VV		Součet		203,000			
60	M	593468R2	panel stropní předpjatý Spirrol HCE 250-0/8	m	725,345	1 414,60	1 026 073,04	
	VV		4,15*30 "panel S3 - 1200x4150x250		124,500			
	VV		4,15*2 "panel S4 - 785x4150x250		8,300			
	VV		4,15*(1+1) "panel S5 - 560x4150x250		8,300			
	VV		8,45*(7+11) "panel S6 - 1200x8450x250		152,100			
	VV		8,45*1 "panel S7 - 1010x8450x250		8,450			
	VV		8,45*2 "panel S8 - 785x8450x250		16,900			
	VV		5,16*1 "panel S9 - 1010x5160x250		5,160			
	VV		5,16*1 "panel S10 - 785x5160x250		5,160			
	VV		4,845*1 "panel S11 - 1200x4845*250		4,845			
	VV		2,715*2 "panel S12 - 1010x2715x250		5,430			
	VV		7,25*24 "panel S1 - 1200x7250x250		174,000			
	VV		7,25*4 "panel S2 - 1010x7250x250		29,000			
	VV		4,45*30 "panel S3 - 1200x4450x250		133,500			
	VV		4,45*2 "panel S4 - 1010x4450x250		8,900			
	VV		6,0*2 "panel S17 - 1010x6000x250		12,000			
	VV		5,55*4 "panel S18 - 785x5550x250		22,200			
	VV		2,70*2 "panel S19 - 1010x2700x250		5,400			
	VV		0,6*2 "panel S20 - 1010x600x250		1,200			
	VV		Součet		725,345			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	593468R3	panel stropní předpjatý Spirrol HCE 250-0/9	m	8,450	1 495,11	12 633,68	
	VV		8,45*1 "panel S13 - 1200x8450x250		8,450			
	VV		Součet		8,450			
62	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 XC1	m3	2,545	4 025,28	10 244,34	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.2.02,03					
	VV		dobetonávka panelového stropu					
	VV		0,495*5,16*0,25+0,435*8,45*0,25 "D1		1,557			
	VV		0,13*8,45*0,25+2,32*2,05*0,15 "D2		0,988			
	VV		Součet		2,545			
63	K	411321616	Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37	m3	13,008	4 094,29	53 258,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.2.3.1.6					
	VV		spojovací lávka "B"					
	VV		30,675*2,0*0,20		12,270			
	VV		S4					
	VV		2,05*2,40*0,15		0,738			
	VV		Součet		13,008			
64	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	104,175	690,05	71 885,96	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.2.3.1.6					
	VV		spojovací lávka "B"					
	VV		30,675*2,0+30,675*0,20*2		73,620			
	VV		S4					
	VV		2,05*2,40+(2,05+2,40)*2*0,15		6,255			
	VV		příloha D.1.23.2.02,03					
	VV		dobetonávka panelového stropu					
	VV		0,495*5,16+0,435*8,45+(0,495+5,16)*2*0,25+(0,435+8,45)*2*0,25 "D1		13,500			
	VV		0,13*8,45+2,32*2,05+(0,13+8,45)*2*0,25+(2,32+2,05)*0,15 "D2		10,800			
	VV		Součet		104,175			
65	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	104,175	172,51	17 971,23	CS ÚRS 2020 02
66	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	52,148	791,26	41 262,63	CS ÚRS 2020 02
	VV		spojovací krček "B"					
	VV		30,675*1,70		52,148			
	VV		Součet		52,148			
67	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	73,435	207,01	15 201,78	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.2.3.1.6					
	VV		spojovací lávka "B"					
	VV		30,675*2,0		61,350			
	VV		příloha D.1.23.2.02,03					
	VV		dobetonávka panelového stropu					
	VV		0,495*5,16+0,435*8,45 "D1		6,230			
	VV		0,13*8,45+2,32*2,05 "D2		5,855			
	VV		Součet		73,435			
68	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	73,435	115,01	8 445,76	CS ÚRS 2020 02
69	K	411354331	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm	m2	4,920	230,02	1 131,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.2.3.1.6					
	VV		S4					
	VV		2,05*2,40		4,920			
	VV		Součet		4,920			
70	K	411354332	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 15 cm	m2	4,920	138,01	679,01	CS ÚRS 2020 02
71	K	4113543R1	Příplatek k podpěrné konstrukce stropů za výšku podepření nad 8 m	m2	4,920	115,01	565,85	
72	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	2,021	37 377,63	75 540,19	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		příloha D.1.2.3.1.6					
	VV		spojovací lávka "B"					
	VV		30,675*2,0*0,20*0,130		1,595			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S4					
	VV		2,05*2,40*0,15*0,130		0,096			
	VV		příloha D.1.23.2.02,03					
	VV		dobetonávka panelového stropu					
	VV		(0,495*5,16*0,25+0,435*8,45*0,25)*0,130 "D1		0,202			
	VV		(0,13*8,45*0,25+2,32*2,05*0,15)*0,130 "D2		0,128			
	VV		Součet		2,021			
73	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	32,026	4 151,79	132 965,23	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.01.23.1.9.10					
	VV		1.NP					
	VV		(38,02+0,175*2+3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*0,365*0,50-		12,552			
	VV		(38,02+0,175*2+3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*0,25*0,12					
	VV		1.NP					
	VV		(4,20*2+38,02+0,175*2+1,55*2+7,0*2+3,18+0,115)*0,30*0,25		5,037			
	VV		2.NP					
	VV		(38,02+0,175*2+3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*0,365*0,40-		9,547			
	VV		(38,02+0,175*2+3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*0,25*0,12					
	VV		(4,20*2+38,02+0,175*2+1,55*2+7,0*2+3,18+0,115)*0,30*0,15		3,022			
	VV		0,60*0,30*0,15		0,027			
	VV		spojovací lávka "B"					
	VV		30,675*0,40*0,20*2-30,675*0,10*0,50*2		1,841			
	VV		Součet		32,026			
74	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	251,142	575,04	144 416,70	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.01.23.1.9.10					
	VV		1.NP					
	VV		(38,02+0,175*2+3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*0,50*2		82,305			
	VV		(4,20*2+38,02+0,175*2+1,55*2+7,0*2+3,18+0,115)*0,25*2		33,583			
	VV		2.NP					
	VV		(38,02+0,175*2+3,23+6,03+1,25+7,30+16,40+9,36+0,365)*0,40*2		65,844			
	VV		(4,20*2+38,02+0,175*2+1,55*2+7,0*2+3,18+0,115)*0,15*2		20,150			
	VV		0,60*0,15*2		0,180			
	VV		spojovací lávka "B"					
	VV		30,675*0,40*2*2		49,080			
	VV		Součet		251,142			
75	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	251,142	149,51	37 548,24	CS ÚRS 2020 02
76	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	4,163	37 377,63	155 603,07	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		32,026*0,130		4,163			
	VV		Součet		4,163			
77	K	430321616	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 30/37	m3	9,872	4 577,32	45 187,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.23.1.4,5					
	VV		schodiště 1.01/2.01					
	VV		(2,0+2,60+2,0)*1,30*0,20 "podstupňová deska		1,716			
	VV		0,50*0,30*1,30 "základ schodiště		0,195			
	VV		0,285*0,15/2*24*1,30 "schody		0,667			
	VV		1,665*1,665*0,20*2 "podesta		1,109			
	VV		schodiště 1.05,1.15/2.05,2.15					
	VV		(2,70+3,10)*1,20*0,20*2 "podstupňová deska		2,784			
	VV		0,30*0,175*1,20*2 "základ schodiště		0,126			
	VV		0,18*0,29/2*1,20*20*2 "schody		1,253			
	VV		3,23*1,565*0,20*2 "podesta		2,022			
	VV		Součet		9,872			
78	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	1,283	37 377,63	47 955,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		množství výztuže 130kg/m3					
	VV		9,872*0,130		1,283			
	VV		Součet		1,283			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	37,395	1 092,58	40 857,03	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.23.1.4,5					
	VV		schodiště 1.01/2.01					
	VV		(2,0+2,60+2,0)*(1,30+0,20) "podstupňová deska		9,900			
	VV		(0,50+1,30*2)*0,30 "základ schodiště		0,930			
	VV		1,30*1,30*2 "podesta		3,380			
	VV		schodiště 1.05,1.15/2.05,2.15					
	VV		(2,70+3,10)*(1,20+0,20)*2 "podstupňová deska		16,240			
	VV		(0,30+1,20*2)*0,175*2 "základ schodiště		0,945			
	VV		2,50*1,20*2		6,000			
	VV		Součet		37,395			
80	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	37,395	287,52	10 751,81	CS ÚRS 2020 02
81	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	13,320	862,56	11 489,30	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.23.1.4,5					
	VV		schodiště 1.01/2.01					
	VV		0,15*1,30*24 "schody		4,680			
	VV		schodiště 1.05,1.15/2.05,2.15					
	VV		0,18*1,20*20*2 "schody		8,640			
	VV		Součet		13,320			
82	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	13,320	172,51	2 297,83	CS ÚRS 2020 02
D 5			Komunikace pozemní		8 436,55			
83	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	61,130	138,01	8 436,55	CS ÚRS 2020 02
	VV		okapový chodník					
	VV		((5,85+16,70+13,69+0,30+4,18)*2+1,40+38,02+1,40)*0,50		61,130			
	VV		Součet		61,130			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		7 492 670,45			
84	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	509,800	253,02	128 989,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		omítka pod obklady					
	VV		509,80		509,800			
	VV		Součet		509,800			
85	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1 696,452	299,02	507 273,08	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.4					
	VV		1.NP					
	VV		(5,78+1,975*2)*2,65+(5,0+2,40*2)*0,25-5,0*2,40-0,80*2,0 "mč. 1.01		14,635			
	VV		(3,35+0,48+4,405+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+2,915+3,285+5,45+1,30)*2,925+2,655*3,15/2+(1,70+1,0*2)*0,25+(1,20+2,15*2)*0,20*2+(1,10+2,15*2)*0,20		119,390			
	VV		-0,90*2,0*8-1,18-2,22-0,80*2,0-1,0*1,70 "mč. 1.02		-21,100			
	VV		(3,18+3,55+2,215+1,50+2,565)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30-0,90*2,0*2-0,84*1,84 "mč. 1.03		30,687			
	VV		(7,0+16,40)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*2+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2		158,340			
	VV		-0,90*2,0*5-0,80*2,0*2-2,25*2,50*4-0,75*2,50*2-0,84*1,84 "mč. 1.04		-39,996			
	VV		(5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2-0,90*2,0*2 "mč. 1.05		50,080			
	VV		(2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30-(0,45*2+2,40)*0,55-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 1.06		38,535			
	VV		(2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 1.07		31,500			
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,80*2,0-2,25*0,75 "mč. 1.08a		39,178			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,75*2,25-0,80*2,0*2 "mč. 1.08		52,948			
	VV		(5,25+4,20)*2*3,10+(1,50+0,75*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20-(1,0*2+5,25)*0,45-0,75*1,50*2-0,90*2,0-0,80*2,0*2 "mč. 1.09		50,978			
	VV		(3,33+1,61)*2*2,65-0,80*2,0-0,70*2,0 "mč. 1.10		23,182			
	VV		(2,2+1,40)*2*2,65-0,70*2,0*3 "mč. 1.10a		14,880			
	VV		(0,95+1,40)*2*2,65-0,70*2,0 "mč. 1.10b		11,055			
	VV		(3,33+0,95)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,70*2,0 "mč. 1.10c		20,722			
	VV		(5,25+4,20)*2*3,10+(0,75*2+1,50)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20-(1,0*2+5,25)*0,45-1,50*0,75*2-0,80*2,0*2-0,90*2,0 "mč. 1.11		50,978			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,75*2,25-0,80*2,0*2 "mč. 1.12		52,948			
VV			(3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,80*2,0-2,25*0,75 "mč. 1.12a		39,178			
VV			(2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 1.13		31,500			
VV			(2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30-(0,45*2+2,40)*0,55-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 1.14		38,535			
VV			(5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2-0,90*2,0*2 "mč. 1.15		50,080			
VV			(1,72+1,50)*2*2,60-0,90*2,0-0,70*2,0 "mč. 1.18		13,544			
VV			(0,95+1,50)*2*2,60-0,70*2,0 "mč. 1.18a		11,340			
VV			(2,15+2,305)*2*2,60-0,90*2,0 "mč. 1.19		21,366			
VV			(2,305+1,50)*2*2,60-0,80*2,0 "mč. 1.20		18,186			
VV			2.NP					
VV			(3,30+5,255+2,90)*2,65+(1,0+1,70*2)*0,25-1,0*1,70 "mč. 2.01		29,756			
VV			(5,64+2,88+7,335+2,05+4,405+0,48+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+1,50+2,63+0,25)*2,925+(1,20+2,15*2)*0,20*2+(1,90+2,40*2)*0,30		132,720			
VV			-(1,25+2,0+1,10+2,0+0,90*2,0*6+0,80*2,0*3+1,18*2,22) "mč. 2.02		-24,570			
VV			(3,15+3,55+2,215+1,50+2,33)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30-0,84*1,84-0,90*2,0*2 "mč. 2.03		29,985			
VV			(7,0+16,40)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*2+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2		158,340			
VV			-0,90*2,0*5-0,80*2,0*2-2,25*2,50*4-0,75*2,50*2-0,84*1,84 "mč. 2.04		-39,996			
VV			(5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2-0,90*2,0*2 "mč. 2.05		50,080			
VV			(2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30-(0,45*2+2,40)*0,55-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 2.06		38,535			
VV			(2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 2.07		31,500			
VV			(3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,80*2,0-2,25*0,75 "mč. 2.08a		39,178			
VV			(5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,75*2,25-0,80*2,0*2 "mč. 2.08		52,948			
VV			(5,25+4,20)*2*3,10+(1,50+0,75*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20-(1,0*2+5,25)*0,45-0,75*1,50*2-0,90*2,0-0,80*2,0*2 "mč. 2.09		50,978			
VV			(3,33+1,61)*2*2,65-0,80*2,0-0,70*2,0 "mč. 2.10		23,182			
VV			(2,2+1,40)*2*2,65-0,70*2,0*3 "mč. 2.10a		14,880			
VV			(0,95+1,40)*2*2,65-0,70*2,0 "mč. 2.10b		11,055			
VV			(3,33+0,95)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30-2,25*0,75-0,70*2,0 "mč. 2.10c		20,722			
VV			(5,25+4,20)*2*3,10+(0,75*2+1,50)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20-(1,0*2+5,25)*0,45-1,50*0,75*2-0,80*2,0*2-0,90*2,0 "mč. 2.11		50,978			
VV			(5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,75*2,25-0,80*2,0*2 "mč. 2.12		52,948			
VV			(3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30-0,80*2,0-2,25*0,75 "mč. 2.12a		39,178			
VV			(2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 2.13		31,500			
VV			(2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30-(0,45*2+2,40)*0,55-0,90*2,0-0,75*2,10 "mč. 2.14		38,535			
VV			(5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2-0,90*2,0*2 "mč. 2.15		50,080			
VV			(7,0+16,40)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*2+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2		158,340			
VV			-0,90*2,0*5-0,80*2,0*2-2,25*2,50*4-0,75*2,50*2-0,84*1,84 "mč. 2.16		-39,996			
VV			(3,55+2,785+1,85+1,50+2,565)*2,60-0,90*2,0 "mč. 2.17		30,050			
VV			(1,50+2,785)*2,60-0,80*2,0 "mč. 2.18		9,541			
VV			(2,305+7,335)*2*2,60+(2,25+1,50*2)*0,30*2-2,25*1,50*2-0,80*2,0 "mč. 2.19		44,928			
VV			(2,785+3,65)*2*3,25-1,10*2,0 "mč. 2.20		39,628			
VV			(1,755+2,785*2)*2,50-1,25*2,0 "mč. 2.21		15,813			
VV			30,675*2*2,60-0,80*0,80*20-1,06*1,06*2-0,80*1,06*2 "krček		142,767			
VV			odečet obkladů					
VV			-509,80		-509,800			
VV			Součet		1 696,452			
86	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	69,939	1 349,04	94 350,51	CS ÚRS 2020 02
VV			spojovací lávka "B"					
VV			30,675*2,28		69,939			
VV			Součet		69,939			
87	M	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	71,338	434,73	31 012,77	CS ÚRS 2020 02
VV			69,939*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		71,338			
88	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	517,800	102,36	53 002,01	CS ÚRS 2020 02
VV			1.NP					
VV			(0,75+2,10)*2*4		22,800			
VV			(2,25+0,75)*2*5		30,000			
VV			(1,50+0,75)*2*4		18,000			
VV			1,20+2,40*2		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,25+2,50)*2*8		76,000			
	VV		(0,75+2,50)*2*4		26,000			
	VV		(5,0+2,40)*2		14,800			
	VV		(1,0+1,70)*2		5,400			
	VV		1,20+2,40*2		6,000			
	VV		2.NP					
	VV		(0,75+2,10)*2*8		45,600			
	VV		(2,25+0,75)*2*5		30,000			
	VV		(1,50+0,75)*2*4		18,000			
	VV		(0,75+2,10)*2		5,700			
	VV		(2,25+2,50)*2*8		76,000			
	VV		(0,75+2,50)*2*4		26,000			
	VV		(2,25+1,50)*2*2		15,000			
	VV		(1,9+2,4)*2		8,600			
	VV		(1,70+1,0)*2		5,400			
	VV		(0,75+2,0)*2		5,500			
	VV		7,70*10		77,000			
	VV		Součet		517,800			
89	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	543,690	38,30	20 823,33	CS ÚRS 2020 02
	VV		517,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		543,690			
90	K	622143004	Montáž omítkových samolepících zateplovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	440,800	104,66	46 134,13	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		(0,75+2,10)*2*4		22,800			
	VV		(2,25+0,75)*2*5		30,000			
	VV		(1,50+0,75)*2*4		18,000			
	VV		1,20+2,40*2		6,000			
	VV		(2,25+2,50)*2*8		76,000			
	VV		(0,75+2,50)*2*4		26,000			
	VV		(5,0+2,40)*2		14,800			
	VV		(1,0+1,70)*2		5,400			
	VV		1,20+2,40*2		6,000			
	VV		2.NP					
	VV		(0,75+2,10)*2*8		45,600			
	VV		(2,25+0,75)*2*5		30,000			
	VV		(1,50+0,75)*2*4		18,000			
	VV		(0,75+2,10)*2		5,700			
	VV		(2,25+2,50)*2*8		76,000			
	VV		(0,75+2,50)*2*4		26,000			
	VV		(2,25+1,50)*2*2		15,000			
	VV		(1,9+2,4)*2		8,600			
	VV		(1,70+1,0)*2		5,400			
	VV		(0,75+2,0)*2		5,500			
	VV		Součet		440,800			
91	M	59051476	profil okenní zateplovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	462,840	56,70	26 243,03	CS ÚRS 2020 02
	VV		440,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		462,840			
92	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	204,239	1 159,28	236 770,19	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		zateplení základů					
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		(3,405+1,10+38,195+1,1+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+7,175+15,925+0,55+5,75*2+3,56*2+1,0*2+3,56*2+8,305+15,925+0,55+		204,239			
	VV		7,175+1,25+4,83+1,0+0,60)*1,40					
	VV		Součet		204,239			
93	M	28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ=0,034	m3	29,166	3 217,93	93 854,15	CS ÚRS 2020 02
	VV		28,5941432021074*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		29,166			
94	K	622221021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm	m2	126,664	1 059,22	134 165,04	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	atiky zevnitř					
		VV	(38,02+0,54*2+2,50*2+(5,90+1,25+7,30+16,70+9,31)*2+8,31)*0,95		126,664			
		VV	Součet		126,664			
95	M	63151527	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 100mm	m2	129,197	266,82	34 472,34	CS ÚRS 2020 02
		VV	126,664*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		129,197			
96	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	922,486	1 206,43	1 112 914,78	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.03.1.4,5,6					
		VV	(38,02+3,58*2+(6,38-0,175*2+1,25+7,30+16,70+9,31-0,175)*2+9,28)*8,25		1 116,143			
		VV	odečet otvorů					
		VV	-(0,75*2,1*4+2,25*0,75*5+1,50*0,75*4+1,2*2,40*2+2,25*2,50*4*2+0,75*2,50*2*2+1,0*1,70+5,0*2,40)		-91,198			
		VV	-(0,75*2,10*8+2,25*0,75*5+1,50*0,75*4+0,75*2,10*2+2,25*2,50*4*2+0,75*2,50*2*2+1,545*2,15+1,0*1,70+2,25*1,50*2)		-92,959			
		VV	odečet spojovací lávka					
		VV	-2,50*3,80		-9,500			
		VV	Součet		922,486			
97	M	63151538	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 160mm	m2	940,936	373,78	351 703,06	CS ÚRS 2020 02
		VV	922,486*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		940,936			
98	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	183,241	1 349,04	247 199,44	CS ÚRS 2020 02
		VV	spojovací lávka "B"					
		VV	30,675*3,55*2-0,80*0,80*10*2-1,06*0,80*23-1,06*1,06*2		183,241			
		VV	Součet		183,241			
99	M	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	186,906	434,73	81 253,65	CS ÚRS 2020 02
		VV	183,241*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		186,906			
100	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	145,885	242,67	35 401,91	CS ÚRS 2020 02
		VV	3,405+1,10+38,195+1,1+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+7,175+15,925+0,55+5,75*2+3,56*2+1,0*2+3,56*2+8,305+15,925+0,55+7,175+1,25+4,83+1,0+0,60		145,885			
		VV	Součet		145,885			
101	M	59051653	lišta soklová Al s okapničkou základací U 16cm 0,95/200cm	m	153,179	128,81	19 730,99	CS ÚRS 2020 02
		VV	145,885*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		153,179			
102	K	6222730R1	D+M opláštění obou stěn a spodního líce pod podlahou spojovací lávky B z fasádních desek cementovláknitých nehořlavých (ref. výrobek Cembrit řady PLANK)- 33/T	m2	438,500	6 146,66	2 695 310,41	
		VV	příloha D1.23.1.10					
		VV	spojovací krček "B"					
		VV	obkladové lamely s dekorem dřeva š. 180 mm, tl. 8mm, osazený svisle na Al obousměrném roštu zvýšeném o tloušťku tepelné izolace minerální 180 mm					
		VV	hliníkový rošt bude tvořen profily T a rozpěrnými kotvami a s distančními profily na vzdálenost 180 mm od betonové nosné konstrukce					
		VV	horní i spodní líc opláštění tvoří vlnovku – je nutno počítat s vyššími prořezy a složitější montáží					
		VV	opláštění bude ve třech barevných odstínech - např. CP 080c Basalt grey, CP370 Oxide red a CP 999 Přírodní šedá v poměru cca 20:20:60					
		VV	cena opláštění včetně spojovacího materiálu, trhacích nýtů a nátěru na řezné hrany, EPDM pásky, balného a dopravy					
		VV	438,50		438,500			
		VV	Součet		438,500			
103	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	87,531	656,70	57 481,61	CS ÚRS 2020 02
		VV	sokl					
		VV	(3,405+1,10+38,195+1,1+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+7,175+15,925+0,55+5,75*2+3,56*2+1,0*2+3,56*2+8,305+15,925+0,55+7,175+1,25+4,83+1,0+0,60)*0,60		87,531			
		VV	Součet		87,531			
104	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	1 114,184	430,13	479 243,96	CS ÚRS 2020 02
		VV	fasáda					
		VV	922,486		922,486			
		VV	atika zevnitř					
		VV	(38,02+0,54*2+2,50*2+(5,90+1,25+7,30+16,70+9,31)*2+8,31)*0,95		126,664			
		VV	ostění, nadpraží					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.NP" 0,18*(2,5*2*12+1,7*2+1,0+2,4*2+5,0+(2,4*2+1,0)*2+(2,1*2+0,8)*4+(0,8*2+2,3)*5+(0,8*2+1,5)*4)		24,786			
	VV		"2.NP" 0,18*(2,5*2*12+1,7*2+1,0+2,4*2+1,9+(1,5*2+2,3)*2+(2,1*2+0,8)*10+(0,8*2+2,3)*5+(0,8*2+1,5)*4)		29,448			
	VV		"pouzdra žaluzií" 10,8		10,800			
	VV		Součet		1 114,184			
105	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	12,156	6 887,83	83 728,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.30					
	VV		skladba P2					
	VV		(10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50)*0,075		7,549			
	VV		skladba P9					
	VV		10,02*0,045		0,451			
	VV		skladba P11					
	VV		(10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20)*0,045		4,156			
	VV		Součet		12,156			
106	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,574	5 607,79	3 218,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		výtahová šachta - podkladní beton					
	VV		2,29*2,505*0,10		0,574			
	VV		Součet		0,574			
107	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	75,292	3 507,75	264 105,51	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.03					
	VV		podkladní mazanina tl. 150 mm					
	VV		(2,28+0,075*2)*(4,83+0,30+0,10)*0,15		1,906			
	VV		(2,28+0,075+0,10)*(4,83+0,30+0,10)*0,15		1,926			
	VV		(38,22+0,075+0,10)*(3,73+0,30+0,10)*0,15		23,786			
	VV		(15,925+0,075+0,30)*(6,425+0,30+0,175)*2*0,15		33,741			
	VV		(12,375+0,30+0,075)*(7,53+0,30*2)*0,15-3,0*0,55*0,15		15,301			
	VV		odečet					
	VV		-2,09*2,405*0,15		-0,754			
	VV		-(1,25*0,60*2+1,175*0,60+2,10*0,90)*0,15		-0,614			
	VV		Součet		75,292			
108	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	12,156	103,51	1 258,27	CS ÚRS 2020 02
109	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,574	103,51	59,41	CS ÚRS 2020 02
110	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	75,292	103,51	7 793,47	CS ÚRS 2020 02
111	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,680	36 802,59	135 433,53	CS ÚRS 2020 02
	VV		síť KARI 8/150 + 10% ztratiné					
	VV		podkladní betan základové šachty					
	VV		2,29*4,645*0,005267*1,10		0,062			
	VV		podkladní beton					
	VV		75,292/0,15*0,005267*1,10		2,908			
	VV		příloha D.1.23.1.30					
	VV		skladba P2 - síť KARI 6/150 + 10% ztratiné					
	VV		(10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50+(0,29*1,20*20+2,50*1,20))*0,003033*1,10		0,369			
	VV		skladba P9					
	VV		10,02*0,003033*1,10		0,033			
	VV		skladba P11					
	VV		(10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20)*0,003033*1,10		0,308			
	VV		Součet		3,680			
112	K	632451234.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 50 mm	m2	96,360	369,18	35 574,18	
	VV		příloha D.1.23.1.30					
	VV		skladba P10					
	VV		51,48+13,50+10,10+8,8+8,8+10,1+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2		96,360			
	VV		Součet		96,360			
113	K	63245124R.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 60 mm	m2	303,760	409,43	124 368,46	
	VV		příloha D.1.23.1.30					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		kročejová izolace					
	VV		skladba P7,8					
	VV		115,70*2+22,30+5,40+22,30+16,77+5,59		303,760			
	VV		Součet		303,760			
114	K	63245125R.TBM	Potěr cementový samonivelační litý CEMFLOW CF 25 tl do 80 mm	m2	375,242	488,78	183 410,78	
	VV		příloha D.1.23.1.30					
	VV		skladba P1					
	VV		12,86+52,12+13,80+10,10+8,80+8,80+1,10+13,80-(0,285*1,30*16+1,30*1,30)-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2		93,842			
	VV		skladba P3, P4					
	VV		115,70*2+22,30+5,40+22,30		281,400			
	VV		Součet		375,242			
115	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	987,382	16,10	15 896,85	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.30					
	VV		skladba P1					
	VV		12,86+52,12+13,80+10,10+8,80+8,80+10,10+13,80-(0,285*1,30*16+1,30*1,30)-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2		102,842			
	VV		skladba P2					
	VV		10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50		100,650			
	VV		skladba P3, P4					
	VV		115,70*2+22,30+5,40+22,30		281,400			
	VV		skladba P7,8					
	VV		115,70*2+22,30+5,40+22,30+16,77+5,59		303,760			
	VV		skladba P9					
	VV		10,02		10,020			
	VV		skladba P10					
	VV		51,48+13,50+10,10+8,8+8,8+10,1+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2		96,360			
	VV		skladba P11					
	VV		10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20		92,350			
	VV		Součet		987,382			
116	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	678,085	20,70	14 036,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.4,5					
	VV		1.NP					
	VV		(5,78+1,975)*2 "mč. 1.01		15,510			
	VV		3,35+0,48+4,405+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+2,915+3,285+5,45+1,30 "mč. 1.02		37,950			
	VV		3,18+3,55+2,215+1,50+2,565 "mč. 1.03		13,010			
	VV		(7,0+16,40)*2 "mč. 1.04		46,800			
	VV		(5,30+2,50)*2 "mč. 1.05		15,600			
	VV		(2,40+4,20)*2 "mč. 1.06		13,200			
	VV		(2,10+4,20)*2 "mč. 1.07		12,600			
	VV		(3,60+4,20)*2 "mč. 1.08a		15,600			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2 "mč. 1.08		21,400			
	VV		(5,25+4,20)*2 "mč. 1.09		18,900			
	VV		(3,33+1,61)*2 "mč. 1.10		9,880			
	VV		(2,2+1,40)*2 "mč. 1.10a		7,200			
	VV		(0,95+1,40)*2 "mč. 1.10b		4,700			
	VV		(3,33+0,95)*2 "mč. 1.10c		8,560			
	VV		(5,25+4,20)*2 "mč. 1.11		18,900			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2 "mč. 1.12		21,400			
	VV		(3,60+4,20)*2 "mč. 1.12a		15,600			
	VV		(2,10+4,20)*2 "mč. 1.13		12,600			
	VV		(2,40+4,20)*2 "mč. 1.14		13,200			
	VV		(5,30+2,50)*2 "mč. 1.15		15,600			
	VV		2.NP					
	VV		3,30+5,255+2,90 "mč. 2.01		11,455			
	VV		5,64+2,88+7,335+2,05+4,405+0,48+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+1,50+2,63+0,25		43,935			
	VV		3,15+3,55+2,215+1,50+2,33 "mč. 2.03		12,745			
	VV		(7,0+16,40)*2 "mč. 2.04		46,800			
	VV		(5,30+2,50)*2 "mč. 2.05		15,600			
	VV		(2,40+4,20)*2 "mč. 2.06		13,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,10+4,20)*2 "mč. 2.07		12,600			
	VV		(3,60+4,20)*2 "mč. 1.08a		15,600			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2 "mč. 2.08		21,400			
	VV		(5,25+4,20)*2 "mč. 2.09		18,900			
	VV		(3,33+1,61)*2 "mč. 2.10		9,880			
	VV		(2,2+1,40)*2 "mč. 2.10a		7,200			
	VV		(0,95+1,40)*2 "mč. 2.10b		4,700			
	VV		(3,33+0,95)*2 "mč. 2.10c		8,560			
	VV		(5,25+4,20)*2 "mč. 2.11		18,900			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2 "mč. 2.12		21,400			
	VV		(3,60+4,20)*2 "mč. 2.12a		15,600			
	VV		(2,10+4,20)*2 "mč. 2.13		12,600			
	VV		(2,40+4,20)*2 "mč. 2.14		13,200			
	VV		(5,30+2,50)*2 "mč. 2.15		15,600			
	VV		Součet		678,085			
117	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	61,130	736,05	44 994,74	CS ÚRS 2020 02
	VV		vymývaná dlažba 500x500x50 mm					
	VV		((5,85+16,70+13,69+0,30+4,18)*2+1,40+38,02+1,40)*0,50		61,130			
	VV		Součet		61,130			
118	K	637311122	Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton	m	124,260	736,05	91 461,57	CS ÚRS 2020 02
	VV		obrubník 50/200/1000 mm					
	VV		(5,85+0,50+16,70+13,69+0,30+4,18)*2+1,40+38,02+1,40+1,0		124,260			
	VV		Součet		124,260			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				741 983,36	
119	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 495,710	48,30	72 242,79	CS ÚRS 2020 02
	VV		fasádní lešení					
	VV		(45,18+0,90*2+(13,68+16,70+0,90+9,36+0,90+9,28)*2)*8,0		1 188,960			
	VV		spojovací krček					
	VV		30,675*4,0*2+30,675*2,0		306,750			
	VV		Součet		1 495,710			
120	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	#####	0,92	123 844,79	CS ÚRS 2020 02
	VV		1495,71*90 "Přepočtené koeficientem množství		134 613,900			
121	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1 495,710	36,80	55 042,13	CS ÚRS 2020 02
122	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	643,660	57,50	37 010,45	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.+2.NP					
	VV		(281,03+(4,0+16,40)*2)*2		643,660			
	VV		Součet		643,660			
123	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	8,240	1 092,58	9 002,86	CS ÚRS 2020 02
124	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	247,200	63,25	15 635,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		8,24*30 "Přepočtené koeficientem množství		247,200			
125	K	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	8,240	862,56	7 107,49	CS ÚRS 2020 02
126	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1 077,008	138,01	148 637,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.+2.NP					
	VV		512,43*2		1 024,860			
	VV		spojovací krček "B"					
	VV		30,675*1,70		52,148			
	VV		Součet		1 077,008			
127	K	953332114	Vložky do svislých dilatačních spár z pryže tl 10 mm kladené volně - 29/O	m2	0,768	1 279,08	982,33	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků					
	VV		mezi pavilonem B, hosp. pavilonem a spojovacím krčkem					
	VV		0,24*1,60*2		0,768			
	VV		Součet		0,768			
128	K	953611125	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 - 21/O	kus	8,000	5 175,36	41 402,88	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
129	K	953611126	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 6 x D6 - 21/O	kus	6,000	5 750,40	34 502,40	CS ÚRS 2020 02
130	K	9539414R1	D+M hasicí přístroj práškový 6kg 34A 183B včetně kovového držáku a pomocného materiálu - 23/O	kus	8,000	1 667,62	13 340,96	
	VV		příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků					
	VV		8,0		8,000			
	VV		Součet		8,000			
131	K	9539415R1	D+M zápusťná krabice do zdi s rámečkem pro 1 modul tabla komunikátoru 125x235x46 mm - 26/O	kus	1,000	3 451,96	3 451,96	
	VV		příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	9539416R1	D+M dilatační lišta podlahová hliníková dl. 1600 mm - 27/O	kus	2,000	690,05	1 380,10	
	VV		příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků					
	VV		mezi povilonem B, hosp. pavilonem a spojovacím krčkm					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
133	K	9539417R1	D+M dilatační lišta stěnová hliníková dl. 2500 mm - 28/O	kus	4,000	2 300,16	9 200,64	
	VV		příloha D.1.23.1.35 - výpis ostatních výrobků					
	VV		mezi povilonem B, hosp. pavilonem a spojovacím krčkm					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
134	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	3,000	78,37	235,11	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		3,0 "ZTI7-9		3,000			
	VV		Součet		3,000			
135	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	8,000	68,69	549,52	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		1,0*3 "VZT3,6,9		3,000			
	VV		2.NP					
	VV		1,0 "VZT7		1,000			
	VV		4,0 "ZTI25,26,29,31		4,000			
	VV		Součet		8,000			
136	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000	122,86	245,72	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		1,0*2 "ZTI27,30		2,000			
	VV		Součet		2,000			
137	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm	kus	2,000	272,82	545,64	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		1,0 "ZTI24		1,000			
	VV		1,0 "ZTI11		1,000			
	VV		Součet		2,000			
138	K	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	6,000	68,69	412,14	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		2,0 "VZT51,55		2,000			
	VV		1,0*2 "ZTI15,18		2,000			
	VV		2.NP					
	VV		1,0*2 "VCZT51,55		2,000			
	VV		Součet		6,000			
139	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	5,760	254,76	1 467,42	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,90*0,40*2 "VZT13,VZT33		0,720			
	VV		0,70*0,40*9 "VZT19,20,22,30,31,32,39,40,42		2,520			
	VV		2.NP					
	VV		0,70*0,40*9 "VZT17,18,20,29,30,31,38,39,41		2,520			
	VV		Součet		5,760			
140	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,432	1 617,58	698,79	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		0,90*0,40*0,30*2 "VZT13,VZT33		0,216			
	VV		2.NP					
	VV		0,90*0,40*0,30*2 "VZT11,32		0,216			
	VV		Součet		0,432			
141	K	971033561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	0,302	1 869,12	564,47	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		0,70*0,80*0,54 "VZT1		0,302			
	VV		Součet		0,302			
142	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	4,850	215,42	1 044,79	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		3,35 "ZTI21		3,350			
	VV		2.NP					
	VV		1,50 "ZTI21		1,500			
	VV		Součet		4,850			
143	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	129,650	235,10	30 480,72	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		3,35*13 "ZTI1-13		43,550			
	VV		3,25*4 "UT1-4		13,000			
	VV		2.NP					
	VV		3,35*16 "ZTI1-16		53,600			
	VV		3,25*6 "UT1,2,5,6,10,11		19,500			
	VV		Součet		129,650			
144	K	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	29,950	261,85	7 842,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		3,35*3 "ZTI16,17,19		10,050			
	VV		2.NP					
	VV		3,35*4 "ZTI18,19,22,23		13,400			
	VV		3,25*2 "UT3,4		6,500			
	VV		Součet		29,950			
145	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	13,400	58,05	777,87	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		3,35*4 "ZTI18,19,22,23		13,400			
	VV		Součet		13,400			
146	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	0,575	3 047,71	1 752,43	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,115*4 "VZT4,5,8,50		0,460			
	VV		2.NP					
	VV		0,115 "VZT50		0,115			
	VV		Součet		0,575			
147	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	3,955	4 312,80	17 057,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,115 "VZT7		0,115			
	VV		0,175 "VZT23		0,175			
	VV		0,115 "VZT25		0,115			
	VV		0,30*2 "VZT27,29		0,600			
	VV		0,115 "VZT28		0,115			
	VV		0,175 "VZT43		0,175			
	VV		0,25 "VZT44		0,250			
	VV		0,115 "VZT45		0,115			
	VV		0,30*2 "VZT47,49		0,600			
	VV		0,115*3 "VZT48,53,54		0,345			
	VV		2.NP					
	VV		0,115*5 "VZT22,43,44,53,54		0,575			
	VV		0,30*2 "VZT28,49		0,600			
	VV		0,175 "VZT45		0,175			
	VV		Součet		3,955			
148	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	4,445	5 462,88	24 282,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,115*12 "VZT11,12,14,16,18,21,26,34,36,38,41,46		1,380			
	VV		0,30*2 "VZT17,37		0,600			
	VV		2.NP					
	VV		0,30*3 "VZT9,10,15		0,900			
	VV		0,115*3 "VZT12,14,19		0,345			
	VV		0,115*8 "VZT25,27,33,35,37,40,46,48		0,920			
	VV		0,30 "VZT36		0,300			
	VV		Součet		4,445			
149	K	97715113R	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 600 mm do stavebních materiálů	m	0,460	10 235,72	4 708,43	
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,115*2 "VZT15,35		0,230			
	VV		2.NP					
	VV		0,115*2 "VZT13,34		0,230			
	VV		Součet		0,460			
151	K	977151213	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	0,250	1 897,63	474,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		2.NP					
	VV		0,25 "SLB1		0,250			
	VV		Součet		0,250			
152	K	977151216	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	3,500	2 242,66	7 849,31	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,25*(3+3+4+4) "ZTI16,17,19,20		3,500			
	VV		Součet		3,500			
153	K	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	2,500	2 242,66	5 606,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,25*10 "ZTI21, EL1, UT1-4		2,500			
	VV		Součet		2,500			
154	K	977151224	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	10,750	3 047,71	32 762,88	CS ÚRS 2020 02
	VV		legenda prostupů					
	VV		1.NP					
	VV		0,25*14 "ZTI11-14		3,500			
	VV		2.NP					
	VV		0,25*16 "ZTI11-16		4,000			
	VV		strop					
	VV		0,25*13 "ZTI11-13		3,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		10,750			
155	K	977151228	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	4,300	4 312,80	18 545,04	CS ÚRS 2020 02
VV			legenda prostupů					
VV			1.NP					
VV			0,25 "VZT10		0,250			
VV			0,25*3 "VZT24,44,52		0,750			
VV			2.NP					
VV			0,25*6 "VCZT8,21,23,42,44,52		1,500			
VV			strop					
VV			0,30*6 "VZT1-4,6,7		1,800			
VV			Součet		4,300			
156	K	977151232	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 450 mm do stavebních materiálů	m	0,980	6 842,98	6 706,12	CS ÚRS 2020 02
VV			legenda prostupů					
VV			1.NP					
VV			0,25*2 "VZT1,2		0,500			
VV			2.NP					
VV			0,25+0,115*2 "VZT4,5,6		0,480			
VV			Součet		0,980			
157	K	977151233	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 500 mm do stavebních materiálů	m	0,500	9 177,64	4 588,82	CS ÚRS 2020 02
VV			legenda prostupů					
VV			2.NP					
VV			0,25 "VZT2		0,250			
VV			0,25 "VZT5		0,250			
VV			Součet		0,500			
D	997		Přesun sutě				31 205,51	
158	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	20,655	728,04	15 037,67	CS ÚRS 2020 02
159	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,655	242,60	5 010,90	CS ÚRS 2020 02
160	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	289,170	10,61	3 068,09	CS ÚRS 2020 02
VV			20,655*14 "Přepočtené koeficientem množství		289,170			
161	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	20,686	391,03	8 088,85	CS ÚRS 2020 02
D	998		Přesun hmot				830 708,90	
162	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2 792,956	297,43	830 708,90	CS ÚRS 2020 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				14 482 847,86	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				696 897,13	
163	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	628,428	18,40	11 563,08	CS ÚRS 2020 02
VV			izolace základové spáry					
VV			3,405*6,425+3,38*6,425+38,195*5,33+42,48*7,175+10,305*5,75+3,56*1,0*2		618,341			
VV			skladba P5					
VV			výtahová šachta - podkladní beton					
VV			2,29*4,405		10,087			
VV			Součet		628,428			
164	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,189	56 123,94	10 607,42	CS ÚRS 2020 02
VV			628,428*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství		0,189			
165	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	86,208	27,60	2 379,34	CS ÚRS 2020 02
VV			příloha D.1.03.1.3					
VV			izolace základové spáry					
VV			(38,02+0,54*2+2,50*2+(5,90+1,25+7,30+16,70+9,31)*2+8,31)*0,60		79,998			
VV			výtahová šachta					
VV			(2,09+2,405*2)*0,90		6,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		86,208			
166	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,030	56 123,94	1 683,72	CS ÚRS 2020 02
	VV		86,208*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,030			
167	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 247,696	123,06	153 541,47	CS ÚRS 2020 02
	VV		izolace základové spáry - 2x modifikovaný asf. pás					
	VV		(3,405*6,425+3,38*6,425+38,195*5,33+42,48*7,175+10,305*5,75+3,56*1,0*2)*2		1 236,681			
	VV		skladba P5					
	VV		výtahová šachta - podkladní beton					
	VV		2,29*2,405*2		11,015			
	VV		Součet		1 247,696			
168	M	628361R1	pás asfaltový natavitelný pro střední radonový index	m2	12,667	177,11	2 243,45	
	VV		11,015*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		12,667			
169	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s výztužnou vložkoupro střední radonový index	m2	1 261,415	203,56	256 773,64	
	VV		izolace základové spáry - 2x modifikovaný asf. pás					
	VV		(3,405*6,425+3,38*6,425+38,195*5,33+42,48*7,175+10,305*5,75+3,56*1,0*2)*2		1 236,681			
	VV		Součet		1 236,681			
	VV		1236,681*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1 261,415			
170	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	172,362	134,56	23 193,03	CS ÚRS 2020 02
	VV		izolace základové spáry					
	VV		(38,02+0,54*2+2,50*2+(5,90+1,25+7,30+16,70+9,31)*2+8,31)*0,60*2		159,996			
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(2,06+2,405*2)*0,90*2		12,366			
	VV		Součet		172,362			
171	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s výztužnou vložkoupro střední radonový index	m2	163,196	177,11	28 903,64	
	VV		izolace základové spáry					
	VV		(38,02+0,54*2+2,50*2+(5,90+1,25+7,30+16,70+9,31)*2+8,31)*0,60*2		159,996			
	VV		Součet		159,996			
	VV		159,996*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		163,196			
172	M	628361R1	pás asfaltový natavitelný pro střední radonový index	m2	14,839	203,56	3 020,63	
	VV		12,366*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		14,839			
173	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovné na betonu, 1 vrstva	m2	206,320	138,01	28 474,22	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba P2					
	VV		10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50		100,650			
	VV		skladba P5					
	VV		výtahová šachta - podkladní beton					
	VV		1,65*2,0		3,300			
	VV		skladba P9					
	VV		10,02		10,020			
	VV		skladba P11					
	VV		10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20		92,350			
	VV		Součet		206,320			
174	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti tl. 5 mm	kg	1 877,512	65,55	123 070,91	CS ÚRS 2020 02
	VV		206,32*9,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 877,512			
175	K	711192101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 1 vrstva	m2	42,401	138,01	5 851,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.3					
	VV		výtahová šachta					
	VV		(1,65+2,0)*2*0,90		6,570			
	VV		skladba P9					
	VV		(2,785+3,65)*2*0,30-1,10*0,30		3,531			
	VV		skladba P11					
	VV		(3,15+3,55+2,215+1,50+2,33)*0,30-0,80*0,30*2-0,90*0,30 "mč. 2.03		3,074			
	VV		(3,60+4,20)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 1.08a		4,440			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2*0,30-0,80*0,30*2 "mč. 2.08		5,940			
	VV		(2,2+1,40)*2*0,30-0,70*0,30*3 "mč. 2.10a		1,530			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,95+1,40)*2*0,30-0,70*0,30 "mč. 2.10b		1,200			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2*0,30-0,80*0,30*2 "mč. 2.12		5,940			
	VV		(3,60+4,20)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 2.12a		4,440			
	VV		(2,785+3,55+1,85+1,50+2,565)*0,30-0,90*0,30 "mč. 2.17		3,405			
	VV		(1,50+2,785)*2*0,30-0,80*0,30 "mč. 2.18		2,331			
	VV		Součet		42,401			
176	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti tl. 5 mm	kg	385,849	65,55	25 292,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		42,401*9,1 "Přepočtené koeficientem množství		385,849			
177	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,000	6 766,14	20 298,42	CS ÚRS 2020 02
D 712			Povlakové krytiny				271 846,61	
178	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	533,569	92,01	49 093,68	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S2+S4					
	VV		477,198+4,92		482,118			
	VV		skladba S3					
	VV		30,265*1,70		51,451			
	VV		Součet		533,569			
179	M	2832201R	folie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	613,604	303,12	185 995,64	
	VV		533,569*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		613,604			
180	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	533,569	27,60	14 726,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S2+S4					
	VV		477,198+4,92		482,118			
	VV		skladba S3					
	VV		30,265*1,70		51,451			
	VV		Součet		533,569			
181	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 (r.f. Filtek 300)	m2	613,604	23,00	14 112,89	CS ÚRS 2020 02
	VV		533,569*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		613,604			
182	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,000	2 639,30	7 917,90	CS ÚRS 2020 02
D 713			Izolace tepelné				800 390,14	
183	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 600,705	113,86	182 256,27	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S2 - spádové klíny					
	VV		(38,02+0,54*2)*(2,945-0,54)+2,50*5,90*2+(7,30-0,54)*41,60+9,31*8,31		482,118			
	VV		odečet S4					
	VV		-2,05*2,40		-4,920			
	VV		Mezisoučet		477,198			
	VV		skladba S3 - spádové klíny					
	VV		30,265*1,70		51,451			
	VV		skladba S4 - spádové klíny					
	VV		2,05*2,40		4,920			
	VV		skladba S2 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách					
	VV		((38,02+0,54*2)*(2,945-0,54)+2,50*5,90*2+(7,30-0,54)*41,60+9,31*8,31)*2		964,235			
	VV		odečet S4					
	VV		-2,05*2,40*2		-9,840			
	VV		Mezisoučet		1 010,766			
	VV		skladba S3 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách					
	VV		30,265*1,70*2		102,901			
	VV		skladba S4 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách					
	VV		2,05*2,40*2		9,840			
	VV		Součet		1 600,705			
184	M	28372312	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm	m2	1 078,443	185,21	199 738,43	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách					
	VV		477,198*2		954,396			
	VV		skladba S3 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách					
	VV		30,265*1,70*2		102,901			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1 057,297			
	VV		1057,297*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		1 078,443			
185	M	2837230R	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 90mm	m2	10,037	135,91	1 364,13	
	VV		skladba S4 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách					
	VV		2,05*2,40*2		9,840			
	VV		Součet		9,840			
	VV		9,84*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		10,037			
186	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	105,300	823,91	86 757,72	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S1 - spádové klíny					
	VV		477,198*(0,02+0,370)/2		93,054			
	VV		skladba S3 - spádové klíny					
	VV		30,265*1,70*(0,02+0,370)/2		10,033			
	VV		skladba S4 - spádové klíny					
	VV		2,05*2,40*(0,02+0,04)/2		0,148			
	VV		Součet		103,235			
	VV		103,235*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		105,300			
187	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	475,892	51,75	24 627,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.30					
	VV		skladba P1					
	VV		12,86+52,12+13,80+10,10+8,80+8,80+1,10+13,80-(0,285*1,30*16+1,30*1,30)-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2		93,842			
	VV		skladba P2					
	VV		10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50		100,650			
	VV		skladba P3, P4					
	VV		115,70*2+22,30+5,40+22,30		281,400			
	VV		Součet		475,892			
188	M	28372309	deska EPS 100S pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	485,410	189,76	92 111,40	CS ÚRS 2020 02
	VV		475,892*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		485,410			
189	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	10,080	195,51	1 970,74	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.07					
	VV		izolace nadpraží oken s žaluziemi					
	VV		0,24*(2,25*16+0,75*8)		10,080			
	VV		Součet		10,080			
190	M	63152104	pás tepelné izolační univerzální λ=0,033-0,033-0,035 tl 160mm	m2	10,584	188,61	1 996,25	CS ÚRS 2020 02
	VV		10,08*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		10,584			
191	K	7131311R1	D+M podkladní izolační profil z PUR pěny a PIR izolace pod vstupní dveře a prosklené stěny - 22/O	m	8,200	1 322,59	10 845,24	
	VV		ref. výrobek Purenit 550MD					
	VV		průřez 80x200 mm					
	VV		8,20		8,200			
	VV		Součet		8,200			
192	K	713291122	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	533,569	123,06	65 661,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S2					
	VV		477,198		477,198			
	VV		skladba S3					
	VV		30,265*1,70		51,451			
	VV		skladba S4					
	VV		2,05*2,40		4,920			
	VV		Součet		533,569			
193	M	6285300R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou parotěsnicí	m2	613,604	150,61	92 414,90	
	VV		533,569*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"		613,604			
194	K	713291142	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr	m2	533,569	18,40	9 817,67	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba S2					
	VV		477,198		477,198			
	VV		skladba S3					
	VV		30,265*1,70		51,451			
	VV		skladba S4					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2,05*2,40		4,920			
		VV	Součet		533,569			
195	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	133,392	56,35	7 516,64	CS ÚRS 2020 02
		VV	533,569*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		133,392			
196	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3,000	7 770,78	23 312,34	CS ÚRS 2020 02
D 714			Akustická a protiotřesová opatření				56 359,17	
197	K	714183002	Montáž pohltivých desek na sraz volně stropů	m2	502,490	57,37	28 827,85	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.23.1.30					
		VV	kročejová izolace					
		VV	skladba P7,8					
		VV	115,70*2+22,30+5,40+22,30+16,77+5,59		303,760			
		VV	skladba P9					
		VV	10,02		10,020			
		VV	skladba P10					
		VV	51,48+13,50+10,10+8,8+8,8+10,1+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2		96,360			
		VV	skladba P11					
		VV	10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20		92,350			
		VV	Součet		502,490			
198	M	28376643	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 5,0 kN/m2)	m3	20,502	1 262,79	25 889,72	CS ÚRS 2020 02
		VV	502,490*0,04		20,100			
		VV	Součet		20,100			
		VV	20,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		20,502			
199	K	998714202	Přesun hmot procentní pro akustická a protiotřesová opatření v objektech v do 12 m	%	3,000	547,20	1 641,60	CS ÚRS 2020 02
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				132 083,93	
200	K	725244R3O	D+M zalamovací sprchové dveře pro montáž do výklenku 950x1900 mm, bezpečnostní sklo matné - 8/O	soubor	6,000	12 650,89	75 905,34	
		VV	příloha D.1.23.1.35					
		VV	6,0		6,000			
		VV	Součet		6,000			
201	K	72529141R	M+D sklopné v úhlu 10° koupelnové zrcadlo invalidní 400x600 mm v bílém kovovém rámu - O06	kus	1,000	3 786,64	3 786,64	
		VV	příloha D.1.03.1.35					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
202	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů kruhový - 11/O	soubor	8,000	1 485,47	11 883,76	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.23.1.35					
		VV	8,0		8,000			
		VV	Součet		8,000			
203	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků obdélníkový - 13/O	soubor	4,000	1 640,73	6 562,92	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.23.1.35					
		VV	4,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
204	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 800 mm - 1/O	soubor	1,000	2 727,55	2 727,55	CS ÚRS 2020 02
		VV	příloha D.1.23.1.35					
		VV	1,0		1,000			
		VV	Součet		1,000			
205	K	725291R2O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo v rámu závěsné 300x500 mm - 9/O	soubor	5,000	1 233,46	6 167,30	
		VV	příloha D.1.23.1.35					
		VV	5,0		5,000			
		VV	Součet		5,000			
206	K	725291R4O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš odpadkový objem 3L, nášlapný otevírací mechanismus, vyjímatelný plastový košík s uchem uvnitř - 10/O	soubor	7,000	709,16	4 964,12	
		VV	příloha D.1.23.1.35					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		7,0		7,000			
	vv		Součet		7,000			
207	K	725291R7O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC štětka - 12/O	soubor	8,000	1 149,07	9 192,56	
	vv		přílha D.1.23.1.35					
	vv		8,0		8,000			
	vv		Součet		8,000			
208	K	725291R8O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové háček na oděvy - 15/O	soubor	6,000	476,27	2 857,62	
	vv		přílha D.1.23.1.35					
	vv		6,0		6,000			
	vv		Součet		6,000			
209	K	72529R02O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů vodorovné nastenné madlo se svislou částí dl. 600 mm, v. 740 mm - 2/O	soubor	1,000	2 365,28	2 365,28	
	vv		přílha D.1.23.1.35					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
210	K	72529R03O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů madlo svislé dl 500 mm - 3/O	soubor	1,000	1 114,57	1 114,57	
	vv		přílha D.1.23.1.35					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
211	K	72529R10O	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové koš odpadkový objem 3L, samozavírací mechanismus, vyjímatelný plastový košík s uchem uvnitř - 10/O	soubor	1,000	709,16	709,16	
	vv		přílha D.1.23.1.35					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
212	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	3,000	1 282,37	3 847,11	CS ÚRS 2020 02
D 762			Konstrukce tesařské				86 593,04	
213	K	7629910R1	D+M dřevěný kmen stromu pr. 300 mm včetně napuštění olejovým nátěrem, dole upevněn na zemním vrtu s horní plotnou, nahoře L profil uchycen k betonové konstrukci - 32/T	kpl	1,000	84 070,91	84 070,91	
	vv		dřevěné kmeny tvoří "nohy" stonožky, kterou vytvářejí spojovací lávky, proto jsou osazeny šikmo					
	vv		- borovice nebo jiná dřevina vhodná do venkovního prostředí					
	vv		- odkorněný povrch					
	vv		- dl. 3900 mm - 4ks, 4050mm - 1ks, 4600 mm -1 ks					
	vv		- vrt ref.v. Screw HEX-120 M12 76x800 mm					
	vv		- L profil 50/50/5 mm					
	vv		- včetně upevňovacího a kotvícího materiálu					
	vv		1,0		1,000			
	vv		Součet		1,000			
214	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	3,000	840,71	2 522,13	CS ÚRS 2020 02
D 763			Konstrukce suché výstavby				1 195 560,00	
215	K	76311334R	SDK příčka instalační tl 400 mm zdvojený profil UA 100/40/2 desky 2xH2 12,5 EI 60 55 dB - W1	m2	19,840	2 110,40	41 870,34	
	vv		přílha D.1.23.1.4,5					
	vv		3,10*1,60*4		19,840			
	vv		Součet		19,840			
216	K	76312144R	SDK stěna přesazena tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 15 bez TI 50 kg/m3 EI 30 - W2	m2	5,850	990,22	5 792,79	
	vv		přílha D.1.23.1.30					
	vv		zákryt ZTI a VZT					
	vv		(0,45+0,30)*2,60*3		5,850			
217	K	763121714	SDK stěna přesazena základní penetrační nátěr	m2	25,690	29,90	768,13	CS ÚRS 2020 02
	vv		19,84+5,85		25,690			
	vv		Součet		25,690			
218	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C3	m2	188,460	715,35	134 814,86	CS ÚRS 2020 02
	vv		přílha D.1.23.1.13,14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		100,66+93,19-5,39		188,460			
	VV		Součet		188,460			
219	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD PO REI 30 RED - C5	m2	57,538	726,85	41 821,50	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.13,14					
	VV		30,675*1,70		52,148			
	VV		5,39 "2.21		5,390			
	VV		Součet		57,538			
220	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD - C4	m2	192,900	797,01	153 743,23	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.13,14					
	VV		100,6+92,30		192,900			
	VV		Součet		192,900			
221	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	438,898	29,90	13 123,05	CS ÚRS 2020 02
	VV		193,85+52,148+192,900		438,898			
	VV		Součet		438,898			
222	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	9,600	741,80	7 121,28	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.04					
	VV		2,40*2 "mč. 1.06,14		4,800			
	VV		příloha D.1.23.1.05					
	VV		2,40*2 "mč. 2.06,14		4,800			
	VV		Součet		9,600			
223	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 300x300 mm	kus	2,000	518,69	1 037,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.13,14					
	VV		1,0*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
224	M	59030711	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm</i>	kus	2,000	713,05	1 426,10	CS ÚRS 2020 02
225	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 600x600 mm	kus	4,000	531,34	2 125,36	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.13,14					
	VV		2,0*2		4,000			
	VV		Součet		4,000			
226	M	59030714	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm</i>	kus	4,000	897,06	3 588,24	CS ÚRS 2020 02
227	K	7634112R1	Dělicí zástěny k WC 600x1200, desky s HPL MAX - laminátem tl 10 mm včetně 1 nerezové nohy, povrchová úprava melanin	kpl	32,000	4 734,50	151 504,00	
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		32,0		32,000			
	VV		Součet		32,000			
228	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	192,260	414,03	79 601,41	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.13,14					
	VV		81,40+110,86		192,260			
	VV		Součet		192,260			
229	M	590360R2	<i>panel minerální 600x600 mm s polozapuštěným roštem - C2</i>	m2	201,873	460,03	92 867,64	
	VV		192,26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		201,873			
230	K	763431012	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,72 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	462,800	360,55	166 862,54	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.13,14					
	VV		115,70*2*2		462,800			
	VV		Součet		462,800			
231	M	590360R1	<i>panel akustický 600x1200 mm - C1</i>	m2	485,940	540,54	262 670,01	
	VV		462,8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		485,940			
232	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,000	11 607,38	34 822,14	CS ÚRS 2020 02
D 764			Konstrukce klempířské			452 945,86		
233	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou poplastováním mechanicky kotvené rš přes 800mm	m2	195,588	1 725,12	337 412,77	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			příloha D.1.23.1.36					
			138,30*1,0 "8/K		138,300			
			61,60*0,93 "9/K		57,288			
			Součet		195,588			
234	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 400 mm	m	35,350	690,05	24 393,27	CS ÚRS 2020 02
			příloha D.1.23.1.36					
			1,25*23 "6/K		28,750			
			1,65*4 "7/K		6,600			
			Součet		35,350			
235	K	7642166R1	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 285 mm	m	92,350	589,99	54 485,58	
			příloha D.1.23.1.36					
			2,20*28 "1/K		61,600			
			0,70*22 "2/K		15,400			
			1,45*8 "3/K		11,600			
			0,95*2 "4/K		1,900			
			1,85*1 "5/K		1,850			
			Součet		92,350			
236	K	76460R08K	D+M kulatý chrlič is integrovanou PVC manžetou DN 100, dl. 600 mm včetně vyjímatelné ochranné mřížky - 10/K	kus	2,000	3 220,23	6 440,46	
			příloha D.1.23.1.36					
			2,0		2,000			
			Součet		2,000			
237	K	76460R09K	D+M těsnící manžeta, tvarovka pro prostup hydroizolací z PVC fólie DN 110 - 11/K	kus	6,000	920,06	5 520,36	
			příloha D.1.23.1.36					
			6,0		6,000			
			Součet		6,000			
238	K	76460R10K	D+M prostup pro kabely DN 50, integrovaná manžeta výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm - 12/K	kus	5,000	2 300,16	11 500,80	
			příloha D.1.23.1.36					
			5,0		5,000			
			Součet		5,000			
239	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	4 397,54	13 192,62	CS ÚRS 2020 02
D 766			Konstrukce truhlářské					6 761 436,19
240	K	7661212R1	D+M dělicí mobilní příčky 7000x3050 mm - 31/T	kpl	4,000	420 009,52	1 680 038,08	
			příloha D.1.23.1.33					
			4,0		4,000			
			Součet		4,000			
241	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdíva	m2	32,625	947,57	30 914,47	CS ÚRS 2020 02
			příloha D.1.03.1.31					
			2,25*0,75*10,0 "O06		16,875			
			1,50*0,75*8,0 "O07		9,000			
			2,25*1,50*2,0 "O12		6,750			
			Součet		32,625			
242	M	6111RO06	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 2250x750 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O06	kus	10,000	25 647,66	256 476,60	
			- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídatné těsnění v zasklívací drážce					
			- integrované speciální reflexní izolační můstky					
			- stavební hl. křídla 78 mm					
			- celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			- minimálně 2 bezpečnostní body					
			- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			- standartní závěsy					
			- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			- barva bílá RAL 9016					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - členění dvěma sloupky na tři části					
			VV - součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 3 kusy					
			VV 10,0		10,000			
			VV Součet		10,000			
243	M	6111RO07	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné dvojkřílové 1500x750 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O07	kus	8,000	13 784,56	110 276,48	
			VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídatné těsnění v zasklívací drážce					
			VV - integrované speciální reflexní izolační můstky					
			VV - stavební hl. křídla 78 mm					
			VV - celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			VV - minimálně 2 bezpečnostní body					
			VV - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			VV - standardní závěsy					
			VV - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			VV - barva bílá RAL 9016					
			VV - členění středním poutcem					
			VV - součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
			VV 8,0		8,000			
			VV Součet		8,000			
244	M	6111RO12	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné izolační trojkřídlové 2250x1500 mm, trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O12	kus	2,000	30 226,28	60 452,56	
			VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídatné těsnění v zasklívací drážce					
			VV - integrované speciální reflexní izolační můstky					
			VV - stavební hl. křídla 78 mm					
			VV - celooobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			VV - minimálně 2 bezpečnostní body					
			VV - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			VV - standardní závěsy					
			VV - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			VV - barva bílá RAL 9016					
			VV - otevíravé sklopné a pevné, trojkřídlové se skloupkem a poutcem vlevo uprostřed, vrchní a pravá část otevíravá					
			VV - spodní levá část pevná					
			VV - součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
			VV 2,0		2,000			
			VV Součet		2,000			
245	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	141,382	996,82	140 932,41	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.03.1.31					
			VV 2,25*2,50*8,0 "O01		45,000			
			VV 2,25*2,50*8,0 "O02		45,000			
			VV 0,75*2,50*8,0 "O03		15,000			
			VV 0,75*2,10*8,0 "O04		12,600			
			VV 0,75*2,10*6,0 "O05		9,450			
			VV 1,90*2,50*1 "O11		4,750			
			VV 1,0*1,70*2,0 "O13		3,400			
			VV 0,84*1,84*4,0 "O17		6,182			
			VV Součet		141,382			
246	M	6111RO04	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné trojkřílové 750x2100 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O04	kus	8,000	14 424,18	115 393,44	
			VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídatné těsnění v zasklívací drážce					
			VV - integrované speciální reflexní izolační můstky					
			VV - stavební hl. křídla 78 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			- celobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			- minimálně 2 bezpečnostní body					
			- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			- standardní závěsy					
			- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			- barva bílá RAL 9016					
			- členění dvěma poutci					
			- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			8,0					
			Součet					
					8,000			
					8,000			
247	M	6111RO05	<i>okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklpné trojkřílové 750x2100 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O05</i>	kus	6,000	14 711,08	88 266,48	
			- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídatné těsnění v zasklívací drážce					
			- integrované speciální reflexní izolační můstky					
			- stavební hl. křídla 78 mm					
			- celobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			- minimálně 2 bezpečnostní body					
			- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			- standardní závěsy					
			- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			- barva bílá RAL 9016					
			- čls potcem dole vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní část pevná					
			- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			- dvoupákový ovladač sklopného křídla 1 kus					
			- spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
			6,0					
			Součet					
					6,000			
					6,000			
248	M	6111RO03	<i>okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklpné trojkřílové 750x2500 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O03</i>	kus	8,000	15 856,06	126 848,48	
			- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídatné těsnění v zasklívací drážce					
			- integrované speciální reflexní izolační můstky					
			- stavební hl. křídla 78 mm					
			- celobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			- minimálně 2 bezpečnostní body					
			- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			- standardní závěsy					
			- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			- barva bílá RAL 9016					
			- s potcem dole vrchní část otevíravá a sklápěcí, spodní část pevná					
			- součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			- dvoupákový ovladač sklopného křídla 3 kusy					
			- spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
			8,0					
			Součet					
					8,000			
					8,000			
249	M	6111RO01	<i>okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklpné čtyřkřílové 2250x2500 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O01</i>	kus	8,000	34 861,50	278 892,00	
			- lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídatné těsnění v zasklívací drážce					
			- integrované speciální reflexní izolační můstky					
			- stavební hl. křídla 78 mm					
			- celobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			- minimálně 2 bezpečnostní body					
			- kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			- standardní závěsy					
			- v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			- barva bílá RAL 9016					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - se sloupkem a poutcem dole, vrchní část otevírává a sklápěcí, spodní část pevná					
			VV - součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
			VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
			VV 8,0		8,000			
			VV Součet		8,000			
250	M	6111RO02	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné čtyřkřířilové 2250x2500 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O02	kus	8,000	34 861,50	278 892,00	
			VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
			VV - integrované speciální reflexní izolační můstky					
			VV - stavební hl. křídla 78 mm					
			VV - celobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			VV - minimálně 2 bezpečnostní body					
			VV - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			VV - standartní závěsy					
			VV - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			VV - barva bílá RAL 9016					
			VV - se sloupkem a poutcem dole, vrchní část otevírává a sklápěcí, spodní část pevná					
			VV - součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
			VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
			VV 8,0		8,000			
			VV Součet		8,000			
251	M	6111RO011	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné čtyřkřířilové 1900x2500 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O11	kus	1,000	34 240,31	34 240,31	
			VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
			VV - integrované speciální reflexní izolační můstky					
			VV - stavební hl. křídla 78 mm					
			VV - celobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			VV - minimálně 2 bezpečnostní body					
			VV - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			VV - standartní závěsy					
			VV - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			VV - barva bílá RAL 9016					
			VV - se sloupkem a poutcem dole, vrchní část otevírává a sklápěcí, spodní část pevná					
			VV - součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 2 kusy					
			VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
			VV 1,0		1,000			
			VV Součet		1,000			
252	M	6111RO013	okno dřevěné EUROOKNO z profilu IV78 otevíravé/sklopné dvojkřířilové 1000x1700 mm izolační trojsklo Ug menší 0,70W/m2K, zvuk. neprůzvučnost Rw=32dB,- O13	kus	2,000	15 167,76	30 335,52	
			VV - lepený dřevěný hranol, mat. borovice, přídavné těsnění v zasklívací drážce					
			VV - integrované speciální reflexní izolační můstky					
			VV - stavební hl. křídla 78 mm					
			VV - celobvodové kování s povrchovou vrstvou pozinkování					
			VV - minimálně 2 bezpečnostní body					
			VV - kliky čtyřpolohové s bezpečnostním mechanismem					
			VV - standartní závěsy					
			VV - v rámu provedena úprava pro kabely bezp. čidel EZS					
			VV - barva bílá RAL 9016					
			VV - s poutcem dole, vrchní část otevírává a sklápěcí, spodní část pevná					
			VV - součástí dodávky dva magnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
			VV - dvoupákový ovladač sklopného křídla 1 kus					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - spodní část bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
			VV 2,0		2,000			
			VV Součet		2,000			
253	M	6111RO017	okno dřevěné vnitřní podávací 840x1840 mm zaskleno dvojsklem bez požadavku na tepelnou izolaci, - O17	kus	4,000	45 892,83	183 571,32	
			VV - standardní závěsy					
			VV - barva bílá RAL 9016					
			VV -dolní křídlo manuálně výsuvné nahoru se zajištěním v horní poloze, horní křídlo pevné zasklení					
			VV - součástí dodávky kování pro udržení výsuvného křídla v horní poloze					
			VV 4,0		4,000			
			VV Součet		4,000			
254	K	76662RO14	D+M dřevěné okno kruhové, bílé RAL 9016, pevné pr. 800 mm - O14	kus	23,000	14 824,26	340 957,98	
			VV - zasklení bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
			VV 23,0		23,000			
			VV Součet		23,000			
255	K	76662RO15	D+M dřevěné okno kruhové, bílé RAL 9016, pevné pr. 1060 mm - O15	kus	4,000	19 606,88	78 427,52	
			VV - zasklení bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. connex)					
			VV 4,0		4,000			
			VV Součet		4,000			
256	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	24,000	559,32	13 423,68	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.23.1.33					
			VV 7,0 "8		7,000			
			VV 17,0 "9		17,000			
			VV Součet		24,000			
257	M	61162R07	dveře vnitřní dřevěné plné 1křídle 700x1970mm otočné - 8	kus	7,000	10 157,51	71 102,57	
			VV - ZV WC typ 9, SG					
			VV -KL/KL WC typ 9					
			VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
			VV 7,0		7,000			
			VV Součet		7,000			
258	M	61162R08	dveře vnitřní dřevěné plné 1křídle 800x1970mm otočné - 9	kus	17,000	4 005,05	68 085,85	
			VV - ZV WC typ 8, SG					
			VV - KL/KL WC typ 8					
			VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
			VV 17,0		17,000			
			VV Součet		17,000			
259	K	766660172	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	13,000	492,15	6 397,95	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.23.1.33					
			VV 13,0 "6		13,000			
			VV Součet		13,000			
260	M	61162R03	dveře vnitřní dřevěné plné 1křídle 900x1970mm otočné - 6	kus	13,000	3 801,99	49 425,87	
			VV - invalidní madlo v. 800 mm - dv. do mč. 1.19					
			VV - ZV typ8, SG					
			VV - KL/KL typ 8 SD					
			VV - dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
			VV 13,0		13,000			
			VV Součet		13,000			
261	K	766660181	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	5,000	809,66	4 048,30	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.02.1.33					
			VV 5,0 "3		5,000			
			VV Součet		5,000			
262	M	61162R04	dveře vnitřní hladké dřevěné plné 1křídle 800x1970mm, PO EW15DP3-C3 - 3	kus	5,000	11 920,59	59 602,95	
			VV - ocelová zárubeň na celou šířku zdíva					
			VV - samozavírač C3					
			VV - stavěč dveřního křídla					
			VV - ZV typ 7, SG					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV - KL/KL typ 7 SD					
			VV - dodávka včetně kotevnic, montážních a lemovacích prvků					
			VV 5,0		5,000			
			VV Součet		5,000			
263	K	766660182	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně	kus	17,000	865,60	14 715,20	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.23.1.33					
			VV 12,0 "4		12,000			
			VV 4,0 "7		4,000			
			VV 1,0 "10		1,000			
			VV Součet		17,000			
264	M	61162R05	dveře vnitřní hladké dřevěné plné 1křídle 900x1970mm, PO EI15DP3-C3 - 4	kus	12,000	12 441,86	149 302,32	
			VV - samozavírač C3					
			VV - ZV typ 7, SG					
			VV - KL/KL typ 7 SD					
			VV 12,0		12,000			
			VV Součet		12,000			
265	M	61162R11	dveře vnitřní plné dřevěné plné 1křídle 900x1970mm, PO EI15DP3-C3 - 7	kus	4,000	14 005,68	56 022,72	
			VV - samozavírač C3					
			VV - ZV typ 12, SG					
			VV - KL/KL typ 12					
			VV 4,0		4,000			
			VV Součet		4,000			
266	M	61162R12	dveře vnitřní plné dřevěné plné 1křídle 1100x1970mm, PO EW15DP3-C3 - 10	kus	1,000	13 947,03	13 947,03	
			VV - samozavírač C3					
			VV - ZV typ 7, SG					
			VV - KL/KL typ 7					
			VV 1,0		1,000			
			VV Součet		1,000			
267	K	766660183	Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových požárních do obložkové zárubně	kus	1,000	2 125,35	2 125,35	CS ÚRS 2020 02
			VV příloha D.1.23.1.33					
			VV 1,0 "5		1,000			
			VV Součet		1,000			
268	M	61161R12	dveře dřevěné dvojkřídle 1250x1970 mm, materiál vysokotlaký materiál HPL, PO EI15DP1-C3, dvoukřídlové otočné - 5	kus	1,000	44 816,35	44 816,35	
			VV - dveřní křídla š. 900 a 350 mm					
			VV - vodorovné madlo v. 800 mm					
			VV - prosklení drátosklo s PO					
			VV - samozavírač					
			VV - kování klika-klika, stavěč dveřního křídla na obě křídla KL/KL typ 5 MA, 2xSD					
			VV - ZV typ 5, SG					
			VV 1,0		1,000			
			VV Součet		1,000			
269	K	7666607R1	D+M systém generální klíče - vložka a zámek FAB 300/FAB 300 HD + 2x klíč	kus	64,000	460,68	29 483,52	
			VV • vhodné pro projekty středního rozsahu					
			VV • zabezpečení splňující požadavky					
			VV pro RC3 podle ENV 1627 nebo NBÚ SS4=2					
			VV • systémy chráněné patentem					
			VV • vysoká úroveň zabezpečení					
			VV • rozsáhlá rozměrová řada					
			VV • široká nabídka kompatibilních zámků					
			VV • výroba klíče ve výrobním závodě pouze se					
			VV souhlasem majitele					
			VV POPIS VÝROBKU					
			VV • 5ti stavítkový uzamykací systém					
			VV • přídatné kódování na hřbetu klíče-HD					
			VV • mosazné těleso i bubínek					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		• spojka úplná nesymetrická					
	VV		PROVEDENÍ VÝROBKU					
	VV		• standardní povrchová úprava:					
	VV		– leštěná mosaz					
	VV		– saténový nikl, označení „Ns“					
	VV		• oboustranná cylindrická vložka:					
	VV		– označení „FAB 300 nebo FAB 300HD“					
	VV		– rozměr od 30+30 mm					
	VV		– další rozměry odstupňované po 5mm					
	VV		• knoflíková cylindrická vložka:					
	VV		– označení „FAB 302 nebo FAB 302HD“					
	VV		– rozměr od 30+30mm					
	VV		– standardně osazen černý plastový					
	VV		knoflík 22mm					
	VV		– další rozměry odstupňované po 5 mm					
	VV		• jednostranná cylindrická vložka:					
	VV		– označení „FAB 301 nebo FAB 301HD“					
	VV		– standardně nastavitelný zub „Z“					
	VV		– rozměr od 30+10mm					
	VV		– další rozměry odstupňované po 5mm					
	VV		RC3, dle ČSN EN 1627:2012 Uzamykací systém typ 2. Dle požadavku NBÚ					
	VV		v souladu se zákonem č. 412/205 sb.					
	VV		Systémy generálního klíče FAB 300/ FAB 300 HD					
	VV		Klíč FAB 300HD					
	VV		DOPLŇKY					
	VV		• zvýšená ochrana proti odvtřetí,					
	VV		označení „B“					
	VV		• prostupová spojka, označení „P“					
	VV		• ozubené kolo, 10 zubů („K10“)					
	VV		nebo 12 zubů („K12“)					
	VV		• malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“					
	VV		nebo velký kovový knoflík 30 mm,					
	VV		označení „VK“					
	VV		KLÍČE					
	VV		• polotovary klíče FAB 300HD					
	VV		• patentově chráněná technologie					
	VV		64,0		64,000			
	VV		Součet		64,000			
270	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	37,000	759,05	28 084,85	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		7,0 "8		7,000			
	VV		17,0 "9		17,000			
	VV		13,0 "6		13,000			
	VV		Součet		37,000			
271	M	61182258	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 600,700,800,900x1970mm tl 60-170mm dub,buk	kus	37,000	2 820,00	104 340,00	CS ÚRS 2020 02
272	K	766682211	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	22,000	990,69	21 795,18	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.02.1.33					
	VV		5,0 "3		5,000			
	VV		12,0 "4		12,000			
	VV		4,0 "7		4,000			
	VV		1,0 "10		1,000			
	VV		Součet		22,000			
273	M	SPL.0011665.UR S	zárubeň protipožární pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm, dub, buk, mahagon	kus	22,000	4 440,36	97 687,92	
274	K	766682222	Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře dvoukřídlové tl stěny do 350 mm	kus	1,000	1 062,67	1 062,67	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		1,0 "5		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		1,000			
275	M	61182281	záruka obložková protipožární pro dveře 2křídle 1250,1450x1970mm tl 180-250mm dub,buk	kus	1,000	5 360,53	5 360,53	CS ÚRS 2020 02
276	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	24,000	242,58	5 821,92	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		22,0 "2/T		22,000			
	VV		2,0 "4/T		2,000			
	VV		Součet		24,000			
277	M	607941R2	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 2/T	m	16,500	384,71	6 347,72	
	VV		0,75*22		16,500			
	VV		Součet		16,500			
278	M	607941R4	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 4/T	m	2,000	384,71	769,42	
	VV		1,0*2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
279	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	24,000	26,53	636,72	CS ÚRS 2020 02
280	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	8,000	242,58	1 940,64	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		8,0 "3/T		8,000			
	VV		Součet		8,000			
281	M	607941R3	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 3/T	m	12,000	384,71	4 616,52	
	VV		1,50*8		12,000			
	VV		Součet		12,000			
282	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	12,000	26,53	318,36	CS ÚRS 2020 02
283	K	766694124	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 2,6 m	kus	13,000	242,58	3 153,54	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		12,0 "1/T		12,000			
	VV		1,0 "5/T		1,000			
	VV		Součet		13,000			
284	M	607941R1	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 1/T	m	27,000	384,71	10 387,17	
	VV		2,25*12		27,000			
	VV		Součet		27,000			
285	M	607941R5	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 310x1000mm - 5/T	m	1,900	384,71	730,95	
	VV		1,90*1		1,900			
	VV		Součet		1,900			
286	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	13,000	26,53	344,89	CS ÚRS 2020 02
287	K	76669R6T	D+M koupelnové věšáky dl. 1680 mm pro 14 dětí v barevném provedení s dřevěnou plastikou vč. plastových rámečků pro zasunutí značek - 6/T	kus	8,000	29 268,41	234 147,28	
288	K	766821R11T	D+M šatní skříňky půlené do zaměstnanecké šatny 400x600x1900 mm s klasickými šatními zámky, materiál laminová dřevotřísková s povrchem melamin, s ABS plastovými hranami - 11/T	kus	16,000	7 235,16	115 762,56	
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		16,0 "11/T		16,000			
	VV		Součet		16,000			
289	K	76682R07T	D+M skříňové vestavěné s nosnou hliníkovou konstrukcí na lůžkoviny 4000x600x2000 mm, materiál laminovaná dřevotřísková - 7/T	kus	4,000	20 939,52	83 758,08	
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
290	K	76682R08T	D+M skříňové vestavěné s nosnou hliníkovou konstrukcí na skladování lehátek 4000x600x2000 mm, materiál laminovaná dřevotřísková - 8/T	kus	4,000	18 701,46	74 805,84	
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
291	K	76682R09T	D+M dřevotřísková dětská lavice 950x2000x260 mm - 9/T	kus	4,000	94 352,63	377 410,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	příloha D.1.23.1.33					
		VV	4,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
292	K	76682R10T	D+M šatní skříň dětská 250x500x1300 mm dřevotřísková s lavičkou a policí na obuv - 10/T	kus	112,000	4 786,64	536 103,68	
		VV	příloha D.1.23.1.33					
		VV	112,0		112,000			
		VV	Součet		112,000			
293	K	76689R14T	D+M kryt tělesa UT 5600x300x520mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 14/T	kus	8,000	21 897,54	175 180,32	
		VV	příloha D.1.23.1.33					
		VV	parapet a kryt provést z jednoho kusu					
		VV	8,0		8,000			
		VV	Součet		8,000			
294	K	76689R15T	D+M kryt tělesa UT 1210x200x620mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 15/T	kus	2,000	5 557,19	11 114,38	
		VV	příloha D.1.23.1.33					
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
295	K	76689R16T	D+M kryt tělesa UT 1100x300x620mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 16/T	kus	4,000	5 115,56	20 462,24	
		VV	příloha D.1.23.1.33					
		VV	4,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
296	K	76689R17T	D+M kryt tělesa UT 1300x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 17/T	kus	4,000	6 044,82	24 179,28	
		VV	příloha D.1.23.1.33					
		VV	4,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
297	K	76689R18T	D+M kryt tělesa UT 1300x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 18/T	kus	4,000	6 044,82	24 179,28	
		VV	příloha D.1.23.1.33					
		VV	4,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
298	K	76689R19T	D+M kryt tělesa UT 2420x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 19/T	kus	3,000	11 253,54	33 760,62	
		VV	příloha D.1.23.1.33					
		VV	3,0		3,000			
		VV	Součet		3,000			
299	K	76689R20T	D+M kryt tělesa UT 700x300x1120mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 20/T	kus	4,000	3 254,73	13 018,92	
		VV	příloha D.1.23.1.33					
		VV	4,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
300	K	76689R21T	D+M kryt tělesa UT 700x300x1120mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 21/T	kus	4,000	11 253,54	45 014,16	
		VV	příloha D.1.23.1.33					
		VV	4,0		4,000			
		VV	Součet		4,000			
301	K	76689R22T	D+M kryt tělesa UT 2420x300x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 22/T	kus	2,000	11 253,54	22 507,08	
		VV	příloha D.1.23.1.33					
		VV	2,0		2,000			
		VV	Součet		2,000			
302	K	76689R23T	D+M kryt tělesa UT 1210x200x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 23/T	kus	2,000	5 557,19	11 114,38	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
303	K	76689R24T	D+M kryt tělesa UT 1300x200x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 24/T	kus	1,000	5 970,07	5 970,07	
304	K	76689R25T	D+M kryt tělesa UT 1300x200x820mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 25/T	kus	1,000	5 970,07	5 970,07	
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
305	K	76689R26T	D+M kryt tělesa UT 1485x300x720mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 26/T	kus	3,000	6 882,08	20 646,24	
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		3,0		3,000			
	VV		Součet		3,000			
306	K	76689R27T	D+M kryt tělesa UT 1400x300x720mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 27/T	kus	1,000	6 492,21	6 492,21	
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
307	K	76689R28T	D+M kryt tělesa UT 1300x300x720mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 28/T	kus	1,000	6 044,82	6 044,82	
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
308	K	76689R29T	D+M kryt tělesa UT 1300x300x720mm, laminovaná dřevotříska, v horní desce mřížka dřevěný masiv, v přední stěně u horní hrany větrací mezera - 29/T	kus	1,000	6 044,82	6 044,82	
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
309	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3,000	65 645,01	196 935,03	CS ÚRS 2020 02
D	767	Konstrukce zámečnické					1 516 177,99	
310	K	76716R01Z	D+M ocelové zábradlí vč. dřevěného madla kotvicích prvků a nátěru světle šedou barvou RAL 7035 - 1/Z	kpl	1,000	57 504,04	57 504,04	
	VV		příloha D.1.23.1.34					
	VV		celk. hm. 148,32kg					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
311	K	76716R02Z	D+M ocelové zábradlí vč. dřevěného madla kotvicích prvků a nátěru světle šedou barvou RAL 7035 - 2/Z	kpl	1,000	57 504,04	57 504,04	
	VV		příloha D.1.23.1.34					
	VV		celk. hm. 148,32kg					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
312	K	76716R03Z	D+M ocelové zábradlí vč. dřevěného madla kotvicích prvků a nátěru světle šedou barvou RAL 7035 - 3/Z	kpl	1,000	115 008,08	115 008,08	
	VV		příloha D.1.23.1.34					
	VV		celk. hm. 297,13kg					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
313	K	76716R04Z	D+M systémový stěnový žebřík hliníkový dl. 3,64 m k výlezu na střechu vč. závěsných háků, kotevních prvků, materiál eloxovaný hliník - 4/Z	kpl	2,000	14 376,01	28 752,02	
	VV		příloha D.1.23.1.34					
	VV		š. 500 mm					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
314	K	76716R05Z	D+M nástěnný držák tvaru U, nastavitelný, pozinkovaná ocel, 3 ks/1 žebřík - 5/Z	kpl	6,000	1 725,12	10 350,72	
	VV		příloha D.1.23.1.34					
	VV		6,0		6,000			
	VV		Součet		6,000			
315	K	76716R06Z	D+M ocelová nosná příčka WC - 6/Z	kpl	4,000	28 752,02	115 008,08	
	VV		příloha D.1.23.1.34					
	VV		celková hm. 116,86 kg					
	VV		4,0		4,000			
	VV		Součet		4,000			
316	K	76716R07Z	D+M pomocná madla pro výstup na střechu dl. 1770 mm, užitná 1200 mm, profil 60x25 mm včetně kotevní patky 120x1200 mm a kotevních prvků a povrchové úpravy - 7/Z	kpl	2,000	4 600,32	9 200,64	
	VV		příloha D.1.23.1.34					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
317	K	76716R08Z	D+M oboustranný ocelový žebřík s madly a plošinou 1200x520x800/1500 mm, žárově pozinkováno včetně kotevních prvků - 8/Z	kpl	2,000	28 752,02	57 504,04	
	VV		příloha D.1.23.1.34					
	VV		celk. hm. 65kg					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
318	K	7673RO016	D+M střešní světlík 1000x2200 mm do CHÚC typu včetně kolmé Fe/Zn světlíkové manžety v. 500 mm, peo větrání a výstup na střechu - O16	kpl	2,000	91 373,92	182 747,84	
	VV		příloha D.1.23.1.31					
	VV		horní vrstva dvouvrstvá PET-G kopule, spodní vrstva PC deska tl. 25 mm čirá					
	VV		hliníkový rám AAG					
	VV		součástí dodávky					
	VV		AAG požární světlíková manžeta s izolací, lakovaná ocel v. 500 mm					
	VV		otevřáč světlíku BF mechanismus, konzole 2.2, motor SG8OT, úhel otevření 105°, doba otevření 60s, ovládací centrála					
	VV		RWZ4d					
	VV		optické kouřové čidlo, tlačítko k otevření větrání a nouzové požární tlačítko s indikací					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
319	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón - 1/O	m2	5,310	511,79	2 717,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.03.1.35					
	VV		1,80*1,0 "5/O		1,800			
	VV		1,80*1,95 "6/O		3,510			
	VV		Součet		5,310			
320	M	697520R1	čistící zóna na hrubé nečistoty z Al profilů s gumovým páskem ve tvaru pilky - 5/O	m2	1,800	5 395,49	9 711,88	
	VV		příloha D.1.23.1.35					
	VV		1,80*1,0		1,800			
	VV		Součet		1,800			
321	M	697520R2	čistící zóna na jemné nečistoty z Al profilů s textilní rohoží Shatwell, hliníkové profily jsou spojeny pružným ohebným profilem - 6/O	m2	3,510	4 675,71	16 411,74	
	VV		příloha D.1.23.1.35					
	VV		1,80*1,95		3,510			
	VV		Součet		3,510			
322	K	767640RD1	D+M vnější dveře s prosklenou stěnou 5000x2400 mm, dvoukřídlové, otočné, aktivní křídlo pravé, zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie - D1	kus	1,000	150 990,28	150 990,28	
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		rám Al bílý s přerušeným tepelným mostem RAL 9016					
	VV		výplň křídla plná bílá RAL 9016					
	VV		hliníkový 5-komorový systém, součinitel prostupu tepla celé stěny U/D menší jak 120W/m2K, zvuková neprůzvučnost min. R/W=27dB					
	VV		neprůhledné plné parapetní výplně					
	VV		vodorovné madlo					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dva megnetické závrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm, s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5m					
	VV		bez prahu					
	VV		dodávka vč. kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
323	K	767640RD2	D+M vnitřní dveře s prosklenou stěnou 5780x2400 mm, dvoukřídlové, otočné, aktivní křídlo pravé, zasklení čiré izolační dvojsklo, bezpečnostní fólie - D2	kus	1,000	172 469,19	172 469,19	
	VV		příloha D.1.23.1.33					
	VV		rám Al bílý RAL 9016					
	VV		neprůhledné plné parapetní výplně					
	VV		vodorovné madlo					
	VV		bez prahu					
	VV		dodávka vč. kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
324	K	76764RD03	D+M vnější vstupní dveře jednokřídlové 1040x2400 mm, otočné, křídlo levé, prosklené - D3	kpl	1,000	168 365,12	168 365,12	
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		- bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 9016					
	VV		- zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické zavrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5 mmechanická zástrč km pas					
	VV		hliníkový 5-komorový systém, součinitel prostupu tepla celé stěny U/D menší jak 120W/m2K, zvuková neprůzvučnost min. R/W=27dB					
	VV		- hliníkový práh					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		kování:					
	VV		protipožární mechanický zadlabávací zámek paníkový úzký a elektromagnetický pohon ovládaný PO čidlem					
	VV		otevření pro přívod vzduchu do CHÚC při požáru					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
325	K	76764RD04	D+M vnější vstupní dveře jednokřídlové 1040x2400 mm, otočné, křídlo pravé, prosklené - D4	kpl	1,000	168 365,12	168 365,12	
	VV		příloha D.1.03.1.33					
	VV		- bílý hliníkový rám s přerušeným tepelným mostem, RAL 9016					
	VV		- zasklení čiré izolační trojsklo, bezpečnostní fólie, polep výplň křídla plná bílá RAL 9016					
	VV		- součástí dodávky dva magnetické zavrtné čtyřdrátové kontakty EZS do kovu pr. 19 mm s prac. mezerou 18 mm a kabelem dl. 0,5 mmechanická zástrč km pas					
	VV		hliníkový 5-komorový systém, součinitel prostupu tepla celé stěny U/D menší jak 120W/m2K, zvuková neprůzvučnost min. R/W=27dB					
	VV		- hliníkový práh					
	VV		- dodávka včetně kotevních, montážních a lemovacích prvků					
	VV		kování:					
	VV		protipožární mechanický zadlabávací zámek paníkový úzký a elektromagnetický pohon ovládaný PO čidlem					
	VV		otevření pro přívod vzduchu do CHÚC při požáru					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
326	K	7678101R1	D+M dvířka z ocelového plechu komaxit v ocelovém rámu 300x300 mm - 19/Oa	kus	18,000	805,06	14 491,08	
	VV		příloha D.1.23.1.35					
	VV		10,0 "čistící kusy ZTI		10,000			
	VV		8,0 " na ventily vody do zdíva		8,000			
	VV		Součet		18,000			
327	K	7678811R1	D+M certifikovaný záchytný systém proti pádu z výšky a do hloubky, lano+kotevní prvky, revize	kpl	1,000	86 382,57	86 382,57	
328	K	767893115	Montáž stříšek nad vstupy kotvených pomocí závěsů rovných, výplň skleněná šířky do 1,50 m	kus	2,000	4 600,32	9 200,64	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.23.1.35					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		2,000			
329	M	28315R9O	prosklená stříška nad vstupem na kovové konstrukci 1500x1200 mm - 19/O	kus	2,000	19 666,38	39 332,76	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
330	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,000	14 720,17	44 160,51	CS ÚRS 2020 02
D 771			Podlahy z dlaždic	774 916,60				
331	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	450,900	17,25	7 778,03	CS ÚRS 2020 02
332	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	450,900	57,50	25 926,75	CS ÚRS 2020 02
333	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	450,900	368,03	165 944,73	CS ÚRS 2020 02
334	K	77115101R	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 tl do 30 mm (ref.v. Poriment)	m2	27,538	471,53	12 984,99	
	VV		skladba P12					
	VV		(0,29*1,20*20+1,20*2,50)*2+(1,30*0,285*16+1,30*1,30)		27,538			
	VV		Součet		27,538			
335	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	68,800	402,53	27 694,06	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.04,05					
	VV		1,20*20*2		48,000			
	VV		1,30*16		20,800			
	VV		Součet		68,800			
336	M	597614R1	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2</i>	m2	21,833	154,44	3 371,89	
	VV		příloha D.1.02.1.04,05					
	VV		1,20*0,29*20*2		13,920			
	VV		1,30*0,285*16		5,928			
	VV		Součet		19,848			
	VV		19,848*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		21,833			
337	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	20,800	345,02	7 176,42	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.04,05					
	VV		1,30*16		20,800			
	VV		Součet		20,800			
338	K	771274242	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	48,000	368,03	17 665,44	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.04,05					
	VV		1,20*20*2		48,000			
	VV		Součet		48,000			
339	M	597614R1	<i>dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2</i>	m2	12,936	154,44	1 997,84	
	VV		příloha D.1.02.1.04,05					
	VV		1,20*0,18*20*2		8,640			
	VV		1,30*0,15*16		3,120			
	VV		Součet		11,760			
	VV		11,76*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		12,936			
340	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	200,715	172,51	34 625,34	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.04					
	VV		1.NP - skladba P1					
	VV		(5,78+1,975*2)-0,80 "mč. 1.01		8,930			
	VV		(3,35+0,48+4,405+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+2,915+3,285+5,45+1,30)		37,950			
	VV		-0,90*8-0,80 "mč. 1.02		-8,000			
	VV		(1,5*2+2,50)-0,90*2 "mč. 1.05		3,700			
	VV		(2,40+4,20)*2-0,90 "mč. 1.06		12,300			
	VV		(2,10+4,20)*2-0,90 "mč. 1.07		11,700			
	VV		(2,10+4,20)*2-0,90 "mč. 1.13		11,700			
	VV		(2,40+4,20)*2-0,90 "mč. 1.14		12,300			
	VV		(1,5*2+2,50)-0,90 "mč. 1.15		4,600			
	VV		2.NP - skladba P10					
	VV		5,64+2,88+7,335+2,05+4,405+0,48+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+1,50+2,63+0,25		43,935			
	VV		-0,90*6-0,80 "mč. 2.02		-6,200			
	VV		(1,5*2+2,50)-0,90*2 "mč. 2.05		3,700			
	VV		(2,40+4,20)*2-0,90 "mč. 2.06		12,300			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,10+4,20)*2-0,90 "mč. 2.07		11,700			
	VV		(2,10+4,20)*2-0,90 "mč. 2.13		11,700			
	VV		(2,40+4,20)*2-0,90 "mč. 2.14		12,300			
	VV		(1,50*2+2,50)-0,90*2 "mč. 2.15		3,700			
	VV		skladba P12					
	VV		(1,20*2+2,50)*2+1,30*2		12,400			
	VV		Součet		200,715			
341	M	597612R1	sokl keramický v. 100 mm	kus	669,050	80,51	53 865,22	
	VV		200,715/0,33		608,227			
	VV		Součet		608,227			
	VV		608,227*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		669,050			
342	K	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	16,160	172,51	2 787,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba P12					
	VV		0,290*20*2+0,285*16		16,160			
	VV		Součet		16,160			
343	M	597612R1	sokl keramický v. 100 mm	kus	53,867	80,51	4 336,83	
	VV		16,16/0,33		48,970			
	VV		Součet		48,970			
	VV		48,97*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		53,867			
344	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných tepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	419,220	690,05	289 282,76	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.30					
	VV		skladba P1					
	VV		12,86+52,12+13,80+10,10+8,80+8,80+10,10+13,80-(0,29*1,20*20+1,20*2,50)*2		110,460			
	VV		skladba P2					
	VV		10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50		100,650			
	VV		skladba P9					
	VV		10,02		10,020			
	VV		skladba P10					
	VV		51,48+13,50+10,10+8,8+8,8+10,1+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2		96,360			
	VV		skladba P11					
	VV		10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20		92,350			
	VV		Skladba P12					
	VV		2,50*1,20*2+1,3*1,3*2		9,380			
	VV		Součet		419,220			
345	M	597614R1	dlažba keramická slinutá protiskluzná R9 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	237,820	154,44	36 728,92	
	VV		skladba P1					
	VV		12,86+52,12+13,80+10,10+8,80+8,80+10,10+13,80-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2		110,460			
	VV		skladba P10					
	VV		51,48+13,50+10,10+8,8+8,8+10,1+13,50-(0,29*1,20*20+2,50*1,20)*2		96,360			
	VV		Skladba P12					
	VV		2,50*1,20*2+1,3*1,3*2		9,380			
	VV		Součet		216,200			
	VV		216,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		237,820			
346	M	597614R2	dlažba keramická slinutá protiskluzná R10 do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	214,942	262,18	56 353,49	
	VV		skladba P2					
	VV		10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,40+2,60+1,40+5,0+3,50-(1,30*0,285*16+1,30*1,30)		93,032			
	VV		skladba P9					
	VV		10,02		10,020			
	VV		skladba P11					
	VV		10,80+15,0+15,10+3,20+1,35+3,20+15,0+15,10+9,4+4,20		92,350			
	VV		Součet		195,402			
	VV		195,402*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		214,942			
347	K	771577111	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	41,580	92,01	3 825,78	CS ÚRS 2020 02
	VV		skladba P2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,20+1,35+3,20+2,60+1,40+5,0+3,50		20,250			
	VV		skladba P11					
	VV		3,20+1,35+3,20+4,20		11,950			
	VV		Skladba P12					
	VV		2,50*1,20*2+1,3*1,3*2		9,380			
	VV		Součet		41,580			
348	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	3,000	7 523,45	22 570,35	CS ÚRS 2020 02
D 776			Podlahy povlakové				584 637,42	
349	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	521,640	9,20	4 799,09	CS ÚRS 2020 02
	VV		409,44 "vinyl		409,440			
	VV		112,20 "koberec		112,200			
	VV		Součet		521,640			
350	K	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	472,460	71,77	33 908,45	CS ÚRS 2020 02
	VV		409,44-49,18 "vinyl		360,260			
	VV		112,20 "koberec		112,200			
	VV		Součet		472,460			
351	K	77614111R	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 35 mm	m2	49,180	178,84	8 795,35	
	VV		D.1.23.1.30					
	VV		spojovací lávka					
	VV		49,18		49,180			
	VV		Součet		49,180			
352	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	224,400	184,82	41 473,61	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. + 2. NP					
	VV		56,10*4		224,400			
	VV		Součet		224,400			
353	M	6975106R	koberec zátěžový	m2	246,840	355,60	87 776,30	
	VV		224,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		246,840			
354	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	409,940	192,98	79 110,22	CS ÚRS 2020 02
	VV		1. + 2. NP					
	VV		59,60+22,30+5,40+22,30+59,60*2+22,30+5,40+22,30+59,60+16,77+5,59+49,18		409,940			
	VV		Součet		409,940			
355	M	2841211R	PVC vinylová akustická podlahovina s kročejovým útlumem 15dB tl. 34 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm	m2	450,934	570,21	257 127,08	
	VV		409,94*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		450,934			
356	K	7764211R1	D+M soklová lišta vinyl h=57mm	m	233,800	127,54	29 818,85	
	VV		1. + 2. NP					
	VV		21,0+16,20+8,30+16,20+21,0*2+16,20+8,30+16,20+21,0+7,0+61,40		233,800			
	VV		Součet		233,800			
357	K	7764211R2	D+M soklová lišta koberec h=55mm	m	82,000	70,50	5 781,00	
	VV		1. + 2. NP					
	VV		20,50*4		82,000			
	VV		Součet		82,000			
358	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	96,000	65,21	6 260,16	CS ÚRS 2020 02
	VV		přílha D.1.23.1.35					
	VV		96,0		96,000			
	VV		Součet		96,000			
359	M	5905410R	profil přechodový Al š. 50mm - 18/O	m	97,920	130,30	12 758,98	
	VV		96*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		97,920			
360	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	3,000	5 676,11	17 028,33	CS ÚRS 2020 02
D 781			Dokončovací práce - obklady				622 346,74	
361	K	781111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	509,800	17,25	8 794,05	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
362	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	509,800	57,50	29 313,50	CS ÚRS 2020 02
363	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	509,800	713,05	363 512,89	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.+2.NP					
	VV		509,80		509,800			
	VV		Součet		509,800			
364	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	560,780	183,12	102 690,03	CS ÚRS 2020 02
	VV		509,8*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		560,780			
365	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	4,320	805,06	3 477,86	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.35					
	VV		0,30*1,80*8		4,320			
	VV		Součet		4,320			
366	M	6346512R	zrcadlo nástěnné číré obdélníkové 300x1800 mm rozdělené na 2-3 díly dle formátu ker. obkladů - 7/O	m2	4,752	1 380,10	6 558,24	
	VV		4,32*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		4,752			
367	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	281,880	172,51	48 627,12	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		5,0*2,10 "mč. 1.03		10,500			
	VV		6,0*2,10+1,20*2 "mč. 1.08a		15,000			
	VV		5,0*2,10+4*1,20 "mč. 1.08		15,300			
	VV		8,0*2,10 "mč. 1.10a		16,800			
	VV		4,0*2,10 "mč. 1.10c		8,400			
	VV		5*2,10+4*1,20 "mč. 1.12		15,300			
	VV		6*2,10*1,20*2 "mč. 1.12a		30,240			
	VV		5*2,10 "mč. 1.17		10,500			
	VV		6*2,10 "mč. 1.18		12,600			
	VV		4*2,10 "mč. 1.18a		8,400			
	VV		2.NP					
	VV		5*2,10 "mč. 2.03		10,500			
	VV		6,0*2,10+1,20*2 "mč. 2.08a		15,000			
	VV		5,0*2,10+4*1,20 "mč. 2.08		15,300			
	VV		8,0*2,10 "mč. 2.10a		16,800			
	VV		4,0*2,10 "mč. 2.10c		8,400			
	VV		5*2,10+4*1,20 "mč. 1.12		15,300			
	VV		6*2,10*1,20*2 "mč. 1.12a		30,240			
	VV		5*2,10 "mč. 2.17		10,500			
	VV		8*2,10 "mč. 2.18		16,800			
	VV		Součet		281,880			
368	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	224,153	184,01	41 246,39	CS ÚRS 2020 02
	VV		1.NP					
	VV		(3,18+3,55+2,215+1,50+2,565)-0,90*2 "mč. 1.03		11,210			
	VV		(3,60+4,20)*2-0,80 "mč. 1.08a		14,800			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2-0,80*2 "mč. 1.08		19,800			
	VV		(2,2+1,40)*2-0,70*3 "mč. 1.10a		5,100			
	VV		(0,95+1,40)*2-0,70 "mč. 1.10b		4,000			
	VV		(3,33+0,95)*2*-0,70 "mč. 1.10c		-5,992			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2-0,80*2 "mč. 1.12		19,800			
	VV		(3,60+4,20)*2-0,80 "mč. 1.12a		14,800			
	VV		2,785+2,565+1,85+3,55+1,40-0,90 "mč. 1.17		11,250			
	VV		(1,72+1,50)*2-0,90-0,70 "mč. 1.18		4,840			
	VV		(0,95+1,50)*2-0,70 "mč. 1.18a		4,200			
	VV		(2,15+2,305)*2-0,90 "mč. 1.19		8,010			
	VV		(2,305+1,50)*2-0,80 "mč. 1.20		6,810			
	VV		2.NP					
	VV		(3,15+3,55+2,215+1,50+2,33)-0,90*2 "mč. 2.03		10,945			
	VV		(3,60+4,20)*2-0,80 "mč. 2.08a		14,800			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2-0,80*2 "mč. 2.08		19,800			
	VV		(2,2+1,40)*2-0,70*3 "mč. 2.10a		5,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,95+1,40)*2-0,70 "mč. 2.10b		4,000			
	VV		(3,33+0,95)*2-0,70 "mč. 2.10c		7,860			
	VV		(5,60+4,20+0,90)-0,80*2 "mč. 2.12		9,100			
	VV		(3,60+4,20)*2-0,80 "mč. 2.12a		14,800			
	VV		(3,55+2,785+1,85+1,50+2,565)-0,90 "mč. 2.17		11,350			
	VV		(1,50+2,785)*2-0,80 "mč. 2.18		7,770			
	VV		Součet		224,153			
369	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,000	6 042,22	18 126,66	CS ÚRS 2020 02
D 783 Dokončovací práce - nátěry							67 521,06	
370	K	7838171R1	Nátěr omítek omyvatelný	m2	638,135	105,81	67 521,06	
	VV		omyvatelný nátěr v barvě malby v. 1500 mm - w3					
	VV		638,135		638,135			
	VV		Součet		638,135			
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							96 255,07	
371	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrupzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 395,001	46,00	64 170,05	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.23.1.4					
	VV		1.NP					
	VV		(5,78+1,975*2)*2,65+(5,0+2,40*2)*0,25 "mč. 1.01		28,235			
	VV		(3,35+0,48+4,405+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+2,915+3,285+5,45+1,30)*2,925+2,655*3,15/2+(1,70+1,0*2)*0,25+(1,20+2,15*2)*0,20*2+(1,10+2,15*2)*0,20 "		119,390			
	VV		(3,18+3,55+2,215+1,50+2,565)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30 "mč. 1.03		35,833			
	VV		(7,0+16,40)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*2+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2 "mč. 1.04		158,340			
	VV		-2,25*2,50*4+4,0 "mč. 1.04		-18,500			
	VV		(5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2 "mč. 1.05		53,680			
	VV		(2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 1.06		43,725			
	VV		(2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 1.07		34,875			
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30 "mč. 1.08a		42,465			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30 "mč. 1.08		57,835			
	VV		(5,25+4,20)*2*3,10+(1,50+0,75*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20 "mč. 1.09		61,490			
	VV		(3,33+1,61)*2*2,65-0,80*2,0 "mč. 1.10		24,582			
	VV		(2,2+1,40)*2*2,65 "mč. 1.10a		19,080			
	VV		(0,95+1,40)*2*2,65-0,70*2,0 "mč. 1.10b		11,055			
	VV		(3,33+0,95)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 1.10c		23,809			
	VV		(5,25+4,20)*2*3,10+(0,75*2+1,50)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20 "mč. 1.11		61,490			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30 "mč. 1.12		57,835			
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30 "mč. 1.12a		42,465			
	VV		(2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 1.13		34,875			
	VV		(2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 1.14		43,725			
	VV		(5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2 "mč. 1.15		53,680			
	VV		2.NP					
	VV		(3,30+5,255+2,90)*2,65+(1,0+1,70*2)*0,25 "mč. 2.01		31,456			
	VV		(5,64+2,88+7,335+2,05+4,405+0,48+1,50+1,85+1,50+8,20+1,50+2,215+1,50+2,63+0,25)*2,925+(1,20+2,15*2)*0,20*2+(1,90+2,40*2)*0,30 "mč. 2.02		132,720			
	VV		(3,15+3,55+2,215+1,50+2,33)*2,65+(0,84+1,84*2)*0,30 "mč. 2.03		35,130			
	VV		(7,0+16,40)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*2+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2		158,340			
	VV		2,25*2,50*4+4,0 "mč. 2.04		26,500			
	VV		(5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2 "mč. 2.05		53,680			
	VV		(2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 2.06		43,725			
	VV		(2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 2.07		34,875			
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30 "mč. 2.08a		42,465			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30 "mč. 2.08		57,835			
	VV		(5,25+4,20)*2*3,10+(1,50+0,75*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20 "mč. 2.09		61,490			
	VV		(3,33+1,61)*2*2,65-0,80*2,0 "mč. 2.10		24,582			
	VV		(2,2+1,40)*2*2,65 "mč. 2.10a		19,080			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,95+1,40)*2*2,65 "mč. 2.10b		12,455			
	VV		(3,33+0,95)*2*2,65+(2,25+0,75*2)*0,30 "mč. 2.10c		23,809			
	VV		(5,25+4,20)*2*3,10+(0,75*2+1,50)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20 "mč. 2.11		61,490			
	VV		(5,60+4,20+0,90)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30 "mč. 2.12		57,835			
	VV		(3,60+4,20)*2*2,65+(0,75*2+2,25)*0,30 "mč. 2.12a		42,465			
	VV		(2,10+4,20)*2*2,65+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 2.13		34,875			
	VV		(2,40+4,20)*2*3,20+(0,75+2,10*2)*0,30 "mč. 2.14		43,725			
	VV		(5,30+2,50)*2*3,30+(1,20+2,15*2)*0,20*2 "mč. 2.15		53,680			
	VV		(7,0+16,40)*2*3,10+(2,25+2,50*2)*0,30*2+(0,75+2,50*2)*0,30*2+(1,20+2,15*2)*0,20*3+(1,10+2,15*2)*0,20*2		158,340			
	VV		2,25*2,50*4+4,0 "mč. 2.16		26,500			
	VV		(3,55+2,785+1,85+1,50+2,565)*2,60 "mč. 2.17		31,850			
	VV		(1,50+2,785)*2,60 "mč. 2.18		11,141			
	VV		(2,305+7,335)*2*2,60+(2,25+1,50*2)*0,30*2 "mč. 2.19		53,278			
	VV		(2,785+3,65)*2*3,25 "mč. 2.20		41,828			
	VV		(1,755+2,785*2)*2,50 "mč. 2.21		18,313			
	VV		30,675*2*2,60 "krček		159,510			
	VV		odečet obkladů					
	VV		-509,80		-509,800			
	VV		odečet omyvatelný nátěr					
	VV		-638,135		-638,135			
	VV		Součet		1 395,001			
372	K	784211163	Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu středně sytého odstínu	m2	1 395,001	23,00	32 085,02	CS ÚRS 2020 02
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy			366 880,91		
373	K	7866271R1	D+M předokenní žaluzie, stříbrná barva RAL 9006 s el. ovládáním 750x2500 mm - 16/O	kpl	8,000	11 631,70	93 053,60	
	VV		přílha D.1.23.1.36					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
374	K	7866271R2	D+M předokenní žaluzie, stříbrná barva RAL 9006 s el. ovládáním 2250x2500 mm - 17/O	kpl	16,000	16 408,05	262 528,80	
	VV		přílha D.1.23.1.36					
	VV		16,0		16,000			
	VV		Součet		16,000			
375	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	3,000	3 766,17	11 298,51	CS ÚRS 2020 02
D M			Práce a dodávky M			570 440,09		
D 33-M			Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh			570 440,09		
376	K	3300300R	D+M osobní výtah nosnost 630kg, bezpřevodový, počet stanic 2, bez strojovny pod stropem, 2 kusy panelových dveří, kabina 1100x1400x2100 mm - V3	kpl	1,000	570 440,09	570 440,09	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.2 - ZTI

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 704 023,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 704 023,22	21,00%	567 844,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 271 868,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.2 - ZTI

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 704 023,22

HSV - Práce a dodávky HSV

45 322,05

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

45 276,16

998 - Přesun hmot

45,89

PSV - Práce a dodávky PSV

2 651 938,69

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

375 306,57

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

646 069,33

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

1 095 591,08

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

482 058,10

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

30 822,15

767 - Konstrukce zámečnické

6 857,45

783 - Dokončovací práce - nátěry

15 234,01

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

6 762,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.2 - ZTI

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 704 023,22

D HSV Práce a dodávky HSV 45 322,05

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 45 276,16

1	K	953945121	Kotvy mechanické M 10 dl 90 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	148,000	305,92	45 276,16	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--	-----	---------	--------	-----------	----------------

D 998 Přesun hmot 45,89

2	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	0,038	966,07	36,71	CS ÚRS 2020 02
3	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,038	241,52	9,18	CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 2 651 938,69

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 375 306,57

4	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 110	m	10,000	398,91	3 989,10	CS ÚRS 2020 02
5	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 125	m	80,000	434,45	34 756,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 8 svodné DN 150	m	71,000	584,01	41 464,71	CS ÚRS 2020 02
7	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	30,000	288,26	8 647,80	CS ÚRS 2020 02
8	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	38,000	309,74	11 770,12	CS ÚRS 2020 02
9	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	22,000	482,83	10 622,26	CS ÚRS 2020 02
10	K	721174062	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 75	m	10,000	316,59	3 165,90	CS ÚRS 2020 02
11	K	721174063	Potrubí kanalizační z PP větrací DN 110	m	20,000	482,83	9 656,60	CS ÚRS 2020 02
12	K	721175111	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučňené třívrstvé DN 75	m	37,000	784,88	29 040,56	CS ÚRS 2020 02
13	K	721175112	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučňené třívrstvé DN 110	m	27,000	1 172,07	31 645,89	CS ÚRS 2020 02
14	K	721175113	Potrubí kanalizační z PP odpadní vysoce odhlučňené třívrstvé DN 125	m	32,000	1 676,15	53 636,80	CS ÚRS 2020 02
15	K	721175121	Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučňené třívrstvé DN 75	m	2,000	784,88	1 569,76	CS ÚRS 2020 02
16	K	721175122	Potrubí kanalizační z PP svodné vysoce odhlučňené třívrstvé DN 110	m	28,000	1 172,07	32 817,96	CS ÚRS 2020 02
17	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	38,000	125,36	4 763,68	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	15,000	132,83	1 992,45	CS ÚRS 2020 02
19	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	156,41	156,41	CS ÚRS 2020 02
20	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	44,000	234,62	10 323,28	CS ÚRS 2020 02
21	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	6,000	805,06	4 830,36	CS ÚRS 2020 02
22	M	HLE.HL50F080	Liniový odtokový žlab do sprchových koutů z nerezové oceli k zabudování do plochy včetně odtoku DN50, montážních potřeb a stavební ochranné zátky, avšak bez krytu žlábků. Stavební délka 800mm	kus	6,000	2 659,06	15 954,36	
23	K	721233212	Střešní vtok DN70, svislý, el.ohřev,s izolační přírubou, tepelně izolovaný HL 62.1P/7	kus	1,000	5 167,40	5 167,40	CS ÚRS 2020 02
24	K	721233213.HLE	Střešní vtok DN100, svislý, el.ohřev,s izolační přírubou, tepelně izolovaný HL 62.1P/1	kus	2,000	5 167,40	10 334,80	
25	K	721233213R01	Střešní vtok DN125, svislý, svislý, el.ohřev,s izolační přírubou, tepelně izolovaný HL 62.1P/2	kus	4,000	5 167,40	20 669,60	
26	K	721259103	Montáž tvarovky DN 70	kus	4,000	161,01	644,04	CS ÚRS 2020 02
27	M	28611086	čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 70	kus	4,000	366,72	1 466,88	CS ÚRS 2020 02
28	K	721259105	Montáž tvarovky DN 100	kus	5,000	193,21	966,05	CS ÚRS 2020 02
29	M	28611087	čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 100	kus	5,000	382,00	1 910,00	CS ÚRS 2020 02
30	K	721259106	Montáž tvarovky DN 125	kus	4,000	241,52	966,08	CS ÚRS 2020 02
31	M	28611088	čistící kus odpadního systému tlumící zvuk DN 125	kus	4,000	600,28	2 401,12	CS ÚRS 2020 02
32	K	721273152	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 75	kus	2,000	859,83	1 719,66	CS ÚRS 2020 02
33	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,000	710,38	2 841,52	CS ÚRS 2020 02
34	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	247,000	32,20	7 953,40	CS ÚRS 2020 02
35	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	161,000	40,25	6 480,25	CS ÚRS 2020 02
36	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,813	966,07	785,41	CS ÚRS 2020 02
37	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,813	241,52	196,36	CS ÚRS 2020 02

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					646 069,33	
38	K	722130234	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 32	m	5,000	509,47	2 547,35	CS ÚRS 2020 02
39	K	722130235	Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované svařované běžné DN 40	m	64,000	583,19	37 324,16	CS ÚRS 2020 02
40	K	722131934	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32	kus	2,000	397,58	795,16	CS ÚRS 2020 02
41	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	250,000	303,23	75 807,50	CS ÚRS 2020 02
42	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	198,000	324,35	64 221,30	CS ÚRS 2020 02
43	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm	m	142,000	362,74	51 509,08	CS ÚRS 2020 02
44	K	722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm	m	130,000	513,38	66 739,40	CS ÚRS 2020 02
45	K	722174073	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	kus	2,000	165,99	331,98	CS ÚRS 2020 02
46	K	722174074	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	kus	2,000	217,68	435,36	CS ÚRS 2020 02
47	K	722174075	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm	kus	2,000	269,41	538,82	CS ÚRS 2020 02
48	K	722174075R01	Kompenzační smyčka - tlaková nerez hadice DN40 1,5m	kus	2,000	3 879,54	7 759,08	
49	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm	kus	115,500	90,51	10 453,91	CS ÚRS 2020 02
	VV		(231)/2		115,500			
	VV		Součet		115,500			
50	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm	kus	235,000	130,53	30 674,55	CS ÚRS 2020 02
	VV		470/2		235,000			
	VV		Součet		235,000			
51	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	84,000	34,51	2 898,84	CS ÚRS 2020 02
52	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm	m	70,000	49,47	3 462,90	CS ÚRS 2020 02
53	K	722181213	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	47,000	95,26	4 477,22	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	58,000	59,01	3 422,58	CS ÚRS 2020 02
55	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	98,000	116,21	11 388,58	CS ÚRS 2020 02
56	K	722181233	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 63 mm	m	22,000	153,69	3 381,18	CS ÚRS 2020 02
57	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	43,000	143,35	6 164,05	CS ÚRS 2020 02
58	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	274,000	198,10	54 279,40	CS ÚRS 2020 02
59	K	722181253	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 63 mm	m	66,000	273,40	18 044,40	CS ÚRS 2020 02
60	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	50,000	65,89	3 294,50	CS ÚRS 2020 02
61	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	64,000	75,51	4 832,64	CS ÚRS 2020 02
62	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	122,000	79,70	9 723,40	CS ÚRS 2020 02
63	K	722182015	Podpurný žlab pro potrubí D 50	m	130,000	110,98	14 427,40	CS ÚRS 2020 02
64	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	144,000	150,09	21 612,96	CS ÚRS 2020 02
65	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	54,000	123,75	6 682,50	CS ÚRS 2020 02
66	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	42,000	329,21	13 826,82	CS ÚRS 2020 02
67	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	24,000	84,29	2 022,96	CS ÚRS 2020 02
68	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	52,000	110,99	5 771,48	CS ÚRS 2020 02
69	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	166,80	1 000,80	CS ÚRS 2020 02
70	K	722220235	Přechodka dGK PPR PN 20 D 50 x G 6/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	483,78	2 902,68	CS ÚRS 2020 02
71	K	722232122	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	8,000	238,82	1 910,56	CS ÚRS 2020 02
72	K	722232123	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	21,000	332,97	6 992,37	CS ÚRS 2020 02
73	K	722232124	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	3,000	475,67	1 427,01	CS ÚRS 2020 02
74	K	722232126	Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C plnopřtokový vnitřní závit	kus	3,000	890,29	2 670,87	CS ÚRS 2020 02
75	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 1/2	kus	4,000	241,52	966,08	CS ÚRS 2020 02
76	M	42210770R01	ventil s regulační přímý DN 15 termostatický (MTCV)	kus	4,000	2 658,57	10 634,28	
77	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závitů G 3/4	kus	2,000	241,52	483,04	CS ÚRS 2020 02
78	M	42210773R01	ventil s regulační přímý DN 20 termostatický (MTCV)	kus	2,000	2 883,95	5 767,90	
79	K	722239104R01	Montáž armatur vodovodních se třemi závitů G 3/4	kus	4,000	289,82	1 159,28	
80	M	55145541R01	ventil termostatický DN20, průtok 47l/min, vestavěné zpětné klapky, Presto29007	kus	4,000	5 624,59	22 498,36	
81	K	722250133R01	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m celoplechový, Q 1,1 l/s	kus	2,000	9 543,74	19 087,48	
82	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	784,000	16,10	12 622,40	CS ÚRS 2020 02
83	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	762,000	19,32	14 721,84	CS ÚRS 2020 02
84	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	1,965	966,07	1 898,33	CS ÚRS 2020 02
85	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	1,965	241,52	474,59	CS ÚRS 2020 02

D 725		Zdravotecnika - zařízení předměty						1 095 591,08
86	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	36,000	805,06	28 982,16	CS ÚRS 2020 02
87	M	642360710	klozet keramický závěsný hluboké splachování dětský	kus	32,000	7 538,92	241 245,44	
88	M	642360210	klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý	kus	3,000	2 325,79	6 977,37	
89	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	1,000	5 625,51	5 625,51	CS ÚRS 2020 02
90	M	551673810R01	sedátko klozetové s poklopem duroplastové dětské	kus	32,000	3 069,75	98 232,00	
91	M	551673810	sedátko klozetové s poklopem duroplastové bílé	kus	3,000	1 302,30	3 906,90	
92	M	551673810R02	sedátko klozetové s poklopem duroplastové pro handicapované	kus	1,000	606,04	606,04	
93	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	kus	34,000	724,55	24 634,70	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
94	M	642110300	umyvadlo keramické závěsné 50 x 41 cm bílé	kus	24,000	1 027,44	24 658,56	
95	M	642110310	umyvadlo keramické závěsné 55 x 42 cm bílé	kus	9,000	1 066,67	9 600,03	
96	M	64211023	umyvadlo keramické závěsné bezbariérové bílé 640x550mm	kus	1,000	2 112,16	2 112,16	CS ÚRS 2020 02
97	M	642110340	kryt na sifon bílý	kus	9,000	1 487,51	13 387,59	
98	K	725244505	Zástěna sprchová rohová rámová se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné jednoduché vstup z čela na vaničku 1000x800 mm	kus	2,000	15 341,96	30 683,92	CS ÚRS 2020 02
99	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	kus	34,000	1 023,53	34 800,02	CS ÚRS 2020 02
100	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	kus	12,000	2 178,88	26 146,56	CS ÚRS 2020 02
101	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	kus	18,000	2 268,59	40 834,62	CS ÚRS 2020 02
102	K	725291641	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo sprchové 750 x 450 mm	kus	4,000	5 032,28	20 129,12	CS ÚRS 2020 02
103	K	725291711	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 550 mm	kus	2,000	3 856,19	7 712,38	CS ÚRS 2020 02
104	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové dl 834 mm	kus	1,000	6 187,93	6 187,93	CS ÚRS 2020 02
105	K	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 mm	soubor	1,000	6 732,70	6 732,70	CS ÚRS 2020 02
106	K	725319111R01	Montáž dřezu nebo připojení výpustek DN 50 ostatních typů	kus	9,000	805,06	7 245,54	
107	K	725319111	Montáž dřezu nebo připojení výpustek DN 40 ostatních typů	kus	4,000	805,06	3 220,24	CS ÚRS 2020 02
108	M	551458210	fontánka pitná závěsná s automaticky ovládaným výtokem, zaoblené rohy, dětská	kus	4,000	14 092,70	56 370,80	
109	M	562414130	příslušenství sítko - vložka s menšími otvory	kus	4,000	454,28	1 817,12	
110	K	725339111	Montáž výlevky	kus	2,000	788,96	1 577,92	CS ÚRS 2020 02
111	M	642711010	výlevka keramická závěsná bílá	kus	2,000	5 053,51	10 107,02	
112	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	kus	118,000	228,52	26 965,36	CS ÚRS 2020 02
113	M	55190001	flexi hadice ohebná sanitární D 9x13mm FF 3/8" 500mm	kus	38,000	202,13	7 680,94	CS ÚRS 2020 02
114	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	4,000	389,12	1 556,48	CS ÚRS 2020 02
115	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	4,000	322,02	1 288,08	CS ÚRS 2020 02
116	M	551439760	baterie dřezová páková nástěnná s ústím 300 mm	kus	4,000	2 015,75	8 063,00	
117	K	725829111	Montáž baterie stojánkové dřezové G 1/2	kus	4,000	322,02	1 288,08	CS ÚRS 2020 02
118	M	55143181	baterie dřezová páková stojánková do 1 otvoru s otáčivým ústím dl ramínka 265mm	kus	4,000	1 703,40	6 813,60	CS ÚRS 2020 02
119	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	14,000	402,53	5 635,42	CS ÚRS 2020 02
120	M	55144004	baterie umyvadlová stojánková páková s ovládáním odpadu	kus	14,000	2 843,93	39 815,02	CS ÚRS 2020 02
121	K	725829131.1	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní typ	kus	24,000	483,03	11 592,72	
122	M	551456860	baterie umyvadlová stojánková páková bez ovládání výpusti	kus	24,000	7 015,93	168 382,32	
123	K	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	6,000	1 207,58	7 245,48	CS ÚRS 2020 02
124	M	551456000	baterie sprchová nástěnná termostatická 150mm chrom	kus	4,000	5 519,15	22 076,60	CS ÚRS 2020 02
125	M	551455390	baterie sprchová zapuštěná s přepínačem	kus	2,000	3 827,54	7 655,08	CS ÚRS 2020 02
126	M	551455450	souprava sprchová komplet	kus	6,000	2 007,33	12 043,98	CS ÚRS 2020 02
127	K	725851315	Ventil odpadní dřezový s přepadem G 6/4	kus	9,000	435,48	3 919,32	CS ÚRS 2020 02
128	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	33,000	1 348,65	44 505,45	CS ÚRS 2020 02
129	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	1,000	1 357,03	1 357,03	CS ÚRS 2020 02
130	K	725862113	Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50	kus	4,000	513,06	2 052,24	CS ÚRS 2020 02
131	K	998725103	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m	t	1,756	966,07	1 696,42	CS ÚRS 2020 02
132	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	1,756	241,52	424,11	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	726131001	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm se stojánkovou baterií do lehkých stěn s kovovou kcí	kus	24,000	4 431,24	106 349,76	CS ÚRS 2020 02
134	K	726131002	Instalační předstěna - umyvadlo do v 1120 mm pro tělesně postižené do lehkých stěn s kovovou kcí	kus	1,000	6 926,15	6 926,15	CS ÚRS 2020 02
135	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	kus	37,000	8 497,57	314 410,09	CS ÚRS 2020 02
136	K	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kcí	kus	1,000	10 524,29	10 524,29	CS ÚRS 2020 02
137	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	kus	36,000	357,10	12 855,60	CS ÚRS 2020 02
138	K	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	kus	62,000	479,54	29 731,48	CS ÚRS 2020 02
139	K	998726113	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 24 m	t	1,044	966,07	1 008,58	CS ÚRS 2020 02
140	K	998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726 prováděný bez použití mechanizace	t	1,044	241,52	252,15	CS ÚRS 2020 02

D 727 Zdravotechnika - požární ochrana 30 822,15

141	K	727121105	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	6,000	1 725,12	10 350,72	CS ÚRS 2020 02
142	K	727121107	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	7,000	1 840,13	12 880,91	CS ÚRS 2020 02
143	K	727121108	Protipožární manžeta D 125 mm z jedné strany dělicí konstrukce požární odolnost EI 90	kus	4,000	1 897,63	7 590,52	CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 6 857,45

144	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	89,000	32,20	2 865,80	CS ÚRS 2020 02
145	M	48455984R01	<i>konzole stěnová nebo závěsná C-nosník, konzoly, spojovací materiál-sestavy</i>	<i>pár</i>	<i>89,000</i>	<i>44,85</i>	<i>3 991,65</i>	

D 783 Dokončovací práce - nátěry 15 234,01

146	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	37,000	34,50	1 276,50	CS ÚRS 2020 02
147	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	37,000	9,20	340,40	CS ÚRS 2020 02
148	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,000	138,01	5 106,37	CS ÚRS 2020 02
149	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	37,000	92,01	3 404,37	CS ÚRS 2020 02
150	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	37,000	138,01	5 106,37	CS ÚRS 2020 02

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 762,48

151	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	6,000	1 127,08	6 762,48	CS ÚRS 2020 02
-----	---	---------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.2.1 - ZTI - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Uchazeč:

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Projektant:

IČ:

DIČ:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

676 584,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	676 584,03	21,00%	142 082,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

818 666,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.2.1 - ZTI - zemní práce

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

676 584,03

HSV - Práce a dodávky HSV

640 483,34

1 - Zemní práce

589 299,50

2 - Zakládání

5 782,82

998 - Přesun hmot

45 401,02

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

36 100,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.2.1 - ZTI - zemní práce

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

676 584,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

640 483,34

D 1

Zemní práce

589 299,50

3	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	427,72	21 386,00	CS ÚRS 2020 02
14	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	100,000	34,62	3 462,00	CS ÚRS 2020 02
15	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	100,000	18,86	1 886,00	CS ÚRS 2020 02
35	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	129,020	1 841,97	237 650,97	CS ÚRS 2020 02
42	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	153,520	326,97	50 196,43	CS ÚRS 2020 02
43	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	153,520	172,86	26 537,47	CS ÚRS 2020 02
52	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	129,020	323,98	41 799,90	CS ÚRS 2020 02
53	K	162211319	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	129,020	288,56	37 230,01	CS ÚRS 2020 02
49	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	132,600	62,68	8 311,37	CS ÚRS 2020 02
VV		zemina na meziskládku a zpětný zásyp						
VV		66,3*2			132,600			
1305	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	62,720	375,39	23 544,46	CS ÚRS 2020 02
VV		přebytečná zemina na skládku						
VV		129,020-66,3			62,720			
1306	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	313,600	27,37	8 583,23	CS ÚRS 2020 02
VV		62,72*5 'Přepočtené koeficientem množství			313,600			
54	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	129,020	348,01	44 900,25	CS ÚRS 2020 02
55	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	129,020	22,43	2 893,92	CS ÚRS 2020 02
1307	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	100,352	394,13	39 551,73	CS ÚRS 2020 02
VV		přebytečná zemina na skládku						
VV		(129,020-66,3)*1,6			100,352			
56	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	66,300	165,84	10 995,19	CS ÚRS 2020 02
58	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	13,260	767,91	10 182,49	CS ÚRS 2020 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	26,520	761,24	20 188,08	CS ÚRS 2020 02
		VV	13,26*2 "Přepočtené koeficientem množství		26,520			
	D	2	Zakládání				5 782,82	
1304	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného šterkopísku	m3	13,260	436,11	5 782,82	CS ÚRS 2020 02
	D	998	Přesun hmot				45 401,02	
141	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	52,960	617,71	32 713,92	CS ÚRS 2020 02
142	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	52,960	239,56	12 687,10	CS ÚRS 2020 02
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				36 100,69	
1199	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	20,000	494,53	9 890,60	CS ÚRS 2020 02
1201	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	16,000	494,53	7 912,48	CS ÚRS 2020 02
1202	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	30,000	494,53	14 835,90	CS ÚRS 2020 02
1204	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	7,000	494,53	3 461,71	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.3 - UT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 123 888,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 123 888,10	21,00%	236 016,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 359 904,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.3 - UT

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 123 888,10

1 - Zdroj tepla	147 657,47
2 - Oběhová čerpadla	81 498,95
3 - Otopná tělesa	70 305,74
4 - Příslušenství otopných těles	34 836,64
5 - Regulační a vyvažovací ventily	44 156,72
6 - Kulové kohouty a uzavírací klapky	28 222,60
7 - Filtry	3 169,54
8 - Zpětné klapky a ventily	2 668,43
9 - Vypouštění a odvzdušnění	25 231,56
10 - Teploměry	31 333,58
11 - Potrubí	424 888,18
12 - Požární ucpávky	10 572,90
13 - Nátěry	10 724,36
14 - Izolace	105 483,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt: SO 23 - Pavilon B

Soupis: SO 23.3 - UT

Místo: Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 123 888,10

D		1	Zdroj tepla	147 657,47				
0	M	1.1	Kombinovaný rozdělovač/sběrač pro vytápění DN 100, kompletní se všemi hrdly a nátrubky, dl. 2,95m, vč. montáže, izolace a uchycení. Hrdla Vstup primár 2xDN65, výstupy sekundár 2xDN25, 2x DN32, 2xDN15, 2xDN32, 2xDN50, 2xDN25, rozteče hrdel: 250mm	ks	1,000	49 400,87	49 400,87	
0	M	1.2	Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy chladicí vody. Výška (mm): 888; Průměr (mm): 634; Hmotnost (kg): 24,7; Objem (l): 250; DN připojení: R 1; Barva: šedá	ks	1,000	10 142,61	10 142,61	
0	M	1.3	Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze s integrovaným vypouštěním. Hmotnost (kg): 0,5; DN připojení: Rp 1;	ks	1,000	1 235,34	1 235,34	
0	M	1.4	Podtlakové odplynovací zařízení s integrovaným doplňováním pro soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou nebo expanzním autosemrazovačem. Maximální provozní teplota do 70 °C. Délka (mm): 290; Šířka (mm): 545; Výška (mm): 660; Hmotnost (kg): 13;	ks	1,000	61 769,41	61 769,41	
0	M	1.5	Uvedení do provozu podtlakového odplynovacího zařízení	ks	1,000	4 400,66	4 400,66	
0	M	1.6	Odlučovač nečistot a kalu, provedení ocel s přírubovým připojením, 110 °C, 10 bar.Délka (mm): 350; Výška (mm): 370; Průměr (mm): 132; Hmotnost (kg): 15; DN připojení: DN 65/PN 16; Barva:šedá	ks	1,000	20 708,58	20 708,58	

D		2	Oběhová čerpadla	81 498,95				
0	M	2.1	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro okruh VZT na rozdělovači tepla (UT.O.Č.1.1) M=0,81 m3/h, V=6m, včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu	ks	1,000	11 391,57	11 391,57	
0	M	2.2	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro okruh OT Hospodářská budova na rozdělovači tepla (UT.O.Č.1.2) M=0,97 m3/h, V=5m, včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu	ks	1,000	11 391,57	11 391,57	
0	M	2.3	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro okruh OT Byt správce na rozdělovači tepla (UT.O.Č.1.3) M=0,2 m3/h, V=5m, včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu	ks	1,000	9 316,44	9 316,44	
0	M	2.4	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro okruh OT Pavilon A na rozdělovači tepla (UT.O.Č.1.4) M=2,0 m3/h, V=6m, včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu	ks	1,000	18 041,44	18 041,44	
0	M	2.5	Oběhové čerpadlo, mokroběžné, proměnné otáčky - pro okruh OT Pavilon B na rozdělovači tepla (UT.O.Č.1.5) M=3,44 m3/h, V=6m, včetně připojovacího materiálu, montáže, oživení, nastavení a uvedení do provozu	ks	1,000	31 357,93	31 357,93	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D		3	Otopná tělesa						70 305,74
0	M	3.1	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 10VK/5040 výška: 500mm, délka: 400mm, hloubka: 47mm	ks	2,000	2 069,79	4 139,58		
0	M	3.2	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 10VK/5050 výška: 500mm, délka: 500mm, hloubka: 47mm	ks	1,000	2 127,81	2 127,81		
0	M	3.3	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 20VK/5040 výška: 500mm, délka: 400mm, hloubka: 66mm	ks	3,000	2 338,31	7 014,93		
0	M	3.4	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5040 výška: 500mm, délka: 400mm, hloubka: 66mm	ks	1,000	2 549,83	2 549,83		
0	M	3.5	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5050 výška: 500mm, délka: 500mm, hloubka: 66mm	ks	1,000	2 657,13	2 657,13		
0	M	3.6	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5060 výška: 500mm, délka: 600mm, hloubka: 66mm	ks	2,000	2 761,87	5 523,74		
0	M	3.7	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5070 výška: 500mm, délka: 700mm, hloubka: 66mm	ks	1,000	2 869,17	2 869,17		
0	M	3.8	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5080 výška: 500mm, délka: 800mm, hloubka: 66mm	ks	4,000	2 974,93	11 899,72		
0	M	3.9	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5100 výška: 500mm, délka: 1000mm, hloubka: 66mm	ks	2,000	3 185,43	6 370,86		
0	M	3.10	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/5120 výška: 500mm, délka: 1200mm, hloubka: 66mm	ks	1,000	3 553,39	3 553,39		
0	M	3.11	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/9070 výška: 900mm, délka: 700mm, hloubka: 66mm	ks	1,000	3 649,55	3 649,55		
0	M	3.12	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 21VK/9120 výška: 900mm, délka: 1200mm, hloubka: 66mm	ks	1,000	4 723,96	4 723,96		
0	M	3.13	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/5070 výška: 500mm, délka: 700mm, hloubka: 100mm	ks	1,000	3 213,16	3 213,16		
0	M	3.14	Deskové ocelové otopné těleso se spodním pravým připojením 22VK/5090 výška: 500mm, délka: 900mm, hloubka: 100mm	ks	1,000	3 491,42	3 491,42		
0	M	3.15	Otopné trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodáváná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. výška: 1220mm, délka: 450mm, hloubka: 30mm	ks	1,000	3 036,06	3 036,06		
0	M	3.16	Otopné trubkové těleso se spodním připojením. Otopná tělesa jsou dodáváná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky. výška: 1500mm, délka: 600mm, hloubka: 30mm	ks	1,000	3 485,43	3 485,43		

D		4	Příslušenství otopných těles					34 836,64
0	M	4.1	Termostatická hlavice	ks	24,000	373,83	8 971,92	
0	M	4.2	Radiátorové šroubení tvaru H přímé je vhodné pro každý radiátor se spodním přívodem se vzdáleností přívodu a vývodu 50 mm. Šroubení umožňuje uzavřít okruh a vypustit topné těleso při jeho demontáži. Jako příslušenství se dodává kohout pro vypouštění a nap	ks	22,000	1 067,54	23 485,88	
0	M	4.3	Rohový regulační ventil DN15, vč.montáže	ks	2,000	654,28	1 308,56	
0	M	4.4	Rohové regulační šroubení DN15, vč.montáže	ks	2,000	535,14	1 070,28	

D		5	Regulační a vyvažovací ventily						44 156,72
0	M	5.1	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 15 s vnitřním závitem, s měřicími koncovkami, vč. montáže	ks	2,000	1 867,93	3 735,86		
0	M	5.2	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 20 s vnitřním závitem, s měřicími koncovkami, vč. montáže	ks	1,000	2 093,39	2 093,39		
0	M	5.3	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 25 s vnitřním závitem, s měřicími koncovkami, vč. montáže	ks	2,000	2 266,70	4 533,40		
0	M	5.4	Ruční závitový vyvažovací ventil DN 40 s vnitřním závitem, s měřicími koncovkami, vč. montáže	ks	1,000	3 749,75	3 749,75		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	5.5	Třicestný regulační ventil se závitovým připojením, DN 15, Kv=0,63, vč. montáže a servopohonu modulačního 0-10V, 24V	ks	1,000	7 203,33	7 203,33	
0	M	5.6	Třicestný regulační ventil se závitovým připojením, DN 15, Kv=4, vč. montáže a servopohonu modulačního 0-10V, 24V	ks	1,000	7 203,33	7 203,33	
0	M	5.7	Třicestný regulační ventil se závitovým připojením, DN 20, Kv=6,3, vč. montáže a servopohonu modulačního 0-10V, 24V	ks	1,000	7 203,33	7 203,33	
0	M	5.8	Třicestný regulační ventil se závitovým připojením, DN 32, Kv=16, vč. montáže a servopohonu modulačního 0-10V, 24V	ks	1,000	8 434,33	8 434,33	

D 6 Kulové kohouty a uzavírací klapky 28 222,60

0	M	6.1	Závitový kulový kohout DN 15, PN 6, včetně montáže	ks	6,000	234,31	1 405,86	
0	M	6.2	Závitový kulový kohout DN 20, PN 6, včetně montáže	ks	4,000	326,68	1 306,72	
0	M	6.3	Závitový kulový kohout DN 25, PN 6, včetně montáže	ks	8,000	487,11	3 896,88	
0	M	6.4	Závitový kulový kohout DN 32, PN 6, včetně montáže	ks	10,000	654,35	6 543,50	
0	M	6.5	Závitový kulový kohout DN 50, PN 6, včetně montáže	ks	6,000	1 331,70	7 990,20	
0	M	6.6	Klapka uzavírací mezipřírubová , vč. přírubového spoje, protipřírub a těsnění,DN 65, PN 6, včetně montáže	ks	2,000	3 539,72	7 079,44	

D 7 Filtry 3 169,54

0	M	7.1	Filtr závitový DN 15, PN 6, vč. montáže	ks	1,000	206,24	206,24	
0	M	7.2	Filtr závitový DN 20, PN 6, vč. montáže	ks	1,000	267,98	267,98	
0	M	7.3	Filtr závitový DN 25, PN 6, vč. montáže	ks	1,000	379,06	379,06	
0	M	7.4	Filtr závitový DN 32, PN 6, vč. montáže	ks	2,000	560,77	1 121,54	
0	M	7.5	Filtr závitový DN 50, PN 6, vč. montáže	ks	1,000	1 194,72	1 194,72	

D 8 Zpětné klapky a ventily 2 668,43

0	M	8.1	Zpětný ventil, DN 15, PN 16, vč. montáže	ks	1,000	232,61	232,61	
0	M	8.2	Zpětný ventil, DN 25, PN 16, vč. montáže	ks	1,000	383,32	383,32	
0	M	8.3	Zpětný ventil, DN 32, PN 16, vč. montáže	ks	2,000	546,30	1 092,60	
0	M	8.4	Zpětný ventil, DN 50, PN 16, vč. montáže	ks	1,000	959,90	959,90	

D 9 Vypouštění a odvzdušnění 25 231,56

0	M	9.1	Kulový vypouštěcí kohout, PN 6, DN 20 s hadicovou vývodkou a zátkou, vč. montáže	ks	24,000	314,77	7 554,48	
0	M	9.2	Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 25, vč. montáže	ks	2,000	472,34	944,68	
0	M	9.3	Odvzdušňovací nádoba PN 6, DN 50, vč. montáže	ks	10,000	1 077,26	10 772,60	
0	M	9.4	Odvzdušňovací ventil, PN 6, DN 15, vč. montáže	ks	22,000	270,90	5 959,80	

D 10 Teploměry 31 333,58

0	M	10.1	Teploměr 0 - 120°C axiální, vč. návarku, jímky a montáže	ks	14,000	651,07	9 114,98	
0	M	10.2	Tlakoměr 0 - 600 kPa, vč. návarku, smyčky, kohoutu a montáže	ks	12,000	1 851,55	22 218,60	

D 11 Potrubí 424 888,18

0	M	11.1	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 15(21,4x2,65)	m	10,000	501,70	5 017,00	
0	M	11.2	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 20(26,9x2,65)	m	50,000	534,44	26 722,00	
0	M	11.3	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 25(33,7x3,25)	m	12,000	600,21	7 202,52	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	11.4	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 32(42,4x3,25)	m	10,000	666,24	6 662,40	
0	M	11.5	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 50(60,2x3,65)	m	5,000	853,66	4 268,30	
0	M	11.6	Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, nízkotlakých DN 65(76x3,2)	m	10,000	917,34	9 173,40	
0	M	11.7	Měděné potrubí 15x1	m	293,000	442,18	129 558,74	
0	M	11.8	Měděné potrubí 18x1	m	138,000	472,28	65 174,64	
0	M	11.9	Měděné potrubí 22x1	m	42,000	541,47	22 741,74	
0	M	11.10	Měděné potrubí 28x1,5	m	16,000	892,89	14 286,24	
0	M	11.11	Měděné potrubí 35x1,5	m	9,000	1 085,70	9 771,30	
0	M	11.12	Měděné potrubí 42x1,5	m	20,000	1 257,87	25 157,40	
0	M	11.13	Měděné potrubí 54x2	m	50,000	1 983,05	99 152,50	

D 12 Požární ucpávky 10 572,90

0	M	12.1	Protipožární tmel	kpl.	10,000	1 057,29	10 572,90	
---	---	------	-------------------	------	--------	----------	-----------	--

D 13 Nátěry 10 724,36

0	M	13.1	Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a dvojnásobným nátěrem prostým. Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním... Nátěr pro armatury, doplňkové konstrukce, uložení	kpl.	1,000	7 353,61	7 353,61	
0	M	13.2	Veškeré pomocné ocelové konstrukce, závěsy a uložení potrubí budou opatřeny nátěrem základním a dvojnásobným nátěrem prostým. Věškeré potrubí bude izolované a bude pod izolací opatřeno nátěrem základním. Armatu... základní nátěr potrubí do DN 65 mm včetně	m	97,000	34,75	3 370,75	

D 14 Izolace 105 483,22

0	M	14.1	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 15x1, tl. 30 mm	m	293,000	140,00	41 020,00	
0	M	14.2	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 18x1, tl. 30 mm	m	138,000	147,97	20 419,86	
0	M	14.3	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 22x1, tl. 30 mm	m	42,000	161,86	6 798,12	
0	M	14.4	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 28x1,5, tl. 30 mm	m	16,000	172,75	2 764,00	
0	M	14.5	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 35x1,5, tl. 30 mm	m	9,000	184,64	1 661,76	
0	M	14.6	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 42x1,5, tl. 30 mm	m	20,000	196,53	3 930,60	
0	M	14.7	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro měděné potrubí 54x2, tl. 30 mm	m	50,000	211,49	10 574,50	
0	M	14.8	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro ocelové potrubí DN15; tl.30 mm	m	10,000	161,86	1 618,60	
0	M	14.9	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro ocelové potrubí DN20; tl.30 mm	m	50,000	172,75	8 637,50	
0	M	14.10	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro ocelové potrubí DN25; tl.30 mm	m	12,000	184,64	2 215,68	
0	M	14.11	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro ocelové potrubí DN32; tl.30 mm	m	10,000	196,53	1 965,30	
0	M	14.12	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro ocelové potrubí DN50; tl.30 mm	m	5,000	213,48	1 067,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	14.13	Izolace potrubí vytápění z minerální vlny; tep. vodivost 0,033 W / m.K, max. teplota 102°C Izolace ko = 0,033 W/(mK) pro ocelové potrubí DN65; tl.40 mm	m	10,000	280,99	2 809,90	

D		15	Společné položky						103 138,21
0	K	15.3	Doprava materiálu	kpl	1,000	8 158,67	8 158,67		
0	K	15.5	Pomocné ocelové konstrukce	kpl	1,000	9 754,79	9 754,79		
0	K	15.6	Zavěšení potrubí, kotvicí systém např. Hilti, množství dle DN	kpl	1,000	14 632,18	14 632,18		
0	K	15.7	Provedení komplexních zkoušek (včetně tlakové a topné zkoušky)	kpl	1,000	33 253,16	33 253,16		
0	K	15.8	Jemné zaregulování systému	kpl	1,000	2 369,58	2 369,58		
0	K	15.9	Vyvážení dle vyhl. 193/2007 sb.včetně protokolu	kpl	1,000	3 949,31	3 949,31		
0	K	15.10	Dvojnásobný proplach systému a náplň upravenou vodou	kpl	1,000	12 606,19	12 606,19		
0	K	15.11	Štítky a popisy potrubí a zařízení	kpl	1,000	2 990,19	2 990,19		
0	K	15.12	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 369,58	2 369,58		
0	K	15.13	Kotevní materiál	kpl	1,000	4 895,89	4 895,89		
0	K	15.14	Montážní materiál	kpl	1,000	8 158,67	8 158,67		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.4 - VZT

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 037 139,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 037 139,48	21,00%	217 799,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 254 938,77

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.4 - VZT

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 037 139,48

D1 - Vzduchotechnika

1 037 139,48

D2 - Zař.č.1 - Větrání tříd a přípraven

613 825,96

D3 - Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení

196 460,09

D4 - Ostatní

213 627,50

D6 - Měření hluku

13 225,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt: SO 23 - Pavilon B

Soupis: **SO 23.4 - VZT**

Místo: Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 037 139,48

D D1 Vzduchotechnika 1 037 139,48

D D2 Zař.č.1 - Větrání tříd a připraven 613 825,96

0	M	1.1	Kompaktní vzduchotechnická rekuperační jednotka ve stojanovém provedení, se stěnovými panely o tloušťce 40mm, vyrobené z Alu-Zinc plechu s odolností C4 proti korozi. Panely jsou uvnitř vyplněné zvukovou a tepelnou izolací z nehořlavé minerální vlny s odol	ks	1,000	295 819,60	295 819,60	
0	M	1.1.1	Směšovací uzel, 0-10V, 24V	ks	1,000	17 498,43	17 498,43	
0	M	1.1.2	Klapka uzavírací, těsná, se servem 24V	ks	2,000	6 142,12	12 284,24	
0	M	1.1.3	Pružná manžeta	ks	2,000	673,73	1 347,46	
0	M	1.1.4	Hlásič kouře včetně patice a adaptéru pro VZT potrubí	ks	1,000	8 169,39	8 169,39	
0	M	1.1.5	Sada pro VAV	ks	1,000	7 156,81	7 156,81	
0	M	1.2	Buňka tlumiče 500x200/500 atyp	ks	16,000	529,04	8 464,64	
0	M	1.3	Protidešťová žaluzie z pozink plechu 600x700, barva dle fasády RAL 8000 (hnědá)	ks	1,000	3 154,38	3 154,38	
0	M	1.4	Výfuková hlavice z pozink plechu o400	ks	1,000	2 571,12	2 571,12	
0	M	1.5	Regulátor variabilního průtoku vzduchu VAV o225, MP-Bus	ks	8,000	8 805,29	70 442,32	
0	M	1.5.1	Tlumič hluku pro kruhové potrubí o225/600 atyp	ks	8,000	1 453,00	11 624,00	
0	M	1.5.2	Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACnet	ks	4,000	3 855,09	15 420,36	
0	M	1.5.3	Čidlo CO2 s displejem na stěnu, 0-10V	ks	4,000	7 960,16	31 840,64	
0	M	1.5.4	Prokabelování	kpl	4,000	1 150,08	4 600,32	
0	M	1.6	Dýza s dlouhým dosahem o200, ručně nastavitelný směr proudu vzduchu	ks	8,000	1 580,23	12 641,84	
0	M	1.7	Výúst' s vířivým výtokem vzduchu 600x600/48 s vodorovným připojením o250 s regulační klapkou - odvodní	ks	4,000	1 994,64	7 978,56	
0	M	1.8	Ohebná Al laminátová hadice o250 á10bm/bal	ks	1,000	1 015,75	1 015,75	
0	M	1.9	Stěnová Al mřížka SM12,5-800x300	ks	8,000	989,56	7 916,48	
0	M	1.10	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o400/20% tvarovek	bm	2,000	494,53	989,06	
0	M	1.10.1	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o315/20% tvarovek	bm	46,000	405,40	18 648,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	1.10.3	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o225/20% tvarovek	bm	111,000	290,40	32 234,40	
0	M	1.10.4	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o200/30% tvarovek	bm	12,000	316,27	3 795,24	
0	M	1.11	Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu	m2	22,000	452,84	9 962,48	
0	M	1.12	Akustická izolace vzduchotechnického potrubí z minerální vlny tl. 60mm s Al polepem	m2	40,000	460,03	18 401,20	
0	M	1.13	Požární klapka pro SPIRO potrubí o315 s teplotním a mechanickým ovládáním	ks	4,000	2 462,21	9 848,84	

D	D3	Zař.č.2 - Větrání soc. zařízení					196 460,09	
0	M	2.1	Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí o250mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.02.4.6.6 - Tabulka zařízení.	ks	5,000	15 022,80	75 114,00	
0	M	2.2	Střešní ventilátor s připojením na kruhové potrubí o200mm, včetně montážního podstavce a zpětné klapky. Technické parametry jsou popsány v dokumentu D.1.02.4.6.6 - Tabulka zařízení.	ks	1,000	8 983,84	8 983,84	
0	M	2.3	Neobsazeno		0,000	0,00	0,00	
0	M	2.4	Talířový ventil odvodní o160mm	ks	34,000	84,71	2 880,14	
0	M	2.5	Talířový ventil odvodní o100mm	ks	11,000	43,05	473,55	
0	M	2.6	Protipožární větrací mřížka EI45 600x304	ks	6,000	7 891,91	47 351,46	
0	M	2.7	Protipožární větrací mřížka EI45 300x106	ks	2,000	4 532,53	9 065,06	
0	M	2.8	Stěnová Al mřížka SM12,5-600x300	ks	24,000	813,13	19 515,12	
0	M	2.9	Stěnová Al mřížka SM12,5-600x200	ks	8,000	659,71	5 277,68	
0	M	2.10	Stěnová Al mřížka SM12,5-300x100	ks	4,000	360,54	1 442,16	
0	M	2.11	Ohebná Al laminátová hadice o160 á10bm/bal	ks	7,000	611,04	4 277,28	
0	M	2.12	Ohebná Al laminátová hadice o100 á10bm/bal	ks	3,000	380,91	1 142,73	
0	M	2.13	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o250/100% tvarovek	bm	3,000	728,86	2 186,58	
0	M	2.13.1	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o200/20% tvarovek	bm	43,000	263,08	11 312,44	
0	M	2.13.2	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o160/30% tvarovek	bm	15,000	273,14	4 097,10	
0	M	2.13.3	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o125/20% tvarovek	bm	3,000	185,45	556,35	
0	M	2.13.4	Kruhové potrubí SPIRO z pozink plechu: - o100/30% tvarovek	bm	13,000	214,20	2 784,60	

D	D4	Ostatní					213 627,50	
0	K	Pol75	Montáž VZT	kpl	1,000	161 011,32	161 011,32	
0	K	Pol66	Zkoušky a protokoly	kpl	1,000	20 701,45	20 701,45	
0	K	Pol67	Naprogramování zařízení a uvedení do provozu	kpl	1,000	19 838,89	19 838,89	
0	K	Pol68	Zaškolení obsluhy	kpl	1,000	2 875,20	2 875,20	
0	K	Pol69	Měření průtočných množství	kpl	1,000	5 175,36	5 175,36	
0	K	Pol76	Doprava	kpl	1,000	4 025,28	4 025,28	

D	D6	Měření hluku					13 225,93	
0	K	Pol77	Měření hluku od vzduchotechniky	kpl	1,000	13 225,93	13 225,93	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.5 - Slaboproud

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

791 975,55

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	791 975,55	21,00%	166 314,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

958 290,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.5 - Slaboproud

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

791 975,55

D1 - Telekomunikační a datové rozvody

151 829,03

D2 - Evakuační rozhlas

259 904,54

D3 - Elektrická zabezpečovací signalizace

154 929,83

D4 - Společní televizní anténa

33 310,49

D5 - Společné kabelové trasy

185 101,18

D6 - Požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru

6 900,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.5 - Slaboproud

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

791 975,55

D D1 Telekomunikační a datové rozvody 151 829,03

1	K	Pol1	Zásuvka 1xRJ-45 nestíněná - Cat.5e, včetně rámečku, design dle standardu silnoproud	ks	4,000	261,21	1 044,84	
1	K	Pol2	Dvojzásuvka 2xRJ-45 nestíněná - Cat.5e, včetně rámečku, design dle standardu silnoproud	ks	19,000	357,47	6 791,93	
1	K	Pol3	IP dveřní komunikátor s klávesnicí ve verzi pro VoIP sítě, spínač na ovládání elektrického zámku	ks	1,000	23 323,96	23 323,96	
1	K	Pol4	VoIP telefonní přístroj s displejem (PoE)	ks	9,000	1 832,38	16 491,42	
2	K	Pol5	Instalační krabice KO68	ks	23,000	68,56	1 576,88	
2	K	Pol6	Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.5e, b2ca s1 d0	m	4 000,000	6,33	25 320,00	
2	K	Pol7	Instalace kabelu UTP4x2x0,5 Cat.5e	m	4 000,000	19,32	77 280,00	

D D2 Evakuační rozhlas 259 904,54

2	K	Pol52	Ústředna evakuačního rozhlasu dle ČSN EN 60849 a ČSN EN 54-16, 100V systém včetně řídící jednotky, Ethernet rozhraní do nadstavby, zesilovače, záložního zesilovače, celkový výkon 500W a napájecího zdroje. konstrukční provedení do 19" rozvaděče.	kpl.	1,000	126 278,87	126 278,87	
2	K	Pol53	Stanice hlasatele v konfiguraci podle výstavby systému	ks	1,000	13 329,32	13 329,32	
2	K	Pol54	Systémový kabel pro napojení mikrofonní stanice P60-R kabel funkční při požáru dle ČSN 73 0848 a dle ZP27/2008	ks	1,000	4 029,88	4 029,88	
2	K	Pol55	Stojanový rozvaděč, výška 27U, šířka 600mm, hloubka 900mm,prosklené dveře se zámkem, ventilační jednotka, rozvodný napájecí panel 8x230V, včetně montážního příslušenství	ks	1,000	27 601,94	27 601,94	
2	K	Pol56	Reproduktor evakuační do podhledu 6/2,5W 100V, včetně montážního materiálu, keramické svorkovnice s tepelnou pojistkou-certifikace EN54-24	ks	28,000	1 308,33	36 633,24	
3	K	Pol57	Reproduktor evakuační nástěnný 6/2,5W 100V, včetně montážního materiálu, keramické svorkovnice s tepelnou pojistkou-certifikace EN54-24	ks	22,000	1 311,09	28 843,98	
3	K	Pol58	Kabel UTP 4x2x0,5 Cat.6, b2ca s1 d0 včetně instalace	m	5,000	27,54	137,70	
3	K	Pol59	Kabel 2x2,5, B2ca, s1, d0, P60-R kabel s funkční integritou při požáru dle ČSN 73 0848 a dle ZP27/2008 včetně instalace	m	300,000	48,08	14 424,00	
3	K	Pol60	Oživení systému, programování ústředny, návazností, zkoušky atd., zaškolení obsluhy	kpl.	1,000	8 625,61	8 625,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D3			Elektrická zabezpečovací signalizace	154 929,83				
3	K	Pol8	Expander (koncentrátor), tamper kontakt, plastový box na povrch	ks	10,000	3 075,32	30 753,20	
3	K	Pol9	Prostorový duální PIR+MW detektor	ks	9,000	1 075,38	9 678,42	
3	K	Pol10	Bezdotyková LED klávesnice pro ovládání a programování systému	ks	1,000	4 027,80	4 027,80	
3	K	Pol11	Vnitřní akustická a optická signalizace	ks	1,000	790,11	790,11	
4	K	Pol12	Požární hlásič opticko kouřový	ks	14,000	1 182,20	16 550,80	
4	K	Pol13	Dveřní a okenní magnetický kontakt (dodávka v rámci oken a dveří)	ks	51,000	140,77	7 179,27	
4	K	Pol14	Propojovací krabice s tamper kontaktem a krabicí KO68	ks	31,000	367,11	11 380,41	
4	K	Pol61	Systémový napájecí zdroj 14V/5A se záložním akumulátorem	ks	2,000	5 611,31	11 222,62	
4	K	Pol16	Kabel J-H(St)-H 4x2x0,6mm s pláštěm LSOH	m	800,000	68,88	55 104,00	
3	K	Pol62	Kabel S/FTP4x2x0,5 Cat.6, b2ca s1 d0 včetně instalace	m	280,000	29,44	8 243,20	
D D4			Společní televizní anténa	33 310,49				
4	K	Pol63	Vedlejší stanice STA , oceloplechový nástěnný rozváděč 350x350x180mm, Komaxit, uzávěr s vložkovým zámkem vystrojený anténním rozbočovačem pro napojení 8 kocových zásuvek	ks	1,000	3 523,85	3 523,85	
4	K	Pol18	Koaxiální kabel 75 ohmů, v dig. kvalitě	m	800,000	31,85	25 480,00	
4	K	Pol19	Účastnická zásuvka TV+R+SAT včetně přístrojové krabice a rámečku	ks	8,000	469,77	3 758,16	
4	K	Pol5	Instalační krabice KO68	ks	8,000	68,56	548,48	
D D5			Společné kabelové trasy	185 101,18				
5	K	Pol20	Trubka instalační ohebná průměr 30 bezhalogenová včetně upevňovacího materiálu pro vysokou mechanickou zátěž, instalace do podlahy	m	50,000	51,05	2 552,50	
5	K	Pol21	Elektroinstalační trubka ohebná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 30mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vnitřní instalaci do stěn pod omítku nebo na povrchu stěn upevněna příchytkami	m	3 000,000	33,92	101 760,00	
5	K	Pol22	Elektroinstalační trubka pevná pro vnitřní kabelové rozvody, průměr 50mm, mech. odolnost 320N/5cm, teplotně stálý materiál, pro vertikální SLB trasy mezi podlažími	m	20,000	88,06	1 761,20	
4	K	Pol23	Kabelový prostup v podlaze, stropu do průměru 100 mm pro vertikální trasy SLB systémů	kpl.	1,000	6 900,48	6 900,48	
5	K	Pol24	Kabelová příchytka nylonová pro hlavní horizontální trasy v mezistropním prostoru, včetně upevňovacího a vázacího materiálu (hmoždinky, šrouby, vázací pásy).	ks	1 000,000	18,75	18 750,00	
6	K	Pol25	Kabelový žlab drátěný 150x50 mm včetně upevňovacího materiálu pro hlavní horizontální trasy SLB v chodbách a spojovacích mostech nad SDK podhledy.	m	100,000	319,48	31 948,00	
6	K	Pol64	Kabelová příchytka ohniodolná, pro upevnění jednoho systémového kabelu, V180 P90-R, E90, Včetně kotevního systému do betonu, pevného zdiva, funkční při požáru. Určeno pro instalaci na zeď a na strop.	ks	900,000	23,81	21 429,00	
D D6			Požárně bezpečnostní zařízení pro omezení šíření požáru	6 900,48				
6	K	Pol26	Certifikovaný systém požárních ucpávek splňující podmínky vyhlášky č.246/2001Sb.	kpl	1,000	6 900,48	6 900,48	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.6 - Silnoprúd

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 711 199,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 711 199,08	21,00%	359 351,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 070 550,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.6 - Silnoprúd

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 711 199,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.6 - Silnoproud

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 711 199,08

0	M	001	SVÍTIDLO 2 - stopní LED vestavěné svítidlo downlight 25W vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z hliníkového profilu, opálový difuzor, 230 x 100 (pr. x v), montážní otvor 200mm (pr.), 25W LED, 4000K, 2350lm, Ra>80, IP44, životnost>30000hod., vyzařovací úh	ks	11,000	883,50	9 718,50	
0	M	002	SVÍTIDLO 3 - stropní LED panel vestavěný 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, mikroprismatický optický kryt pro nízké oslnění UGR<19, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 3800lm, Ra>80, IP20, třída ochrany II, životnost>40000hod.	ks	72,000	1 305,30	93 981,60	
0	M	003	SVÍTIDLO 4 - stropní LED panel vestavěný 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, mikroprismatický optický kryt, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 4230lm, Ra>80, IP20, třída ochrany II, životnost>40000hod., vyzařovací úhel 120°, n	ks	13,000	1 297,41	16 866,33	
0	M	004	SVÍTIDLO 4.1 - stropní LED panel přisazený na strop 40W vestavné svítidlo, těleso z hliníkového profilu, mikroprismatický optický kryt, 595 x 595 x 10 mm (š x h x v), 40W LED, 4000K, 4230lm, Ra>80, IP20, třída ochrany II, životnost>40000hod., vyzařovací ú	ks	12,000	1 595,83	19 149,96	
0	M	005	SVÍTIDLO 5 - stopní LED vestavěné svítidlo downlight 21W vestavné kruhové svítidlo LED, těleso z hliníkového profilu, opálový difuzor, 225 x 25 (pr. x v), montážní otvor 210mm (pr.), 21W LED, 4000K, 1600lm, Ra>80, IP20, životnost>50000hod., vyzařovací úhe	ks	204,000	836,87	170 721,48	
0	M	006	SVÍTIDLO 7 - stropní přisazené, zavěšené LED svítidlo 60W přisazené/zavěšené svítidlo, těleso ze světlešedého plastu, opálový difusor z optického polykarbonátu, 1609 x 63 x 75 (š x h x v), 60W LED, 6500lm, 4000K, Ra>80, IP66, třída ochrany I, životnost>5	ks	2,000	1 516,20	3 032,40	
0	M	007	N1 - nouzové svítidlo nástěnné, stropní LED nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na stěnu nebo strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso bílý polykarbonát v barvě RAL 9003, optika transparentní polykarbonátové čočky, optická část vyrobena z met	ks	29,000	2 277,82	66 056,78	
0	M	008	N1 IP66 - nouzové svítidlo nástěnné, stropní LED, IP66 nouzové svítidlo LED jednostranné přisazené na stěnu nebo strop, vestavné do zdi nebo do stropu, těleso bílý polykarbonát v barvě RAL 9003, optika transparentní polykarbonátové čočky, optická část vyr	ks	1,000	2 504,30	2 504,30	
0	M	009	N2 - nouzové svítidlo stropní oboustranné LED nouzové LED svítidlo oboustranné přisazené na strop, vestavné do stropu, těleso polykarbonát v bílé barvě RAL 9003, vybaveno plastovou signalizační prosvětlenou tabulkou z opálového polykarbonátu a zajišťuje v	ks	10,000	3 518,84	35 188,40	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M		010	SVÍTIDLO NA - stropní vestavěné nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní vestavěné, svítí při výpadku napájení, 24W, 180 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003, optický kryt z vysoce průhledného PMMA, 90 x 40 (pr. X	ks	32,000	2 732,83	87 450,56	
0	M		011	SVÍTIDLO NB - stropní vestavěné nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní vestavěné, svítí při výpadku napájení, 24W, 180 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003, optický kryt z vysoce průhledného PMMA, 90 x 40 (pr. X	ks	16,000	2 732,83	43 725,28	
0	M		012	SVÍTIDLO NA.1 - stropní přisazené nouzové LED svítidlo 24W nouzové svítidlo LED stropní přisazené, svítí při výpadku napájení, 24W, 250 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003,transparentní polykarbonátové čočky, 213 x 83 x 20 (š	ks	2,000	2 128,20	4 256,40	
0	M		013	SVÍTIDLO NB.1 - stropní přisazené nouzové LED svítidlo 36W nouzové svítidlo LED stropní přisazené, svítí při výpadku napájení, 36W, 450 lm v nouzovém režimu, těleso z polykarbonátu bílé barvy RAL 9003,transparentní polykarbonátové čočky, 213 x 83 x 20 (š	ks	4,000	2 240,93	8 963,72	
0	M		014	Reflektorové LED svítidlo 20W s infrapasivním čidlem pohybu PIR nástěnné LED svítidlo reflektor 20W s infrapasivním čidlem pohybu PIR, hliníková slitina práškově lakovaná, difuzor sklo, LED 20W neutrální bílá 4000K, 1500lm, 230V, zvýšené krytí IP54, d=180	ks	2,000	995,40	1 990,80	
0	M		015	ROZVADĚČ RPB1 Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x1055x250mm, jmenovitý proud 63A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 6kA, kompletní do	ks	1,000	48 064,22	48 064,22	
0	M		016	ROZVADĚČ RPB2 Oceloplechový-plastový, zapuštěný, IP 30/20, zaměnitelné dveře levé/pravé provedení, zámek cylindrická vložka, přívody horem, vývody horem, rozměry: 590x1195x250mm, jmenovitý proud 125A, zkratová odolnost rozvaděče Ik"= max. 10kA, kompletní	ks	1,000	61 884,88	61 884,88	
0	M		017	JEDNOPÓLOVÝ VYPÍNAČ Jednopólový vypínač 10A/230V, řazení 1, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	25,000	179,02	4 475,50	
0	M		018	TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ ZAPÍNAČÍ S ORIENTAČNÍ DOUTNAVKOU Tlačítkový ovladač zapínací 10A/230V s orientační doutnavkou 230V, řazení 1/0, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svisl	ks	22,000	226,06	4 973,32	
0	M		019	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	14,000	184,04	2 576,56	
0	M		020	SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ, IP44 Sériový přepínač 10A/230V, řazení 6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů), krytí IP44	ks	8,000	203,21	1 625,68	
0	M		021	DVOJITÝ SÉRIOVÝ PŘEPÍNAČ Dvojitý sériový přepínač 10A/230V, řazení 6+6, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	32,000	255,78	8 184,96	
0	M		022	KŘÍŽOVÝ PŘEPÍNAČ Křížový přepínač 10A/230V, řazení 7, pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístrojů)	ks	16,000	222,06	3 552,96	
0	M		023	INFRAPASIVNÍ ČIDLO POHYBU STROPNÍ Stropní infrapasivní čidlo pohybu pro spínání osvětlení, 230V, třívodičové zapojení, indukční spínaná zátěž 600VA, detekční úhel 360°, nastavitelný čas sepnutí 5s - 10 min., detekční vzdálenost 6m, montážní výška méně jak	ks	3,000	1 346,20	4 038,60	
0	M		024	JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svislé/vodorovné vícerámečky dle počtu přístř	ks	41,000	189,60	7 773,60	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	025	JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, IP44 Jednofázová zásuvka 16A/230V s ochranným kolíkem, ochrannými clonkami a víčkem pod omítku do instalační krabice, kompletní vč. krytu a rámečku (při umístění více přístrojů vedle sebe budou použity svíslé/vodorovné vícerámečky dl	ks	27,000	306,52	8 276,04	
0	M	026	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku	ks	45,000	480,74	21 633,30	
0	M	027	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pro PC, pod omítku do dvounásobné instalační krabice, kompletní vč. krytů a vodorovného dvourámečku, vybaveny popisovým pol	ks	1,000	490,96	490,96	
0	M	028	DVĚ JEDNOFÁZOVÉ ZÁSUVKY VE VODOROVNÉM DVOURÁMEČKU PRO PC S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU Dvě jednofázové zásuvky 16A/230V s ochranným kolíkem a ochrannými clonkami pro PC, z toho jedna vybavena vestavěným 3. st. přepětové ochrany se světelnou signalizací, pod omítk	ks	14,000	1 676,97	23 477,58	
0	M	029	1-CYKY-J 5x50mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	70,000	529,15	37 040,50	
0	M	030	1-CYKY-J 5x16mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	31,000	193,73	6 005,63	
0	M	031	1-CYKY-J 5x4mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	38,000	64,56	2 453,28	
0	M	032	1-CYKY-J 5x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	17,000	43,24	735,08	
0	M	033	1-CYKY-J 5x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	110,000	31,98	3 517,80	
0	M	034	1-CYKY-J 3x2,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá	m	2 150,000	31,78	68 327,00	
0	M	035	1-CYKY-J 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá	m	2 350,000	25,55	60 042,50	
0	M	036	1-CYKY-O 3x1,5mm2 Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, hnědá, šedá	m	1 350,000	25,55	34 492,50	
0	M	037	1-CXKH-V-O 3x1,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 HFFR vícežilový kabel s funkční integritou kabelové trasy, měděné jádro, přídatná izolace ze skloslídových pásek, izolace žil zesílená bezhalogenová izolace, HFFR výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil če	m	40,000	42,19	1 687,60	
0	M	038	1-CXKH-V-J 3x1,5mm2, P60-R, B2ca s1 d0 HFFR vícežilový kabel s funkční integritou kabelové trasy, měděné jádro, přídatná izolace ze skloslídových pásek, izolace žil zesílená bezhalogenová izolace, HFFR výplň a plášť HFFR, barva izolace jednotlivých žil če	m	160,000	42,19	6 750,40	
0	M	039	H07V-K 1x4mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá	m	310,000	23,60	7 316,00	
0	M	040	H07V-K 1x6mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá	m	30,000	27,80	834,00	
0	M	041	H07V-K 1x25mm2 Celoplastový jednožilový kabel, měděné jádro z jemných drátků, PVC izolace, barva izolace zelenožlutá	m	155,000	71,08	11 017,40	
0	M	042	UKONČENÍ KABELŮ Ukončení kabelů (kabelová oka, návlečky, izolace, atd.) - komplet	ks	1,000	4 658,13	4 658,13	
0	M	043	ZNAČENÍ KABELŮ Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového	ks	130,000	10,71	1 392,30	
0	M	044	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 500/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	2,000	552,64	1 105,28	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	045	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 300/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	10,000	361,70	3 617,00	
0	M	046	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 200/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	5,000	293,03	1 465,15	
0	M	047	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 100/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	135,000	228,46	30 842,10	
0	M	048	KABELOVÉ ŽLABY DRÁTĚNÉ 50/50 Kabelové žlaby drátěné, pozinkované vč. příslušenství pro montáž (nosný a upevňovací materiál, kovové hmoždinky, oblouky, T-kusy, křížení, spojky, příchytky, ochranné kryty, přepážky, kabelové příchytky s podélnými opěrkami,	m	5,000	201,60	1 008,00	
0	M	049	PŘÍSTROJOVÉ KRABICE Elektroinstalační krabice pod omítku Č73x42, 66mm, do dutých příček, univerzální, spojovatelné do souvislé řady, vč. veškerého příslušenství pro montáž	ks	310,000	69,28	21 476,80	
0	M	050	ROZVODNÉ KRABICE POD OMÍTKU Elektroinstalační krabice pod omítku Č73x42mm, do dutých příček, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (víčko, trnů, atd.)	ks	75,000	159,75	11 981,25	
0	M	051	ROZVODNÉ KRABICE VELKÉ POD OMÍTKU Elektroinstalační krabice pod omítku Č103x50mm, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (víčko, trnů, atd.)	ks	40,000	162,66	6 506,40	
0	M	052	ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH Elektroinstalační krabice na povrch 85x85x40mm, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásy, atd.), krytí IP54	ks	110,000	94,71	10 418,10	
0	M	053	ROZVODNÉ KRABICE NA POVRCH VELKÉ Elektroinstalační krabice na povrch 105x105x40mm, univerzální, vč. bezšroubových svorek 2-5 x 2,5mm2 a veškerého příslušenství pro montáž (kovové hmoždinky, spojovací materiál, vázací pásy, atd.), krytí IP54	ks	55,000	103,29	5 680,95	
0	M	054	OHEBNÉ TRUBKY PRŮMĚR 25 Ohebná trubka PVC průměru 25mm, bezhalogenové, samozhášivé, střední mechanická odolnost 750N/5cm, vč. příslušenství pro montáž (spojky, příchytky, ohyby, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)	m	80,000	46,89	3 751,20	
0	M	055	PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 40/20 Plastová vkladací lišta hranatá, rozměry 40x20mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž (kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, up	m	25,000	70,65	1 766,25	
0	M	056	PLASTOVÁ VKLÁDACÍ LIŠTA 20/20 Plastová vkladací lišta hranatá, rozměry 20x20mm, pro montáž na stěnu nebo strop, dvojitý zámek víka vč. veškerého příslušenství pro montáž (kryty ohybové, spojovací, koncové, odbočné, rohy, průchodkové, kovové hmoždinky, up	m	40,000	59,68	2 387,20	
0	M	057	SVORKY K OCHRANNÉMU POSPOJOVÁNÍ Svorka k ochrannému pospojování kompletní vč. veškerého příslušenství	ks	30,000	561,21	16 836,30	
0	M	058	KABELOVÉ PŘÍCHYTKY Plastové kabelové příchytky pro kabelové svazky průměru max. 50mm s uchycením šroubem do betonu, vč. příslušenství pro montáž (vázací pásy dle průměru kabelových svazků, kovové hmoždinky, upevňovací materiál, atd.)	ks	1 000,000	37,73	37 730,00	
0	M	059	VÁZACÍ PÁSKY Plastová vázací páska pro vázání a uchycení kabelů, černá, délka 300mm, šířka 7,6mm, zatížitelnost 55kg	ks	400,000	2,42	968,00	
0	M	060	ZEMNÍCÍ PÁSEK Zemnicí pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. svorek pro spojení dvou pásků, ochrany spojů proti korozi	m	165,000	69,87	11 528,55	
0	M	061	ZEMNÍCÍ DRÁT Zemnicí drát FeZn průměru 10mm, pozinkovaný, potažený PVC	m	70,000	120,54	8 437,80	
0	M	062	DRÁT AlMgSi Drát AlMgSi průměru 8mm vč. podpěr svodového drátu na střeše pro daný typ střešní krytiny, kompletní vč. příslušenství pro montáž	m	190,000	81,28	15 443,20	
0	M	063	OCHRANNÁ TRUBKA Ochranná trubka svodu u země před mechanickým poškozením, délka 1,7m, nerez	ks	14,000	418,77	5 862,78	
0	M	064	DRŽÁK OCHRANNÉ TRUBKY Držák ochranné trubky pro připevnění k objektu, nerez, délka a provedení dle stavby, kompletní	ks	28,000	167,23	4 682,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	065	PODPĚRA SVODOVÉHO DRÁTU Podpěra svodového drátu do zdi, nerez, délka a provedení dle stavby, kompletní vč. příslušenství pro montáž	ks	280,000	97,45	27 286,00	
0	M	066	PODPĚRA SVODOVÉHO DRÁTU Podpěra svodového drátu na střeše, nerez, délka a provedení dle konkrétní střešní krytiny, kompletní vč. příslušenství pro montáž	ks	180,000	100,52	18 093,60	
0	M	067	JÍMACÍ TYČ Jímací tyč s rovným koncem AlMgSi, délka 1m vč. držáků a příslušenství pro montáž a připojení, kompletní	ks	8,000	628,94	5 031,52	
0	M	068	SPOJOVACÍ SVORKA Nerez Spojovací svorka pro spojení dvou vodičů, nerez	ks	55,000	63,72	3 504,60	
0	M	069	UNIVERZÁLNÍ SVORKA Nerez Univerzální svorka SU, SP, SK, SO, nerez	ks	90,000	75,00	6 750,00	
0	M	070	ZKUŠEBNÍ SVORKA SZ Zkušební svorka pro spojení nadzemních částí hromosvodu s uzemněním, nerez	ks	14,000	92,42	1 293,88	
0	M	071	SPOJOVACÍ SVORKA SR Spojovací svorka pro spojení pásek/vodič, pásek/pásek, pozinkovaná	ks	105,000	59,62	6 260,10	
0	M	072	OCHRANA PROTI KOROZI Ochrana podzemních částí a spojů uzemnění proti korozi	m2	2,000	295,79	591,58	
0	M	073	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, hmoždinky, příchytka, atd - komplet	ks	1,000	2 794,88	2 794,88	
0	M	074	OCELOVÁ KONSTRUKCE Ocelová konstrukce všeobecně (závitové tyče, příčníky, výložníky, atd.)	kg	200,000	62,14	12 428,00	
0	M	075	POŽÁRNÍ UCPÁVKY Požární ucpávky kabelových tras při průchodu dělicími stěnami požárních úseků, provedení a materiál dle specifikace požární zprávy	m2	1,500	6 521,38	9 782,07	
0	M	076	OSTATNÍ Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, odstranění vad a nedodělků, atd.	hod.	80,000	326,07	26 085,60	
0	M	077	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE Strojní sekání drážek pro kabelové trasy ve zděných konstrukcích, na betonových nosných prvcích ručně dle statického posouzení objektu, rozměry max. 100x40mm, prostupy stěnami a stropy, atd. - komplet	m	400,000	65,96	26 384,00	
0	M	078	LIKVIDACE Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet	ks	1,000	4 658,13	4 658,13	
0	M	079	CENTRAL TEST NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ Připojení nových svítidel nouzového osvětlení na stávající bezdrátový systém central test v objektu školky realizovaný v rámci SO03 - Hospodářský pavilon - nastavení svítidel, doprogramování ústředny pro nová svítidla, nas	ks	1,000	11 597,52	11 597,52	
0	M	080	ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o shodě, certifikáty, atd.	hod.	18,000	512,39	9 223,02	
0	K	084	MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů	ks	1,000	325 035,04	325 035,04	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.7 - MaR

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

271 540,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	271 540,65	21,00%	57 023,54
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

328 564,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.7 - MaR

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

271 540,65

1 - ROZVADĚČE -

97 013,92

2 - ČIDLA A POHONY

30 751,42

3 - KABELY ,KABELOVÉ TRASY

28 958,36

4 - OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE

77 094,31

5 - INŽENÝRSKÁ ČINNOST

37 722,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.7 - MaR

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

271 540,65

D 1

ROZVADĚČE -

97 013,92

0	M	1-1	Rozváděč RMARH Nástěnný oceloplechový, IP 54, sestava 1 pole Rozměry (šxvxh): 800×1500×300 Přívody a vývody do rozvaděče horem. Kabelové průchodky dle dimenzí jednotlivých vývodů Ovládací prvky - přepínače, tlačítkové ovladače, signálky Přístrojová náplň	ks	1,000	97 013,92	97 013,92	
---	---	-----	--	----	-------	-----------	-----------	--

D 2

ČIDLA A POHONY

30 751,42

0	M	2-1	Prostorové teplotní čidlo Pt 1000, IP54, -20/+60°C,	ks	3,000	246,35	739,05	
0	M	2-2	Venkovní teplotní čidlo Pt 1000, IP54, -40/+60°C,	ks	1,000	298,67	298,67	
0	M	2-3	Čidlo teploty PT1000 s mosaznou jímkou G1/2, 150mm , -40..150°C, IP54	ks	2,000	569,41	1 138,82	
0	M	2-4	Čidlo teploty PT1000 příložené vč. příslušenství , -40..150°C, IP54	ks	4,000	442,49	1 769,96	
0	M	2-5	Čidlo tlaku 0..600kPa s odběrem a 3W ventilem 0-10V, 24V, IP54	ks	1,000	879,81	879,81	
0	M	2-6	Snímač zaplavení 24VDC, vyhodnocovací jednotka s relé výstupem na DIN lištu, sondy komplet	ks	1,000	1 068,68	1 068,68	
0	M	2-7	Přepínač 1-0-A se signálkou na rozvaděči	ks	11,000	1 171,91	12 891,01	
0	M	2-8	Ovládací tlačítko se signálkou na rozvaděči	ks	1,000	879,81	879,81	
0	M	2-9	Signální siréna do rozvaděče, 50 Hz, 230V, IP54, 80dB	ks	1,000	1 407,70	1 407,70	
0	M	2-10	Servisní vypínač jednofázový na omítku , 16A s možností uzamčení ve vypnuté poloze, IP54, pomocný kontakt Převezeno do souhrnu	ks	11,000	879,81	9 677,91	

D 3

KABELY ,KABELOVÉ TRASY

28 958,36

0	M	3-1	Kabel JYTY J-Y(St)Y 1x2x0,8	m	520,000	5,77	3 000,40	
0	M	3-2	Kabel JYTY J-Y(St)Y 2x2x0,8	m	205,000	8,20	1 681,00	
0	M	3-3	Kabel Ethernet cat 5E	m	10,000	6,77	67,70	
0	M	3-6	Kabel 1-CYKY-J 3x1,5mm2	m	245,000	10,38	2 543,10	
0	M	3-7	Kabel 1-CYKY-J 5x2,5mm2	m	15,000	27,77	416,55	
0	M	3-9	Kabel CY6mm2	m	100,000	12,92	1 292,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	3-10	Oceloplechový žlab 60/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž (konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd.)	m	30,000	221,36	6 640,80	
0	M	3-11	Oceloplechový žlab 100/50mm, galvanizovaný, včetně víka a příslušenství pro montáž (konzole pro montáž na stěnu, spojky, nosníky,šrouby, úchyty, závěsy a výložníky po 1,5m, atd.)	m	5,000	267,19	1 335,95	
0	M	3-12	Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, pevná, vč. příchytěk a montážního příslušenství	m	45,000	25,81	1 161,45	
0	M	3-13	Instalační trubka PVC, prům 16-32mm, ohebná, vč. příchytěk a montážního příslušenství	m	60,000	14,08	844,80	
0	M	3-14	Požární ucpávky komplet	ks	1,000	2 932,71	2 932,71	
0	M	3-15	Ocelové nosné konstrukce	ks	1,000	1 759,62	1 759,62	
0	M	3-16	Propojení ukazatele hladiny s ŘJ hladiny kabelem TCEKFY 2Px1,0	m	120,000	29,89	3 586,80	
0	M	3-17	Propojení dálkového ovladače lapolu tuků kabelem JYTY 7x1	m	30,000	18,18	545,40	
0	M	3-18	Zapojení položek 3-16 a 3-17 dle požadavku dodavatele ZTI Převedeno do souhrnu	ks	1,000	1 150,08	1 150,08	

D		4	OSTATNÍ MATERIÁL A MONTÁŽNÍ PRÁCE	77 094,31				
0	M	4-1	Instalační a přístrojové krabice, drobný montážní materiál	ks	1,000	11 395,32	11 395,32	
0	K	4-2	Montáž, kompletace, oživení	ks	1,000	51 426,49	51 426,49	
0	K	4-3	Stavební připomocné práce, stavební připravenost	ks	1,000	4 887,84	4 887,84	
0	M	4-4	Drobný nespecifikovaný a montážní materiál Převedeno do souhrnu	ks	1,000	9 384,66	9 384,66	

D		5	INŽENÝRSKÁ ČINNOST	37 722,64				
0	K	5-4	Provozní zkoušky	ks	1,000	4 600,32	4 600,32	
0	K	5-5	Výchozí revize elektro	ks	1,000	6 440,45	6 440,45	
0	K	5-6	Software pro DDC a PLC regulátory	ks	1,000	18 401,29	18 401,29	
0	K	5-7	Oživení systému	ks	1,000	4 600,32	4 600,32	
0	K	5-8	Zaučení obsluhy Převedeno do souhrnu	ks	1,000	3 680,26	3 680,26	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.8 - Gastro

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

605 803,39

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	605 803,39	21,00%	127 218,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

733 022,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 23 - Pavilon B

Soupis:

SO 23.8 - Gastro

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

605 803,39

D1 - Pavilon B - 1.NP

308 918,00

D2 - Výdejní kuchyňka 1.

164 070,70

D3 - Výdejní kuchyňka 2.

144 847,30

D4 - Pavilon B - 2.NP

296 885,39

D5 - Výdejní kuchyňka I.

152 831,64

D6 - Výdejní kuchyňka II.

144 053,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt: SO 23 - Pavilon B

Soupis: SO 23.8 - Gastro

Místo: Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38 Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

605 803,39

D D1 Pavilon B - 1.NP

308 918,00

D D2 Výdejní kuchyňka 1.

164 070,70

0	K	Pol52	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, 1x plná police, prolomená pracovní deska, 1x otvor vlevo pro stojánkovou vodovodní baterii, částečná kapotáž dřezu z čela, vpravo ve spodním prostoru stolu místo pro umístění podstolové myčky,	ks	1,000	19 128,62	19 128,62	
0	K	Pol53	Stojánková, vodovodní baterie, pákové ovládání	ks	1,000	3 533,52	3 533,52	
0	K	Pol54	Podstolová profesionální myčka, dvouplášťové provedení, čelní zakládání, velikost koše 400x400mm, pracovní výkon 20 košu za hod, mycí cykly 180", spotřeba vody 2,75 lt , objem mycí vany 10 litrů, magnetický spínač dvířek, zásuvná výška 320 mm, součástí m	ks	1,000	37 920,94	37 920,94	
0	K	Pol55	Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x kolečko, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +	ks	1,000	28 490,28	28 490,28	
0	K	Pol56	Pracovní stůl, 2x částečná police vlevo, vpravo úkos a prostor pro podstolovou chladničku, 6x noma, vysokově nastavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení - viz projektová dokumentace - DOMĚREK	ks	1,000	18 139,55	18 139,55	
0	K	Pol57	Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1050x350	ks	1,000	6 983,77	6 983,77	
0	K	Pol58	Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1100x350	ks	1,000	7 213,78	7 213,78	
0	K	Q9	Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby	ks	1,000	5 639,54	5 639,54	
0	K	R7	Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610	ks	1,000	4 913,62	4 913,62	
0	K	Pol59	Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění odpadků 600x	ks	1,000	12 619,16	12 619,16	
0	K	Q12	Servírovací vozík, 2x plná police, obě police s prolisem, svařovaná, tuhá konstrukce zajišťující dostatečnou stabilitu a nosnost vozíku, pojízdný - 4x kolečko, každé o průměru 100mm, dvě kolečka opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení 700x500x850	ks	1,000	8 708,89	8 708,89	
0	K	Q13	Zmrazovací vana pro myčku nadopr, konvektomat, provedení automatické s objemovým řízením - ne časovým !!!, teplota vody max. 43°C, objem pryskyřice 10 lt, nastavení regenerace v rozsahu 0 až 99 m3	ks	1,000	10 779,03	10 779,03	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D3			Výdejní kuchyňka 2.	144 847,30				
0	K	Pol60	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, 1x plná police, prolomená pracovní deska, 1x otvor vlevo pro stojánkovou vodovodní baterii, částečná kapotáž dřezu z čela, vlevo ve spodním prostoru stolu místo pro umístění podstolové myčky,	ks	1,000	16 632,94	16 632,94	
0	K	R2	Vodovodní stojánková baterie, pákové ovládání	ks	1,000	3 533,52	3 533,52	
0	K	Pol54	Podstolová profesionální myčka, dvouplášťové provedení, čelní zakládání, velikost koše 400x400mm, pracovní výkon 20 košu za hod, mycí cykly 180" , spotřeba vody 2,75 lt , objem mycí vany 10 litrů, magnetický spínač dvířek, zásuvná výška 320 mm, součástí m	ks	1,000	37 920,94	37 920,94	
0	K	Pol55	Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x kolečko, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +	ks	1,000	28 490,28	28 490,28	
0	K	Pol61	Pracovní stůl, 2x částečná police vpravo, vlevo úkos a prostor pro podstolovou chladničku, 6x nopa, vysokově nastavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení - viz projektová dokumentace - DOMÉREK	ks	1,000	17 679,52	17 679,52	
0	K	Q7	Vypuštěno	ks	1,000	0,00	0,00	
0	K	Pol62	Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1700x350	ks	1,000	8 708,89	8 708,89	
0	K	Q9	Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby	ks	1,000	5 639,54	5 639,54	
0	K	R7	Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610	ks	1,000	4 913,62	4 913,62	
0	K	Pol59	Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění odpadků 600x	ks	1,000	12 619,16	12 619,16	
0	K	Q12	Servírovací vozík, 2x plná police, obě police s prolisem, svařovaná, tuhá konstrukce zajišťující dostatečnou stabilitu a nosnost vozíku, pojízdný - 4x kolečko, každé o průměru 100mm, dvě kolečka opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení 700x500x850	ks	1,000	8 708,89	8 708,89	

D D4 Pavilon B - 2.NP 296 885,39

D D5			Výdejní kuchyňka I.	152 831,64				
0	K	Pol52	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, 1x plná police, prolomená pracovní deska, 1x otvor vlevo pro stojánkovou vodovodní baterii, částečná kapotáž dřezu z čela, vpravo ve spodním prostoru stolu místo pro umístění podstolové myčky,	ks	1,000	19 128,62	19 128,62	
0	K	R2	Vodovodní stojánková baterie, pákové ovládání	ks	1,000	3 533,52	3 533,52	
0	K	Pol54	Podstolová profesionální myčka, dvouplášťové provedení, čelní zakládání, velikost koše 400x400mm, pracovní výkon 20 košu za hod, mycí cykly 180" , spotřeba vody 2,75 lt , objem mycí vany 10 litrů, magnetický spínač dvířek, zásuvná výška 320 mm, součástí m	ks	1,000	37 920,94	37 920,94	
0	K	Pol55	Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x kolečko, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +	ks	1,000	28 490,28	28 490,28	
0	K	Pol56	Pracovní stůl, 2x částečná police vlevo, vpravo úkos a prostor pro podstolovou chladničku, 6x nopa, vysokově nastavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení - viz projektová dokumentace - DOMÉREK	ks	1,000	17 679,52	17 679,52	
0	K	Pol57	Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1050x350	ks	1,000	6 983,77	6 983,77	
0	K	Pol58	Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1100x350	ks	1,000	7 213,78	7 213,78	
0	K	Q9	Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby	ks	1,000	5 639,54	5 639,54	
0	K	R7	Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610	ks	1,000	4 913,62	4 913,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	Pol59	Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění odpadků 600x	ks	1,000	12 619,16	12 619,16	
0	K	Q12	Servírovací vozík, 2x plná police, obě police s prolisem, svařovaná, tuhá konstrukce zajišťující dostatečnou stabilitu a nosnost vozíku, pojízdný - 4x kolečko, každé o průměru 100mm, dvě kolečka opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení 700x500x850	ks	1,000	8 708,89	8 708,89	

D D6 Výdejní kuchyňka II. 144 053,75

0	K	Pol60	Mycí stůl, 1x vevařený lisovaný dřez o rozměru 400x400x250mm, 1x plná police, prolomená pracovní deska, 1x otvor vlevo pro stojánkovou vodovodní baterii, částečná kapotáž dřezu z čela, vlevo ve spodním prostoru stolu místo pro umístění podstolové myčky,	ks	1,000	15 379,36	15 379,36	
0	K	R2	Vodovodní stojánková baterie, pákové ovládání	ks	1,000	3 533,52	3 533,52	
0	K	Pol54	Podstolová profesionální myčka, dvouplášťové provedení, čelní zakládání, velikost koše 400x400mm, pracovní výkon 20 košu za hod, mycí cykly 180" , spotřeba vody 2,75 lt , objem mycí vany 10 litrů, magnetický spínač dvířek, zásuvná výška 320 mm, součástí m	ks	1,000	37 920,94	37 920,94	
0	K	Pol55	Vyhřívaná výdejní vodní lázeň, dělená, pojízdná, kapacita 3x GN 1/1-200, nerezové provedení, pojízdná - 4x kolečko, každé o pr. 100 mm z toho 2x bržděná, každá vana disponuje samostatným topným tělesem, samostatným termostatem pro regulaci teploty až do +	ks	1,000	28 490,28	28 490,28	
0	K	Pol61	Pracovní stůl, 2x částečná police vpravo, vlevo úkos a prostor pro podstolovou chladničku, 6x police, vysoké nastavitelné nožičky, zadní lem, nerezové provedení - viz projektová dokumentace - DOMÉREK	ks	1,000	18 139,55	18 139,55	
0	K	Q7	Vypuštěno	ks	1,000	0,00	0,00	
0	K	Pol62	Nástěnná police dvoupatrová, celonerezové provedení, vč. konzol pro zavěšení police na zeď 1700x350	ks	1,000	8 708,89	8 708,89	
0	K	Q9	Keramické umyvadlo, vč. vodovodní baterie - dodávka stavby	ks	1,000	5 639,54	5 639,54	
0	K	R7	Odpadkový koš 50l, celonerezové provedení, pojízdné provedení - 4x kolečko, vč. víka 435x610	ks	1,000	4 913,62	4 913,62	
0	K	Pol59	Profesionální chladnička, čistý objem 130 lt, nerezové opláštění, 1x plné dveře, ventilované cirkulační chlazení, digitální termostat, automatické odtávání, integrovaný zámek dveří, teplotní rozsah -2°C až +8°C, chladnička určena k uskladnění odpadků 600x	ks	1,000	12 619,16	12 619,16	
0	K	Q12	Servírovací vozík, 2x plná police, obě police s prolisem, svařovaná, tuhá konstrukce zajišťující dostatečnou stabilitu a nosnost vozíku, pojízdný - 4x kolečko, každé o průměru 100mm, dvě kolečka opatřeny aretační brzdou, nerezové provedení 700x500x850	ks	1,000	8 708,89	8 708,89	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 24 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Uchazeč:

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Projektant:

IČ:

DIČ:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

404 411,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	404 411,58	21,00%	84 926,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

489 338,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 24 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

404 411,58

HSV - Práce a dodávky HSV

404 411,58

1 - Zemní práce

84 301,67

5 - Komunikace pozemní

204 536,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

95 790,12

997 - Přesun sutě

4 812,54

998 - Přesun hmot

14 971,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 24 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

404 411,58

D HSV Práce a dodávky HSV

404 411,58

D 1 Zemní práce

84 301,67

1	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	30,000	57,50	1 725,00	CS ÚRS 2020 02
2	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	5,000	138,01	690,05	CS ÚRS 2020 02
3	K	122151103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně	m3	79,200	238,64	18 900,29	CS ÚRS 2020 02
	VV		odkopávka pro nové konstrukce ploch					
	VV		155,0*0,43		66,650			
	VV		23,0*0,10		2,300			
	VV		30,0*0,30		9,000			
	VV		5,0*0,25		1,250			
	VV		Součet		79,200			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	79,200	299,02	23 682,38	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina na skládku					
	VV		79,20		79,200			
	VV		Součet		79,200			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	396,000	13,80	5 464,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		79,2*5 "Přepočtené koeficientem množství		396,000			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	126,720	253,02	32 062,69	CS ÚRS 2020 02
	VV		79,200*1,60		126,720			
	VV		Součet		126,720			
32	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	79,200	22,43	1 776,46	CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní

204 536,14

8	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm 0/32	m2	315,000	172,51	54 340,65	CS ÚRS 2020 02
	VV		dopravní plocha					
	VV		155,0*2		310,000			
	VV		chodník					
	VV		3,0		3,000			
	VV		varovný pás					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		315,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	30,000	230,02	6 900,60	CS ÚRS 2020 02
	VV		chodníkový přejezd					
	VV		30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
10	K	564911511	Podklad z R-materiálu tl 50 mm	m2	30,000	143,76	4 312,80	CS ÚRS 2020 02
	VV		chodníkový přejezd					
	VV		30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
11	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	30,000	34,50	1 035,00	CS ÚRS 2020 02
	VV		chodníkový přejezd					
	VV		30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
12	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	30,000	575,04	17 251,20	CS ÚRS 2020 02
	VV		chodníkový přejezd					
	VV		30,0		30,000			
	VV		Součet		30,000			
13	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,000	322,02	1 610,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		chodník					
	VV		3,0		3,000			
	VV		varovný pás					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Součet		5,000			
14	M	59245019	<i>dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x60mm přírodní</i>	m2	2,000	517,54	1 035,08	CS ÚRS 2020 02
15	M	5924501R	<i>dlažba zámková tl. 60 mm</i>	m2	3,000	322,02	966,06	
16	K	596212212	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	155,000	299,02	46 348,10	CS ÚRS 2020 02
	VV		dopravní plocha					
	VV		155,0		155,000			
	VV		Součet		155,000			
17	M	5924509R	<i>dlažba zámková tl. 80 mm</i>	m2	155,000	356,53	55 262,15	
18	K	596411111	Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 80 mm pl do 50 m2	m2	23,000	281,77	6 480,71	CS ÚRS 2020 02
19	M	59246016	<i>dlažba plošná betonová vegetační 600x400x80mm</i>	m2	23,000	391,03	8 993,69	CS ÚRS 2020 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							95 790,12	
20	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	81,000	391,03	31 673,43	CS ÚRS 2020 02
21	M	59217021	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x150x300mm</i>	m	81,000	189,76	15 370,56	CS ÚRS 2020 02
22	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	81,000	350,77	28 412,37	CS ÚRS 2020 02
	VV		3,0+78,0		81,000			
	VV		Součet		81,000			
23	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	3,000	143,76	431,28	CS ÚRS 2020 02
24	M	59217016	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm</i>	m	78,000	126,51	9 867,78	CS ÚRS 2020 02
25	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	442,78	2 213,90	CS ÚRS 2020 02
	VV		stávající obrubník					
	VV		5,0		5,000			
	VV		Součet		5,000			
26	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	80,000	97,76	7 820,80	CS ÚRS 2020 02
D 997 Přesun sutě							4 812,54	
27	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	7,650	172,51	1 319,70	CS ÚRS 2020 02
28	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	107,100	9,20	985,32	CS ÚRS 2020 02
	VV		7,65*14 "Přepočtené koeficientem množství		107,100			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,650	109,26	835,84	CS ÚRS 2020 02
30	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	7,650	218,52	1 671,68	CS ÚRS 2020 02
D 998			Přesun hmot				14 971,11	
31	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	86,784	172,51	14 971,11	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 25 - ZTI - venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Uchazeč:

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Projektant:

IČ:

DIČ:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

924 853,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	924 853,08	21,00%	194 219,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 119 072,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 25 - ZTI - venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

924 853,08

HSV - Práce a dodávky HSV

880 721,38

1 - Zemní práce

806 730,51

2 - Zakládání

6 166,60

998 - Přesun hmot

67 824,27

PSV - Práce a dodávky PSV

4 569,30

767 - Konstrukce zámečnické

4 569,30

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

39 562,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 25 - ZTI - venkovní kanalizace - areálový rozvod - zemní práce

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

924 853,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

880 721,38

D 1

Zemní práce

806 730,51

1	K	115101241	Čerpání vody na dopravní výšku do 50 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	40,000	427,72	17 108,80	CS ÚRS 2020 02
2	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	200,000	34,62	6 924,00	CS ÚRS 2020 02
3	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	200,000	18,86	3 772,00	CS ÚRS 2020 02
4	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	50,000	423,69	21 184,50	CS ÚRS 2020 02
5	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	50,000	202,18	10 109,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	44,200	209,77	9 271,83	CS ÚRS 2020 02
8	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	232,940	648,30	151 015,00	CS ÚRS 2020 02
10	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	350,230	326,97	114 514,70	CS ÚRS 2020 02
11	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	350,230	172,86	60 540,76	CS ÚRS 2020 02
13	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	409,680	62,68	25 678,74	CS ÚRS 2020 02
VV		zemina na meziskládku a zpětný zásyp						
VV		204,84*2			409,680			
29	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	72,300	375,39	27 140,70	CS ÚRS 2020 02
VV		přebytečná zemina na skládku						
VV		277,14-204,84			72,300			
30	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	361,500	27,37	9 894,26	CS ÚRS 2020 02
VV		72,3*5 'Přepočtené koeficientem množství			361,500			
14	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	277,140	348,01	96 447,49	CS ÚRS 2020 02
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	277,140	22,43	6 216,25	CS ÚRS 2020 02
31	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	115,680	394,13	45 592,96	CS ÚRS 2020 02
VV		přebytečná zemina na skládku						
VV		(277,14-204,84)*1,6			115,680			
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	204,840	165,84	33 970,67	CS ÚRS 2020 02
17	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	64,720	767,91	49 699,14	CS ÚRS 2020 02
18	M	58331200	šterkopísek netříděný zásypový	t	129,440	761,24	98 534,91	CS ÚRS 2020 02
VV		64,72*2 "Přepočtené koeficientem množství			129,440			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	120,000	123,98	14 877,60	CS ÚRS 2020 02
20	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	120,000	35,31	4 237,20	CS ÚRS 2020 02
D 2 Zakládání							6 166,60	
21	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	14,140	436,11	6 166,60	CS ÚRS 2020 02
D 998 Přesun hmot							67 824,27	
22	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	157,852	429,67	67 824,27	CS ÚRS 2020 02
D PSV Práce a dodávky PSV							4 569,30	
D 767 Konstrukce zámečnické							4 569,30	
23	K	767991911	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	10,000	387,35	3 873,50	CS ÚRS 2020 02
24	K	767991912	Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné řezání plamenem	m	10,000	69,58	695,80	CS ÚRS 2020 02
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							39 562,40	
25	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	30,000	494,53	14 835,90	CS ÚRS 2020 02
26	K	HZS1431	Hodinová zúčtovací sazba dělník inženýrských sítí	hod	16,000	494,53	7 912,48	CS ÚRS 2020 02
27	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	26,000	494,53	12 857,78	CS ÚRS 2020 02
28	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný	hod	8,000	494,53	3 956,24	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 26 - Opěrná zeď 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

894 070,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	894 070,03	21,00%	187 754,71
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 081 824,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 26 - Opěrná zeď 2

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

894 070,03

HSV - Práce a dodávky HSV

668 999,22

1 - Zemní práce

253 316,31

3 - Svislé a kompletní konstrukce

383 411,26

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

18 418,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 487,04

998 - Přesun hmot

6 366,12

PSV - Práce a dodávky PSV

225 070,81

767 - Konstrukce zámečnické

225 070,81

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 26 - Opěrná zeď 2

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

894 070,03

D HSV Práce a dodávky HSV

668 999,22

D 1 Zemní práce

253 316,31

1	K	131251104	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	179,038	171,75	30 749,78	CS ÚRS 2020 02
	VV		příloha D.1.31.3					
	VV		(2,10*(2,80+20,80+13,0)+2,40*(3,10+21,60+13,60))/2*1,20		101,268			
	VV		(1,60*(3,10+21,60+13,60))+(1,70*(3,20+21,80+13,80))/2*0,50		77,770			
	VV		Součet		179,038			
4	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	304,908	62,68	19 111,63	CS ÚRS 2020 02
	VV		zemina na meziskládku a zpětný zásyp					
	VV		152,454*2		304,908			
	VV		Součet		304,908			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	26,584	375,39	9 979,37	CS ÚRS 2020 02
	VV		přebytečná zemina na skládku					
	VV		179,038-152,454		26,584			
	VV		Součet		26,584			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	132,920	27,37	3 638,02	CS ÚRS 2020 02
	VV		26,584*5 "Přepočtené koeficientem množství		132,920			
7	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	152,454	943,07	143 774,79	CS ÚRS 2020 02
	VV		zemina na zpětný zásyp					
	VV		152,454		152,454			
	VV		Součet		152,454			
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	42,534	394,13	16 763,93	CS ÚRS 2020 02
	VV		26,584*1,60		42,534			
	VV		Součet		42,534			
19	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	179,038	22,43	4 015,82	CS ÚRS 2020 02
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	152,454	165,84	25 282,97	CS ÚRS 2020 02
	VV		179,038 "výkopek celkem		179,038			
	VV		odečet					
	VV		-4,602 "podkladní mazanina		-4,602			
	VV		opěrná zeď					
	VV		-(2,50+20,20+11,10)*1,10*0,20		-7,436			
	VV		-(2,95+18,0+11,60)*1,40*0,30		-13,671			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		-1,0*0,50*1,75				-0,875	
	WV		Součet				152,454	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				383 411,26	
10	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37 XF1, XA2, XC2	m3	25,400	4 036,78	102 534,21	CS ÚRS 2020 02
	WV		(2,50+20,20+11,10)*1,10*0,20				7,436	
	WV		(2,95+18,0+11,60)*1,75*0,30				17,089	
	WV		1,0*0,50*1,75				0,875	
	WV		Součet				25,400	
11	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	129,895	862,56	112 042,23	CS ÚRS 2020 02
	WV		(2,50+20,20+11,10)*2*0,20				13,520	
	WV		(2,95+18,0+11,60)*1,75*2				113,925	
	WV		(1,0+0,20*2)*1,75				2,450	
	WV		Součet				129,895	
12	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	129,895	349,62	45 413,89	CS ÚRS 2020 02
13	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	3,302	37 377,63	123 420,93	CS ÚRS 2020 02
	WV		množství výztuže 130kg/m3					
	WV		25,40*0,130				3,302	
	WV		Součet				3,302	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 418,49	
14	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	4,602	4 002,28	18 418,49	CS ÚRS 2020 02
	WV		podkladní beton					
	WV		(2,60+20,40+12,40)*1,30*0,10				4,602	
	WV		Součet				4,602	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 487,04	
15	K	9361791R1	D+M trubky PVC DN 100 osazené při betonování zdi	m	10,850	690,05	7 487,04	
	WV		odvodnění zdi					
	WV		0,35*31				10,850	
	WV		Součet				10,850	
D	998		Přesun hmot				6 366,12	
16	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 12 m	t	14,157	449,68	6 366,12	CS ÚRS 2020 02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				225 070,81	
D	767		Konstrukce zámečnické				225 070,81	
17	K	7671611R1	D+M ocelové zábradlí včetně madla a povrchové úpravy	kpl	1,000	218 515,36	218 515,36	
	WV		příloha D.1.31.3					
	WV		celk. hm. 602,56kg					
	WV		1,0				1,000	
	WV		Součet				1,000	
18	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	3,000	2 185,15	6 555,45	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 29 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

128 263,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 263,20	21,00%	26 935,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

155 198,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 29 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

128 263,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 29 - Veřejné osvětlení

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 263,20

0	M	001	STOŽÁROVÉ SVÍTIDLO venkovní kryté stožárové LED svítidlo 30W, IP65, hliníkový kryt s vysokou odolností proti korozi, práškově lakovaný šedou barvou, integrovaný předřadník, transparentní sklo, 517 x 220 x 117 mm, 4000K, 3400lm, vyzařovací úhel 145x85°, Ra	ks	3,000	17 574,93	52 724,79	
0	M	002	STOŽÁR VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ osvětlovací stožár bezpaticový sadový, hliníkový, žárově pozinkovaný dle normy DIN EN ISO 1461, spodní část díku nad zemí opatřena otvorem s dvířky pro montáž elektropříslušenství, ve spodní části díku pro vetknutí otvor pro p	ks	3,000	7 436,11	22 308,33	
0	M	003	STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE stožárová svorkovnice pro montáž do bezpaticových sadových stožárů a sloupků oplocení, připojení jednoho svítidla, smýčkováná, soustava TN-S, svorky pro připojení vodičů do průřezu 16mm ² , pro připojení max. dvou kabelů 5J, vč. pojist	ks	3,000	701,13	2 103,39	
0	M	004	1-CYKY-J 5x10mm ² Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	45,000	141,17	6 352,65	
0	M	005	1-CYKY-J 3x1,5mm ² Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil černá, modrá, zelenožlutá	m	15,000	28,48	427,20	
0	M	006	UKONČENÍ KABELŮ Ukončení kabelů (kabelová oka, návlečky, izolace, atd.) - komplet	ks	1,000	2 077,42	2 077,42	
0	M	007	ZNAČENÍ KABELŮ Kabelové štítky pro označení kabelů, nesmazatelný popis s označením kabelu, číslem kabelu dle kabelové tabulky, typu a průřezu kabelu, odkud - kam a číslo okruhu, možnost čištění vč. veškerého příslušenství pro označení a montáž kabelového	ks	5,000	11,95	59,75	
0	M	008	OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 110 Ohebná dvouplášťová kurugovaná chránička, vnější průměr 110mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, -45 - +60°C	m	5,000	87,96	439,80	
0	M	009	ZEMNÍČÍ PÁSEK Zemnicí pásek FeZn 30x4mm, pozinkovaný, vč. svorek pro spojení dvou pásků, ochrany spojů proti korozi	m	35,000	77,90	2 726,50	
0	M	010	ZEMNÍČÍ DRÁT Zemnicí drát FeZn průměru 10mm, pozinkovaný, potažený PVC	m	12,000	134,40	1 612,80	
0	M	011	SPOJOVACÍ SVORKA SR Spojovací svorka pro spojení pásek/vodič, pásek/pásek, pozinkovaná	ks	10,000	66,48	664,80	
0	M	012	OCHRANA PROTI KOROZI Ochrana podzemních částí a spojů uzemnění proti korozi	m ²	0,500	329,79	164,90	
0	M	013	PŘIPOJOVACÍ SVORKA SP FeZn Připojovací svorka SP, FeZn	ks	3,000	58,48	175,44	
0	M	014	VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 40cm, HLOUBKY 60cm Výkop ve volném terénu šířky 400mm, hloubky 600mm, vč. pískového lože pro kabely, položení kabelů, zapískování, uložení zemnicího pásku, výstražné fólie, záhozu a hutnění terénu, komplet	m	30,000	367,70	11 031,00	

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M		015	VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 60cm, HLOUBKY 110cm Výkop pod komunikacemi šířky 600mm, hloubky 1100mm, vč. položení chráničů, obetonování, protažení kabelů, protažení zemnicího pásu, výstražné fólie, záhozu a hutnění terénu, komplet	m	5,000	870,44	4 352,20	
0	M		016	ODKOPÁNÍ KABELU Nalezení stávajícího smotaného kabelu pod terénem z předchozí etapy výstavby, ruční odkopání, vytažení, očištění, komplet	ks	1,000	5 193,54	5 193,54	
0	M		017	DROBNÝ NESPECIFIKOVANÝ MATERIÁL Sádra šedá, šrouby univerzální, podložky, matice, hřebíky, vruty, hmoždinky, přichytky, atd - komplet	ks	1,000	519,35	519,35	
0	M		018	OSTATNÍ Uvedení do provozu, odzkoušení, naprogramování, předání uživateli, poučení obsluhy, instruktážní návody, odstranění vad a nedodělků, atd.	hod.	2,000	363,55	727,10	
0	M		019	LIKVIDACE Odvoz, třídění a ekologická likvidace obalových materiálů - komplet	ks	1,000	1 038,71	1 038,71	
0	M		020	ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o shodě, certifikáty, atd.	hod.	2,000	571,29	1 142,58	
0	K		023	MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů	ks	1,000	12 420,95	12 420,95	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 30 - Sadovnické úpravy

Soupis:

SO 30.1 - Sadovnické úpravy - ošetření - řezy ponechaných dřevin

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 803,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 803,61	21,00%	2 478,76
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 282,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 30 - Sadovnické úpravy

Soupis:

SO 30.1 - Sadovnické úpravy - ošetření - řezy ponechaných dřevin

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 803,61

HSV - Práce a dodávky HSV

11 803,61

1 - Zemní práce - ošetření - řezy ponechaných dřevin

11 803,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 30 - Sadovnické úpravy

Soupis:

SO 30.1 - Sadovnické úpravy - ošetření - řezy ponechaných dřevin

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 803,61

D HSV

Práce a dodávky HSV

11 803,61

D 1

Zemní práce - ošetření - řezy ponechaných dřevin

11 803,61

1	K	R-položka	Volně rostoucí živý plot: Symphoricarpos alba - pámelník bílý Forsythia intermedia - zlatice prostřední Philadelphus coronarius - pustoryl věncový Sambucus nigra - bez černý	ks	1,000	780,90	780,90	
2	K	R-položka.1	Namulčování plochy drcenou kůrou ve vrstvě 100 mm vč. specifikace kůry	kpl	1,000	499,48	499,48	
3	K	184852235	Aesculus hippocastanum - jírovec maďal plocha koruny 80m2 - zdravotní řez + lokální řez směrem k překážce	ks	1,000	1 920,63	1 920,63	CS ÚRS 2020 02
5	K	184852235.1	Prunus padus - střemcha obecná plocha koruny 80m2 - zdravotní řez	ks	1,000	1 920,63	1 920,63	
6	K	184852234	Acer platanoides - javor mléč plocha koruny 35m2 - zdravotní řez	ks	1,000	1 644,62	1 644,62	CS ÚRS 2020 02
7	K	R-položka.2	Frangula alnus - krušina olšová plocha koruny 8m2 - zdravotní řez	ks	1,000	1 437,60	1 437,60	
8	K	184852241	Acer platanoides - javor mléč plocha koruny 224m2- zdravotní řez + lokální řez směrem k překážce	ks	1,000	3 599,75	3 599,75	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 30 - Sadovnické úpravy

Soupis:

SO 30.2 - Sadovnické úpravy - výsadba a rozvojová péče

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 757 810,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 757 810,48	21,00%	369 140,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 126 950,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 30 - Sadovnické úpravy

Soupis:

SO 30.2 - Sadovnické úpravy - výsadba a rozvojová péče

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 757 810,48

HSV - HSV

1 757 810,48

1 - Zemní práce - výsadba a rozvojová péče	252 879,58
D1 - Výsadba stromů	47 627,10
D2 - LISTNATÉ STROMY ALEJOVÉ, obvod km. 14-16cm, bal 500-600mm	79 276,17
D4 - Výsadbový materiál celkem	25 722,47
Výsadba větších výpě - Výsadba větších výpěstků keřů	22 327,99
D7 - Listnatý keř, kont. 100-150 cm, 7 l a více	9 488,12
D5 - OSTATNÍ MATERIÁL	4 368,93
Výsadba tvarovaného - Výsadba tvarovaného živého plotu	30 163,81
D9 - Listnaté keře, kont. 80-100 cm, 2 l a více	6 210,60
D5 - OSTATNÍ MATERIÁL	5 968,86
Výsadba pokryvných d - Výsadba pokryvných dřevin a menších výpěstků listnatých keřů	93 624,31
D10 - Listnaté keře kont. 40-60	10 074,86
D5 - OSTATNÍ MATERIÁL	20 994,69
Výsadba trvalkových - Výsadba trvalkových záhonů	34 363,34
D11 - TRVALKY k 9 a větší	11 799,76
D5 - OSTATNÍ MATERIÁL	4 363,66
Trávník hřišťový a p - Trávník hřišťový a parkový založený výsevem	116 940,94
D12 - Rozvojová péče - první vegetační období	257 261,46
D13 - Rozvojová péče - druhé vegetační období	218 115,71

D14 - Rozvojová péče - třetí vegetační období	255 657,78
D15 - Rozvojová péče - čtvrté vegetační období	245 367,18
D16 - Rozvojová péče - páté vegetační období	231 108,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 30 - Sadovnické úpravy

Soupis:

SO 30.2 - Sadovnické úpravy - výsadba a rozvojová péče

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 757 810,48

D HSV HSV

1 757 810,48

D 1 Zemní práce - výsadba a rozvojová péče 252 879,58

1	K	R položka	Příprava půdy v rovině nebo svahu do 1:5, tj. chemické odplevelení totálním herbicidem, odstranění stařiny - plevelu, rozrušení půdy do hloubky 50-150 mm (rotavátorování, nakopání) plošná úprava nerovností 50-100mm plochy jednotlivě do 500 m2, vláčení – u	m2	1 437,000	53,72	77 195,64	
2	K	R položka.1	Příprava půdy na svahu od 1:5 do 1:2, tj. chemické odplevelení totálním herbicidem, odstranění stařiny - plevelu, rozrušení půdy do hloubky 50-150 mm (nakopání) plošná úprava nerovností 50-100mm plochy jednotlivě do 500 m2, uhrabání	m3	270,000	83,27	22 482,90	
3	K	Pol17	Totální herbicid, např. Roundup Bioaktiv, v množství 50 ml /l vody/ 100 m2	m3	0,850	676,82	575,30	

D D1 Výsadba stromů 47 627,10

4	K	183101221	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s případným naložením přebytečných výkopců na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1m3	ks	15,000	1 449,10	21 736,50	CS ÚRS 2020 02
5	K	R - položka	Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletového hnojiva	ks	15,000	174,81	2 622,15	
6	K	184102115	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při prům. balu přes 500 do 600mm	ks	15,000	531,34	7 970,10	CS ÚRS 2020 02
7	K	R - položka.1	Řez stromů při výsadbě	ks	12,000	165,61	1 987,32	
8	K	184215133	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, při prům. kúlů do 100mm při délce kúlů přes 2 do 3m	ks	15,000	296,72	4 450,80	CS ÚRS 2020 02
9	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solit. dřevin v rov nebo svahu do 1:5, o prům. mísy do 1m	ks	15,000	79,01	1 185,15	CS ÚRS 2020 02
10	K	R-položka	Ochrana kmene proti poškození teplotními vlivy nátěrem	ks	12,000	588,84	7 066,08	
11	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulč. kúrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5	m2	15,000	40,60	609,00	CS ÚRS 2020 02

D D2 LISTNATÉ STROMY ALEJOVÉ, obvod km. 14-16cm, bal 500-600mm 79 276,17

12	K	Pol30	Acer campestre Elsrijk - javor babyka	ks	2,000	7 647,46	15 294,92	
13	K	Pol31	Acer platanoides Emerald Queen - javor mléč	ks	4,000	4 464,61	17 858,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	Pol32	Aesculus carnea Briotii - jírovec pleťový	ks	1,000	5 755,00	5 755,00	
15	K	Pol33	Sorbus aucuparia Moravica - jeřáb obecný sladkoplodý	ks	1,000	5 755,00	5 755,00	
16	K	Pol34	Tilia cordata Rancho - lípa malolistá	ks	1,000	4 464,61	4 464,61	
17	K	Pol34.1	JELHIČNATÉ STROMY, bal. 500-600 mm, min. výška 200-250 cm	ks	3,000	5 024,70	15 074,10	
18	K	Pol35	Pinus sylvestris - borovice lesní	ks	3,000	5 024,70	15 074,10	

D		D4	Výsadbový materiál celkem	25 722,47				
19	K	Pol36	Zahradnický kompost v dávce 100 l /rostlina	m3	1,500	1 184,58	1 776,87	
20	K	Pol37	Půdní kondicioner 0,5 kg/jamka (např. Terracottem)	kg	7,500	442,78	3 320,85	
21	K	Pol38	Plné kombinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 150 g / strom	kg	2,250	224,27	504,61	
22	K	Pol39	Kůl frézovaný se špicí 7/250	ks	45,000	284,07	12 783,15	
23	K	Pol40	Příčka 6/60	ks	45,000	40,60	1 827,00	
24	K	Pol41	Úvazek plochý š. 3 cm, 3 m/strom	m	45,000	20,01	900,45	
25	K	Pol42	Ochranný nátěr proti poškození kmenů teplotními vlivy (např. Arboflex cca 180 g/strom, cena vč. základ. nátěru LX - 60)	kg	2,700	1 109,83	2 996,54	
26	K	Pol43	Voda pro závlivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 100 l/ks	m3	1,500	126,51	189,77	
27	K	Pol44	Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm	m3	1,500	948,82	1 423,23	

D		Výsadba větších		Výsadba větších výpěstků keřů		22 327,99		
28	K	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu do 1:5 objemu od 0,02 do 0,05 m3	ks	21,000	77,86	1 635,06	CS ÚRS 2020 02
29	K	R - položka.2	Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletového hnojiva	ks	21,000	59,80	1 255,80	
30	K	184102112	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rov. nebo svahu do 1:5 při prům. balu od 200 do 300mm	ks	21,000	90,74	1 905,54	CS ÚRS 2020 02
31	K	R - položka.3	Střih keře při výsadbě	ks	21,000	74,18	1 557,78	
32	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solit. dřevin v rov nebo svahu do 1:5, o prům. mísy do 1m	ks	16,000	79,01	1 264,16	CS ÚRS 2020 02
33	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5	m2	21,000	40,60	852,60	CS ÚRS 2020 02

D		D7	Listnatý keř, kont. 100-150 cm, 7 l a více	9 488,12				
34	K	Pol45	Forsythia intermedia - zlatice prostřední	ks	10,000	250,14	2 501,40	
35	K	Pol46	Physocarpus opulifolius Diablo - tavola kalinolistá	ks	1,000	276,02	276,02	
36	K	Pol47	Staphylea pinnata - klokoč zpeřený	ks	2,000	345,02	690,04	
37	K	Pol48	Weigela x Bristol Ruby - vajgélíe kult.	ks	6,000	819,43	4 916,58	
38	K	Pol49	Viburnum opulus - kalina obecná	ks	2,000	552,04	1 104,08	

D		D5	OSTATNÍ MATERIÁL	4 368,93				
39	K	Pol50	Zahradnický kompost v dávce 20 l /rostlina	m3	0,420	1 184,58	497,52	
40	K	Pol51	Půdní kondicioner 0,1kg/jamka (např. Terracottem)	kg	2,100	442,78	929,84	
41	K	Pol65	Plné kombinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 80 g / keř	kg	1,680	224,27	376,77	
42	K	Pol44	Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm	m3	2,100	948,82	1 992,52	
43	K	Pol70	Kůl frézovaný se špicí 4/150	ks	2,000	249,57	499,14	
44	K	Pol74	Úvazek plochý š. 2 cm, 0,5 m / dřevina	m	1,000	20,01	20,01	
45	K	Pol78	Voda pro závlivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 20 l/ks	m3	0,420	126,51	53,13	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D Výsadba tvarova Výsadba tvarovaného živého plotu							30 163,81	
46	K	183111142	Hloubení rýh pro vysazování rostlin v zemině tř 1-4 s výměnou půdy na 50% v rovině nebo ve svahu do 1:5, šířky přes 200mm do 400mm, hloubky do 400mm s případným naložením přebytečných výkopků a odvozem do 20km a se složením	m	24,000	357,68	8 584,32	CS ÚRS 2020 02
47	K	R - položka.4	Promísení půdy z rýhy a kompostu s kondicionerem	m3	0,770	411,73	317,03	
48	K	184102111	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rov. nebo svahu do 1:5 při prům. balu od 100 do 200mm	ks	60,000	55,55	3 333,00	CS ÚRS 2020 02
49	K	R - položka.3.1	Střih keře při výsadbě	ks	60,000	74,18	4 450,80	
50	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5	m2	32,000	40,60	1 299,20	CS ÚRS 2020 02
D D9 Listnaté keře, kont. 80-100 cm, 2 l a více							6 210,60	
51	K	Pol79	Carpinus betulus - habr obecný	ks	60,000	103,51	6 210,60	
D D5 OSTATNÍ MATERIÁL							5 968,86	
52	K	Pol80	Zahradnický kompost v dávce 20 l /rostlina	m3	1,200	1 184,58	1 421,50	
53	K	Pol84	Půdní kondicioner 2kg/m3 (např. Terracottem)	kg	3,070	442,78	1 359,33	
54	K	Pol44	Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm	m3	3,200	948,82	3 036,22	
55	K	Pol78	Voda pro závlivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 20 l/ks	m3	1,200	126,51	151,81	
D Výsadba pokryvr Výsadba pokryvných dřevin a menších výpěstků listnatých keřů							93 624,31	
56	K	183111214	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu 1:5 objemu od 0,01 do 0,02m3	ks	162,000	57,04	9 240,48	CS ÚRS 2020 02
57	K	R - položka.2.1	Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletového hnojiva	ks	162,000	174,81	28 319,22	
58	K	184102111	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rov. nebo svahu do 1:5 při prům. balu od 100 do 200mm	ks	162,000	55,55	8 999,10	CS ÚRS 2020 02
59	K	R - položka.3.2	Střih keře při výsadbě	ks	162,000	74,18	12 017,16	
60	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5	m2	98,000	40,60	3 978,80	CS ÚRS 2020 02
D D10 Listnaté keře kont. 40-60							10 074,86	
61	K	Pol85	Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný	ks	10,000	89,71	897,10	
62	K	Pol86	Philadelphus lemoinei Erectus - pustoryl	ks	56,000	60,38	3 381,28	
63	K	Pol87	Potentilla fruticosa - mochna dřevitá	ks	10,000	60,38	603,80	
64	K	Pol88	Spiraea bumalda Anthony Waterer - tavolník nízký	ks	68,000	60,38	4 105,84	
65	K	Pol89	Spiraea cinerea Grefsheim - tavolník popelavý	ks	18,000	60,38	1 086,84	
D D5 OSTATNÍ MATERIÁL							20 994,69	
66	K	Pol90	Zahradnický kompost v dávce 2 l/rostlina	m3	0,320	1 184,58	379,07	
67	K	Pol91	Půdní kondicioner 0,05 kg/jamka (např. Terracottem)	kg	8,100	442,78	3 586,52	
68	K	Pol92	Plné kombinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 40 g / keř	kg	6,480	224,27	1 453,27	
69	K	Pol44	Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 100 mm	m3	16,200	948,82	15 370,88	
70	K	Pol93	Voda pro závlivku (cena vodné + stočné Praha 2019) 10 l/ks	m3	1,620	126,51	204,95	
D Výsadba trvalkov Výsadba trvalkových záhonů							34 363,34	

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	183111213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy 50%, s případným naložením přebytečných výkopků na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20km a se složením, v rov. nebo svahu 1:5 objemu do 0,01m3	ks	152,000	34,39	5 227,28	CS ÚRS 2020 02
72	K	R - položka.2.2	Promísení půdy z jamky a kompostu s kondicionerem, přidání tabletového hnojiva	ks	152,000	59,80	9 089,60	
73	K	183211322	Výsadba květin hmkovaných přes 80 do 120mm do předem připravené půdy se zalitím	ks	152,000	19,67	2 989,84	CS ÚRS 2020 02
74	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulč. kůrou s př. nalož. odpadu na dopr. prostředek, s odvozem na vzdál. do 20 km a se složením, při tl. mulče 100 mm v neslehnutém stavu, v rov. nebo na svahu do 1:5	m2	22,000	40,60	893,20	CS ÚRS 2020 02
D D11 TRVALKY k 9 a větší							11 799,76	
75	K	Pol94	Lavandula angustifolia Hidcote Blue - levandule	ks	72,000	77,63	5 589,36	
76	K	Pol95	Salvia nemorosa Mainacht - šalvěj hajní	ks	8,000	77,63	621,04	
77	K	Pol96	Sedum telephyum Herbstfreude - rozchodník	ks	72,000	77,63	5 589,36	
D D5 OSTATNÍ MATERIÁL							4 363,66	
78	K	Pol97	Zahradnický kompost v dávce 1 l/rostlina	m3	0,150	1 184,58	177,69	
79	K	Pol98	Půdní kondicioner 0,025 kg/jamka (např. Terracottem)	kg	3,800	442,78	1 682,56	
80	K	Pol92	Plné kombinované hnojivo s postupným uvolňováním 2 roky, např. Sylvamix Forte v dávce 40 g / keř	kg	6,080	224,27	1 363,56	
81	K	Pol99	Mulčovovací kůra drcená hrubá prosátá vrstva 50 mm	m3	1,100	948,82	1 043,70	
82	K	Pol100	Voda pro závlivu (cena vodné + stočné Praha 2019) 5 l/ks	m3	0,760	126,51	96,15	
D Trávník hřišťový Trávník hřišťový a parkový založený výsevem							116 940,94	
83	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 292,000	30,82	39 819,44	CS ÚRS 2020 02
84	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2	m2	270,000	20,93	5 651,10	CS ÚRS 2020 02
85	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině a svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t	0,065	6 980,99	453,76	CS ÚRS 2020 02
86	K	185802123	Hnojení půdy nebo trávníku na svahu od 1:5 do 1:2 umělým hnojivem na široko	t	0,014	13 915,98	194,82	CS ÚRS 2020 02
87	K	184911312	Položení mulčovací textilie ve svahu do 1:2	m2	270,000	71,65	19 345,50	CS ÚRS 2020 02
88	K	185804312	Zalítí plochy jednotlivě přes 20 m2 (14 x 10 l / m2)	m3	37,810	134,56	5 087,71	CS ÚRS 2020 02
89	K	Pol101	Travní směs hřišťová 25 g/m2	kg	32,300	212,76	6 872,15	
90	K	Pol102	Travní směs parková 25 g/m2	kg	6,750	212,76	1 436,13	
91	K	Pol103	Plné kombinované hnojivo, např. NPK	kg	78,100	55,66	4 347,05	
92	K	Pol104	Kokosová geotextilie 700g/m2 např. Geomanet K700 EKO (x 1,2 koeficient prostřihu a překrytí)	m2	324,000	67,06	21 727,44	
93	K	Pol105	Ocelová kotvící skoba 20 cm např. Geopin steel 20 cm, 5 ks/ m2	ks	1 350,000	5,35	7 222,50	
94	K	Pol106	Voda pro závlivu (cena vodné + stočné Praha 2019) 10 l/m2 14x	m3	37,810	126,51	4 783,34	
D D12 Rozvojová péče - první vegetační období							257 261,46	
95	K	R-položka.1	Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	12,000	652,10	7 825,20	
96	K	R-položka.2	Kontrola úvazků a kůlů vč. případné výměny poškozených kůlů	ks	12,000	210,46	2 525,52	
97	K	R-položka.3	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 80l/strom	m3	7,680	668,20	5 131,78	
98	K	R-položka.4	Odplevelení a úprava kořenové mísy	ks	36,000	94,08	3 386,88	
99	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	12,000	154,46	1 853,52	
100	K	R-položka.6	Udržovací a výchovný řez keřů	ks	243,000	371,48	90 269,64	
101	K	R-položka.7	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 50l/m2	m3	60,400	668,20	40 359,28	
102	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	453,000	94,08	42 618,24	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	151,000	154,46	23 323,46	
104	K	R-položka.9	Udržovací a výchovný řez keřů	m2	30,000	371,48	11 144,40	
105	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	90,000	94,08	8 467,20	
106	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	30,000	154,46	4 633,80	
107	K	R-položka.10	Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou	ks	304,000	8,51	2 587,04	
108	K	R-položka.11	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 30l/m2	m3	5,280	668,20	3 528,10	
109	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	66,000	94,08	6 209,28	
110	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	22,000	154,46	3 398,12	

D D13 Rozvojová péče - druhé vegetační období 218 115,71

111	K	R-položka.1	Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	12,000	652,10	7 825,20	
112	K	R-položka.2	Kontrola úvazků a kůlů vč. případné výměny poškozených kůlů	ks	12,000	210,46	2 525,52	
113	K	R-položka.3	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 80l/strom	m3	7,680	668,20	5 131,78	
114	K	R-položka.4	Odplevelení a úprava kořenové mísy	ks	36,000	94,08	3 386,88	
115	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	12,000	154,46	1 853,52	
116	K	R-položka.6	Udržovací a výchovný řez keřů	ks	243,000	371,48	90 269,64	
117	K	R-položka.7	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 50l/m2	m3	6,040	668,20	4 035,93	
118	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	453,000	94,08	42 618,24	
119	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	151,000	154,46	23 323,46	
120	K	R-položka.9	Udržovací a výchovný řez keřů	m2	30,000	371,48	11 144,40	
121	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	90,000	94,08	8 467,20	
122	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	30,000	154,46	4 633,80	
123	K	R-položka.10	Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou	ks	304,000	8,51	2 587,04	
124	K	R-položka.11	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 30l/m2	m3	5,280	668,20	3 528,10	
125	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	36,000	94,08	3 386,88	
126	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	22,000	154,46	3 398,12	

D D14 Rozvojová péče - třetí vegetační období 255 657,78

127	K	R-položka.1	Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	12,000	652,10	7 825,20	
128	K	R-položka.2	Kontrola úvazků a kůlů vč. případné výměny poškozených kůlů	ks	12,000	210,46	2 525,52	
129	K	R-položka.3	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 80l/strom	m3	5,280	668,20	3 528,10	
130	K	R-položka.4	Odplevelení a úprava kořenové mísy	ks	36,000	94,08	3 386,88	
131	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	12,000	154,46	1 853,52	
132	K	R-položka.6	Udržovací a výchovný řez keřů	ks	243,000	371,48	90 269,64	
133	K	R-položka.7	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 50l/m2	m3	60,400	668,20	40 359,28	
134	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	453,000	94,08	42 618,24	
135	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	151,000	154,46	23 323,46	
136	K	R-položka.9	Udržovací a výchovný řez keřů	m2	30,000	371,48	11 144,40	
137	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	90,000	94,08	8 467,20	
138	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	30,000	154,46	4 633,80	
139	K	R-položka.10	Odstranění odkvetlých květenství a ostranění nadzemních částí před zimou	ks	304,000	8,51	2 587,04	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	R-položka.11	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 30l/m2	m3	5,280	668,20	3 528,10	
141	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	66,000	94,08	6 209,28	
142	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	22,000	154,46	3 398,12	

D		D15	Rozvojová péče - čtvrté vegetační období	245 367,18				
143	K	R-položka.1	Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	12,000	652,10	7 825,20	
144	K	R-položka.12	Odstranění kotvení	ks	12,000	86,26	1 035,12	
145	K	R-položka.13	Instalace a dodávka plastové děrované ochrany před poškozením báze kmene vyžínačem (např. TreeProtector - chránička)	ks	12,000	98,56	1 182,72	
146	K	R-položka.3	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 80l/strom	m3	6,760	668,20	4 517,03	
147	K	R-položka.4	Odplevelení a úprava kořenové mísy	ks	36,000	94,08	3 386,88	
148	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	12,000	154,46	1 853,52	
149	K	R-položka.6	Udržovací a výchovný řez keřů	ks	243,000	371,48	90 269,64	
150	K	R-položka.7	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 50l/m2	m3	45,300	668,20	30 269,46	
151	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	453,000	94,08	42 618,24	
152	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	151,000	154,46	23 323,46	
153	K	R-položka.9	Udržovací a výchovný řez keřů	m2	30,000	371,48	11 144,40	
154	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	90,000	94,08	8 467,20	
155	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	30,000	154,46	4 633,80	
156	K	R-položka.10	Odstranění odkvetlých květenství a odstranění nadzemních částí před zimou	ks	304,000	8,51	2 587,04	
157	K	R-položka.11	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 30l/m2	m3	3,960	668,20	2 646,07	
158	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	66,000	94,08	6 209,28	
159	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	22,000	154,46	3 398,12	

D		D16	Rozvojová péče - páté vegetační období	231 108,38				
160	K	R-položka.1	Udržovací a zdravotní řez stromů (pokud bude nutné tak i výchovný řez podporující tvar stromu s průběžným kmenem)	ks	12,000	652,10	7 825,20	
161	K	R-položka.3	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 80l/strom	m3	3,840	668,20	2 565,89	
162	K	R-položka.4	Odplevelení a úprava kořenové mísy	ks	36,000	94,08	3 386,88	
163	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	12,000	154,46	1 853,52	
164	K	R-položka.6	Udržovací a výchovný řez keřů	ks	243,000	371,48	90 269,64	
165	K	R-položka.7	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 50l/m2	m3	30,200	668,20	20 179,64	
166	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	453,000	94,08	42 618,24	
167	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	151,000	154,46	23 323,46	
168	K	R-položka.9	Udržovací a výchovný řez keřů	m2	30,000	371,48	11 144,40	
169	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	90,000	94,08	8 467,20	
170	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	30,000	154,46	4 633,80	
171	K	R-položka.10	Odstranění odkvetlých květenství a odstranění nadzemních částí před zimou	ks	304,000	8,51	2 587,04	
172	K	R-položka.11	Zalítí rostlin vč. ceny vody - 30l/m2	m3	3,960	668,20	2 646,07	
173	K	R-položka.8	Odplevelení mulčovaných ploch	m2	66,000	94,08	6 209,28	
174	K	R-položka.5	Doplnění mulčovací kůry vrstva 50 mm	m2	22,000	154,46	3 398,12	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

281 69 522

CZ281 69 522

Projektant:

IČ:

DIČ:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 200 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 200 000,00	21,00%	1 302 000,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 502 000,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

6 200 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 200 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

2 200 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

3 900 000,00

VRN6 - Územní vlivy

100 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 200 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

6 200 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

2 200 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	2 200 000,00	2 200 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	---------------------	----	-------	--------------	--------------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

3 900 000,00

2	K	040001000	Inženýrská činnost	Kč	1,000	3 900 000,00	3 900 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--------------------	----	-------	--------------	--------------	----------------

D VRN6 Územní vlivy

100 000,00

3	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	100 000,00	100 000,00	CS ÚRS 2020 02
---	---	-----------	--------------	----	-------	------------	------------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

ON - ON

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 430 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 430 000,00	21,00%	300 300,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 730 300,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

ON - ON

Místo:

Datum:

20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 430 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1 430 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

779 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost

600 400,00

VRN7 - Provozní vlivy

18 000,00

VRN9 - Ostatní náklady

32 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

ON - ON

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 430 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1 430 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

779 200,00

1	K	012002001	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	Kč	1,000	136 000,00	136 000,00	
2	K	012002002	Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí	Kč	1,000	19 200,00	19 200,00	
3	K	013203001	Náklady na vypracování výrobní (dílenské dokumentace)	Kč	1,000	84 000,00	84 000,00	
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetického zaměření realizované stavby	Kč	1,000	540 000,00	540 000,00	CS ÚRS 2020 02

D VRN4 Inženýrská činnost

600 400,00

5	K	041103001	Inženýrská činnost	Kč	1,000	60 000,00	60 000,00	CS ÚRS 2020 02
6	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	Kč	1,000	144 000,00	144 000,00	CS ÚRS 2020 02
7	K	042903000	Náklady na zpracování a vyhotovení provozního řádu a havarijního plánu	Kč	1,000	20 000,00	20 000,00	CS ÚRS 2020 02
8	K	043194000	Individuální a komplexní vyzkoušení	Kč	1,000	76 000,00	76 000,00	CS ÚRS 2020 02
9	K	044003000	Náklady na měření a revize	Kč	1,000	38 400,00	38 400,00	CS ÚRS 2020 02
10	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	248 000,00	248 000,00	CS ÚRS 2020 02
11	K	049303001	Doklady požadované k převzetí díla	Kč	1,000	14 000,00	14 000,00	

D VRN7 Provozní vlivy

18 000,00

12	K	072103011	Dopravní značení a čištění tohoto značení po dobu realizace stavby	Kč	1,000	18 000,00	18 000,00	CS ÚRS 2020 02
----	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	----------------

D VRN9 Ostatní náklady

32 400,00

13	K	091003001	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	
14	K	091704001	Označení stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	
15	K	092203000	Zaškolení obsluhy	Kč	1,000	16 400,00	16 400,00	CS ÚRS 2020 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 31 - Oplocení a terenní úpravy

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

IČ:

281 69 522

DIČ:

CZ281 69 522

Projektant:

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 278 357,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 278 357,19	21,00%	268 455,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 546 812,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 31 - Oplocení a terenní úpravy

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel:

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 278 357,19

HSV - Práce a dodávky HSV

1 155 330,04

1 - Zemní práce

73 627,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

89 670,84

5 - Komunikace pozemní

379 511,20

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

574 690,45

998 - Přesun hmot

37 830,00

PSV - Práce a dodávky PSV

123 027,15

766 - Konstrukce truhlářské

474,51

783 - Dokončovací práce - nátěry

122 552,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část

Objekt:

SO 31 - Oplocení a terenní úpravy

Místo:

Datum: 20.01.2021

Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant: D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 278 357,19

D HSV Práce a dodávky HSV

1 155 330,04

D 1 Zemní práce

73 627,55

1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	50,700	283,01	14 348,61	CS ÚRS 2020 02
	vv		dopadová plocha pro skluzavku					
	vv		108,0*0,30		32,400			
	vv		hřiště					
	vv		61,0*0,30		18,300			
	vv		Součet		50,700			
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	0,378	2 136,36	807,54	CS ÚRS 2020 02
	vv		betonová patka sloupku					
	vv		0,15*0,15*0,70*24,0		0,378			
	vv		Součet		0,378			
5	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	50,178	375,39	18 836,32	CS ÚRS 2020 02
	vv		přebytečná zemina na skládku					
	vv		49,80+0,378		50,178			
	vv		Součet		50,178			
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	250,890	27,37	6 866,86	CS ÚRS 2020 02
	vv		50,178*5 "Přepočtené koeficientem množství		250,890			
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	80,285	394,13	31 642,73	CS ÚRS 2020 02
	vv		50,178*1,60		80,285			
	vv		Součet		80,285			
30	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	50,178	22,43	1 125,49	CS ÚRS 2020 02


D 3 Svislé a kompletní konstrukce

89 670,84

8	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním beton C30/37	kus	24,000	451,41	10 833,84	CS ÚRS 2020 02
	vv		24,0		24,000			
	vv		Součet		24,000			
9	M	55342255	sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2500/38x1,5mm	kus	24,000	359,98	8 639,52	CS ÚRS 2020 02
10	M	55342270	vzpěra plotová 48x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm	kus	6,000	417,48	2 504,88	CS ÚRS 2020 02
11	K	348121221	Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	23,000	276,02	6 348,46	CS ÚRS 2020 02
	vv		23,0		23,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet			23,000		
12	M	5923312R	deska plotová betonová 2950x50x290mm	kus	23,000	832,66	19 151,18	
13	K	348273902	Držák plotových polí průběžný dl 300 mm vkládaný do ložných spár plotového sloupku	kus	46,000	169,06	7 776,76	CS ÚRS 2020 02
14	K	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m	m	70,000	163,31	11 431,70	CS ÚRS 2020 02
15	M	31324810	svařované plotové pletivo v rolích 25m výšky 1,50m průměr drátu 3mm rozměr oka 38x76mm povrchová úprava Pz a komaxit	m	70,000	328,35	22 984,50	CS ÚRS 2020 02
D 5			Komunikace pozemní				379 511,20	
16	K	564801111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 30 mm fr 0-4	m2	169,000	40,75	6 886,75	CS ÚRS 2020 02
VV			dopadová plocha pro skluzavku					
VV			108,0		108,000			
VV			hřiště					
VV			61,0		61,000			
VV			Součet		169,000			
17	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm fr 0-32	m2	166,000	207,96	34 521,36	CS ÚRS 2020 02
18	K	5792313R1	Ručně litý pryžový povrch stabilizační EPDM tl. 35mm horní vrstva probarvená ve hmotě	m2	169,000	2 000,61	338 103,09	
VV			dopadová plocha pro skluzavku					
VV			108,0		108,000			
VV			hřiště					
VV			61,0		61,000			
VV			Součet		169,000			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				574 690,45	
19	K	91623211R	Obruba ploch pro tělovýchovu z obrubníků do betonového lože výšky 25 mm (pryžový obrubník)	m	125,750	943,07	118 591,05	
VV			hřiště					
VV			((10,0+6,10)*2+68,40)*1,25		125,750			
VV			Součet		125,750			
20	K	9162391R1	D+M herní prvek - prolézačka se skluzavkou J2687	kus	1,000	456 099,40	456 099,40	
D 998			Přesun hmot				37 830,00	
21	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 3 m	t	38,698	977,57	37 830,00	CS ÚRS 2020 02
D PSV			Práce a dodávky PSV				123 027,15	
D 766			Konstrukce truhlářské				474,51	
22	K	7666607R1	D+M systém generální klíče - vložka a zámek FAB 300/FAB 300 HD + 2x klíč	kus	1,000	460,68	460,68	
VV			• vhodné pro projekty středního rozsahu					
VV			• zabezpečení splňující požadavky					
VV			pro RC3 podle ENV 1627 nebo NBÚ SS4=2					
VV			• systémy chráněné patentem					
VV			• vysoká úroveň zabezpečení					
VV			• rozsáhlá rozměrová řada					
VV			• široká nabídka kompatibilních zámků					
VV			• výroba klíče ve výrobním závodě pouze se					
VV			souhlasem majitele					
VV			POPIS VÝROBKU					
VV			• 5ti stavítkový uzamykací systém					
VV			• přídavné kódování na hřbetu klíče-HD					
VV			• mosazné těleso i bubínek					
VV			• spojka úplná nesymetrická					
VV			PROVEDENÍ VÝROBKU					
VV			• standardní povrchová úprava:					
VV			– leštěná mosaz					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV – saténový nikl, označení „Ns“ VV • oboustranná cylindrická vložka: VV – označení „FAB 300 nebo FAB 300HD“ VV – rozměr od 30+30 mm VV – další rozměry odstupňované po 5mm VV • knoflíková cylindrická vložka: VV – označení „FAB 302 nebo FAB 302HD“ VV – rozměr od 30+30mm VV – standardně osazen černý plastový VV knoflík 22mm VV – další rozměry odstupňované po 5 mm VV • jednostranná cylindrická vložka: VV – označení „FAB 301 nebo FAB 301HD“ VV – standardně nastavitelný zub „Z“ VV – rozměr od 30+10mm VV – další rozměry odstupňované po 5mm VV RC3, dle ČSN EN 1627:2012 Uzamykací systém typ 2. Dle požadavku NBÚ VV v souladu se zákonem č. 412/205 sb. VV Systémy generálního klíče FAB 300/ FAB 300 HD VV Klíč FAB 300HD VV DOPLŇKY VV • zvýšená ochrana proti odvrtání, VV označení „B“ VV • prostupová spojka, označení „P“ VV • ozubené kolo, 10 zubů („K10“) VV nebo 12 zubů („K12“) VV • malý kovový knoflík 20 mm, označení „MK“ VV nebo velký kovový knoflík 30 mm, VV označení „VK“ VV KLÍČE VV • polotovary klíče FAB 300HD VV • patentově chráněná technologie VV 1,0 VV Součet		1,000 1,000			
23	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	3,000	4,61	13,83	CS ÚRS 2020 02
D 783			Dokončovací práce - nátěry	122 552,64				
24	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	288,000	34,50	9 936,00	CS ÚRS 2020 02
25	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	288,000	34,50	9 936,00	CS ÚRS 2020 02
26	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	288,000	9,20	2 649,60	CS ÚRS 2020 02
27	K	783306811	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	288,000	71,31	20 537,28	CS ÚRS 2020 02
			VV nátěr stávajícího oplocení VV 96,0*1,50*2 VV Součet		288,000 288,000			
28	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	288,000	138,01	39 746,88	CS ÚRS 2020 02
29	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí (nátěr dle stávajícího ve třech odstínech RAL- žlutá, zelená, oranžová.)	m2	288,000	138,01	39 746,88	CS ÚRS 2020 02

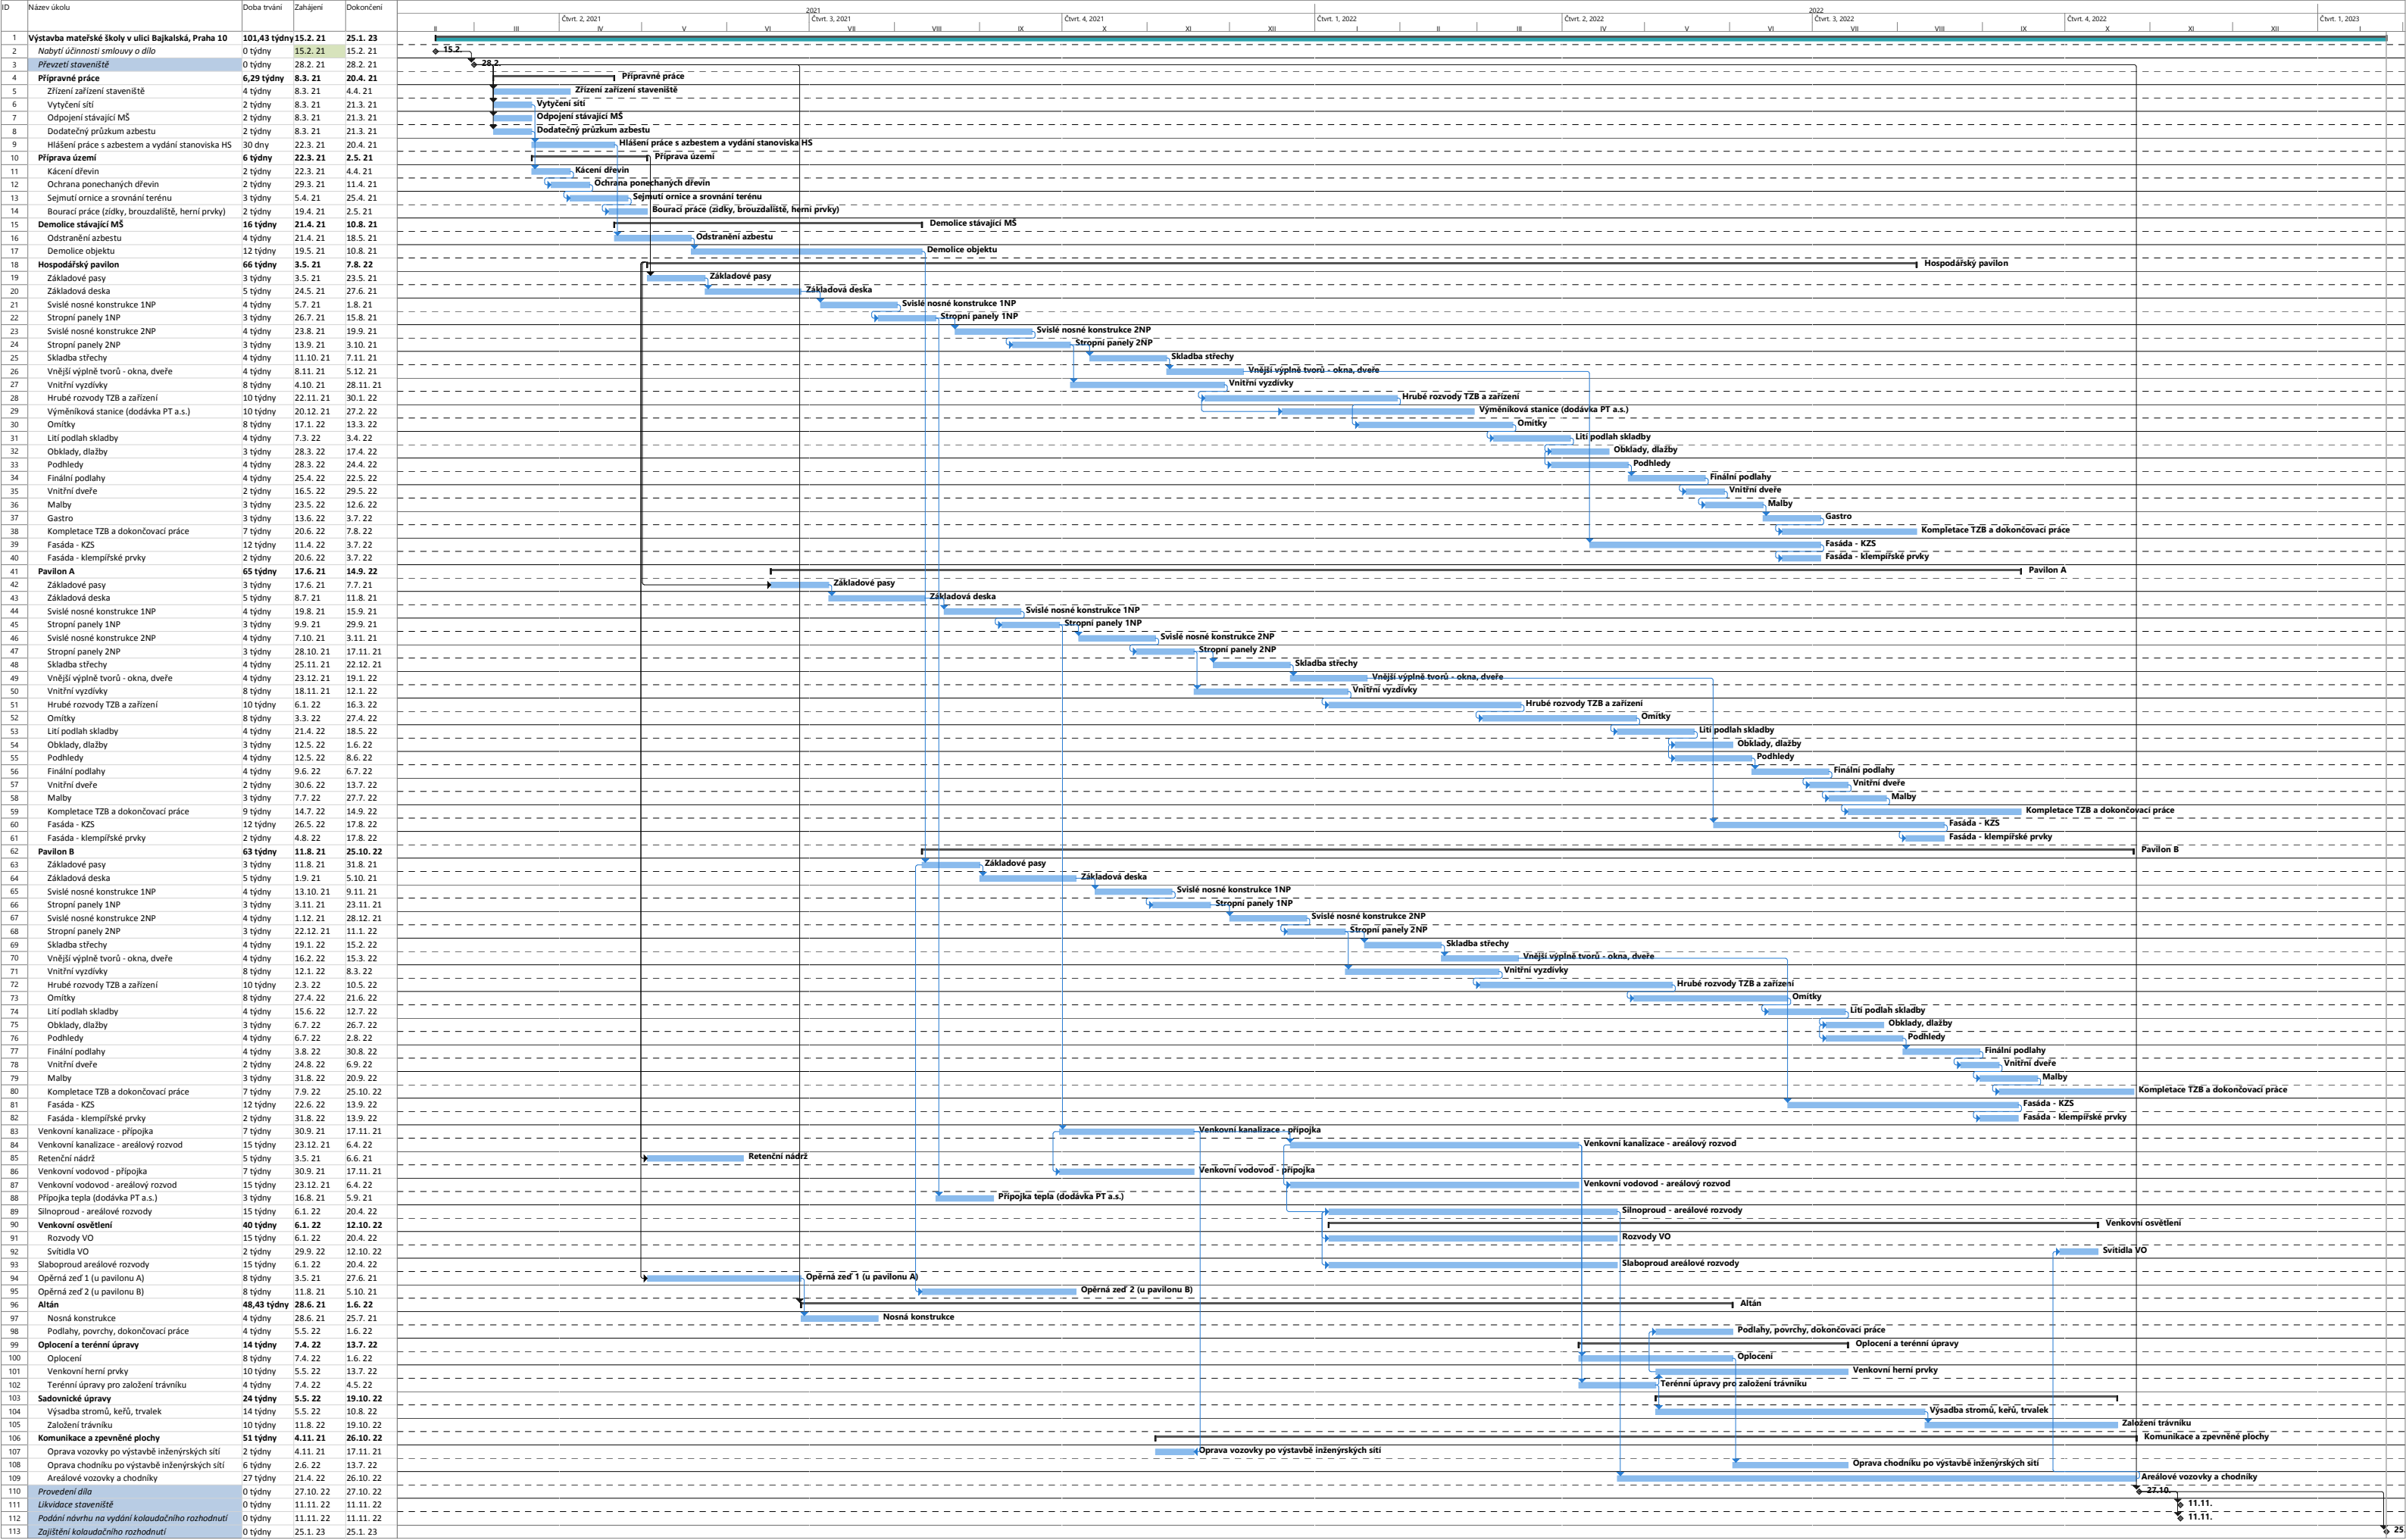

Čestné prohlášení o využití poddodavatelů

Sdružení GEOSAN + Vistoria – MŠ Bajkalská, jehož vedoucím společníkem je GEOSAN GROUP a. s. se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, IČ: 28169522, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459 a dalším společníkem je VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, IČ: 25110977, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4581 (dále jen „uchazeč“),

čestně prohlašuje,

že se na plnění veřejné zakázky „**Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10**“ nebudou podílet poddodavatelé.

Příloha č. 5

Čestné prohlášení – Seznam členů realizačního týmu

Zadávací řízení	Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10
Název dodavatele (vč. právní formy)	GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská
Sídlo	U Průhonu 1516/32, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO	

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že pro plnění zakázky využije následující realizační tým:

Stavbyvedoucí	
Titul, jméno a příjmení	
Vztah k dodavateli (zaměstnanec nebo jiný vztah)	zaměstnanec
Osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 3 písm. a) „Pozemní stavby“ zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr nebo technik	autorizovaný inženýr - pozemní stavby, č. 0011242
Délka praxe v oboru pozemních staveb	17
zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí) na zakázce, jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci, přičemž alespoň u jedné se jednalo o novostavbu	
Název a popis zkušenosti	Rekonstrukce a přístavba školy Pernerova 29 – občanská vybavenost, škola - rekonstrukce budovy školy, vybudování půdní vestavby
Funkce na zakázce	vedoucí projektového týmu – stavbyvedoucí
Finanční objem stavebních prací v Kč bez DPH	155 099 509,36 Kč
Jednalo se o novostavbu	NE
Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního nebo e-mailového spojení	Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace a Městská část Praha 8 Ing. Stanislav Hladiš, + hladis@sespha8.cz Mgr. Tomáš Tatranský, tomas.tatransky@praha8.cz
Místo a čas plnění	Praha 8, Pernerova 29, 05/2018 – 08/2019
zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí) na zakázce, jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci, přičemž alespoň u jedné se jednalo o novostavbu	

Název a popis zkušenosti	Rezidence Stodůlky – 117 bytových jednotek – novostavba - rezidenční komplex se skládá z třinácti- a čtyřpodlažní budovy, podzemní garážová stání
Funkce na zakázce	projektový manažer - stavbyvedoucí
Finanční objem stavebních prací v Kč bez DPH	225 000 000,-
Jednalo se o novostavbu	ANO
Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního nebo e-mailového spojení	Byty Hůrka s.r.o., Hvězdova 1716, Praha 4 - Nusle Pavel Tošovský, tel.:  bytyhurka@psj.cz
Místo a čas plnění	Praha 5 – Stodůlky, 06/2011-08/2013
zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí) na zakázce, jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci, přičemž alespoň u jedné se jednalo o novostavbu	
Název a popis zkušenosti	Bohemian National Hall , rekonstrukce budovy pro potřeby generálního konzulátu ČR v New Yorku, Czech Centers, víceúčelový sál pro 300 osob, klubové kino pro 60 osob, galerie, restaurace pro 100 míst
Funkce na zakázce	stavbyvedoucí
Finanční objem stavebních prací v Kč bez DPH	340 000 000
Jednalo se o novostavbu	NE
Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního nebo e-mailového spojení	Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Loretánské náměstí 5, Praha 1 – Hradčany Ing. Pavel Semerák, tel. 224 182 143
Místo a čas plnění	New York, 321-325 East 73rd st, 11/2007-11/2008
zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí) na zakázce, jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 100 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci, přičemž alespoň u jedné se jednalo o novostavbu	
Název a popis zkušenosti	BBC building GAMMA – novostavba administrativní budovy, 10 nadzemních a 3 podzemní podlaží, v přízemí restaurace, kavárna a drobné obchodní plochy
Funkce na zakázce	hlavní stavbyvedoucí
Finanční objem stavebních prací v Kč bez DPH	1 200 000 000
Jednalo se o novostavbu	ANO
Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního nebo e-mailového spojení	PASSERINVEST GROUP, a.s., Želetavská 1525/1, 140 00 Praha 4 Ing. Čestmír Šimůnek,  info@passerinvest.cz
Místo a čas plnění	Praha 4 – Michle, 10/2005-04/2007

Zástupce stavbyvedoucího	
Titul, jméno a příjmení	
Vztah k dodavateli (zaměstnanec nebo jiný vztah)	zaměstnanec- VISTORIA CZ a.s.
Osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 3 písm. a) „Pozemní stavby“ zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr nebo technik	autorizovaný technik – pozemní stavy Č. 35258
Délka praxe v oboru pozemních staveb	více než 5 let
zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) na zakázce, jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci	
Název a popis zkušenosti	Rekonstrukce pavilonu E – tělocvičen k Milíčovu 674, Praha 4; práce zahrnovaly celkovou rekonstrukci tělocvičen a navazujícího spojovacího krčku. Jedná se třípodlažní podsklepený objekt s ocelovým skeletem a celobetonovými stropy, s vyzdívanými čelními fasádami a montovanými prosklenými fasádními panely, založený na železobetonových pasech a patkách.
Funkce na zakázce	stavbyvedoucí
Finanční objem stavebních prací v Kč bez DPH	64,7 mil. Kč
Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního nebo e-mailového spojení	MČ Praha 4, Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4 Ing. Kvído Boublík, tel: 267 902 273
Místo a čas plnění	Praha 4, K Milíčovu 674; 10/2017 – 09/2018
zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) na zakázce, jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci	
Název a popis zkušenosti	Přestavba ZŠ Štěrboholy; rekonstrukce budovy, provedení nástavby (2 podlaží učeben), přístavby (předložené vstupní schodiště, výtah) a vestavby (vložení jídelny a gymnastického sálu).
Funkce na zakázce	stavbyvedoucí
Finanční objem stavebních prací v Kč bez DPH	90,8 mil. Kč
Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního nebo e-mailového spojení	MČ Praha – Štěrboholy, Ústřední 527/14, 102 00 Praha 10 František Ševít, starosta, tel: 
Místo a čas plnění	U školy 285, Praha 10 – Štěrboholy; 11/2017 – 07/2019
zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) na zakázce, jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci	

Název a popis zkušenosti	Rekonstrukce čerpací stanice Bruska, Praha 6 – 2. část; rekonstrukce zahrnovala výměnu střešní krytiny, výměnu oken, fasádu a izolaci proti spodní vodě objektu, demontáž a demolici staré trafostanice a vybudování nové, komplet. demontáž původní technologie, dodávku a montáž nového technologického zařízení vč. elektroinstalace.
Funkce na zakázce	stavbyvedoucí
Finanční objem stavebních prací v Kč bez DPH	98,4 mil. Kč
Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního nebo e-mailového spojení	Pražská vodohospodářská společnost a.s., Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 Ing. Petr Bureš, tel: 251 170 317
Místo a čas plnění	Praha 6; 08/2010 – 05/2012
zkušenosti v obdobné funkci (stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího) na zakázce, jejichž předmětem byly stavební práce v minimálním finančním objemu 50 mil. Kč bez DPH za každou stavební práci	
Název a popis zkušenosti	Zateplení objektu SOŠ pro administrativu EU (Lipí) Praha 9; práce zahrnovaly odstranění boletických panelů s obsahem azbestu a nahrazení sendvičovou konstrukcí, hliníkovou provětrávanou fasádu, stávající zděné konstrukce byly zatepleny kontakt. fasádním systémem, výměnu výplní otvorů, staveb. úpravy pro vznik nových učeben a hygienického zařízení, výměna ÚT, ZTI, elektro.
Funkce na zakázce	stavbyvedoucí
Finanční objem stavebních prací v Kč bez DPH	55 mil. Kč
Název a adresa objednatele, jméno kontaktní osoby včetně telefonního nebo e-mailového spojení	Magistrát hlavního města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1 Ing. Jana Hrstkova, tel: 236 004 310
Místo a čas plnění	Lipí 1911, Praha 9; 10/2009 – 12/2010

Technik BOZP:

Titul, jméno a příjmení	
Vztah k dodavateli (zaměstnanec nebo jiný vztah)	zaměstnanec
osvědčení o odborné způsobilosti k zajišťování úkolů a prevence rizik v oblasti BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	ANO
Délka praxe v oblasti řízení a kontroly BOZP	více než 5 let

Dohledový technik – statik	
Titul, jméno a příjmení	
Vztah k dodavateli (zaměstnanec nebo jiný vztah)	pracovně právní vztah - VISTORIA CZ a.s.
osvědčení o autorizaci ČKAIT dle § 5 odst. 3 písm. g) „Statika a dynamika staveb“ zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – autorizovaný inženýr	autorizovaný inženýr – statika a dynamika staveb č. 30795
Délka praxe v oboru statika dynamika staveb	více než 5 let

Dodatek č. 1

**ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění**

ze dne 17. 6. 2021

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 10
se sídlem: Vršovická 68/1429, 101 38 Praha 10
zastoupený: Renatou Chmelovou, starostkou
IČO: 000 63 941
DIČ: CZ000 63 941
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 27-2000733369/0800
Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních a technických: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí
odboru majetkoprávního

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská
zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské
smlouvy
Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČO: 281 69 522
DIČ: CZ28169522

Společník: VISTORIA CZ a.s.
se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
IČO: 251 10 977
DIČ: CZ25110977

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s.
č. účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1

I.

Dne 17. 6. 2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2021/OMP/0933 uzavřenou podle
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„Smlouva“).

II.

Dne 17. 6. 2021 bylo uzavřeno Další smluvní ujednání ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933, ve kterém se smluvní strany se dohodly, že objednatel koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci doplní bez zbytečného odkladu poté, co odpadnou překážky na straně objednatele tohoto koordinátora určit již při uzavření smlouvy. Objednatel tak učiní nejpozději do předání staveniště podle čl. 5.1.1. smlouvy.

III.

1. Doplnuje se čl. 9.13. Objednatel je dále oprávněn pověřit jakoukoli třetí osobu výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla, která bude oprávněna vykonávat práva a plnit povinnosti stanovené jí obecně závaznými právními předpisy a případně touto smlouvou. Koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla jmenuje Objednatel VSP spol. s r.o., Palackého 465/16, 702 00 Ostrava, IČO 48392430. Jmenování či odvolávání koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci provádění díla nepodléhá souhlasu Zhotovitele.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

Místo: Praha

Místo: Praha


Za objednatele:

Za zhotovitele:

Tomáš
Urbánek
k

Digitálně
podepsal
Tomáš Urbánek
Datum:
2021.07.23
11:35:33 +02'00'

Jméno: Mgr. Tomáš Urbánek
Funkce: vedoucí odboru majetkoprávního



Jméno: 
Funkce: pověřená osoba
na základě pověření a společenské smlouvy

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/0933

ze dne 17. 6. 2021

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská**

zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské smlouvy

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Společník: VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČO: 251 10 977

DIČ: CZ25110977

Adresa pro zaslání korespondence zhotoviteli:

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s.

č. účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označování jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Čas plnění

Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění čl. 5, doba plnění, odstavec 5. 1, bod 5. 1. 2. výše uvedené smlouvy – provedení díla. Termín provedení díla se prodlužuje o 21 dní na dobu plnění 20 měsíců a 21 dní.

III.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 2 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 2 836 963, 92 Kč bez DPH

a zároveň se snižuje o částku 102 502, 99 Kč bez DPH

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 2 734 460, 93 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 131 660 927,51 Kč

(slovy:stotřicetjednamilionůšestsetšedesáttisícdevětsetdvacetšedm korun českých a 51 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. Dodatku č. 1 spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

III.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, položkové rozpočty méněprací a víceprací, č. 2, pověření č. 20/GG/082, k podepisování dokumentů elektronickým podpisem.

V Praze dne

Tomáš
Urbánek

Digitálně podepsal
Tomáš Urbánek
Datum: 2022.01.25
13:18:47 +01'00'

Městská část Praha 10

Mgr. Tomáš Urbánek
vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel

V Praze dne



pověřená osoba na základě pověření a
společenské smlouvy
Zhotovitel

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. ze dne 2022


Ověřovatel jméno a příjmení:.....

Podpis:.....

Rekapitulace změn

Projekt : Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Organizační j.: Název zakázky: Číslo zakázky: VRT: T. dok. dle SOD T. dok. dle ZL	PVŘ Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10 AV/21028.1.130 Martin Jelen 31.3.2023 31.3.2023	Cena dle zákl. SOD: Cena vč. dodatků: Cena všech ZL	128 926 467	§222 ZZVZ		Maximální procenta	Maximální hodnota Změny	Vyčerpáno	Zbývá	Zpracoval / Datum aktualizace :	M.J.	15.12.2021																	
				odst. 4	odst. 5								odst. 6	Odst. 5 a 6	Odst. 7														
č. číslo ZL	Název ZL	Datum	Dopad změny do		Stav schvalování změny	Přípočty	Odpočty	Změna celkem	Zařídění odst. Dle §222 ZZVZ	Záhmůti změny do																			
			SOD s klientem							změna termínu	Cena Změny (Kč)	Záhmůti změny do SOD s klientem																	
			cena	termín									č.dod.	Kč															
1	ZL01	SO 01+021 Příprava území - kláčení zeleně	30.08.21	13.10.21	K	ANO	NE	S	86 861,22	86 861,22	odst. 5																		
													2	ZL02	SO07 + SO 16 - retenční nádrž a vodoměrná šachta	18.10.21	GG	ANO	NE	S	1 181 643,57	1 284 146,56	-102 502,99	odst. 7					
3	ZL03	Kompenzační smyčka teplovodu	09.12.21	K	ANO	NE	S	137 522,80	137 522,80	odst. 6	137 522,80																		
														4	ZL04	AZBEST	14.10.21	K	ANO	ANO	P	2 052 907,75	2 052 907,75	odst. 5	2 052 907,75				
5	ZL05	Izolace spodní stavby	09.12.21	P	ANO	NE	P	95 503,74	95 503,74	odst. 5	95 503,74																		
														6	ZL06	Příprava území skrytka ornice	09.12.21	P	ANO	NE	P	390 934,55	390 934,55	odst. 5	390 934,55				
7	ZL08	Likvidace nábytku	30.08.21	02.12.21	K	ANO	NE	S	41 812,58	41 812,58	odst. 5	41 812,58																	
															8	ZL09	Likvidace výměňkové stanice	30.08.21	02.12.21	K	ANO	NE	S	31 421,28	31 421,28	odst. 6	31 421,28		

Technický list změny (TLZ) č.:		1	
Datum předložení TLZ:		20.09.2021	
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:	17.06.2021		
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	Změna rozsahu kácení dřevin a přípravy území		
Žadatel změny:	GD		
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Na základě doplněné resp. aktualizovaného dendrologického posudku vznikl rozdíl mezi skutečností a smluvním zadáním. Tato změna řádně doplněna zpracovatelem Projektové dokumentace.		
Vyřádění projektant:			
Vyřádění TDI:			
Vyřádění GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt	1 SO 01, SO 21	
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná	Kalkulace	
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Orientační cenový dopad:	Odpočet: Připočet: ANO	Cenová kalkulace : SO 01: připočty SO 21: připočty	35 144,68 Kč 51 716,54 Kč 86 861,22 Kč
	Jméno <i>EVA NAVRATILOVÁ</i>	Datum <i>9.12.</i>	Podpis 
Za objednavatele:			Razítko
		<i>9.12.2021</i>	
Za TDI		<i>9.12.2021</i>	
Za projektanta:		<i>9.12.2021</i>	
Za zhotovitele:		<i>9.12.2021</i>	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 001									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 01 - Příprava území							
Místo:							Datum:		
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská – vedoucí společník					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							35 144,68		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				32 854,71		
	D	1	Zemní práce				32 854,71		
1	K	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	59,000	52,10	3 073,90	smluvní položka	
6	K	112201111	Odstranění pařezů průměru do 200 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypaním jámy	ks	3,000	563,54	1 690,62	smluvní položka	
7	K	112201112	Odstranění pařezů průměru do 300 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypaním jámy	ks	1,000	1 114,43	1 114,43	smluvní položka	
20	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	kus	4,000	111,33	445,32	smluvní položka	
21	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	59,000	69,46	4 098,14	smluvní položka	
26	K	R-položka.2	Cena za uložení odpadu - pařezy, kořeny	t	0,200	517,54	103,51	smluvní položka SO 21	
46	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km	kus	12,000	115,01	1 380,12	smluvní položka	
	WV		3*4		12,000				
NP	K	132251251	HLoubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,000	578,01	7 514,13	smluvní položka SO 02.1 ASŘ	
	WV		13*1						
NP	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	13,000	348,01	4 524,13	smluvní položka SO 08.1	
	WV		13*1						
NP	K	171201221	Likvidace odpadu kod odpadu 200 201 (Křídlatka) vč. naložení a odvozu na skládku do 40km	kpl	1,000	8 910,41	8 910,41	vlastní kalkulace	
			kalkulace ceny:						
			Cenová nabídka AVE Pražské komunální služby a.s. : 7.900,- Kč bez DPH						
			+ koordinační přírážka ve výši 12,79%: 8 910,41,- Kč bez DPH						
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 289,97		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)	%	6,970	328,55	2 289,97		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 001										
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část								
Objekt:		SO 21 - Příprava území								
Místo:								Datum:		
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38						Projektant:		
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společnosti						Zpracovatel:		
PČ		Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem										51 716,54
	D	HSV	Práce a dodávky HSV							47 797,17
	D	1	Zemní práce							47 161,17
1	K	111211201	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 ručně			m2	60,000	52,10	3 126,00	smluvní položka
2	K	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 mm			kus	2,000	177,11	354,22	smluvní položka
6	K	112201112	Odstranění pařezů průměru do 300 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypaním jámy			ks	2,000	1 114,43	2 228,86	smluvní položka
11	K	112201117	Odstranění pařezů průměru do 900 mm v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m nebo naložením a zasypaním jámy			ks	1,000	9 499,67	9 499,67	smluvní položka
13	K	162201405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 km D kmene do 300 mm			kus	2,000	54,51	109,02	smluvní položka
18	K	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm			kus	2,000	143,88	287,76	smluvní položka
19	K	162201424	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 900 mm			kus	1,000	917,76	917,76	smluvní položka
20	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm			m2	60,000	70,04	4 202,40	smluvní položka
25	K	R-položka.1	Cena za uložení odpadu - větve			t	0,300	517,54	155,26	smluvní položka
26	K	R-položka.2	Cena za uložení odpadu - pařezy, kořeny			t	0,400	517,54	207,02	smluvní položka
30	K	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 1 km			kus	8,000	92,01	736,08	smluvní položka
	WV		2*4				8,000			
31	K	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 1 km			kus	8,000	115,01	920,08	smluvní položka
	WV		2*4				8,000			
32	K	162301974	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 1 km			kus	4,000	126,51	506,04	smluvní položka
	WV		1*4				4,000			
NP	K	111111331	Odstranění ruderalního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5			m2	2 300,000	7,07	16 261,00	CS ÚRS 2021 02
NP	K	111111332	Odstranění ruderalního porostu přes 500 m2 naložení a odvoz do 20 km ve svahu přes 1:5 do 1:2			m2	750,000	10,20	7 650,00	CS ÚRS 2021 02
	D		Přesun hmot HSV							636,00
NP	K		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03			t	1,000	636,00	636,00	CS ÚRS 2021 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady							3 919,37
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)			%	8,200	477,97	3 919,37	

Technický list změny (TLZ) č.:		2	
Datum předložení TLZ:		29.09.2021	
SoD č.:	objednatel: T. 2021/OMP/0933	zhotovitel:	AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	Změna technického řešení retenční nádrže a vodoměrné šachty z konstrukce monolitické na konstrukci prefabrikovanou		
Žadatel změny:	GDS		
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Optimalizace technického řešení ve varbě na postup výstavby. Změna technologie znamená úsporu pro Objednatel při zachování stejných technických i užitných vlastností. Technický postup je vhodnější s ohledem na probíhající klimatické podmínky.		
Vyřádění projektant:			
Vyřádění TDI:			
Vyřádění GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č.		
	Dotčený objekt	SO 07.1: Vodoměrná šachta SO 16: Retenční nádrž	
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	
		Cenová kalkulace :	
		SO 07.1: přípočty	176 349,25
		SO 07.1: odpočty	-197 581,56
		SO 16: přípočty	1 005 094,32
		SO 16: odpočty	-1 086 565,00
		Celkem	-102 502,99 Kč
	Jméno	Datum	Razítko
Za objednatele	JANA KAMÁTKOVÁ	9.12.	
Za TDI		9.12.2021	
Za projektanta		9.12.2021	
Za zhotovitele		9.12.2021	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 002										
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část								
Objekt:		SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka								
Soupis:		SO 07.1 - Vodoměrná šachta								
Místo:							Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská					Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									176 549,25	
	d	HSV	Práce a dodávky HSV						176 549,25	
	d	3	Svislé a kompletní konstrukce						176 549,25	
NP1	H	954GZ310-01-R	Vodoměrná šachta prefabrikovaná čtyřhranná Dywidag Prefa			kus	1,000	176 549,25	176 549,25	vlastní
			prefabrikovaná železobetonová obdélníková nádrž DYWIDAG Aquaschutz®							
			složená ze základní nádrže, krycí desky, kominku a poklopu							
			vyrobeno z betonu C40/50 XC4/XP3/XA2							
			základní nádrž vnitřního rozměru 3,00 x 1,50m							
			vnější půdorysný rozměr nádrže 3,40 x 1,90m							
			světlostá výška 1,80m							
			tloušťka stěny 0,20m, tloušťka dna 0,20m							
			krycí deska tl. 0,20m s otvorem 600x600mm a nabetonovaným							
			komínkem výšky 0,35m							
			Poklop Purator 600x600mm D400							
			napojovací otvory: 2x vývrt DN100							

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 002										
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část								
Objekt:		SO 07 - Venkovní vodovodní přípojka								
Soupis:		SO 07.1 - Vodoměrná šachta								
Místo:		Datum:								
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.			
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská					Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava		
Náklady soupisu celkem								-197 581,56		
d		HSV	Práce a dodávky HSV				-176 549,25			
d		3	Svislé a kompletní konstrukce				-105 436,75			
12	K	380311641	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z betonu prostého tř. C 16/20 tl 150 mm	m3	-0,392	4 094,29	-1 604,96	CS	ÚRS	2020 02
13	K	380326132	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl 300 mm	m3	-5,776	5 290,37	-30 557,18	CS	ÚRS	2020 02
14	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	-43,672	805,06	-35 158,58	CS	ÚRS	2020 02
15	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	-43,672	230,02	-10 045,43	CS	ÚRS	2020 02
16	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	-0,751	37 377,63	-28 070,60	CS	ÚRS	2020 02
d		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-20 293,22			
17	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-0,241	6 887,83	-1 659,97	CS	ÚRS	2020 02
18	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-2,940	5 607,79	-16 486,90	CS	ÚRS	2020 02
19	K	632450121	Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	-5,760	372,63	-2 146,35	CS	ÚRS	2020 02
d		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-50 805,60			
20	K	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně	m	-10,000	977,57	-9 775,70	CS	ÚRS	2020 02
21	K	931991112	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve stěně	m	-13,880	989,07	-13 728,29	CS	ÚRS	2020 02
22	K	952903112	Vycházení objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 3,5 m	m2	-3,920	138,01	-541,00	CS	ÚRS	2020 02
23	K	953171022	Osazování poklopů litinových nebo ocelových hmotnosti do 100 kg - nádrže	kus	-1,000	747,55	-747,55	CS	ÚRS	2020 02
24	M	552410R1	poklop z tvárné litiny C 250 v rámu čtvercový uzamykatelný 600x600 mm včetně soupravy s klíčem	kus	-1,000	17 711,24	-17 711,24			
25	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	-0,400	2 242,66	-897,06	CS	ÚRS	2020 02
26	K	9853241R1	Nátěr betonové konstrukce krystalizační nátěrovou hmotou	m2	-20,120	368,03	-7 404,76			
d		997	Přesun sutě				-13,68			
27	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,008	447,96	-3,58	CS	ÚRS	2020 02
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,008	314,55	-2,52	CS	ÚRS	2020 02
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km	t	-0,112	47,84	-5,36	CS	ÚRS	2020 02
30	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-0,008	277,05	-2,22	CS	ÚRS	2020 02
d		PSV	Práce a dodávky PSV				-21 032,31			
d		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-13 664,61			
31	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	-5,760	18,40	-105,98	CS	ÚRS	2020 02
32	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,002	56 123,94	-112,25	CS	ÚRS	2020 02
33	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	-12,552	27,60	-346,44	CS	ÚRS	2020 02
34	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,004	56 123,94	-224,50	CS	ÚRS	2020 02
35	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAF	m2	-11,520	123,06	-1 417,65	CS	ÚRS	2020 02
36	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm	m2	-13,248	177,11	-2 346,35			
37	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAF	m2	-25,104	134,56	-3 377,99	CS	ÚRS	2020 02
38	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm	m2	-30,125	177,11	-5 335,44			
39	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-3,000	132,67	-398,01	CS	ÚRS	2020 02
d		713	Izolace tepelné				-7 367,70			
40	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-12,552	195,51	-2 454,04	CS	ÚRS	2020 02
41	M	28376379	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	-13,180	356,53	-4 699,07	CS	ÚRS	2020 02
42	K	998713201	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	%	-3,000	71,53	-214,59	CS	ÚRS	2020 02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 002									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 16 - Retenční nádrž							
Místo:								Datum:	
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38						Projektant:	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská						Zpracovatel:	
								D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 005 094,32		
	d	HSV	Práce a dodávky HSV				1 005 094,32		
	d	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 005 094,32		
NP1	H	954GF2310-01-R	Jímka prefabrikovaná čtyřhranná Dywidag Prefa prefabrikovaná montovaná nádrž obdelníková DYNIDAG - Aquaschutz® nádrž sestavená ze 2 základních dílů a 2 stropních dílů z betonu C40/50 XC4/XP3/XA2 vnitřní rozměr 2,50 x 12,2m vnější rozměr 2,90 x 12,6m světla výška 1,90m stropní deska tloušťky 0,25m, zatížitelnost 60t 2x vstupní šachta DN1000 s konusem a poklopem Purator P-POP RS D400 napojovací otvory: 3x vložka DN200RG, 4 x jádrový vývrt DN 50	kus	1,000	1 005 094,32	1 005 094,32		vlastní

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 002									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 16 - Retenční nádrž							
Místo:								Datum:	
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38						Projektant:	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník						Zpracovatel:	
								D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 086 565,00		
	d	HSV	Práce a dodávky HSV				-1 005 094,32		
	d	3	Svislé a kompletní konstrukce				-765 875,51		
12	K	380321662	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 30/37 tl 300 mm	m3	-68,106	4 393,31	-299 210,77		CS ÚRS 2020 02
13	K	380356211	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných zřízení	m2	-145,630	690,05	-100 491,98		CS ÚRS 2020 02
14	K	380356212	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch rovinných odstranění	m2	-145,630	230,02	-33 497,81		CS ÚRS 2020 02
15	K	380356221	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených zřízení	m2	-1,256	1 150,08	-1 444,50		CS ÚRS 2020 02
16	K	380356222	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených odstranění	m2	-1,256	230,02	-288,91		CS ÚRS 2020 02
17	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonářské oceli 10 505	t	-8,854	37 377,63	-330 941,54		CS ÚRS 2020 02
	d	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-48 227,97		
18	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-3,948	6 887,83	-27 193,15		CS ÚRS 2020 02
19	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	-3,751	5 607,79	-21 034,82		CS ÚRS 2020 02
	d	8	Trubní vedení				-45 818,74		
20	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	-4,000	2 415,17	-9 660,68		CS ÚRS 2020 02
21	M	59224162	skruž kanalizační 100 x 100 x 12 cm	kus	-2,020	3 145,70	-6 354,31		CS ÚRS 2020 02
22	M	59224160	skruž kanalizační 100 x 25 x 12 cm	kus	-2,020	1 218,51	-2 461,39		CS ÚRS 2020 02
23	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	-2,000	2 415,17	-4 830,34		CS ÚRS 2020 02
24	M	59224168	skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12 cm	kus	-2,020	1 989,98	-4 019,76		CS ÚRS 2020 02
25	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro tlidu zatížení D400, E600	kus	-2,000	1 610,11	-3 220,22		CS ÚRS 2020 02
26	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro tlidu zatížení D400 uzamykatelný včetně soupravy klíče	kus	-2,000	6 909,63	-13 819,26		CS ÚRS 2020 02
27	K	89962013R	Obetonování plastové šachty betonem prostým tř. C 16/20 otevírný výkop	m3	-0,109	6 440,45	-702,01		
28	K	899640112	Bednění pro obetonování plastových šachet kruhových otevírný výkop	m2	-0,544	1 380,10	-750,77		CS ÚRS 2020 02
	d	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-82 433,25		
29	K	931991111	Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně	m	-30,000	747,55	-22 426,50		CS ÚRS 2020 02
33	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	-0,600	3 047,71	-1 828,63		CS ÚRS 2020 02
34	K	9853241R1	Nátěr betonové konstrukce krystalizační nátěrovou hmotou	m2	-84,310	690,05	-58 178,12		
	d	997	Přesun sutě				-129,91		
35	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	-0,076	447,96	-34,04		CS ÚRS 2020 02
36	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	-0,076	314,55	-23,91		CS ÚRS 2020 02
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	-1,064	47,84	-50,90		CS ÚRS 2020 02
38	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	-0,076	277,05	-21,06		CS ÚRS 2020 02
	d	998	Přesun hmot				-62 608,94		
39	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy betonové monolitické v do 25 m	t	-204,424	306,27	-62 608,94		CS ÚRS 2020 02
	d	PSV	Práce a dodávky PSV				-81 470,68		
	d	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-10 874,69		
40	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	-83,912	40,25	-3 377,46		CS ÚRS 2020 02
41	M	2832305R	folie PE separační podlahová oddělující tepelnou izolaci tl 1,5mm	m2	-100,694	71,31	-7 180,49		
42	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-3,000	105,58	-316,74		CS ÚRS 2020 02
	d	712	Povlakové krytiny				-23 033,82		
43	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° folii položenou volně s přilepením spoju	m2	-34,857	313,97	-10 944,05		CS ÚRS 2020 02
44	M	2832201R	folie hydroizolační mPVC tl 1,5mm	m2	-40,086	182,86	-7 330,13		
45	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	-34,857	27,60	-962,05		CS ÚRS 2020 02
46	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	-40,086	23,00	-921,98		CS ÚRS 2020 02
47	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy	m2	-34,857	36,80	-1 282,74		CS ÚRS 2020 02
48	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	-40,086	23,00	-921,98		CS ÚRS 2020 02
49	K	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	-3,000	223,63	-670,89		CS ÚRS 2020 02
	d	713	Izolace tepelné				-47 562,17		
50	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošné rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-83,462	195,51	-16 317,66		CS ÚRS 2020 02
51	M	28376379	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	-87,635	356,53	-31 244,51		CS ÚRS 2020 02

Technický list změny (TLZ) č.:		3																
Datum předložení TLZ:		23.11.2021																
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV																
Ze dne:																		
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10																	
Objekt:																		
Název změny:	Odstranění dilatační smyčky teplovodu																	
Žadatel změny:	GD																	
Popis změny a důvod - zhotovitel:	V průběhu realizace zemních prací byla na pozemku zjištěna stará nefunkční dilatační smyčka teplovodu Pražské Teplárenské a.s., kterou je nutné pro další postup prací odstranit. Zpracovatel PD v rámci přípravy stavby a projednání s Pražskou Teplárenskou neobdržel vyjádření o existenci této nefunkční smyčky.																	
Vyjádření projektant:																		
Vyjádření TDI:																		
Vyjádření GI:																		
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt		SO 01															
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná																	
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO																
Orientační cenový dopad:	Odpočet: Připočet: ANO	Cenová kalkulace : SO 01: připočty	137 522,80 Kč 137 522,80 Kč															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jméno</th> <th>Datum</th> <th>Razítko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Za objednavatele: JVA NABATKOVA</td> <td>9.12.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za TDI:</td> <td>9.12.2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za projektanta:</td> <td>9.12.2021</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za zhotovitele:</td> <td>9.12.2021</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Jméno	Datum	Razítko	Za objednavatele: JVA NABATKOVA	9.12.		Za TDI:	9.12.2021		Za projektanta:	9.12.2021		Za zhotovitele:	9.12.2021	
Jméno	Datum	Razítko																
Za objednavatele: JVA NABATKOVA	9.12.																	
Za TDI:	9.12.2021																	
Za projektanta:	9.12.2021																	
Za zhotovitele:	9.12.2021																	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL003 - Odstranění dilatační smyčky teplovodu

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2021

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

IČ:

26760312

DIČ:

CZ26760312

IČ:

25110977

DIČ:

CZ25110977

Cena bez DPH

137 522,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	137 522,80	21,00%	28 879,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

166 402,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL003 - Odstranění dilatační smyčky teplovodu

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

137 522,80

HSV - Práce a dodávky HSV

125 132,52

1 - Zemní práce

70 073,47

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 779,25

997 - Přesun sutě

36 279,80

M - Práce a dodávky M

1 968,00

23-M - Montáže potrubí

1 968,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 422,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL003 - Odstranění dilatační smyčky teplovodu

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							137 522,80	
D HSV Práce a dodávky HSV							125 132,52	
D 1 Zemní práce							70 073,47	
1	K	129951121	Bourání konstrukcí z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	11,100	3 730,00	41 403,00	CS ÚRS 2021 02
	W		"spodní deska					
	W		5*6*0,25		7,500			
	W		"horní deska					
	W		5*6*0,12		3,600			
	W		Součet		11,100			
2	K	131251102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	27,000	209,77	5 663,79	SoD
	W		5*6*0,9		27,000			
3	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	38,100	348,01	13 259,18	SoD
4	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	27,000	127,00	3 429,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	174101101a_PK1	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	38,100	165,84	6 318,50	SoD
	W		5*6*(0,9+0,25+0,12)		38,100			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							18 779,25	
6	K	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	3,675	5 110,00	18 779,25	CS ÚRS 2021 02
	W		"zdivo					
	W		6*0,5*0,3*2		1,800			
	W		5*0,5*0,3*2		1,500			
	W		2,5*0,5*0,3		0,375			
	W		Součet		3,675			
D 997 Přesun sutě							36 279,80	
7	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	32,505	506,47	16 462,81	SoD
8	K	997013501b	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	32,505	242,60	7 885,71	SoD
9	K	997013509b	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	455,070	10,61	4 828,29	SoD
	W		32,505*14 'Přepočtené koeficientem množství		455,070			
10	K	997013601__PK_II	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	32,505	218,52	7 102,99	SoD
D M Práce a dodávky M							1 968,00	
D 23-M Montáže potrubí							1 968,00	
11	K	230082007	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 18 mm tl 2,0 mm	kus	8,000	246,00	1 968,00	CS ÚRS 2021 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 422,28	
12	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	1 271,01	10 422,28	

Technický list změny (TLZ) č.:	4
Datum předložení TLZ:	25.11.2021

SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:		
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10	
Objekt:		

Název změny:	AZBEST-střecha
---------------------	----------------

Žadatel změny:	GDS
-----------------------	-----

Popis změny a důvod - zhotovitel:	Při dodatečném průzkumu nebezpečných látek resp. azbestu, byla zjištěna přítomnost azbestu ve střešní krytině stávajícího objektu a to v celé ploše střechy. Toto zjištění bylo doloženo protokolem z laboratoře. Byl předložen technologický postup na tyto práce. Kalkulace ceny je v přílohách ZL.
--	---

Vyjádření projektant:	
------------------------------	--

Vyjádření TDI:	
-----------------------	--

Vyjádření GI:	
----------------------	--

Odkazy :	Zápis z KD č.	
	Zápis v deníku změn PD č.	
	Dotčený objekt	SO 01

Přílohy:	PD - schéma/podklady	
	ZL kalkulace - podrobná s VV	
	Jiná	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	21 dní
--	-------------------------	-----	--------

Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	Cenová kalkulace : 2 052 907,75 Kč Celkem bez DPH 2 052 907,75 Kč
----------------------	-------------------------	-----	---

	Jméno	Datum	Razítko
Za objednatele:	EVA NAVRATILOVÁ	9.12.	
Za TDI		9.12.2021	
Za projektanta:		9.12.2021	
Za zhotovitele:		9.12.2021	

Rozpočet	Likvidace azbestu		JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
	SO 22	odstranění střešní krytiny	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
	MŠ Bajkalská, Praha 10 - Vršovice		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 052 908		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			2 052 907,75 Kč
DPH	21,0 %			431 111,00 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 484 019 Kč

Položkový rozpis prací a dodávek								
S:	SO 22	Demolice stávající MŠ, Bajkalská 1534/19, 110 00 Praha 10 - Vršovice						
	D.1:	Odstranění střešní krytiny - UZAVŘENÉ						
		kontrolované pásmo						
R:	D.1.2	Odstranění střešního souvrství s obsahem azbestu - 50mm						
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenová soustava /platnost	Cenová úroveň
Díl:					2 052 907,75			
1	R-AZC01	Vybudování uzavřeného kontrolovaného pásma včetně dočasné konstrukce na střešní části	ks	3,00	184 486,67	553 460,01	Vlastní	Indiv
		zahrnuje celý rozsah kontrolovaného pásma nutný k provedení demontáže a likvidace střešní krytiny s obsahem azbestu v rámci uzavřeného kontrolovaného pásma. Bude zřízeno ks neprodyšně uzavřených kontrolovaných pásem, které budou neprodyšně uzavřena vysokopevnostní plachtou.						
2	R-AZC02	Montáž personální dekontaminační propusti	ks	3,00	14 293,00	42 879,00	Vlastní	Indiv
		zahrnuje vybudování tříkomorové dekontaminační komory (hygienické smýčky) pro dekontaminaci osob odstraňujících materiály s obsahem azbestu v kontrolovaných pásmech						
3	R-AZC03	Montáž materiálové dvoukomorové dekontaminační propusti	ks	3,00	14 293,00	42 879,00	Vlastní	Indiv
		zahrnuje vybudování dvoukomorové dekontaminační komory pro dekontaminaci obalů odpadů před opuštěním kontrolovaného pásma ve všech kontrolovaných pásmech						
4	R-AZC04	Demontáž kontrolovaného pásma, personální a materiálové propusti	kpl.	3,00	31 226,33	93 678,99	Vlastní	Indiv
		zahrnuje dekontaminaci použitých zařízení a použitého technologického vybavení a nářadí, demontáž a likvidaci kontrolovaného pásma, personální materiálové propusti v kontrolovaných pásmech						
5	R-AZC05	Provoz odsávacích zařízení v kontrolovaném pásmu a dekontaminačních komorách	kpl.	3,00	38 529,00	115 587,00	Vlastní	Indiv
		zahrnuje dodávku odsávací filtrační techniky zajišťující v kontrolovaném pásmu vytvoření diferenčního tlaku -20Pa současně s pětinasobnou výměnou vnitřního ovzduší, dodávku a výměnu filtračních jednotek M5 a G4 po celou dobu trvání prací.						
6	R-AZC06	Enkapsulace horní vrstvy střešního asfaltového souvrství před řezáním na pásy před bouráním	m2	496,80	144,95	72 011,16	Vlastní	Indiv
		aplikace enkapsulačního přípravku na bázi vodní PVAC disperze, příprava na zahájení řezání na pásy						
7	R-AZC07	Vybourání střešní krytiny ze živých pásů s obsahem azbestu po prkenný záklop	m2	496,80	935,66	464 835,89	Vlastní	Indiv
		řezání asfaltového souvrství na pásy za průběžné enkapsulace vodní PVAC disperzí ke snížení prašnosti, jejich vyjmutí z místa uložení, balení, dekontaminace obalů						
9	R-AZC09	Dekontaminace stávajícího prkenného záklopu a prostor kontrolovaného pásma	m2	496,80	506,95	251 852,76	Vlastní	Indiv
		dekontaminace zbylých střešních konstrukcí - prkenného záklopu střešní konstrukce vysátím vysavači třídy H13 a enkapsulací vodní PVAC disperzí a dočišťovací práce stávající střešní konstrukce - prkenného záklopu						
11	R-AZC11	Svislá doprava neprodyšně zabaleného a označeného odpadu a odpadů kategorie "N" a odpadů kat. "O"	t	7,00	4 303,00	30 121,00	Vlastní	Indiv
		přesuny hmot v balení BIG BAG do deponie odpadů (přistaveného kontejneru)						

12	R-AZC12	Použití prostředků osobní ochrany zaměstnance	pásma	3,00	90 909,00	272 727,00	Vlastní	Indiv
		použití základních prostředků osobní ochrany zaměstnance pro práci s azbestem - polomaska s filtrací FF P3, jednorázový overal s certifikací pro práci s azbestem, ochranné rukavice. Prostředky osobní ochrany se mění za nové po každém opuštění kontrolovaného pásma, minimálně po dvou hodinách práce (1 ks KP: 8 prac., 6 dnů)						
13	R-AZC13	Závěrečný monitoring dle ČSN ISO EN 16000-7	ks	3,00	14 546,00	43 638,00	Vlastní	Indiv
		zahrnuje závěrečné měření v kontrolovaném pásmu před zrušením kontrolovaného pásma v souladu s výše uvedenou normou						
14	R-AZC14	Odvoz a likvidace nebezpečných odpadů na příslušné skládce	t	7,00	4 405,42	30 837,94	Vlastní	Indiv
		zahrnuje všechny přesuny hmot, nakládku, odvoz a likvidaci odpadů v souladu se zákonem o odpadech v platném znění						
15	R-AZC15	Zřízení a zrušení zařízení staveniště s azbestem	kompl.	1,00	38 400,00	38 400,00	Vlastní	Indiv
		mimostaveništní doprava, zřízení staveniště, zřízení denní místnosti pro pracovníky s azbestem, skladovacích prostor a sociální zázemí						
		Celkem bez DPH				2 052 907,75		

Technický list změny (TLZ) č.:		5	
Datum předložení TLZ:		09.12.2021	
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Za dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	Izolace spodní stavby		
Žadatel změny:	GDS		
Popis změny a důvod - zhotovitel:	- oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci položky 6285500R - doplnění výkazu výměr o položky opracování potrubních přestupů		
Vyřádění projektant:			
Vyřádění TDI:			
Vyřádění GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt	SO 02.1 - ASŘ SO 03.1 - ASŘ SO 23.1 - ASŘ	
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	
		Cenová kalkulace :	
		SO 02.1 přípočty	23 636,51
		SO 03.1 přípočty	23 553,52
		SO 23.1 přípočty	48 313,71
		Celkem	95 503,74 Kč
Za objednavatele:	Jméno: EVA NAVRÁTKOVÁ Datum: 17.12.		Razítko
Za TDI:		17.12.2021	
Za projektanta:		17.12.2021	
Za zhotovitele:		17.12.2021	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 005									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí technik				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 636,51		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 096,39		
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 096,39		
155	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index	m2	71,992	203,56	14 654,73		smluvní položka
	W		izolace základů - 2x pás SBS						
	W		oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2						
	W		553,788*0,13		71,992				
158	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index	m2	17,430	203,56	3 548,08		smluvní položka
	W		izolace základů - 2x pás SBS						
	W		oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2						
	W		96,834*0,18		17,430				
	NP	K	711474067 Izolace proti vodě opravení trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	10,000	325,00	3 250,00		CS ÚRS 2021 02
		W	splšková kanalizace		7,000				
		W	dešťová kanalizace		2,000				
		W	vodovod		1,000				
		W	součet		10,000				
163	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,000	214,53	643,58		CS ÚRS 2020 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 540,12		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)	%	6,970	220,96	1 540,12		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 005									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 03 - Hospodářský pavilon							
Soupis:		SO 03.1 - ASŘ							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí technik				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 553,52		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				22 018,81		
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 018,81		
154	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index	m2	63,117	203,56	12 848,09		smluvní položka
	W		oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2						
	W		486,519*0,13		63,117				
157	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou pro střední radonový index	m2	14,759	203,56	3 004,40		smluvní položka
	W		izolace základů - 2x pás SBS						
	W		oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2						
	W		81,998*0,18		14,759				
	NP	K	711474067 Izolace proti vodě opravení trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	17,000	325,00	5 525,00		CS ÚRS 2021 02
		W	splšková kanalizace		11,000				
		W	tuková kanalizace		2,000				
		W	dešťová kanalizace		3,000				
		W	vodovod		1,000				
		W	součet		17,000				
162	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,000	213,77	641,32		CS ÚRS 2020 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 534,71		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)	%	6,970	220,19	1 534,71		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 005									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 23 - Pavilon B							
Soupis:		SO 23.1 - ASŘ							
Misto:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							48 313,71		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				44 652,23		
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				44 652,23		
169	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s výztužnou vložkoupro střední radonový index	m2	160,769	203,56	32 726,04		smluvní položka
	W		izolace základové spáry - 2x modifikovaný asf. pás						
	W		oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2						
	W		1236,681*0,13		160,769				
171	M	6285500R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s výztužnou vložkoupro střední radonový index	m2	28,799	177,11	5 100,64		smluvní položka
	W		izolace základové spáry						
	W		oprava dopočtem jednotkového množství materiálu ve specifikaci, kod položky 71114-1559 1,15000 m2/m2						
	W		159,996*0,18		28,799				
NP	K	711474067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	17,000	325,00	5 525,00		CS ÚRS 2021 02
	W		spláskové kanalizace		12,000				
	W		dešťová kanalizace		4,000				
	W		vodovod		1,000				
	W		součet		17,000				
177	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,000	433,52	1 300,55		CS ÚRS 2020 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 661,48		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	446,52	3 661,48		

Technický list změny (TLZ) č.:		6																									
Datum předložení TLZ:		09.12.2021																									
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV																									
Ze dne:																											
Projekt registrační číslo:																											
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10																										
Objekt:																											
Název změny:	Příprava území - skryvka ornice																										
Žadatel změny:	GD																										
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Oprava výměry položky č. 121151123 a její uvedení do souladu s přílohou D.1.21.01 Dokumentace provedení stavby																										
Vyjádření projektant:																											
Vyjádření TDI:																											
Vyjádření GI:																											
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt	SO 01																									
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná																										
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO																									
Orientační cenový dopad:	Odpočet: Připočet: ANO	Cenová kalkulace : SO 01: připočty	390 934,55 Kč 390 934,55 Kč																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jméno</th> <th>Datum</th> <th>Podpis</th> <th>Razítko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JA NADASTLOVÁ</td> <td>19.12.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za objednavatele:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za TDI:</td> <td>17.12.2021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za projektanta:</td> <td>17.12.2021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za zhotovitele:</td> <td>17.12.2021</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Jméno	Datum	Podpis	Razítko	JA NADASTLOVÁ	19.12.			Za objednavatele:				Za TDI:	17.12.2021			Za projektanta:	17.12.2021			Za zhotovitele:	17.12.2021		
Jméno	Datum	Podpis	Razítko																								
JA NADASTLOVÁ	19.12.																										
Za objednavatele:																											
Za TDI:	17.12.2021																										
Za projektanta:	17.12.2021																										
Za zhotovitele:	17.12.2021																										

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 006									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 01 - Příprava území							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							390 934,55		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				365 461,86		
D	1		Zemní práce				365 461,86		
13	K	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	1 340,800	272,57	365 461,86		CS ÚRS 2020 02
			Smluvní množství: 335,2 (m2)						
			Množství dle přílohy D.1.21.01 : 1676 (m2)						
			Rozdíl: 1340,8 (m2)						
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				25 472,69		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)	%	6,970	3 654,62	25 472,69		

Technický list změny (TLZ) č.:		8	
Datum předložení TLZ:		29.11.2021	
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:	17.06.2021		
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	Demolice mateřské školy - doplnění dle pasportu		
Žadatel změny:	GD		
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Doplnění výkazu výměr o likvidaci volně stojícího nábytku, krytů otopných těles a skládkovně směsného odpadu v rozsahu pasportizace zbývajících nábytku nezahrnutého do výkazu výměr.		
Vyřádění projektant:			
Vyřádění TDI:			
Vyřádění GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č.	1	
	Zápis v deníku změn PD č.		
	Dotčený objekt	SO 22	
Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV	Kalkulace	
	Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	ANO	
	Přípočet:		
	Cenová kalkulace :		
	So 22: přípočty		41 812,58 Kč
			41 812,58 Kč
	Jméno	Datum	Razítko
Za objednatele:		17.12.	
Za TDI:		9.12.2021	
Za projektanta:		9.12.2021	
Za zhotovitele:		12.2021	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 008													
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část											
Objekt:		SO 22 - Demolice stávající MŠ											
Místo:		Datum:											
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38						Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.			
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník						Zpracovatel:					
PČ	Typ	Kód	Popis					MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem												41 812,58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV								38 643,79		
D											38 643,79		
NP			Demontáž prvků (kryty topení, volné stojící skříně, vestavěné skříně, regály)					hod	96,000	363,00	34 848,00	vlastní ocenění	
	w		stavební dělník, (363,-h) - pol. z ÚRS H2S 1292-21 II										
NP	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					t	1,450	879,00	1 274,55	CS ÚRS 2021 02	
	w		(kryty topení, volné stojící skříně, vestavěné skříně, regály)						1,45				
NP	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904					t	2,212	1 140,00	2 521,24	CS ÚRS 2020 02	
	w		(kryty topení, volné stojící skříně, vestavěné skříně, regály)						1,45				
	w		koberec 650g/m2: (108+13+16)*0,00065						0,08905				
	w		PVC 2,8kg/m2: (113+49+30+3,1+8,6+1,25)*0,0028						0,57386				
	w		koženková dělicí stěna 5kg/m2: (2*4,7*2,1)*0,005						0,0987				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady								3 168,79		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)					%	8,200	386,44	3 168,79		

Technický list změny (TLZ) č.:		9																					
Datum předložení TLZ:		29.11.2021																					
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel:	AV.21028.1.130/001/INV																				
Ze dne:	17.06.2021																						
Projekt registrační číslo:																							
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10																						
Objekt:																							
Název změny: Demolice mateřské školy - likvidace výměňkové stanice																							
Žadatel změny: GD																							
Popis změny a důvod - zhotovitel:		Doplnění výkazu výměr o likvidaci výměňkové stanice v rozsahu pasportizace.																					
Vyjádření projektant:																							
Vyjádření TDI:																							
Vyjádření GI:																							
Odkazy :	Zápis z KD č.	1																					
	Zápis v deníku změn PD č.																						
	Dotčený objekt	SO 22																					
Přílohy:	PD - schéma/podklady																						
	ZL kalkulace - podrobná s VV	Kalkulace																					
	Jiná																						
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO																					
	s dopadem																						
Orientační cenový dopad:	Odpočet:																						
	Připočet:	ANO																					
	Cenová kalkulace :																						
	So 22:	připočty	31 421,28 Kč																				
			31 421,28 Kč																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jméno</th> <th>Datum</th> <th>Předpis</th> <th>Razítko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Za objednavatele: JUD. NAVRATILOVA</td> <td>11.12.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za TDI:</td> <td>9.12.2021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za projektanta:</td> <td>9.12.2021</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za zhotovitele:</td> <td>9.12.2021</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Jméno	Datum	Předpis	Razítko	Za objednavatele: JUD. NAVRATILOVA	11.12.			Za TDI:	9.12.2021			Za projektanta:	9.12.2021			Za zhotovitele:	9.12.2021		
Jméno	Datum	Předpis	Razítko																				
Za objednavatele: JUD. NAVRATILOVA	11.12.																						
Za TDI:	9.12.2021																						
Za projektanta:	9.12.2021																						
Za zhotovitele:	9.12.2021																						

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 009									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 22 - Demolice stávající MŠ							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							31 421,28		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 040,00		
			Ostatní				29 040,00		
NP			Demontáž výměňkové stanice komplet zařízení vč. likvidace	hod	80,000	363,00	29 040,00		vlastní ocenění
			demontáž výměníku tepla, čerpadel, expanzní nádoby, trubních rozvodů, trubních izolací, armatur, elektropřísušek - dělník stavební (363.-th)- HZS 1292						
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 381,28		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (8.20%)	%	8,200	290,40	2 381,28		



POVĚŘENÍ č. 20/GG/082

k podepisování dokumentů elektronickým podpisem

GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III

IČO: 281 69 522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva

(dále jen „zaměstnavatel“)

tímto

pověřuje

svou zaměstnankyni

 která je držitelkou kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis zaměstnavatele (dále jen „pověřený zaměstnanec“),

aby v souladu s výkonem své pracovní pozice tímto elektronickým podpisem podepisoval veškeré elektronické dokumenty zaměstnavatele, jejichž podepsání forma úkonu vyžaduje, a to zejména, nikoliv však výlučně:

- žádosti o účast a nabídky v řízeních o veřejných zakázkách,
- žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
- objasnění či doplnění údajů, dokladů, vzorků či modelů,
- veškerou další komunikaci se zadavatelem včetně registrace společnosti na profilu zadavatele,
- námitky týkající se úkonů či opomenutí zadavatele,
- návrhy na zahájení řízení před správním či soudním orgánem,
- smlouvy, dohody, smíry či narovnání,
- odvolání, stanoviska, prohlášení, uplatnění nároků
- a další.

Pověřený zaměstnanec je v souladu s výkonem své pracovní pozice rovněž oprávněn podepisovat při účasti zaměstnavatele v elektronické aukci.

Pověřený zaměstnanec je oprávněn výše popsaným způsobem činit veškeré hmotněprávní a procesněprávní úkony, k nimž by byl oprávněn za zaměstnavatele jeho statutární orgán.

Praha dne 10. srpna 2020

**Luděk
Kostka**

Digitálně podepsal
Luděk Kostka
Datum: 2020.08.10
12:44:12 +02'00'

Luděk Kostka, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám pověření:



 pověřená osoba

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/0933

ze dne 17. 6. 2021

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostkou Renatou Chmelovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská**

zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské smlouvy

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Společník: VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČO: 251 10 977

DIČ: CZ25110977

Adresa pro zaslání korespondence zhotoviteli:

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s.

č. účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označování jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Čas plnění

Tímto Dodatkem č. 3 se mění znění čl. 5, doba plnění, odstavec 5. 1, bod 5. 1. 2. výše uvedené smlouvy – provedení díla a dodatku č. 2. Termín provedení díla se prodlužuje o 67 dní na dobu plnění 20 měsíců a 88 dní.

III.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 3 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 2 746 753, 57 Kč bez DPH

a zároveň se snižuje o částku 299 665, 65 Kč bez DPH

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 2 447 087,92 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 134 108 015, 43 Kč

(slovy: stotřicetčtyřimilionůstoosmtisícpatnáct korun českých a 43 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

IV.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, položkové rozpočty méněprací a víceprací, č. 2, pověření č. 20/GG/082, k podepisování dokumentů elektronickým podpisem.

V Praze dne _____

Tomáš Urbánek

Digitálně podepsal Tomáš Urbánek
Datum: 2022.05.09 08:30:50 +02'00'

Městská část Praha 10

Mgr. Tomáš Urbánek

vedoucí odboru majetkoprávního

Objednatel

V Praze dne _____



pověřená osoba na základě pověření a
společenské smlouvy

Zhotovitel

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. ze dne 2022

Ověřovatel jméno a příjmení:.....

Podpis:.....

Organizační j.:		PVŘ		Cena dle zák. SOD:		128 926 467		\$222 ZZVZ		Maximální procenta		Maximální hodnota Změny		Vyčerpano		Zbývá		Zpracoval / Datum aktualizace :		M.J.		17.02.2022	
Název zakázky:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10		Cena vč. dodatků:		131 660 928		odst. 4		15%		19 338 970		19 338 970									
Číslo zakázky:		AV.21028.1.130						odst. 5		50%		64 463 233		60 813 983									
VRT:		Martin Jelen						odst. 6		50%		64 463 233		62 528 766									
T. dok. dle SOD		31.3.2023		Cena všech ZL		5 181 549		Odst. 5 a 6		30%		38 677 940		33 393 888									
T. dok. dle ZL		27.6.2023						Odst. 7				-102 503											
č.	číslo ZL	Název ZL		Datum		Příčina změny		Dopad změny do SOD s klientem		Slav schvalování změny		Přípočty	Odpočty	Změna celkem	Zařídění odst. Dle \$222 ZZVZ	Cena Změny (Kč)	změna termínu	Zahnutí změny do dod.SOD s klientem		č. dod.	Kč		
7	ZL 07	Alky														3 398 318		21					
10	ZL 10	Archeologický průzkum			zjištění	podání ZL				S													
11	ZL 11	Pojíždění techniky pro stavbu v ochr.pásmu horkovodu								J						1 783 231		67					
14	ZL 14									P						Celkem ZL							
						(kod)										5 181 549	88						
																663 856 69							
																17 708 03							
																1 765 523 20	67						

Technický list změny (TLZ) č.:		7
Datum předložení TLZ:		03.12.2021
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV
Za dne:		
Projekt registrační číslo:		
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10	
Objekt:		
Název změny:	HSV - vyzdívký atik	
Žadatel změny:	Uvedení do souladu projektové dokumentace a VÝKAZU VÝMĚR	
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Oprava smluvního výkazu výměr, uvedení do souladu s Dokumentací pro provedení stavby	
Vyjádření projektanta:	PROJEKTANT SOUHLASÍ	
Vyjádření TDI:	S PŘEDLOŽENÍM OCENĚNÍM SOUHLASÍ	
Vyjádření GI:		
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt	SO 02.1 - ASŘ SO 03.1 - ASŘ SO 23.1 - ASŘ
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobně s VV Jiná	
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO Cenová kalkulace : SO 02.1 přípočty 287 325,43 SO 02.1 odpočty -89 166,40 SO 03.1 přípočty 222 100,51 SO 03.1 odpočty -69 755,61 SO 23.1 přípočty 454 096,40 SO 23.1 odpočty -140 743,64 Celkem 663 856,69 Kč

	Jméno	Datum
Za objednatele:	J. H. KUBÁTKOVÁ	14.1.22
Za TDI		
Za projektanta		
Za zhotovitele		

Ořídil: 12.12.2021
 170 00 Praha 7
 DIČ: CZ28169522

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 007									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							287 325,43		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				274 413,69		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				266 253,77		
18	K	311113142	Nosná zed' tl do 200 mm z hladkých tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	86,820	1 242,09	107 838,25	smluvní položka	
	W		příloha D.1.02.1.6						
	W		atika						
	W		(21,70+3,58+5,63+1,25+7,30+16,50+5,85+6,98+18,03)*1,00		86,820				
24	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,736	37 377,63	64 902,52	smluvní položka	
	W		množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice atika						
	W		(21,70+3,58+5,63+1,25+7,30+16,50+5,85+6,98+18,03)*1,00*0,02		1,736				
NP0	K	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	89,060	1 050,00	93 513,00	CS ÚRS 2021 02	
	W		25,8+25,8-0,40-0,4+13,68+13,68-0,4-0,4+5,85+5,85		89,060				
D	998		Přesun hmot				8 159,92		
148	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	27,435	297,43	8 159,92	smluvní položka	
			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm (-82,479*0,16519)		-13,62470601				
			Nosná zed' tl do 200 mm z hladkých tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 (86,820*0,45195)		39,238299				
			Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 (1,736*1,04881)		1,821153684				
			součet		27,435				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 911,74		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)	%	6,970	1 852,47	12 911,74		
			VRN odečty (Kč)		-89 166,40				
			VRN přípočty (Kč)		274 413,69				
			součet		185 247,290				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 007									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-89 166,40		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-89 166,40		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-89 166,40		
21	K	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm	m2	-82,479	1 081,08	-89 166,40	smluvní položka	
	W		příloha D.1.02.1.6						
	W		atika						
	W		(21,70+3,58+5,63+1,25+7,30+16,50+5,85+6,98+18,03)*0,95		-82,479				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 007									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 03 - Hospodářský pavilon							
Soupis:		SO 03.1 - ASŘ							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							222 100,51		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				212 173,95		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				205 791,02		
23	K	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	67,920	1 242,09	84 362,75	smluvní položka	
	W		příloha D.1.03.1.6						
	W		atika						
	W		(21,23+13,13-0,40)/2*1		67,920				
28	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,358	37 377,63	50 773,77	smluvní položka	
	W		příloha D.1.03.1.6						
	W		množství výztuže 20kg/m2 - prolévané hárnice atika						
	W		(21,23+13,13-0,40)/2*1*0,020		1,358				
NP01	K	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	67,290	1 050,00	70 654,50	CS ÚRS 2021 02	
			21,23+21,23-0,4-0,4+13,13+13,3-0,4-0,4		67,290				
	D	998	Presun hmot				6 382,93		
147	K	998011002	Presun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	21,462	297,40	6 382,93	smluvní položka	
			Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm (-64,524*0,16519)		-10,659				
			Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 (67,92*0,45195)		30,696				
			Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 (1,358*1,04881)		1,425				
			součet		21,462				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 926,56		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)	%	6,970	1 424,18	9 926,56		
			VRN odečty (Kč)		-69 755,61				
			VRN přípočty (Kč)		212 173,95				
			součet		142 418,340				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 007									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 03 - Hospodářský pavilon							
Soupis:		SO 03.1 - ASŘ							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-69 755,61		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-69 755,61		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				-69 755,61		
25	K	311234021	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm	m2	-64,524	1 081,08	-69 755,61	smluvní položka	
	W		příloha D.1.03.1.6						
	W		atika						
	W		(21,23+13,13-0,40)/2*0,95		-64,524				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 007									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 23 - Pavilon B							
Soupis:		SO 23.1 - ASŘ							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							454 096,40		
d	HSV		Práce a dodávky HSV				430 348,78		
d	3		Svislé a kompletní konstrukce				414 242,62		
26	K	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	137,040	1 242,09	170 216,01		smluvní položka
	W		příloha D.1.23.1.6						
	W		atika						
	W		(38,02+3,58*2+1,10+5,98+1,25+7,30+17,10+9,31+8,88+9,31+17,10+7,30+1,25+5,98)*1,00		137,040				
32	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	2,741	37 377,63	102 444,61		smluvní položka
	W		příloha D.1.23.1.6						
	W		množství výztuže 20kg/m2 - prolévané tvárnice atika						
	W		(38,02+3,58*2+1,10+5,98+1,25+7,30+17,10+9,31+8,88+9,31+17,10+7,30+1,25+5,98)*1,00*0,02		2,741				
NP0	K	985331111	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	134,840	1 050,00	141 582,00		CS ÚRS 2021 02
	W		45,18+45,18-0,4-0,4+13,68+13,68+9,36+9,36-0,4-0,4		134,840				
d	998		Přesun hmot				16 106,16		
162	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	54,151	297,43	16 106,16		smluvní položka
			Zdvo jednoduché z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm (-130,188*0,16519)		-10,659				
			Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 (137,040*0,45195)		61,935				
			Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 (2,741*1,04881)		2,875				
			součet		54,151				
d	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				23 747,62		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	2 896,05	23 747,62		
			VRN odečty (Kč)		-140 743,64				
			VRN přípočty (Kč)		430 348,78				
			součet		289 605,140				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 007									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 23 - Pavilon B							
Soupis:		SO 23.1 - ASŘ							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-140 743,64		
d	HSV		Práce a dodávky HSV				-140 743,64		
d	3		Svislé a kompletní konstrukce				-140 743,64		
29	K	311234021	Zdvo jednoduché z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 200 mm	m2	-130,188	1 081,08	-140 743,64		smluvní položka
	W		příloha D.1.23.1.6						
	W		atika						
	W		(38,02+3,58*2+1,10+5,98+1,25+7,30+17,10+9,31+8,88+9,31+17,10+7,30+1,25+5,98)*0,95		-130,188				

Technický list změny (TLZ) č.:		10	
Datum předložení TLZ:		29.11.2021	
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:		Archeologický průzkum	
Žadatel změny:		GOS	
Popis změny a důvod - zhotovitel:		Dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění hraří náklady záchranného archeologického výzkumu stavebník	
Vyřádění projektant: PROJEKTANT SOUHLASÍ			
Vyřádění TDI: S PŘEDLOŽENÝM OCEŇOVÁNÍM SOUHLASÍ			
Vyřádění GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt		
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	AND	
Cenová kalkulace :			
ON	přípočty	17 708,03	
Celkem		17 708,03 Kč	
jméno		Datum	
Za objednavatele:		JIA NAVRÁTKOVÁ 15.2.22	
Za TDI:			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			
		Razítko	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 010									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		ON-ON							
Místo:							Datum:		
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17 708,03		
			Ostatní náklady				17 708,03		
NP			Archeologický výzkum formou odborného dohledu nad výkopovými pracemi	kpl	1,000	17 708,03	17 708,03		Vlastní
			kalkulace ceny:						
			Cenová nabídka Archeo Pro o.p.s.: 15 700,- Kč bez DPH						
			+ koordinační přírážka ve výši 12,79%: 17 708,03 Kč bez DPH						

Technický list změny (TLZ) č.:		11
Datum předložení TLZ:		16.02.2022
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:	17.06.2021	
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10	
Objekt:		
Název změny:	Pojíždění techniky v ochranném pásmu horkovodu	
Žadatel změny:	GD	
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Po projednání DSP dokumentace obsahovala souhlasné stanovisko se stavebním záměrem od PTas, kde bylo popsáno, že se v ochranném pásmu horkovodu nesmí pohybovat těžká stavební technika, ale zároveň souhlasí se zpevněnými plochami v areálu, které v tomto pásmu jsou. Zhotovitel poskytl informaci o tom jaké typy těžké techniky se budou pohybovat po staveništi a na základě této informace projektant ověřil zatížení od stavební techniky oproti zatížení, které bylo uvažováno na nové komunikaci. PTas po dotázání poskytlo archivní výkresy, které bohužel neobsahovaly detailní informace o horkovodním kanálu vypovídající o možnosti jeho pojezdu. Dle dostupných informací byl závěr takový, že by zatížení od stavební techniky nemělo být větší než uvažované zatížení, kterému odolá komunikace v areálu. S touto informací proběhlo jednání na PTas, kde vznikl požadavek na osazení silničních panelů z hlediska bezpečnosti a ochrany kanálu před poškozením. Tento požadavek nemohl dříve nikdo předpokládat. Byly předloženy 3 varianty postupu výstavby a řešení pohybu těžké techniky po staveništi. Tyto varianty byly diskutovány na KD stavby a následně zaslány včetně harmonogramů a hrubého vyčíslení zvýšených nákladů mailem dne 14.2.2022. Ve vazbě na vyjádření Pražské teplárenské, časovou a ekonomickou stránku jednotlivých variant, se jeví jako nejrealističtější varianta 3, která je zapracována do tohoto ZL. Jedná se o řešení- panelová cesta v místě plánované komunikace na již vybudované definitivní vrstvy komunikace. Tomu musí předcházet realizace areálových rozvodů zejména dešťové a splaškové kanalizace. Toto řešení vyvolává úpravu harmonogramu postupu výstavby oproti smluvnímu harmonogramu a prodloužení lhůty výstavby. V příloženém HMG jsou zřejmé změny pořadí prováděných činností a rovněž úpravy realizačních časů některých činností oproti smluvnímu HMG ve snaze minimalizovat časové dopady na realizaci. I po úpravách (zkrácení) realizačních časů dochází k celkovému prodloužení lhůty výstavby.	
Vyjádření projektant:	PROJEKTANT SOUHLASÍ	
Vyjádření TDI:	S POPLNENÍM DO SOUHLASÍ	
Vyjádření Investora:		



Odkazy :	Zápis z KD č.	13/3	+ návazné body
	Dotčený objekt		
Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV	Kalkulace	
	Jiná	HMG	
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu		viz HMG
	s dopadem	ANO	
Orientační cenový dopad:	Odpočet:		Cenová kalkulace : připočty
	Připočet:	ANO	
			1 765 523,20 Kč 1 765 523,20 Kč
	Jméno	Datum	Razítko
Za objednatele:	Dis. Eva Navrátilová	21.4.22	
Za TDI			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

MŠ Bajkalská- řešení těžké dopravy na staveništi					
Náklady na prodloužení výstavby o 2,2 měsíce	kpl	1	1 326 723,20	1 326 723,20	viz samostatná příloha č. 1
pronájem 4 měsíce (60,-/m2/měs)	m2	400	240,00	96 000,00	pronájem na 4 měsíce
doprava na stavbu a zpět, manipulace	m2	400	580,00	232 000,00	
oprava podloží (konstrukční skladby podloží komunikace)	m2	400	200,00	80 000,00	po demontáži panelové cesty
zvýšené náklady na dopravu stropních panelů pavilonu A nad 1.NP, vzhledem k dosud neodsouhlasenému ZL 11- změna trasy a na stavbě a návoz "sólo" auty (ne návěs)	kpl	1	30 800,00	30 800,00	zvolena alternativa dopravy pro minimalizaci dopadů do realizačního HMG. U ostatních pavilonů toto není možné.
CELKEM bez DPH				1 765 523,20	

KALKULACE NÁKLADŮ NA PRODLOUŽENÍ VÝSTAVBY			
Náklady na vedení stavby	měs	Kč/měs	Celkem
vedoucí projektového týmu	2,2	100 000,00	220 000,00
hlavní stavbyvedoucí	2,2	80 000,00	176 000,00
stavbyvedoucí	2,2	80 000,00	176 000,00
mistr	2,2	65 000,00	143 000,00
přípravář	2,2	80 000,00	176 000,00
dopravné / pohonné hmoty (kpl)	2,2	30 000,00	66 000,00
Náklady na zařízení staveniště	měs	Kč/měs	Celkem
sanitární buňka - nájem (1ks)	2,2	8 000,00	17 600,00
kancelářská buňka - nájem (8ks)	2,2	40 000,00	88 000,00
sklad - nájem (1ks)	2,2	3 000,00	6 600,00
náklady na připojení IT ZS na internet	2,2	1 250,00	2 750,00
energie ZS (kpl)	2,2	20 000,00	44 000,00
odpady ZS (kpl)	2,2	600,00	1 320,00
úklid ZS (kpl)	2,2	3 136,00	6 899,20
ostraha staveniště (kpl)	2,2	57 500,00	126 500,00
oplocení staveniště (100bm)	2,2	5 000,00	11 000,00
DIO (kpl)	2,2	1 470,00	3 234,00
Specifické náklady	měs	Kč/měs	Celkem
bankovní garance	2,2	14 000,00	30 800,00
pojištění stavby	2,2	6 100,00	13 420,00
vedení účetnictví	2,2	8 000,00	17 600,00
Celkem náklady na prodloužení výstavby o 2,2 měs			1 326 723,20



POVĚŘENÍ č. 20/GG/082
k podepisování dokumentů elektronickým podpisem

GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva

(dále jen „zaměstnavatel“)

tímto

pověřuje

svou zaměstnankyni ,
 která je držitelkou kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis zaměstnavatele (dále jen „pověřený zaměstnanec“),

aby v souladu s výkonem své pracovní pozice tímto elektronickým podpisem podepisoval veškeré elektronické dokumenty zaměstnavatele, jejichž podepsání forma úkonu vyžaduje, a to zejména, nikoliv však výlučně:

- žádosti o účast a nabídky v řízeních o veřejných zakázkách,
- žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace,
- objasnění či doplnění údajů, dokladů, vzorků či modelů,
- veškerou další komunikaci se zadavatelem včetně registrace společnosti na profilu zadavatele,
- námitky týkající se úkonů či opomenutí zadavatele,
- návrhy na zahájení řízení před správním či soudním orgánem,
- smlouvy, dohody, smíry či narovnání,
- odvolání, stanoviska, prohlášení, uplatnění nároků
- a další.

Pověřený zaměstnanec je v souladu s výkonem své pracovní pozice rovněž oprávněn podepisovat při účasti zaměstnavatele v elektronické aukci.

Pověřený zaměstnanec je oprávněn výše popsaným způsobem činit veškeré hmotněprávní a procesněprávní úkony, k nimž by byl oprávněn za zaměstnavatele jeho statutární orgán.

Praha dne 10. srpna 2020

**Luděk
Kostka**

Digitálně podepsal
Luděk Kostka
Datum: 2020.08.10
12:44:12 +02'00'

Luděk Kostka, člen představenstva
GEOSAN GROUP a. s.

Přijímám pověření:



 pověřená osoba

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/0933

ze dne 17. 6. 2021

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená 1. místostarostkou Ing. Janou Komrskovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucího OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: **GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská**

zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské smlouvy

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Společník: VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČO: 251 10 977

DIČ: CZ25110977

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s.

č. účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 4 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 2 013 660, 35 Kč bez DPH

a zároveň se snižuje o částku 119 485, 79 Kč bez DPH

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 1 894 174, 50 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 136 002 189, 93 Kč

(slovy: stotřicetšestmilionůdvatisícetsoomsdesátdevět korun českých a 93 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

IV.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, položkové rozpočty méněprací a víceprací.

V Praze dne Dušan Digitálně podepsal
 Kodrla Dušan Kodrla
Datum: 2022.07.29
10:01:30 +02'00'

Městská část Praha 10

Ing. Dušan Kodrla

pověřený vedením odboru majetkoprávního

Objednatel



pověřená osoba na základě pověření a
společenské smlouvy
Zhotovitel

Rekapitulace změn

Projekt : Vystavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Organizační j.:		PVŘ		Cena dle zákl. SOD:		128 926 467		§222 ZZVZ		Maximální procenta		Maximální hodnota Změny		Vyčeráno		Zbývá		Datum aktualizace :		M.J.		17.02.2022																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Název zakázky:		Výstava mateřské školy v ulici Baletská, Praha 10		Cena vč. dodatků:		131 660 928		odst. 4		15%		19 338 970		4 337 195		60 126 038																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Číslo zakázky:		AV/21028.1.130						odst. 5		50%		64 463 233		2 786 497		61 676 737																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
VRT:		Martin Jelen						odst. 6		50%		64 463 233		6 682 071		31 995 869																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
T. dok. dle SOD		31.3.2023				7 244 219		Odst. 5 a 6		30%		38 677 940		-102 503																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
T. dok. dle ZL		27.6.2023						Odst. 7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
č.	číslo ZL	Název ZL	Datum		Dopad změny do SOD s klientem		Stav schvalování změny	Přípočky	Odpočty	Změna celkem	Zajištění odst. Dle §222 ZZVZ	Cena Změny (Kč)	změna termínu	celkem dle	Zahrnutí změny do dod SOD s klientem	Základní	Změna celkem	Zajištění odst. Dle §222 ZZVZ	Cena Změny (Kč)	změna termínu	celkem dle	Zahrnutí změny do dod SOD s klientem	Základní	Změna celkem	Zajištění odst. Dle §222 ZZVZ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			zjištění	podání ZL	Přčina změny	(kód)																				cena	termín	S	J	P	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL012	
Datum předložení TLZ:			
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:		Dohledání skutečné trasy vodovodní přípojky	
Žadatel změny:			
Popis změny a důvod - zhotovitel:		Přesná trasa vodovodní přípojky nebyla v minulosti zanesena v podkladech. Bylo ji nutné v areálu dohledat postupným ručním kopáním sond.	
Vyjádření projektant:			
Vyjádření TDI:		BEZ PŘÍLOH	
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č.	17	
	Zápis v deníku změn PD č.		
	Dotčený objekt	SO 07	
Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV		
	Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		
Cenový dopad:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		
		Cenová kalkulace :	
		přípočty	85 918,43
		Celkem	85 918,43 Kč
Jméno		Datum	Razítko
Za objednavatele:			
Za TDI			
Za projektanta			
Za zhotovitele			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL012 - Dohledání skutečné trasy vodovodní přípojky

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 918,43	
D HSV Práce a dodávky HSV							79 407,06	
D 1 Zemní práce							79 407,06	
1	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3	m3	33,500	2 136,36	71 568,06	SoD
	W		*výkop jednotlivých sond					
	W		1*1*1*18		18,000			
	W		1*1*1,5*5		7,500			
	W		1*1*2*4		8,000			
	W		Součet		33,500			
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	33,500	234,00	7 839,00	CS ÚRS 2022 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							6 511,37	
3	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	794,07	6 511,37	SoD

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL013	
Datum předložení TLZ:			
SoD č.:	objednatel:	2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:		Likvidace lokálních výskytů navážek a nahrazení materiálem dle požadavků geologa	
Žadatel změny:			
Popis změny a důvod - zhotovitel:		Při realizaci výkopových prací pro základy objektů byly průběžně nacházeny staré navážky suti. Geolog z důvodu bezpečného založení objektů stanovil staré navážky suti odtěžit a nahradit hutněnou šterkodrtí.	
Vyřádění projektant:			
Vyřádění TDI: <i>JEZ PROPOJENÉ</i>			
Vyřádění GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č.	17	
	Zápis v deníku změn PD č.		
	Dotčený objekt	SO 02, SO 03, SO 23	
Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV		
	Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		
Cenový dopad:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		
		Cenová kalkulace :	
		přípočty	90 550,85
		Celkem	90 550,85 Kč
Jméno		Datum	Razítko
Za objednavatele:			
Za TDI			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL013 - Likvidace lokálních výskytů navážek a nahrazení materiálem dle požadavků geologa

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Př	Tř	Kód	Popis	M ¹	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							90 550,85	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				83 688,43	
D		1	Zemní práce				39 288,25	
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	14,700	974,00	14 317,80	CS ÚRS 2022 01
	WV		"odkopávky navážek v místě základů					
	WV		"Pavilon A					
	WV		1*2+0,9*3+1,2+0,7*2		7,300			
	WV		"Hospodářský pavilon					
	WV		0,8+1+0,7+1,5+1		5,000			
	WV		"Pavilon B					
	WV		1,2*2		2,400			
	WV		Součet		14,700			
2	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	14,700	234,00	3 439,80	CS ÚRS 2022 01
3	M	58344171	šterkodit frakce 0/32	t	29,400	465,00	13 671,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		14,7*2 Přepočtené koeficientem množství		29,400			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	14,700	375,39	5 518,23	SoD
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	73,500	27,37	2 011,70	SoD
	WV		14,7*5 Přepočtené koeficientem množství		73,500			
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,700	22,43	329,72	SoD
D		997	Přesun sutě				44 400,18	
7	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	29,400	728,04	21 404,38	SoD
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	29,400	242,60	7 132,44	SoD
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	411,600	10,61	4 367,08	SoD
	WV		29,4*14 Přepočtené koeficientem množství		411,600			
10	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	29,400	391,03	11 496,28	SoD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 862,42	
11	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	836,88	6 862,42	SoD

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL017	
Datum předložení TLZ:			
SoD č.:	objednatel 2021/OMP/0933	zhotovitel:	AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:		Sanace únosnosti pláně komunikace	
Žadatel změny:			
Popis změny a důvod - zhotovitel:	ZL řeší sanaci zemní pláně pod budoucími komunikacemi v areálu objektu. Z důvodu nevhodného stavu zemin v aktivní zóně pod navrženou stavbou, zjištěno geotechnickými zkouškami, bylo nutné nevhodné zeminy odtěžit a nahradit je štěrkodrtí. Dle PD byl v místě komunikace před hospodářským pavilonem navržen polyetylenový odlučovač tuků (referenční výrobek LipuMax P-DA). Z důvodu zjištěného geotechnicky nevyhovujícího podloží byla odsouhlasena změna za robustnější betonový odlučovač (referenční výrobek LipuMax-C) odpovídajícího objemu a odečteno nedodávané dovybavení.		
Vyjádření projektant:			
Vyjádření TDI:		BEZ PŘÍPOČTŮ	
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt	19 - 23 SO 04, SO 24, SO 17	
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	
		Cenová kalkulace :	
		přípočty	512 551,62
		odpočty	-1 645,65
		Celkem	510 905,97 Kč
	Jméno	Datum	Podpis
Za objednatele:			
Za TDI:			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL017 - Sanace únosnosti pláně komunikace

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Př.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							510 770,99	
D HSV Práce a dodávky HSV							454 187,91	
D 1 Zemní práce							183 414,43	
1	K	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	168,000	283,01	47 545,68	SoD
VV					560*0,3	168,000		
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	2,250	209,77	471,98	SOD
VV					výkop pro sondy zátěžových zkoušek			
VV					5*0,3*1,5*1,0	2,250		
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	170,250	299,02	50 908,16	SoD
VV					168*2,25	170,250		
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	851,250	13,80	11 747,25	SoD
VV					170,25*5 *Přepočtené koeficientem množství	851,250		
5	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	272,400	253,02	68 922,65	SoD
VV					170,25*1,6 *Přepočtené koeficientem množství	272,400		
6	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky	m3	170,250	22,43	3 818,71	SoD
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							-1 645,65	
7	M	59431150R02	zařízení pro měření tukové vrstvy	kus	-1,000	1 645,65	-1 645,65	SoD
P					Nedodávané dovybavení lapolu			
D 5 Komunikace pozemní							206 096,80	
8	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm 0/63	m2	560,000	138,01	77 285,60	SoD
9	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	560,000	230,02	128 811,20	SoD
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							66 276,96	
10	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	560,000	53,25	29 820,00	SoD
D 91 Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch							36 456,96	
11	K	910.001	Statické zátěžové zkoušky, z 02/2022 skutečnost dle fa dodavatele	kpl	1,000	22 080,00	22 080,00	fa dodavatel
12	K	910.002	Statické zátěžové zkoušky, z 03/2022 skutečnost dle fa dodavatele	kpl	1,000	10 240,00	10 240,00	fa dodavatel
13	K	910.003	Koordinální a inženýrská činnost	%	12,800	323,20	4 136,96	
P					Poznámka k položce: Pro statické zátěžové zkoušky přefakturované od dodavatele KALKULACE přírůžky na SUB: Zisk 3,2% Správní režie - centrála 3,6% Správní režie - závod (projekt) 3,5% Finanční náklady 1,5% Rezerva na reklamace 1% CELKEM 12,8%			
D 998 Přesun hmot							45,37	
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	0,263	172,51	45,37	SoD
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							17 874,00	
15	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	54,000	331,00	17 874,00	CS ÚRS 2022 01
VV					"příprava na provedení statických zátěžových zkoušek			
VV					"6 výjezdů, 3 pracovníci, po 3 hodinách			
VV					6*3*3	54,000		
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							38 709,08	
16	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	4 720,62	38 709,08	SoD

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL 18	
Datum předložení TLZ:		18.05.2022	
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	izolace střech objektů Pavilon A, Hospodářský pavilon, Pavilon B		
Žadatel změny:			
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Zl řeší: oprava smluvního výkazu výměr, uvedení do souladu s Dokumentací pro provádění stavby		
Vyjádření projektant:			
Vyjádření TDI:	- 2 PŘIPOMÍNEK		
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt	KD č. 25, bod 25/2 SO 02, SO 03, SO 23	
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	
		Cenová kalkulace :	
		SO 02 odečty	-26 859,65
		SO 02 přípočty	213 853,48
		SO 03 odečty	-41 886,81
		SO 03 přípočty	141 987,56
		SO 23 odečty	-49 093,68
		SO 23 přípočty	426 650,11
		Celkem	664 651,01 Kč
Jméno		Datum	Podpis
Eva Navrátilová, DiS.			
Za objednatele:			
Za TDI			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 18									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ - odečty							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-26 859,65		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-26 859,65		
	D	712	Povlakové krytiny				-26 859,65		
164	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	-291,921	92,01	-26 859,65		smluvní položka
	W		skladba Střechy S1+S4						
	W		2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85		-276,893				
	W		spojovací krček "A" skladba S2						
	W		8,84*1,70		-15,028				
	W		Součet		291,921				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 18									
Stavba:									
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část									
Objekt:									
SO 02 - Pavilon A									
Soupis:									
SO 02.1 - ASŘ - připočty									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:									
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant:									
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč:									
GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							213 853,48		
o PSV							201 669,25		
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu							21 408,00		
NP	K	711772211	Izolace proti vodě opravování kotevních prostupů termoplasty	kus	19,000	532,00	10 108,00	CS ÚRS 2022 01	
	VV		záchytný systém proti pádu ze střechy		11,000				
	VV		záchytný systém proti pádu ze střechy - spojovací látky A		2,000				
	VV		zámečnický výrobek 9/Z		2,000				
	VV		zámečnický výrobek 9/Z		2,000				
	VV		zámečnický výrobek 7/Z		2,000				
	VV		Součet		19,000				
NP	K	711772122	Izolace proti vodě opravování trubního prostupu na plášťovou troubu D přes 200 do 500 mm tmelem	kus	5,000	2 260,00	11 300,00	CS ÚRS 2022 01	
	VV		VZT DN 250		1,000				
	VV		VZT DN 300		3,000				
	VV		VZT DN 350		1,000				
	VV		Součet		5,000				
D 712 Povlakové krytiny							110 098,57		
NP	K	712363601	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m	m2	320,608	201,00	64 442,21	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Oprava zatřídění položky podle II. TI						
	VV		skladba střechy S1+S4						
	VV		odečet dwg - výjez na střechu: 308,48-(2,9)		305,580				
	VV		mezisoučet		305,580				
	VV		spojovací krček "A" skladba S2						
	VV		8,84*1,70		15,028				
	VV		Součet		320,608				
165	M	2832201R	folie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	32,990	303,12	9 999,99	smluvní položka	
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství: 291,921*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-335,709				
	VV		skladba střechy S1+S4						
	VV		305,58*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		351,417				
	VV		spojovací krček "A" skladba S2						
	VV		15,028*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		17,282				
	VV		Rozdíl		32,990				
166	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10" podkladní textilní vrstvy	m2	28,687	27,60	791,76	smluvní položka	
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství: 291,921		-291,921				
	VV		skladba střechy S1+S4						
	VV		305,58		305,580				
	VV		spojovací krček "A" skladba S2						
	VV		15,028		15,028				
	VV		Rozdíl		28,687				
167	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 (r.t. Filtek 300)	m2	32,990	23,00	758,77	smluvní položka	
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství: 291,921*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-335,709				
	VV		skladba střechy S1+S4						
	VV		305,58*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		351,417				
	VV		spojovací krček "A" skladba S2						
	VV		15,028*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		17,282				
	VV		Rozdíl		32,990				
NP	K	712362301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytažení na visivou plochu fólií PVC	m2	59,710	182,00	10 867,22	CS ÚRS 2022 01	
	VV		Dopočet HI folie na svazích atikách						
	VV		skladba S1, S4						
	VV		0,7*(2,5+21,7+5,3+7,3+5,85)*2		59,710				
165	M	2832201R	folie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	68,667	303,12	20 814,19	smluvní položka	
	VV		Dopočet HI folie na svazích atikách						
	VV		skladba S1, S4						
	VV		59,711*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		68,667				
168	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%		808,14	2 424,43	smluvní položka	
	VV		přesun hmot odečty (kč)		-26 859,650				
	VV		přesun hmot připočty (kč)		107 674,140				
	VV		součet		80 814,490				
D 713 Izolace tepelné							70 162,68		
169	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	86,061	113,86	9 798,91	smluvní položka	
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství:						
	VV		skladba střechy S1+S4						
	VV		(2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85)*2 "EPS 100S ve dvou vrstvách		-553,786				
	VV		2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85 "EPS spádové klíny		-276,893				
	VV		skladba střechy S1+S4						
	VV		odečet dwg - výjez na střechu: (308,48-(2,9))*2 "EPS 100S ve dvou vrstvách		611,160				
	VV		odečet dwg - výjez na střechu: 308,48-(2,9) "EPS spádové klíny		305,580				
	VV		Rozdíl		86,061				
172	M	28372312	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm	m2	58,521	192,77	11 281,19	smluvní položka	
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství:						
	VV		skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách						
	VV		(2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85-2,05*2,40)*2		-543,946				
	VV		skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách						
	VV		odečet dwg - výjez na střechu - skladba S4: (308,48-(2,9))*(2,05*2,40)*2		601,320				
	VV		Rozdíl		57,374				
	VV		57,374*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		58,521				
174	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	2,633	1 422,63	3 745,24	smluvní položka	
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství:						
	VV		skladba S1 - spádové klíny						
	VV		(2,50*5,30+21,70*4,06+18,95*7,30+6,36*5,85-2,05*2,40)*(0,02+0,16)*2		-24,478				
	VV		skladba S1 - spádové klíny						
	VV		(308,48-(2,9)*(2,05*2,40))*(0,02+0,16)*2		27,059				
	VV		Rozdíl		2,581				
	VV		2,581*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		2,633				
180	K	713291122	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	28,687	123,06	3 530,22	smluvní položka	
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství:						
	VV		odečet dwg - výjez na střechu: 308,48-(2,9)		-276,893				
	VV		Rozdíl		305,580				
	VV		Součet		28,687				
NP	K	713291221	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů asfaltovým pásem	m2	89,376	138,00	12 333,89	CS ÚRS 2022 01	

		VV		Dopočet parotésné izolace na svislých atkách						
		VV		skladba S1: S4						
		VV		1,0*(2,5+21,7+5,3+7,3+5,85)*2		85,300				
		VV		spojovací krček "A" skladba S2						
		VV		0,2*(8,49+1,7)*2		4,076				
	181	M	6285300R	pás asfaltový nataviteľný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou parotésnici	m2	149,179	150,61	22 467,83	smluvní položka	
		VV		Dopočet parotésné izolace na svislých atkách						
		VV		skladba S1 - vytažení na svislých atkách						
		VV		85,3*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		110,890				
		VV		spojovací krček "A" skladba S2						
		VV		0,2*(8,49+1,7)*2*1,3 *Přepočtené koeficientem množství		5,299				
		VV		Oprava množství parotésné izolace vodorovná plocha						
		VV		skladba S1: S4						
		VV		28,887*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		32,990				
		VV		Součet		149,179				
	184	K	713291142	Montáž izolace tepelné parotésné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr	m2	28,687	18,40	527,84	smluvní položka	
		VV		Oprava množství						
		VV		Smluvní množství		-276,893				
		VV		odečet dwg - výřez na střechu: 308,48-(2,9)		305,580				
		VV		Rozdíl		28,687				
	185	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	7,172	56,35	404,13	smluvní položka	
		VV		28,887*0,25 *Přepočtené koeficientem množství		7,172				
	151	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	85,300	27,60	2 354,28	smluvní položka	
		VV		Dopočet penetrační nátěr na svislých atkách						
		VV		1,0*(2,5+21,7+5,3+7,3+5,85)*2		85,300				
	152	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0,030	56 123,94	1 675,58	smluvní položka	
		VV		85,3*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0,030				
	186	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3,000	681,19	2 043,57	smluvní položka	
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 184,23		
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)	%	6,970	1 748,10	12 184,23		
				VRN odečty (Kč)		-26 859,65				
				VRN přípočty (Kč)		201 669,25				
				součet		174 809,600				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 18									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4, 1537/7, 1538/1, 1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 03 - Hospodářský pavilon							
Soupis:		SO 03.1 - ASŘ - odečty							
Místo:									
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Datum:		
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		
							Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-41 886,81		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-41 886,81		
	D	712	Povlakové krytiny				-41 886,81		
163	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T18 do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	-130,008	172,51	-22 427,68		smluvní položka
		VV	skladba S1						
		VV	(20,15+4,0)*(12,05+4,0)		130,008				
		VV	Součet		130,008				
165	K	712363405	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T18 do 100 mm krajní pole, budova v do 18 m	m2	-112,800	172,51	-19 459,13		smluvní položka
		VV	skladba S1						
		VV	20,15*4,0+8,05*4,0		112,800				
		VV	Součet		112,800				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 18

	Stayba:	

Výstavba mateřské školy v ulici Balkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část

Objekt:

SO 03 - Hospodářský pavilon

Soupis:

SO 03.1 - ASŘ - přípočty

	Misto	

Datum	
-------	--

Zadavai

ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38

Projektant:

D PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Uchaze

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník

Zpracovatel

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							141 987,56	
	O	PSV	Práce a dodávky PSV				135 465,15	
	O	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu				20 812,00	
NP	K	711772211	Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů termoplasty	kus	11,000	532,00	5 852,00	CS ÚRS 2022 012
	VV		záchytný systém proti pádu ze střechy		7,000			
	VV		zámečnický výrobek 2/2		4,000			
	VV		Součet		11,000			
NP	K	711772122	Izolace proti vodě opracování trubního prostupu na plášťovou troubu D přes 200 do 500 mm tmelem	kus	5,000	2 260,00	11 300,00	CS ÚRS 2022 012
	VV		VZT DN 260		3,000			
	VV		VZT DN 300		1,000			
	VV		Součet		4,000			
NP	K	711772123	Izolace proti vodě opracování trubního prostupu na plášťovou troubu D přes 500 do 1000 mm tmelem	kus	1,000	3 660,00	3 660,00	CS ÚRS 2022 012
	VV		VZT DN 730		1,000			
	D	712	Povlakové krytiny				85 197,00	
NP	K	712363601	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m	m2	130,008	201,00	26 131,61	CS ÚRS 2021 02
	VV		Oprava zatížení polozky podle tl. TI					
	VV		skladba S1					
	VV		(20,15+4,0)*(12,05+4,0)		130,008			
	VV		Součet		130,008			
NP	K	712363602	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole,budova v do 18m	m2	112,800	322,00	36 321,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		Oprava zatížení polozky podle tl. TI					
	VV		skladba S1					
	VV		20,15*4,0+8,05*4,0		112,800			
	VV		Součet		112,800			
NP	K	712362301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střech vytvázení na vlnislou plochu fólií PVC	m2	45,080	182,00	8 204,56	CS ÚRS 2022 01
	VV		Dopočet HI folie na svazích atikách					
	VV		skladba S1					
	VV		0,7*(20,15+12,05)*2		45,080			
164	M	2832201R	folie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	51,842	256,12	13 277,77	smluvní položka
	VV		Dopočet HI folie na svazích atikách					
	VV		skladba S1					
	VV		45,08*1,15 "Připočtené koeficientem množství		51,842			
169	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,000	420,49	1 261,46	CS ÚRS 2020 02
	VV		přesun hmot odečty (kč)		-41 886,810			
	VV		přesun hmot přípočty (kč)		83 935,540			
	VV		součet		42 048,730			
	D	713	Izolace tepelné				29 456,15	
170	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	13,223	113,86	1 505,57	smluvní položka
	VV		Dopočet montáže TI na skladbě S4					
	VV		skladba S4 - spádové klíny					
	VV		2,05*2,15		4,408			
	VV		skladba S4 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách					
	VV		2,05*2,15*2		8,815			
	VV		Součet		13,223			
NP	M	2832310	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením lambda=0,037 tl 90mm	m2	8,991	209,00	1 879,18	CS ÚRS 2021 02
	VV		Dopočet TI na skladbě S4					
	VV		skladba S4 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách					
	VV		2,05*2,15*2*1,02 "Připočtené koeficientem množství		8,991			
172	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	0,135	1 304,58	175,95	smluvní položka
	VV		Dopočet TI spádových klínů na skladbě S4					
	VV		skladba S4 - spádové klíny					
	VV		2,05*2,15*(0,02+0,04)*2 *1,02 "Připočtené koeficientem množství		0,135			
176	K	713291122	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	4,408	123,06	542,45	smluvní položka
	VV		Dopočet montáže izolace asfaltovým pásem na skladbě S4					
	VV		skladba S4					
	VV		2,05*2,15		4,408			
NP	K	713291221	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů asfaltovým pásem	m2	64,400	138,00	8 887,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		Dopočet parotěsné izolace na svazích atikách					
	VV		skladba S1					
	VV		1,0*(20,15+12,05)*2		64,400			
177	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerální posypem na horním povrchu	m2	88,789	150,61	13 372,45	smluvní položka
	VV		Dopočet parotěsné izolace na svazích atikách					
	VV		skladba S1					
	VV		64,4*1,3 "Připočtené koeficientem množství		83,720			
	VV		Dopočet montáže izolace asfaltovým pásem na skladbě S4					
	VV		skladba S4					
	VV		4,408*1,15 "Připočtené koeficientem množství		5,089			
	VV		Součet		88,789			
178	K	713291142	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr	m2	4,408	18,40	81,11	smluvní položka
	VV		Dopočet asfalt nátěr skladbě S4					
	VV		skladba S4					
	VV		2,05*2,15		4,408			
184	K	713291142	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr	m2	64,400	18,40	1 184,96	CS ÚRS 2021 02
	VV		Dopočet asfalt nátěr na svazích atikách					
	VV		1,0*(20,15+12,05)*2		64,400			
179	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	litr	17,202	56,35	969,33	smluvní položka
	VV		Dopočet asfalt nátěr na skladbě S4					
	VV		skladba S4					
	VV		4,408*0,25 "Připočtené koeficientem množství		1,102			
	VV		Dopočet asfalt nátěr na svazích atikách					
	VV		64,4*0,25 "Připočtené koeficientem množství		16,100			
	VV		Součet		17,202			
180	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3,000	285,98	857,95	smluvní položka
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				6 522,41	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)				6 522,41	
	VV		VRN odečty (Kč)	%	6,970	935,78		
	VV		VRN přípočty (Kč)					
	VV		součet					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 18									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 23 - Pavilon B							
Soupis:		SO 23.1 - ASŘ - odečty							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-49 093,68		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-49 093,68		
D		712	Povlakové krytiny				-49 093,68		
178	K	712363404	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu T1 tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m	m2	-533,569	92,01	-49 093,68		smluvní položka
	W		skladba S2+S4						
	W		477,198*4,92		482,118				
	W		skladba S3						
	W		30,265*1,70		51,451				
	W		Součet		533,569				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 18									
Stavba: Výchova mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část									
Objekt: SO 23 - Pavilon B									
Soupis: SO 23.1 - ASŘ - přípočty									
Místo:									
Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38						Datum:		D. PLOŠ	
Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník						Projektant:		PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ	
						Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							426 650,11		
o PSV Práce a dodávky PSV							398 036,78		
o 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynu							28 324,00		
NP	K	711772211	Izolace proti vodě oprávcování kotevních prostupů termoplasty	kus	32,000	532,00	17 024,00		CS ÚRS 2022 012
	VV		záchytný systém proti pádu ze střešy		16,000				
	VV		záchytný systém proti pádu ze střešy - spojovací látka B		4,000				
	VV		zámečnický výrobek 8/2		8,000				
	VV		zámečnický výrobek 7/2		4,000				
	VV		Součet		32,000				
NP	K	711772122	Izolace proti vodě oprávcování trubního prostupu na plášťovou troubu D přes 200 do 500 mm tmelem	kus	5,000	2 260,00	11 300,00		CS ÚRS 2022 012
	VV		VZT DN 250		1,000				
	VV		VZT DN 300		5,000				
	VV		VZT DN 500		1,000				
	VV		Součet		7,000				
o 712 Povlakové krytiny							211 451,29		
NP	K	712363601	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m	m2	617,131	201,00	124 043,33		CS ÚRS 2022 01
	VV		Oprava zatřídění položky podle tl. TI						
	VV		skladba S3+S4						
	VV		odečet dwg - 2x výlez na střešy: 570,74-(2,3*1,1*2)		565,680				
	VV		skladba S3						
	VV		30,265*1,70		51,451				
	VV		Součet		617,131				
179	M	2832201R	folie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	96,097	303,12	29 128,82		smluvní položka
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství: 533,569*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		-613,604				
	VV		skladba S3+S4						
	VV		565,68*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		650,532				
	VV		spojovací křížek "B" skladba S2						
	VV		51,451*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		59,169				
	VV		Rozdíl		96,097				
180	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střeš do 10" podkladní textilní vrstvy	m2	83,562	27,60	2 306,31		smluvní položka
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství:						
	VV		skladba S2+S4						
	VV		477,198+4,92		-482,118				
	VV		skladba S2+S4						
	VV		odečet dwg - 2x výlez na střešy: 570,74-(2,3*1,1*2)		565,680				
	VV		Rozdíl		83,562				
181	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2 (r.f. Filtek 300)	m2	96,096	23,00	2 210,21		smluvní položka
	VV		Oprava množství						
	VV		83,562*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		96,096				
NP	K	712362301	Provedení dvojitého hydroizolačního systému plochých střeš vytváření na svislou plochu fólii PVC	m2	92,414	182,00	16 819,35		CS ÚRS 2022 01
	VV		Dopčet parotěsné izolace na svislých atikách						
	VV		skladba S2						
	VV		0,71(44,1+9,31+7,3+5,3)*2		92,414				
179	M	2832201R	folie hydroizolační střešní PV-PC mechanicky kotvená tl 1,8mm	m2	106,276	303,12	32 214,41		smluvní položka
	VV		Dopčet parotěsné izolace na svislých atikách						
	VV		skladba S2						
	VV		92,414*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		106,276				
182	K	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	3,000	1 576,29	4 728,86		smluvní položka
	VV		presun hmot odečty (kč)		-49 093,680				
	VV		presun hmot připočty (kč)		206 722,430				
	VV		součet		157 628,750				
o 713 Izolace tepelné							158 261,49		
183	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, díly, deskami	m2	235,927	113,86	26 862,65		smluvní položka
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství:						
	VV		skladba S2 - spádové klíny						
	VV		(38,02+0,54*2)*(2,945-0,54)+2,50*5,90*2+(7,30+0,54)*41,60+9,31*8,31		-482,118				
	VV		skladba S2 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách						
	VV		((38,02+0,54*2)*(2,945-0,54)+2,50*5,90*2+(7,30+0,54)*41,60+9,31*8,31)*2		-964,235				
	VV		skladba S2 - spádové klíny						
	VV		odečet dwg - 2x výlez na střešy - skladba S4: 570,74-(2,3*1,1*2)-(2,05*2,4)		560,760				
	VV		skladba S2 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách						
	VV		odečet dwg - 2x výlez na střešy - skladba S4: (570,74-(2,3*1,1*2)-(2,05*2,4))*2		1 121,520				
	VV		Rozdíl		235,927				
184	M	28372312	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 120mm	m2	167,124	185,21	30 953,04		smluvní položka
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství:						
	VV		skladba S1 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách - ve VV chybně označeno jako S1, správně má být S2						
	VV		477,198*2		-954,396				
	VV		skladba S2 - EPS ve dvou na sebe kolmých vrstvách						
	VV		(570,74-(2,3*1,1*2)-(2,05*2,4))*2		1 121,520				
	VV		Rozdíl		167,124				
186	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	16,294	823,91	13 424,95		smluvní položka
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství:						
	VV		skladba S1 - spádové klíny - ve VV chybně označeno jako S1, správně má být S2						
	VV		477,198*(0,02+0,370)*2		-93,054				
	VV		skladba S2 - spádové klíny						
	VV		(570,74-(2,3*1,1*2)-(2,05*2,4))*((0,02+0,37)*2)		109,348				
	VV		Rozdíl		16,294				
192	K	713291122	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem asfaltovým pásem	m2	83,562	123,06	10 283,14		smluvní položka
	VV		Oprava množství						
	VV		Smluvní množství:						
	VV		skladba S2						
	VV		477,198		-477,198				
	VV		skladba S2						
	VV		570,74-(2,3*1,1*2)-(2,05*2,4)		560,760				
	VV		Rozdíl		83,562				

	NP	K	713291221	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů asfaltovým pásem	m2	144,848	138,00	19 989,02	CS ÚRS 2022 01	
		VV		Dopčet parotěsné izolace na svislých atikách						
		VV		skladba S2						
		VV		1,0*(44,1+9,31+7,3+5,3)/2		132,020				
		VV		spojovací krček "B" skladba S2						
		VV		0,2*(1,7+30,37)/2		12,828				
	193	M	6285300R	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS II 4,0mm s vložkou parotěsnicí	m2	284,399	150,61	42 833,29	smluvní položka	
		VV		Oprava množství						
		VV		Smluvní množství:						
		VV		skladba S2						
		VV		83,562*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		96,096				
		VV		Dopčet parotěsné izolace na svislých atikách						
		VV		skladba S2						
		VV		132,02*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		171,626				
		VV		spojovací krček "B" skladba S2						
		VV		12,828*1,3 "Přepočtené koeficientem množství		16,676				
		VV		Součet		284,399				
	194	K	713291142	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem podkladní asfaltový nátěr	m2	83,562	18,40	1 537,54	smluvní položka	
		VV		Oprava množství						
		VV		Smluvní množství:						
		VV		skladba S2						
		VV		477,198		-477,198				
		VV		skladba S2						
		VV		570,74-(2,3*1,1*2)-(2,05*2,4)		560,760				
		VV		Rozdí		83,562				
	195	M	11163153	emulze asfaltová penetrační	ltr	20,891	56,35	1 177,18	smluvní položka	
		VV		Oprava množství						
		VV		83,562*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		20,891				
	151	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	144,848	27,60	3 997,80	smluvní položka	
		VV		Dopčet penetrační nátěr na svislých atikách						
		VV		skladba S2						
		VV		1,0*(44,1+9,31+7,3+5,3)/2		132,020				
		VV		spojovací krček "B" skladba S2						
		VV		0,2*(1,7+30,37)/2		12,828				
		VV		Součet		144,848				
	152	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,046	56 123,94	2 593,32	smluvní položka	
		VV		132,02*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství		0,046				
	196	K	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	3,000	1 536,52	4 609,56	smluvní položka	
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 613,33		
		D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	3 489,43	28 613,33		
				VRN odečty (Kč)		-49 093,68				
				VRN přípočty (Kč)		398 036,78				
				součet		348 943,100				

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL020	
Datum předložení TLZ:			
SoD č.:	objednatel:	2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	Vnitřní omítky		
Žadatel změny:			
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Jelikož projekt původně předpokládal prefabrikovaná schodiště, nebylo na ramena, podesty ani stupně nutné uvažovat omítky. Monolitická schodiště, která jsou uvedena ve VV a jak jsou nakonec realizována (dle rozhodnutí z KD č. 18 - bod 18/2), musí být omítnuta. ZL obsahuje výměry omítek schodišť a dále rohových a začišťovacích profilů, které ve výkazu výměr nebyly.		
Vyjádření projektant:			
Vyjádření TDI: <i>Bez protipřípově</i>			
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č.	18, 35	
	Zápis v deníku změn PD č.		
	Dotčený objekt	SO 02, SO 03, SO 23	
Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV		
	Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		
Cenový dopad:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		
		Cenová kalkulace :	
		přípočty	396 982,91
		Celkem	396 982,91 Kč
	Jméno	Datum	Razítko
Za objednatele:			
Za TDI:			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL020 - Vnitřní omítky

Místo:

Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						396 982,91		
D HSV Práce a dodávky HSV						366 897,36		
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						366 301,31		
1	K	611321145	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně	m2	96,823	383,00	37 083,21	CS ÚRS 2022 01
	W		"pavilon A: m.č. 1.07, 1.02 (1,1+3,2)*2,5+0,18*1,25*20		15,250			
	W		(3,3+0,5+3,6)*1,5+0,15*1,5*24		16,500			
	W		"hospodářský pavilon: m.č. 1.04 (1,1+3,2)*2,7+0,163*1,25*22		16,093			
	W		"pavilon B: m.č. 1.05, 1.15, 1.02 (1,1+3,2)*2,5*2+0,18*1,25*20*2		30,500			
	W		(1,8*2+2,6+1,5*2)*(1,3+0,2)+0,15*1,3*24		18,480			
	W		Součet		96,823			
2	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	1 276,070	102,36	130 618,53	SoD
	W		"pavilon A: m.č. 1.01-1.02, 1.06-1.12, 1.12b 16,55+14,69+89,74+11,45+4,95+4,95+3,75+3,75+12,2+9,2+3,75		174,980			
	W		"pavilon A: m.č. 2.02, 2.06-2.12, 2.12b, 2.13 19,3+89,74+20,4+4,95+4,95+3,75+3,75+9,7+11,15+3,75+7,5		178,940			
	W		"hospodářský pavilon: m.č. 1.01, 1.03-1.09, 1.12, 1.16-1.22, B.1-B.5 6,35+27,89+4,95+2,25+3,95+2,25+4,5+7,45+11,8+6,35+7,45+6,35+6+6+11,2+11,2+5,5+10,65+3+2,25+5,25		152,590			
	W		"hospodářský pavilon: m.č. 2.01-2.13, 2.16 10,05+28,19+2,25+7,45+4,5+2,25+9,5+2,6+48,8+19,1+5,25+4,5+5,25+5,2		154,890			
	W		"pavilon B: m.č. 1.01-1.02, 1.04-1.09, 1.10b-1.16 9,8+50,95+74,92+11,55+4,95+4,95+3,75+3,75+12,2+5,2+3,75+9,7+3,75+3,75+4,95+4,95+9,4+74,92		297,190			
	W		"pavilon B: m.č. 2.01-2.02, 2.04-2.09, 2.10b-2.16, 2.19, 2.21 4,4+45,94+74,92+20,4+4,95+4,95+3,75+3,75+12,2+5,2+3,75+9,7+3,75+3,75+4,95+18,25+74,92+10,5+2,5		317,480			
	W		Součet		1 276,070			
3	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	1 502,677	70,50	105 938,73	CS ÚRS 2022 01
	W		1366,07*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		1 502,677			
4	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích zajišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	676,900	104,66	70 844,35	SoD
	W		"pavilon A: O01-O08 29+23+10,5+9,9+29,7+18+22,5+7,5		150,100			
	W		"D1-D3 6,2+8,9+5,9		21,000			
	W		"hospodářský pavilon: O01-O08 22,5+15,75+19,8+10,5+6+3,75+7,5+21		106,800			
	W		"D1-D5 6,2*4+5,8*4		48,000			
	W		"pavilon B: O01-O07, O11-O13 58+58+46+39,6+29,7+37,5+24+6,9+10,5+8,8		319,000			
	W		"D1-D4 9,8+10,6+5,8*2		32,000			
	W		Součet		676,900			
5	M	28342201	profil zajišťovací PVC 9mm	m	744,590	29,30	21 816,49	CS ÚRS 2022 01
	W		676,9*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		744,590			
D 998 Přesun hmot						596,05		
6	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,004	297,43	596,05	SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady						30 085,55		
7	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	3 668,97	30 085,55	SoD

Technický list změny (TLZ) č.:	21
Datum předložení TLZ:	01.06.2022

SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:		
Projekt registrační číslo:		
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10	
Objekt:		

Název změny:	Odstranění kompenzační smyčky teplovodu
---------------------	---

Žadatel změny:	GD
-----------------------	----

Popis změny a důvod - zhotovitel:	V průběhu realizace areálových rozvodů byly na pozemku nalezeny další dvě kompenzační smyčky teplovodu Pražské Teplárenské a.s. Funkční smyčka byla zachována, nefunkční smyčka byla odstraněna. Pro další postup prací bylo nutné betony vybourat a nefunkční potrubí odstranit.
--	---

Vyřádění projektant:	
-----------------------------	--

Vyřádění TDI:	BEZ PŘÍPOČTY
----------------------	--------------

Vyřádění GI:	
---------------------	--

Odkazy :	Zápis z KD č.	28, 31
	Zápis v deníku změn PD č.	
	Dotčený objekt	SO 01

Přílohy:	PD - schéma/podklady	
	ZL kalkulace - podrobná s VV	
	Jiná	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO
	s dopadem	

Orientační cenový dopad:	bez dopadu	ANO	Cenová kalkulace :	
	s dopadem		SO 01: přípočty	145 300,31 Kč
				145 300,31 Kč

Jméno	Datum	Razítko
Za objednavatele:		
Za TDI		
Za projektanta:		
Za zhotovitele:		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL021 - Odstranění kompenzační smyčky teplovodu

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 300,31	
D HSV Práce a dodávky HSV							128 216,61	
D 1 Zemní práce							81 169,49	
1	K	129951121	Bourání konstrukcí z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách strojně	m3	17,360	3 800,00	65 968,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		"kompenzační smyčka č.2 0,9*12*0,45		4,860			
	WV		"kompenzační smyčka č.3 12,5		12,500			
	WV		Součet		17,360			
2	K	139911121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,800	6 680,00	12 024,00	CS ÚRS 2022 01
	WV		"kompenzační smyčka č.3 "deska 2*3*0,3		1,800			
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,160	165,84	3 177,49	SoD
	WV		17,36+1,8		19,160			
D 997 Přesun sutě							47 047,12	
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	42,152	506,47	21 348,72	SoD
5	K	997013501b	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,152	242,60	10 226,08	SoD
6	K	997013509b	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	590,128	10,61	6 261,26	SoD
	WV		42,152*14 "Přepočtené koeficientem množství		590,128			
7	K	997013601__PK _II	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	42,152	218,52	9 211,06	SoD
D M Práce a dodávky M							6 072,00	
D 23-M Montáže potrubí							6 072,00	
8	K	230082007	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 18 mm tl 2,0 mm	kus	24,000	253,00	6 072,00	CS ÚRS 2022 02
	WV		"2 trubky po 12 m"					
	WV		"likvidace 1ks/1m"					
	WV		2*12		24,000			
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							11 011,70	
9	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	1 342,89	11 011,70	SoD

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/0933

ze dne 17. 6. 2021

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená 1. místostarostkou Ing. Janou Komrskovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Dušan Kodrla, pověřen zastupováním vedoucího OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská**

zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské smlouvy

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Společník: VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČO: 251 10 977

DIČ: CZ25110977

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.; Sberbank CZ, a.s.

č. účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 4211219537/6800, 9119032/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 5 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 2 463 808,05 Kč bez DPH

a zároveň se snižuje o částku 563 676, 50 Kč bez DPH

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 1 900 131, 55 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 137 902 321, 48 Kč

(slovy: stotřicetsedmmilionůdevětsetdvatisíctřístadvacetjedna korun českých a 48 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

IV.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty méněprací a víceprací.

V Praze dne _____

Dušan Kodrla

Digitálně podepsal Dušan Kodrla
Datum: 2022.10.11 08:09:50 +02'00'

Městská část Praha 10

Ing. Dušan Kodrla

pověřený vedením odboru majetkoprávního

Objednatel

V Praze dne _____



pověřená osoba na základě pověření a

společenské smlouvy

Zhotovitel

Rekapitulace změn										Projekt : Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10									
Organizační j.:	PVR	Cena dle zák. SOD:	128 926 467	§222 ZZVZ	Maximální procenta	Maximální hodnota Změny	Zbývá	Zpracoval /	M.J.	06.09.2022									
Název zakázky:	Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10			odst. 4	15%	19 338 970	19 338 970												
Číslo zakázky:	AV/21028.1.130	Cena vč. dodatku:	137 902 322	odst. 5	50%	64 463 233	57 788 119												
VRT:	Martin Jelen			odst. 6	50%	64 463 233	61 077 161												
T. dok. dle SOD	31.3.2023			Odst. 5 a 6	30%	38 677 940	29 599 882												
T. dok. dle ZL	27.6.2023	Cena všech ZL	9 300 770	Odst. 7			-102 593												
č.	číslo ZL	Název ZL	Datum	Přčina změny	Stav schvalování změny	Přípočty	Odpočty	Změna celkem	Zařídění odst. Dle §222 ZZVZ	Zahrnuté změny do dot SOD s klientem									
								Cena Změny (Kč)	změna termínu	č.dod. Kč									
								7 581 410		88									
								Celkem ZL	celkem dříl	Dod č. částka									
								9 300 770	88	8 975 8									
1	Z.01	SOD+1021 Příprava území - kácení zeleně	30.08.21	K	ANO	NE	86 861,22	86 861,22	odst. 5	2									
2	Z.02	SOD + SO16 - retenční nádrž a vodoměrná šachta	18.10.21	GG	ANO	NE	1 181 643,57	-102 502,99	odst. 7	2									
3	Z.03	Kompenzační smýčka teplovodu	09.12.21	K	ANO	NE	137 522,80	137 522,80	odst. 6	2									
4	Z.04	AZBEST	14.10.21	K	ANO	ANO	2 052 908,00	2 052 908,00	odst. 5	2									
5	Z.05	Izolace spodní stavby	09.12.21	P	ANO	NE	96 503,74	96 503,74	odst. 5	2									
6	Z.06	Příprava území skrytá orlice	09.12.21	P	ANO	NE	390 934,55	390 934,55	odst. 5	2									
7	Z.07	Atiky	09.12.21	K	ANO	NE	963 522,34	299 665,65	odst. 5	3									
8	Z.08	Likvidace nátěrů	30.08.21	02.12.21	K	ANO	41 812,58	41 812,58	odst. 5	2									
9	Z.09	Likvidace výměňkové stanice	02.12.21	K	ANO	NE	31 421,28	31 421,28	odst. 6	2									
10	Z.10	Architektonický průzkum	30.08.21	29.11.21	P	ANO	17 706,03	17 706,03	odst. 5	3									
11	Z.11	Pojíždění techniky pro stavbu v ochr.pásmu horkovodu	14.04.22	P	ANO	ANO	1 765 523,20	1 765 523,20	odst. 6	3									
12	Z.12	dohledání skutečné trasy vodovodní přípojky	10.06.22	P	ANO	NE	85 918,43	85 918,43	odst. 6	4									
13	Z.13	Likvidace lokálních výsoků nadáček a nahrazení materiálem dle požadavků geologa	10.06.22	GG	ANO	NE	90 550,85	90 550,85	odst. 6	4									
14	Z.14	Změna tvaru úpěrné zdi a navazující lešení úpravy a odvodnění	24.02.22	03.08.22		ANO	45 308,33	-399 760,25	odst. 5	5									
15	Z.15	Redukce pákových ovladačů u dřevěných oken	03.03.22	13.07.22		ANO	216 797,68	33 485,72	odst. 5	5									
16	Z.16	Arealové rozvody	03.03.22		ANO	NE	448 645,60	337 325,99	odst. 6	5									
17	Z.17	Sanace únosnosti pláně komunikace	10.06.22		ANO	NE	512 416,64	1 645,65	odst. 6	4									
18	Z.18	Střechy na pavilonech skutečné plochy hydroizolací, tep. izolací s hledem na VV	16.06.22		ANO	NE	782 491,15	664 651,01	odst. 5	4									
19	Z.19	neobsazeno	-	-	-	-	-	-	-	-									
20	Z.20	Vnitřní omítky	10.06.22		ANO	NE	396 982,91	396 982,91	odst. 5	4									
21	Z.21	Odstranění kompenzační smýčky teplovodu	10.06.22	K	ANO	NE	145 300,31	145 300,31	odst. 6	4									
22	Z.22	Akustické prvky schodišť	15.06.22		ANO	NE	308 670,10	168 360,34	odst. 5	5									
23	Z.23	Výztuž monolitických konstrukcí	01.09.22		ANO	NE	724 675,11	724 675,11	odst. 6	5									
24	Z.24	Bourání asfaltových konstrukcí ve vyšší mocnosti v komunikaci	09.06.22	K	ANO	NE	168 773,01	168 773,01	odst. 6	5									
25	Z.25	Žaluzie	23.06.22	18.07.22	K	ANO	147 868,31	147 868,31	odst. 5	5									
26	Z.26	Doplnění výřezu otvoru a narovnání výkazu sádkartonových kci		11.06.22	P	ANO	453 042,72	453 042,72	odst. 5	5									
27	Z.27	Spojovací lásky A a B	02.09.22		ANO	NE	619 804,18	491 069,01	odst. 5	5									
28	Z.28	Detail uložení stropních panelů na výřahovou šachtu	02.09.22		ANO	NE	53 628,42	53 628,42	odst. 5	5									
29	Z.29	Atlán - monolit	02.09.22		ANO	NE	46 578,03	46 578,03	odst. 5	5									

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL 015	
Datum předložení TLZ:		03.08.2022	
SoD E.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:		Redukce pákových ovladačů u dřevěných oken	
Žadatel změny:			
Popis změny a důvod - zhotovitel:		Na základě revize vnějších dřevěných výplní dochází ke změně - počtu pákových ovladačů výklopných křídel oken - počtu kruhových oken - příplatek za uzavíratelné klíky Dále ZL řeší scházející položky ve uceleném rozpočtu, příplatek za provádění vnějších a vnitřních napařovacíh pásek u výplní oken.	
Vyjádření projektanta:			
Vyjádření TDI: <i>autorka</i>			
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt	SO 02.1 - ASŘ SO 03.1 - ASŘ SO 23.1 - ASŘ	
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	Cenová kalkulace : SO 02.1 přípočty 37 588,86 SO 02.1 odpočty -38 501,40 SO 03.1 přípočty 32 805,33 SO 03.1 odpočty -33 917,90 SO 23.1 přípočty 125 403,80 SO 23.1 odpočty -110 897,66 Celkem 33 485,72 Kč
Imeno	Datum	Podpis	Razítko
Eva Navrátilová, DiS			
Za objednatele:			
Za TDI:			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			



POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ - přípočty							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							57 588,86		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				56 345,15		
	D	767	Konstrukce zámečnické				56 345,15		
NP	K	767627306	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	212,966	116,00	24 704,02		CS ÚRS 2022 02
			O01: (2,250+2,500)*2*4		38,000				
			O02: (0,750+2,500)*2*4		26,000				
			O03: (2,250+1,500)*2*2		15,000				
			O04: (0,750+2,100)*2*2		11,400				
			O05: (0,75+2,1)*2*6		34,200				
			O06: (1,5+0,75)*2*6		27,000				
			O07: (2,25+0,75)*2*6		36,000				
			O08: (0,75+1,5)*2*2		9,000				
			O09: (3,14*1,006)*2		6,318				
			O10: (3,14*0,8)*4		10,048				
			Součet		212,966				
NP	K	767627307	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	212,966	115,00	24 491,05		CS ÚRS 2022 02
			O01: (2,250+2,500)*2*4		38,000				
			O02: (0,750+2,500)*2*4		26,000				
			O03: (2,250+1,500)*2*2		15,000				
			O04: (0,750+2,100)*2*2		11,400				
			O05: (0,75+2,1)*2*6		34,200				
			O06: (1,5+0,75)*2*6		27,000				
			O07: (2,25+0,75)*2*6		36,000				
			O08: (0,75+1,5)*2*2		9,000				
			O09: (3,14*1,006)*2		6,318				
			O10: (3,14*0,8)*4		10,048				
			Součet		212,966				
NP			Příplatek za uzamykatelnou kliku	ks	24,000	280,00	6 720,00		
			O01:		8,000				
			O02:		8,000				
			O11:		8,000				
			Součet		24,000				
313	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,000	143,36	430,08		smluvní položka
			Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou		24 704,020				
			Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou		24 491,050				
			Příplatek za uzamykatelnou kliku		6 720,000				
			kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155		-37 380,000				
			Montáž oken kovových - pákového uzávěru		-4 199,160				
			Součet		14 335,910				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 243,71		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)	%	6,970	178,44	1 243,71		
			VRN odečty (Kč)		-38 501,400				
			VRN přípočty (Kč)		56 345,150				
			součet		17 843,750				


POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ - odpočty							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-38 501,40		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-38 501,40		
	D	767	Konstrukce zámečnické				-38 501,40		
NP	M	54913110	kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155	kus	-42,000	890,00	-37 380,00		CS ÚRS 2022 02
			O07		-6,000				
			O08		-2,000				
			O03		-4,000				
			O05		-6,000				
			O04		-4,000				
			O01		-8,000				
			O02		-4,000				
			O11		-8,000				
			Součet		-42,000				
292	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3,000	-373,80	-1 121,40		smluvní položka

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 03 - Hospodářský pavilon							
Soupis:		SO 03.1 - ASŘ - přípočty							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							32 805,02		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				32 877,53		
D	767		Konstrukce zámečnické				32 877,53		
NP	K	767627306	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	142,800	116,00	16 564,80	CS ÚRS 2022 02	
			O01: (1,500+1,500)/2*5		30,000				
			O02: (0,750+0,750)/2*7		21,000				
			O03: (0,750+2,100)/2*4		22,800				
			O04: (2,250+1,500)/2*2		15,000				
			O05: (1,500+0,750)/2*2		9,000				
			O06: (2,250+0,750)/2*1		6,000				
			O07: (0,750+1,500)/2*2		9,000				
			O08: (2,250+1,500)/2*4		30,000				
			Součet		142,800				
NP	K	767627307	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	142,800	115,00	16 422,00	CS ÚRS 2022 02	
			O01: (1,500+1,500)/2*5		30,000				
			O02: (0,750+0,750)/2*7		21,000				
			O03: (0,750+2,100)/2*4		22,800				
			O04: (2,250+1,500)/2*2		15,000				
			O05: (1,500+0,750)/2*2		9,000				
			O06: (2,250+0,750)/2*1		6,000				
			O07: (0,750+1,500)/2*2		9,000				
			O08: (2,250+1,500)/2*4		30,000				
			Součet		142,800				
266	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,000	-36,42	-109,27	smluvní položka	
			Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou		16 564,800				
			Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou		16 422,000				
			kování uzavěr ventilační okenní pákový typ K301 11155		-32 930,000				
			#ODKA2		-3 899,260				
			Součet		-3 842,460				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				-72,51		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)	%	6,970	-10,40	-72,51		
			VRN odečty (Kč)		-33 917,90				
			VRN přípočty (Kč)		32 877,53				
			Součet		-1 040,370				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 03 - Hospodářský pavilon							
Soupis:		SO 03.1 - ASŘ - odpočty							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-33 917,90		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-33 917,90		
D	767		Konstrukce zámečnické				-33 917,90		
NP	M	54913110	kování uzavěr ventilační okenní pákový typ K301 11155	kus	-37,000	890,00	-32 930,00	CS ÚRS 2020 02	
			O01		-10,000				
			O04		-4,000				
			O05		-2,000				
			O06		-2,000				
			O07		-4,000				
			O08		-8,000				
			O03		-7,000				
			Součet		-37,000				
251	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3,000	-329,30	-987,90	smluvní položka	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 23 - Pavilon B							
Soupis:		SO 23.1 - ASŘ - přípočty							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							126 403,80		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				125 228,28		
D	767		Konstrukce zámečnické				125 228,28		
NP	K	767627306	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou	m	485,490	116,00	56 316,79		CS ÚRS 2022 02
			O01: (2,250+2,500)*2*8		76,000				
			O02: (2,250+2,500)*2*8		76,000				
			O03: (0,750+2,500)*2*8		52,000				
			O04: (0,750+2,100)*2*8		45,600				
			O05: (0,75+2,1)*2*6		34,200				
			O06: (2,25+0,75)*2*10		60,000				
			O07: (1,500+0,750)*2*8		36,000				
			O11: (1,900+2,500)*2*1		8,800				
			O12: (2,250+1,500)*2*2		15,000				
			O13: (1,000+1,700)*2*2		10,800				
			O14: (3,14*0,8)*23		57,776				
			O15: (3,14*1,060)*4		13,314				
			Součet		485,490				
NP	K	767627307	Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou	m	485,490	115,00	55 831,30		CS ÚRS 2022 02
			O01: (2,250+2,500)*2*8		76,000				
			O02: (2,250+2,500)*2*8		76,000				
			O03: (0,750+2,500)*2*8		52,000				
			O04: (0,750+2,100)*2*8		45,600				
			O05: (0,75+2,1)*2*6		34,200				
			O06: (2,25+0,75)*2*10		60,000				
			O07: (1,500+0,750)*2*8		36,000				
			O11: (1,900+2,500)*2*1		8,800				
			O12: (2,250+1,500)*2*2		15,000				
			O13: (1,000+1,700)*2*2		10,800				
			O14: (3,14*0,8)*23		57,776				
			O15: (3,14*1,060)*4		13,314				
			Součet		485,490				
NP			Příplatek za uzamykatelnou kliku	ks	41,000	280,00	11 480,00		
			O01:		16,000				
			O02:		16,000				
			O03:		8,000				
			O11:		1,000				
			Součet		41,000				
330	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	3,000	533,40	1 600,19		smluvní položka
			Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru parotěsnou páskou interiérovou		56 316,790				
			Příplatek k montáži oken za přípojovací spáru paropropustnou páskou exteriérovou		55 831,300				
			Příplatek za uzamykatelnou kliku		11 480,000				
			kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155		-63 190,000				
			#ODKAZI		-7 098,580				
			Součet		53 339,510				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 175,52		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	143,36	1 175,52		
			VRN odečty (Kč)		-110 892,66				
			VRN přípočty (Kč)		125 228,28				
			součet		14 335,620				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 015									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 23 - Pavilon B							
Soupis:		SO 23.1 - ASŘ - odpočty							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-110 892,66		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-110 892,66		
D	767		Konstrukce zámečnické				-110 892,66		
NP	M	54913110	kování uzávěr ventilační okenní pákový typ K301 11155	kus	-71,000	890,00	-63 190,00		CS ÚRS 2020 02
			O06: -10		-10,000				
			O12: -4		-4,000				
			O04: -8		-8,000				
			O05: -6		-6,000				
			O03: -8		-8,000				
			O01: -16		-16,000				
			O02: -16		-16,000				
			O11: -1		-2,000				
			O13: -4		-1,000				
			Součet		-71,000				
254	K	76662RO14	D+M dřevěné okno kruhové, bílé RAL 9016, pevné pr. 800 mm - O14	kus	-3,000	14 824,26	-44 472,78		smluvní položka
	W		- zasklení bezpečnostní zasklení tvrzeným sklem proti rozbití min. tř. bezpečnosti 3(B)3 (např. conex)						
	W		-3		-3,000				
	W		Součet		-3,000				
309	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	3,000	-1 076,63	-3 229,88		smluvní položka

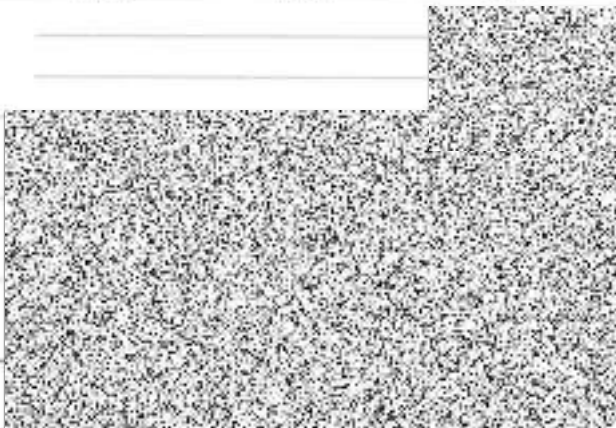Technický list změny (TLZ) č.:		ZL016	
Datum předložení TLZ:			
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:		Areálové rozvody	
Žadatel změny:			
Popis změny a důvod - zhotovitel:		Z důvodu, že areálový rozvod vody vedl v místě rostoucích keřů (dle OŽP k zachování), byla trasa připojení přeprojektována - změnový list obsahuje kromě těchto odpočtů za změnu a kratší trasu také přípočty za šachetní litinové poklopy, šachetní dna a potrubí dešťové kanalizace, které ve výkazu výměr nebylo uvedeno. Šachta na kanalizační přípojce musí mít kvůli PVK poklop s pražským znakem, všechny ostatní poklopy na šachtách v areálových rozvodech jsou bez znaku.	
Vyjádření projektant:			
Vyjádření TDI:		TDO COMPLAN NETA PŘÍPOJNÍKY.	
Vyjádření GI:			
Odkazy :		Zápis z KD č. 20, 23 Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt SO 05, SO 06	
Přílohy:		PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná	
Časový dopad oproti původnímu řešení:		bez dopadu s dopadem ANO	
Cenový dopad:		bez dopadu s dopadem ANO	
		Cenová kalkulace : přípočty 448 645,60 odpočty -111 319,61 Celkem 337 325,99 Kč	
Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:			
Za TDI			
Za projektanta			
Za zhotovitele			
 Geosan GEOSAN GROUP s.r.o. U Pískovny 154/32 170 00 Praha 7 IČO: 02618552			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10
Objekt: ZL016 - Areálové rozvody

Místo: Datum: D-PLUS
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: PROJEKTOVÁ A
Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: INŽENÝRSKÁ a.s.
VISTORIA CZ a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	337 325,99
HSV - Práce a dodávky HSV	311 761,51
1 - Zemní práce	-82 184,46
8 - Trubní vedení	390 172,25
998 - Přesun hmot	3 773,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 564,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10
Objekt: ZL016 - Areálové rozvody

Místo: Datum: D-PLUS
Zadavatel: Městská část Praha 10 Projektant: PROJEKTOVÁ A
Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská Zpracovatel: INŽENÝRSKÁ a.s.
VISTORIA CZ a.s.

Př. Tř. Kód Popis M. Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 337 325,99

D HSV Práce a dodávky HSV 311 761,51
D 1 Zemní práce -82 184,46

1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-55,000	447,16	-24 593,80	SOD
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-80,000	79,22	-6 337,60	SOD
VV zemina na meziskládku a zpětný zásyp -40*2					-80,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-15,000	297,85	-4 467,75	SOD
VV přebytková zemina na skládku -55*(-40)					-15,000			
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-30,000	23,05	-691,50	SOD
VV -15*2 Přepočtené koeficientem množství					-30,000			
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-55,000	50,18	-2 759,90	SOD
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-55,000	22,43	-1 233,65	SOD
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-18,000	1 330,00	-23 940,00	SOD
VV přebytková zemina na skládku -55*(-40)					-15,000			
VV -15*1,2 Přepočtené koeficientem množství					-18,000			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-40,000	143,35	-5 734,00	SOD
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	-11,000	553,66	-6 090,26	SOD
VV -55*0,2					-11,000			
10	M	58331200	šterkopsek netříděný zásypový	t	-22,000	288,00	-6 336,00	SOD
VV -11*2 Přepočtené koeficientem množství					-22,000			
D	8		Trubní vedení				390 172,25	

11	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 8,2 mm	m	-55,000	137,73	-7 575,15	SoD
12	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	-55,000	392,00	-21 560,00	SoD
	WV		"změna trasy - areálový rozvod vody					
	WV		"rozdíl trasy potrubí					
	WV		-23,5-8,5-20-3		-55,000			
13	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	16,800	289,82	4 868,98	SoD
14	M	28611174	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10	m	16,800	699,47	11 751,10	SoD
	WV		"dešťová kanalizace					
	WV		2,7+0,8+4,4+1,2+7,7		16,800			
15	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	77,700	322,02	25 020,95	SoD
16	M	28611177	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN10	m	77,700	1 036,19	80 511,96	SoD
	WV		"dešťová kanalizace					
	WV		4,5+50+23,2		77,700			
17	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	18 187,72	90 938,60	SoD
18	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm	kus	5,000	16 321,72	81 608,60	SoD
	WV		"splašková kanalizace šachty" 7		7,000			
	WV		"dešťová kanalizace šachty" 6		6,000			
	WV		"odpočet - ve WV vykázano" -1-7		-8,000			
	WV		Součet		5,000			
19	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	1 610,11	22 541,54	SOD
20	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	13,000	6 909,63	89 825,19	SoD
	WV		"splašková kanalizace šachty" 7		7,000			
	WV		"dešťová kanalizace šachty" 6		6,000			
	WV		"lapol" 1		1,000			
	WV		"na přípoje kanalizace - s pražským znakem" -1		-1,000			
	WV		Součet		13,000			
21	M	28661935.01	POKLOP LITINOVÝ DN 600 D400 - s pražským znakem	kus	1,000	12 240,48	12 240,48	
	P		Poznámka k položce: POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400					
	D	998	Přesun hmot				3 773,72	
22	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,125	966,07	3 018,97	SoD
23	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,125	241,52	754,75	SoD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				25 564,48	
24	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	3 117,62	25 564,48	SoD

Technický list změny (TLZ) č.:

ZL 22

Datum předložení TLZ:

14.06.2022

SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:		
Projekt registrační číslo:		
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10	
Objekt:		

Název změny: Akustické prvky schodišť

Žadatel změny:

Popis změny a důvod - zhotovitel:

ZL řeší:
Ve smluvním VV a DPS jsou uvedeny akustické prvky pro PREFÁ schodišťová ramena, ale ve smluvním VV jsou schodišťová ramena monolitická.
Dle rozhodnutí z KD č. 1B - bod 18/2 se ramena provádí monolitická a došlo ke změně a doplnění projekčního řešení akustických prvků.

Vyjádření projektant:

Vyjádření TDI:

TDO souhlasí s navrženým řešením.

Vyjádření GI:

Odkazy:

Zápis z KD č.
Zápis v deníku změn PD č.
Dotčený objekt

KD č. 38, bod 38/1

SO 02, SO 03, SO 23

Přílohy:

PD - schéma/podklady
ZL kalkulace - podrobná s VV
Jiná

Časový dopad oproti původnímu řešení:

bez dopadu
s dopadem

ANO

Cenový dopad:

bez dopadu
s dopadem

ANO

Cenová kalkulace:

SO 02	odečty	-43 703,04
SO 02	přípočty	95 580,24
SO 03	odečty	-20 701,44
SO 03	přípočty	52 790,90
SO 23	odečty	-75 905,28
SO 23	přípočty	160 298,96
Celkem		168 360,34 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:	Eva Navrátilová, DiS			
Za TDI:				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				



POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22									
Stavba:									
Objekt:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ - odečty							
Místo:							Datum:		
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant:		
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:		
D PLUS							PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-43 703,04		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-43 703,04		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-43 703,04		
116	K	953611125	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 - 23/O	kus	-4,000	5 175,36	-20 701,44		smluvní položka
	W		příloha D.1.02.1.36						
	W		4,0		4,000				
	W		Součet		4,000				
117	K	953611126	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 6 x D6 - 23/O	kus	-4,000	5 750,40	-23 001,60		smluvní položka
	W		příloha D.1.02.1.36						
	W		4,0		4,000				
	W		Součet		4,000				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ - přípočty							
Místo:							Datum:		
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant:		
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:		
D PLUS							PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							95 580,24		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				92 200,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 200,00		
NP 01			výztužný koš Z	kus	4,000	2 100,00	8 400,00		nová položka
NP 02			trnsole Z-V	kus	4,000	4 300,00	17 200,00		nová položka
NP 03			trnsole B-V1-L1200-B350	kus	1,000	3 200,00	3 200,00		nová položka
NP 04			trnsole B-V1-L1500-B350	kus	1,000	4 000,00	4 000,00		nová položka
NP 05			trnsole D-H komplet	kus	4,000	2 500,00	10 000,00		nová položka
NP 06			T-V6-H250-L1000	kus	2,000	8 500,00	17 000,00		nová položka
NP 07			T-V6-H200-L1000	kus	2,000	8 500,00	17 000,00		nová položka
NP 08			spárová deska L-420	kus	22,000	700,00	15 400,00		nová položka
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 380,24		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)	%	6,970	484,97	3 380,24		
			VRN odečty (Kč)		-43 703,04				
			VRN přípočty (Kč)		92 200,00				
			součet		48 496,960				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22									
Stavba:									
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část									
Objekt:									
SO 03 - Hospodářský pavilon									
Soupis:									
SO 03.1 - ASŘ - odečty									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:									
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant:									
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč:									
GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-20 701,44		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-20 701,44		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-20 701,44		
107	K	953611125	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 (ref.vyr. Halfen HTF) - 18/O	kus	-4,000	5 175,36	-20 701,44	smluvní položka	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22									
Stavba:									
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část									
Objekt:									
SO 03 - Hospodářský pavilon									
Soupis:									
SO 03.1 - ASŘ - přípočty									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:									
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant:									
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč:									
GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							52 790,90		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				50 700,00		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				50 700,00		
NP 01			výztužný koš Z	kus	4,000	2 100,00	8 400,00	nová položka	
NP 02			tronsole Z-V	kus	4,000	4 300,00	17 200,00	nová položka	
NP 03			tronsole B-V1-L1200-B350	kus	1,000	3 200,00	3 200,00	nová položka	
NP 04			tronsole D-H komplet	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	nová položka	
NP 05			T-V6-H250-L1000	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	nová položka	
NP 06			spárová deska L-420	kus	12,000	700,00	8 400,00	nová položka	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 090,90		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)	%	6,970	299,99	2 090,90		
			VRN odečty (Kč)			-20 701,44			
			VRN přípočty (Kč)			50 700,00			
			součet			29 998,560			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22									
Stavba:									
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část									
Objekt:									
SO 23 - Pavilon B									
Soupis:									
SO 23.1 - ASŘ - odečty									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:									
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant:									
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč:									
GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-75 905,28		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-75 905,28		
128	K	953611125	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 4 x D6 - 21/O	kus	-8,000	5 175,36	-41 402,88	smluvní položka	
129	K	953611126	Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi podestou a ramenem 2 x 6 x D6 - 21/O	kus	-6,000	5 750,40	-34 502,40	smluvní položka	

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 22								
Stavba:	Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:	SO 23 - Pavilon B							
Soupis:	SO 23.1 - ASŘ - přípočty							
Místo:						Datum:		
Zadavatel:	ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant:	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:	GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							160 298,96	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				154 800,00	
NP 01			výztužný koš Z	kus	12,000	2 100,00	25 200,00	nová položka
NP 02			tronsole Z-V	kus	12,000	4 300,00	51 600,00	nová položka
NP 03			tronsole B-V1-L1200-B350	kus	4,000	3 200,00	12 800,00	nová položka
NP 04			tronsole B-V1-L1500-B350	kus	1,000	4 000,00	4 000,00	nová položka
NP 05			tronsole D-H komplet	kus	6,000	2 500,00	15 000,00	nová položka
NP 06			T-V6-H250-L1000	kus	2,000	8 500,00	17 000,00	nová položka
NP 07			spárová deska L-420	kus	38,000	700,00	26 600,00	nová položka
NP 08			tronsole F-V1-L300 (tloušťka elastomeru 15mm)	kus	1,000	2 600,00	2 600,00	nová položka
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 498,96	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (6,97%)	%	6,970	788,95	5 498,96	
			VRN odečty (Kč)		-75 905,28			
			VRN přípočty (Kč)		154 800,00			
			součet		78 894,720			

Technický list změny (TLZ) č.:		24	
Datum předložení TLZ:		02.08.2022	
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:		Bourání asfaltových konstrukcí ve vyšší mocnosti v komunikaci	
Žadatel změny:		GD	
Popis změny a důvod - zhotovitel:		Změnový list obsahuje o 550 mm větší tloušťku živice bourané ve vozovce při realizaci kanalizační a vodovodní přípojky a celkově větší výměru bouraného souvrství a nového sfaltového povrchu, na kterém trvalo TSK pro převzetí.	
Vyřádění projektant:			
Vyřádění TDI: <i>DOUHLA</i>			
Vyřádění GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č.	37	
	Zápis v deníku změn PD č.		
	Dotčený objekt	SO 05	
Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV		
	Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		
Orientační cenový dopad:	bez dopadu	ANO	Cenová kalkulace : přípočty
	s dopadem		
		168 773,01 Kč	168 773,01 Kč
Jméno		Datum	Podpis
Za objednatele:			
Za TDI			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL024_opr - Bourání asfaltových konstrukcí ve vyšší mocnosti v komunikaci

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

168 773,01

HSV - Práce a dodávky HSV

155 982,49

1 - Zemní práce

27 157,25

5 - Komunikace pozemní

43 303,50

997 - Přesun sutě

85 521,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 790,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL024_opr - Bourání asfaltových konstrukcí ve vyšší mocnosti v komunikaci

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

P.č.	Typ	Kód	Popis	M.j.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava
------	-----	-----	-------	------	----------	----------------------------	---------------------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

168 773,01

D HSV

Práce a dodávky HSV

155 982,49

D 1

Zemní práce

27 157,25

1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm	m2	20,450	302,00	6 175,90	SoD
2	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm	m2	20,450	181,02	3 701,86	SoD
3	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm	m2	20,450	137,09	2 803,49	SoD
	VV	"skutečnost - chodník; vozovka; chodník						
	VV	16+28+6			50,000			
	VV	"dle VV k SoD SO 05.1 + SO 07.2						
	VV	-12,75-16,8			-29,550			
	VV	Součet			20,450			
4	K	113107346	Příplatek za odstranění podkladu živичného v tl o 550 mm větší	m2	28,000	517,00	14 476,00	

11	K	573312311	Prolití podkladu asfaltem v množství 4 kg/m2	m2	20,450	173,43	3 546,64	SoD
12	K	578132113	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	20,450	493,84	10 099,03	SoD
13	K	578901112	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 6 kg/m2	m2	20,450	22,77	465,65	SoD
D 997 Přesun sutě 85 521,74								
14	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	56,780	118,80	6 745,46	SoD
15	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	56,780	138,35	7 855,51	SoD
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	794,920	47,84	38 028,97	SoD
VV 56,78*14 Přepočtené koeficientem množství				794,920				
17	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	6,646	277,05	1 841,27	SoD
18	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	44,203	649,57	28 712,94	SoD
VV 4,499+39,704				44,203				
19	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	5,931	394,13	2 337,59	SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 12 790,52								
20	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	1 559,82	12 790,52	SoD

Technický list změny (TLZ) č.:		25	
Datum předložení TLZ:		18.07.2022	
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:		Žaluzie	
Žadatel změny:		GD, INV	
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Změnový list obsahuje úpravu ovládání exteriérových žaluzií v pobytových místnostech dětí. Pro lepší podmínky užívání budou instalovány vícekanálové spínače s možností současného ovládání více kusů žaluzií a pro ochranu před povětrnostními vlivy jsou doplněna větrná čidla. Motory žaluzií budou se spínačem i větrným čidlem komunikovat bezdrátově, což je úspora za kabeláže navíc a za doplnění nadstavby k jednodušším motorům. Dále ZL obsahuje interiérové žaluzie chybějící ve VV objektu B.		
Vyřádění projektant:			
Vyřádění TDI: 			
Vyřádění GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č.	39, 41	
	Zápis v deníku změn PD č.		
	Dotčený objekt	SO 02, SO 23	
Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV		
	Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		
Orientační cenový dopad:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		
		Cenová kalkulace :	
		přípočty	147 868,31 Kč
			147 868,31 Kč
	Jméno	Datum	Podpis
Za objednatele:			
Za TDI			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL025 - Žaluzie

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

147 868,31

PSV - Práce a dodávky PSV

136 662,03

742 - Elektroinstalace - slaboproud

15 455,26

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

121 206,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

11 206,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL025 - Žaluzie

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Pr	Tr	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							147 868,31	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					136 662,03	
D	742	Elektroinstalace - slaboproud					15 455,26	
1	K	22032200R	Montáž čidla, snímače nebo sířeny pro ovládání žaluzií	kus	2,000	2 538,99	5 077,98	CN dodavatele
P			Poznámka k položce: Koordináční přírážka 12,8% 2214/(1-12,8%)=2538,99 Kč KALKULACE: Zisk 3,2% Správní režie - centrála 3,6% Správní režie - závod (projekt) 3,5% Finanční náklady 1,5% Rezerva na reklamace 1% CELKEM 12,8%					
2	M	4046104R	detektor větru pro exteriérové žaluze	kus	2,000	5 129,59	10 259,18	CN dodavatele
P			Poznámka k položce: Koordináční přírážka 12,8% 4473/(1-12,8%)=5129,59 Kč KALKULACE: Zisk 3,2% Správní režie - centrála 3,6% Správní režie - závod (projekt) 3,5% Finanční náklady 1,5% Rezerva na reklamace 1% CELKEM 12,8%					
3	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	153,372	0,77	118,10	CS ÚRS 2022 01
D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy					121 206,77	
4	K	7866271R3	D+M žaluzie hliníková vnitřní vodorovná se zesílenými profily, barva bílá, manuální ovládání, šířka - lamely 25 mm - 20/O	m2	23,098	1 207,15	27 882,75	SoD
VV			"SO 23.1; příloha D.1.23.1.36					
VV			1,43*1,36*2					
VV			0,61*0,65*4					
VV			0,69*0,61*20					
VV			0,6*0,61*10					
VV			0,63*0,55*16					
VV			Součet					
			23,098					
5	K	7866271R4	D+M ovládání exteriérových žaluzií na dálkové vícekanálové nástěnné spínače s centrálním ovládáním	kus	12,000	1 677,18	20 126,16	CN dodavatele

			Poznámka k položce: Koordinační přírážka 12,8% 1462,5/(1-12,8%)=1677,18 Kč KALKULACE: Zisk 3,2% Správní režie - centrála 3,6% Správní režie - závod (projekt) 3,5% Finanční náklady 1,5% Rezerva na reklamace 1% CELKEM 12,8% WV WV WV WV WV						
			*objekt SO 02.1			4,000			
			*objekt SO 23.1			8,000			
			Součet			12,000			
6	K	7866271R5	Doplatek za žaluziový motor Somfy io pro dálkové ovládání a pro připojení povětrnostního čidla	kus	36,000	1 935,21		69 667,56	CN dodavatele
			Poznámka k položce: Koordinační přírážka 12,8% 1687,5/(1-12,8%)=1935,21 Kč KALKULACE: Zisk 3,2% Správní režie - centrála 3,6% Správní režie - závod (projekt) 3,5% Finanční náklady 1,5% Rezerva na reklamace 1% CELKEM 12,8% WV WV WV WV WV						
			*objekt SO 02.1			12,000			
			*objekt SO 23.1			24,000			
			Součet			36,000			
7	K	998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	1 176,765	3,00		3 530,30	SoD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					11 206,28	
8	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	1 366,62		11 206,28	SoD

Technický list změny (TLZ) č.:		26																					
Datum předložení TLZ:		11.08.2022																					
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV																					
Ze dne:																							
Projekt registrační číslo:																							
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10																						
Objekt:																							
Název změny:		Doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových kci																					
Žadatel změny:		GD																					
Popis změny a důvod - zhotovitel:		Změnový list obsahuje doplnění sádrokartonových konstrukcí o opláštění kotvení mobilních příček z důvodu akustického izolování dělených prostor, opláštění zámečnických kci Z6; dále doplnění výkazu výměr o výřezy otvorů pro revizní dvířka a zápusťná svítidla a narovnání výkazu výměr s PD.																					
Vyjádření projektanta:																							
Vyjádření TDI: <i>06.09.2022</i>																							
Vyjádření GI:																							
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt		SO 02, SO 03, S23																				
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná																						
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO																					
Orientační cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	Cenová kalkulace : připočty 453 042,72 Kč 453 042,72 Kč																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jméno</th> <th>Datum</th> <th>Podpis</th> <th>Razítko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Za objednavatele:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za TDI</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za projektanta:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za zhotovitele:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Jméno	Datum	Podpis	Razítko	Za objednavatele:				Za TDI				Za projektanta:				Za zhotovitele:			
Jméno	Datum	Podpis	Razítko																				
Za objednavatele:																							
Za TDI																							
Za projektanta:																							
Za zhotovitele:																							

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL026 - Doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových kcí

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

453 042,72

HSV - Práce a dodávky HSV

7 400,64

997 - Přesun sutě

7 400,64

PSV - Práce a dodávky PSV

411 307,94

763 - Konstrukce suché výstavby

411 307,94

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

34 334,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL026 - Doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových kcí

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Př.	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

453 042,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 400,64

D 997

Přesun sutě

7 400,64

1	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	1,898	728,04	1 381,82	SoD
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,898	242,60	460,45	SoD
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,572	10,61	281,93	SoD
VV					1,898*14 'Přepočtené koeficientem množství	26,572		
4	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	1,898	2 780,00	5 276,44	CS ÚRS 2022 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

411 307,94

D 763

Konstrukce suché výstavby

411 307,94

5	K	763101851	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkrovní jednoduché opláštění do 0,01 m2	kus	93,000	16,10	1 497,30	CS ÚRS 2022 02
---	---	-----------	---	-----	--------	-------	----------	----------------

	VV		"SO 02.6; svítidlo NA + NB						
	VV		18+8			26,000			
	VV		"SO 03.6; svítidlo NA + NB						
	VV		14+5			19,000			
	VV		"SO 23.6; svítidlo NA + NB						
	VV		32+16			48,000			
	VV		Součet			93,000			
6	K	763101853	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2	kus	427,000	107,00	45 689,00	CS ÚRS 2022 02	
	VV		"SO 02.6; svítidlo 2 + 5						
	VV		8+114			122,000			
	VV		"SO 03.6; svítidlo 2 + 5						
	VV		15+75			90,000			
	VV		"SO 23.6; svítidlo 2 + 5						
	VV		11+204			215,000			
	VV		Součet			427,000			
7	K	763101854	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	13,000	161,00	2 093,00	CS ÚRS 2022 02	
	VV		"SO 02.6; revizní dvířka 300/300						
	VV		6			6,000			
	VV		"SO 03.6; revizní dvířka 300/300						
	VV		2			2,000			
	VV		"SO 23.6; revizní dvířka 300/300						
	VV		5			5,000			
	VV		Součet			13,000			
8	K	763101856	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	73,000	338,00	24 674,00	CS ÚRS 2022 02	
	VV		"SO 02.6; svítidlo 4 + 4.1						
	VV		7+6			13,000			
	VV		"SO 03.6; svítidlo 4						
	VV		26			26,000			
	VV		"SO 23.6; svítidlo 4 + 4.1						
	VV		13+12			25,000			
	VV		"SO 02.6; revizní dvířka 600/600						
	VV		4			4,000			
	VV		"SO 23.6; revizní dvířka 600/600						
	VV		5			5,000			
	VV		Součet			73,000			
9	K	763121612.R	Montáž nosné konstrukce z profilů UA SDK stěna představená	m2	54,960	357,00	19 620,72	CS ÚRS 2022 02	
10	M	59030617	profil výztužný UA 50	m	164,880	180,00	29 678,40	CS ÚRS 2022 02	
	VV		54,96*3 "Přepočtené koeficientem množství			164,880			
11	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,400	884,00	8 309,60	SoD	
	VV		"SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14						
	VV		66,5+59,4			125,900			
	VV		"odpočet dle VV SOD						
	VV		-116,5			-116,500			
	VV		Součet			9,400			
12	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	24,200	290,00	7 018,00	SoD	
	VV		"SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14						
	VV		6,245*2+1,6*2			15,690			
	VV		"odpočet dle VV SOD						
	VV		-12,49			-12,490			
	VV		"SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14						
	VV		10,5*2			21,000			
	VV		Součet			24,200			
13	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	10,800	395,00	4 266,00	SoD	
	VV		"SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14						
	VV		2,295*2+3,95*2			12,490			
	VV		"odpočet dle VV SOD						
	VV		-4,59			-4,590			
	VV		"SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14						
	VV		2,4*2*2+2,9			12,500			
	VV		"odpočet dle VV SOD						
	VV		-9,6			-9,600			
	VV		Součet			10,800			
14	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	108,000	1 050,00	113 400,00	CS ÚRS 2022 02	
	VV		"SO 02.6; svítidlo 3						
	VV		36			36,000			
	VV		"SO 23.6; svítidlo 3						
	VV		72			72,000			
	VV		Součet			108,000			
15	K	763164531	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	84,000	706,00	59 304,00	CS ÚRS 2022 02	
	VV		"obklad kolejnic dle D.1.02.1.34 - T23 detail 1						
	VV		6*7*2			84,000			
16	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	42,000	47,20	1 982,40	CS ÚRS 2022 02	
	VV		84*0,5			42,000			
17	M	63152097	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	42,840	186,00	7 968,24	CS ÚRS 2022 02	
	VV		42*1,02 "Přepočtené koeficientem množství			42,840			
18	K	763164792	Montáž SDK obkladu kčí dvojité opláštění	m2	54,960	830,00	45 616,80	CS ÚRS 2022 02	
	VV		"obklad příčky zámečnický výrobek Z6 dle D.1.02.1.35						
	VV		(3,1*1,2*2+1,2*0,4+0,4*3,1)*6			54,960			
19	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	115,416	136,00	15 696,58	CS ÚRS 2022 02	
	VV		54,96*2,1 "Přepočtené koeficientem množství			115,416			
20	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 300x300 mm	kus	9,000	518,69	4 668,21	SoD	

		"SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14						
		2+4				6,000		
		"odpočet dle VV SOD						
		2				-2,000		
		"SO 03.1; dle D.1.03.1.09,10						
		2				2,000		
		"SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14						
		5				5,000		
		"odpočet dle VV SOD						
		2				-2,000		
		Součet				9,000		
21	M	59030711	dviřka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	9,000	713,05	6 417,45	SoD
22	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 600x600 mm	kus	1,000	531,34	531,34	SoD
		"SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14						
		5				5,000		
		"odpočet dle VV SOD						
		4				-4,000		
		Součet				1,000		
23	M	59030714	dviřka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	897,06	897,06	SoD
24	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	3 993,281	3,00	11 979,84	CS ÚRS 2022 02
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					34 334,14	
25	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	4 187,09	34 334,14	SoD

ROZPOČET VÍCEPRACÍ									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-19 874,91		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-19 874,91		
D		4	Vodorovné konstrukce				-14 004,32		
50	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	-15,028	791,26	-11 891,06		SOD
	W		spojovací krček "A"						
	W		8,84*1,70		15,028				
	W		Součet		15,028				
59	K	417321616	Zluzující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	-0,509	4 151,79	-2 113,26		SOD
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací krček A						
	W		8,49*0,40*0,20*2-8,49*0,10*0,50*2		0,509				
	W		Součet		0,509				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-5 870,59		
D		764	Konstrukce klempířské				-5 870,59		
226	K	764216R2K	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL koncovky rš 390 mm	m	-8,300	707,30	-5 870,59		SOD
	W		příloha D.1.02.1.36						
	W		1,65*2 "4/K		3,300				
	W		1,29*4 "5/K		5,000				
	W		Součet		8,300				

ROZPOČET VÍCEPRACÍ									
Stavba:									
Objekt:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Soupis:		SO 02 - Pavilon A							
		SO 02.1 - ASŘ							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 806,95		
d		HSV	Práce a dodávky HSV				116 889,77		
d		3	Svislé a kompletní konstrukce				30 242,08		
18	K	311113142	Nosná zed' tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	4,807	1 242,09	5 970,98 CS ÚRS 2020 02		
	W		spojovací lávka "A" - dopočet dozdní otvorů						
	W		0,80*0,80*4+1,06*1,06*2		4,807				
	W		Součet		4,807				
NP	K	341321410	Stěny nosné ze žb tř. C 25/30	m2	2,122	4 280,00	9 080,45 CS ÚRS 2022 02		
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací lávka "A" - betonové žebro						
	W		8,84*0,60*0,2*2		2,122				
	W		Součet		2,122				
NP	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	21,216	567,00	12 029,47 CS ÚRS 2022 02		
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací lávka "A" - betonové žebro						
	W		8,84*0,60*2*2		21,216				
	W		Součet		21,216				
NP	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	21,216	149,00	3 161,18 CS ÚRS 2022 02		
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací lávka "A" - betonové žebro						
	W		8,84*0,60*2*2		21,216				
	W		Součet		21,216				
d		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 763,36		
135	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	16,000	3 047,71	48 763,36 SOD		
			O/09: 2*16*0,2		6,400				
			O/10: 4*12*0,2		9,600				
d		997	Přesun sutě				2 355,93		
144	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,560	728,04	1 135,74 CS ÚRS 2020 02		
145	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,560	242,60	378,46 CS ÚRS 2020 02		
146	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,840	10,61	231,72 CS ÚRS 2020 02		
	W		1,56*14 "Přepočtené koeficientem množství"		21,840				
147	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,560	391,03	610,01 CS ÚRS 2020 02		
d		4	Vodorovné konstrukce				33 630,30		
NP	M	15484353	plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm	m2	18,034	1 140,00	20 558,30 CS ÚRS 2022 02		
			15,028*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		18,034				
NP		HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	16,000	434,00	6 944,00 CS ÚRS 2022 02		
NP	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	383,00	6 128,00 CS ÚRS 2022 02		
d		998	Přesun hmot				1 898,10		
148	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,382	297,43	1 898,10 SOD		
			přesun hmot odečty		-1,371				
			přesun hmot připočty		7,752				
			Součet		6,382				
d		PSV	Práce a dodávky PSV				12 903,85		
d		764	Konstrukce klempířské				12 903,85		
NP	K	764217405	Oplechování parapetů obých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm	m	8,300	1 530,00	12 699,00 CS ÚRS 2022 02		
			příloha D.1.02.1.36						
			1,65*2 "4/K"		3,300				
			1,25*4 "5/K"		5,000				
			Součet		8,300				
230	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	68,28	204,85 CS ÚRS 2020 02		
			Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL koncovky rš 390 mm		-5 870,590				
			Oplechování parapetů obých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm		12 699,000				
			Součet		6 828,410				
d		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 013,33		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	1 099,19	9 013,33		
			odečty		-19 874,910				
			připočty		129 793,620				
			Součet		109 918,710				

ROZPOČET VÍCEPRACÍ


Slavba:									
Objekt:	Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část								
Soupis:	SO 23 - Pavilon B								
	SO 23.1 - ASŘ								
Místo:						Datum:			
Zadavatel:	ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant:	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		
Uchazeč:	GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-108 860,26		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-108 860,26		
D	4		Vodorovné konstrukce				-84 466,99		
66	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	-52,148	791,26	-41 262,63	SOD	
	W		spojovací krádek "B"						
	W		30,675*1,70		52,148				
	W		Součet		52,148				
73	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	-1,841	4 151,79	-7 643,45	SOD	
	W		příloha D.01.23.1.9.10						
	W		spojovací lávka "B"						
	W		30,675*0,40*0,20*2-30,675*0,10*0,50*2		1,841				
	W		Součet		1,841				
74	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-49,080	575,04	-28 222,96	SOD	
	W		příloha D.01.23.1.9.10						
	W		spojovací lávka "B"						
	W		30,675*0,40*2*2		49,080				
	W		Součet		49,080				
75	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-49,080	149,51	-7 337,95	SOD	
D	998		Přesun hmot				6 498,85		
162	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	21,850	297,43	6 498,85	SOD	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-24 393,27		
D	764		Konstrukce klempířské				-24 393,27		
234	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 400 mm	m	-35,350	690,05	-24 393,27	CS ÚRS 2020 02	
	W		příloha D.1.23.1.36						
	W		1,25*23 "6/K		28,750				
	W		1,65*4 "7/K		6,600				
	W		Součet		35,350				

ROZPOČET VÍCEPRACÍ									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 23 - Pavilon B							
Soupis:		SO 23.1 - ASŘ							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							480 997,23		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				403 727,97		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				105 702,48		
26	K	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvrdic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	17,294	1 242,09	21 481,20	CS ÚRS 2020 02	
	W		spojovací lávka "B" - dopočet dozrání otvorů						
	W		0,80*0,80*20+1,06*1,06*4		17,294				
	W		Součet		17,294				
NP	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m2	7,362	4 280,00	31 509,36	CS ÚRS 2022 02	
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací lávka "B" - betonové žebro						
	W		30,675*0,60*0,2*2		7,362				
	W		Součet		7,362				
NP	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	73,620	567,00	41 742,54	CS ÚRS 2022 02	
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací lávka "B" - betonové žebro						
	W		30,675*0,60*0,2*2		73,620				
	W		Součet		73,620				
NP	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	73,620	149,00	10 969,38	CS ÚRS 2022 02	
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací lávka "B" - betonové žebro						
	W		30,675*0,60*0,2*2		73,620				
	W		Součet		73,620				
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				185 300,77		
146	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	60,800	3 047,71	185 300,77	SOD	
			Ø115: 4*16*0,2		12,800				
			Ø114: 20*12*0,2		48,000				
D		997	Přesun sutě				8 698,81		
158	K	997013113	Vnitrosaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,760	728,04	4 193,51	CS ÚRS 2020 02	
159	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,760	242,60	1 397,38	CS ÚRS 2020 02	
160	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,640	10,61	855,59	CS ÚRS 2020 02	
	W		5,76*14 *Přepočtené koeficientem množství		80,640				
161	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	5,760	391,03	2 252,33	CS ÚRS 2020 02	
D		4	Vodorovné konstrukce				97 482,46		
NP	M	15484353	plech trapezový 150/280 PES 25µm tř 0,75mm	m2	62,578	1 140,00	71 338,46	CS ÚRS 2022 02	
			52,148*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		62,578				
NP		HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	32,000	434,00	13 888,00	CS ÚRS 2022 02	
NP	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	383,00	12 256,00	CS ÚRS 2022 02	
D		998	Přesun hmot				6 543,45		
162	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	22,000	297,43	6 543,45	SOD	
			přesun hmot odečty		-6,195				
			přesun hmot připočty		27,195				
			Součet		22,000				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				49 066,64		
D		764	Konstrukce klempířské				49 066,64		
NP	K	764217405	Oplechování parapetů obých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rs 400 mm	m	31,600	1 530,00	48 348,00	CS ÚRS 2022 02	
	W		příloha D.1.23.1.36						
	W		1,25*20 *B/K		25,000				
	W		1,65*4 *7/K		6,600				
	W		Součet		31,600				
239	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	239,55	718,64	CS ÚRS 2020 02	
			Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastovaním rs 400 mm		-24 393,270				
			Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m		48 348,000				
			Součet		23 954,730				
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 202,62		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	3 439,34	28 202,62		
			odečty		-108 860,260				
			připočty		452 794,610				
			Součet		343 934,350				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ - přípočty							
Místo:									
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 778,76		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 810,31		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 810,31		
NP	M		nosné elastomerové ložisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, šíře 106mm	m	4,100	2 776,03	11 381,73		
			příloha D.1.02.2.10						
			2,05*2		4,100				
NP	M	63150944	Deska podlahová 1250*600mm ISOVER TDPT 25/25	m2	1,485	244,00	362,34		CS ÚRS 2022 02
			příloha D.1.02.2.10						
			(2*2,05*0,25)+(2*2,05*0,1)+(2*0,1*0,25)		1,485				
NP	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	1,845	35,90	66,24		CS ÚRS 2022 02
			příloha D.1.02.2.10						
			2,05*0,1*2		0,410				
			(2*2,05*0,25)+(2*2,05*0,1)		1,435				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				968,45		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	118,10	968,45		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 03 - Hospodářský pavilon							
Soupis:		SO 03.1 - ASŘ - přípočty							
Místo:									
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 070,90		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				25 943,53		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 943,53		
NP	M		nosné elastomerové ložisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, šíře 106mm	m	4,100	2 776,03	11 381,73		
			příloha D.1.03.2.8						
			2,05*2		4,100				
NP	M		nosné elastomerové ložisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, šíře 130mm	m	4,100	3 341,52	13 700,23		
			příloha D.1.03.2.8						
			2,05*2		4,100				
NP	M	63150944	Deska podlahová 1250*600mm ISOVER TDPT 25/25	m2	2,970	244,00	724,68		CS ÚRS 2022 02
			příloha D.1.03.2.8						
			(4*2,05*0,25)+(4*2,05*0,1)+(4*0,1*0,25)		2,970				
NP	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	3,813	35,90	136,89		CS ÚRS 2022 02
			příloha D.1.03.2.8						
			2*2,05*0,1+2*2,05*0,13		0,943				
			(4*2,05*0,25)+(4*2,05*0,1)		2,870				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 127,37		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	259,44	2 127,37		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - PŘÍPOČTY									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 23 - Pavilon B							
Soupis:		SO 23.1 - ASŘ - přípočty							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 778,76		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 810,31		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				11 810,31		
NP	M		nosné elastomerové ložisko CALENBERG CIGULAR® S tl. 10mm, šíře 106mm	m	4,100	2 776,03	11 381,73		
			příloha D.1.23.2.13						
			2,05*2		4,100				
NP	M	63150944	Deska podlahová 1250*600mm ISOVER TDPT 25/25	m2	1,485	244,00	362,34		CS ÚRS 2022 02
			příloha D.1.23.2.13						
			(2*2,05*0,25)+(2*2,05*0,1)+(2*0,1*0,25)		1,485				
NP	K	714451001	Montáž antivibračních rohoží z recyklované pryže volně položených vodorovně nebo svisle	m2	1,845	35,90	66,24		CS ÚRS 2022 02
			příloha D.1.23.2.13						
			2*2,05*0,1		0,410				
			(2*2,05*0,25)+(2*2,05*0,1)		1,435				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				968,45		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	118,10	968,45		

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL 29	
Datum předložení TLZ:		02.09.2022	
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	Altán - monolit		
Žadatel změny:	GDS		
Popis změny a důvod - zhotovitel:	ZL řeší: narovnání VV na DPS		
Vyřádění projektant:			
Vyřádění TDI:			
Vyřádění GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt	SO 19 - Altán	
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	
		Cenová kalkulace :	
		SO 19 přípočty	46 578,03
		Celkem	46 578,03 Kč
	Jméno	Datum	Podpis
	Eva Navrátilová, DiS.		
Za objednavatele:			
Za TDI			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

položkový rozpočet vícepráce									
Stavba:									
Objekt:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
		SO 19 - Altán							
Místo:							Datum:		
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská – vedoucí společník					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							46 578,03		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				43 048,09		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				37 140,71		
15	K	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	1,471	4 082,79	6 003,74		CS ÚRS 2020 02
	W		příloha D.1.19.02						
	W		Dle SOD		4,141				
	W		oprava chyby výšky stěny jako průměr výšky na krajích a uprostřed						
	W		8,70*(3,6+2,85)/2*0,20		5,612				
	W		rozdlí SOD a oprava		1,471				
16	K	311351411	Zřízení kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m	m2	15,041	1 610,11	24 217,66		CS ÚRS 2020 02
	W		příloha D.1.19.02						
	W		Dle SOD		42,364				
	W		oprava chyby výšky stěny jako průměr výšky na krajích a uprostřed						
	W		(8,70+0,20)*(3,6+2,85)/2*2		57,405				
	W		rozdlí SOD a oprava		15,041				
17	K	311351412	Odstanění kruhového oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí r do 2,5 m	m2	15,041	460,03	6 919,31		CS ÚRS 2020 02
D	998		Přesun hmot				5 907,38		
33	K	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	3,669	1 610,11	5 907,38		CS ÚRS 2020 02
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 529,94		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	430,48	3 529,94		

Dodatek č. 7

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/0933

ze dne 17. 6. 2021

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostou Ing. arch. Martinem Valovičem

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská**

zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské smlouvy

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Společník: VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČO: 251 10 977

DIČ: CZ25110977

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.

č. účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 9119032/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Tímto Dodatkem se opravují ZL č. 16, 26 a 27. Uzavřením bude Dodatek č. 5 opraven.

II.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 7 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 1 487 156, 89 Kč bez DPH

a zároveň se snižuje o částku 1 571 575,67 Kč bez DPH

Celkem se tedy cena díla snižuje o částku: 84 418,78 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 137 817 902, 70 Kč

(slovy: stotřicetsedmmilionůosmsetsedmnáctisícdevětsetdva korun českých a 70 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

IV.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty méněprací a víceprací.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Městská část Praha 10
Bc. Jakub Brzoň
vedoucí odboru majetkoprávního
Objednatel


pověřená osoba na základě pověření a
společenské smlouvy
Zhotovitel

Jakub
Brzoň

Digitálně podepsal
Jakub Brzoň
Datum: 2023.04.27
07:51:20 +02'00'



Rekapitulace změn

Projekt : Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

[illegible]

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL016	
Datum předložení TLZ:			
SoD č.:	objednatel:	2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAIKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	Areálové rozvody		
Žadatel změny:			
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Z důvodu, že areálový rozvod vody vedl v místě rostoucích keřů (dle OŽP k zachování), byla trasa připojení přeprojektována - změnový list obsahuje kromě těchto odpočtů za změnu a kratší trasu také přípočty za šachetní litinové poklopy, šachetní dna a potrubí dešťové kanalizace, které ve výkazu výměr nebylo uvedeno. Šachta na kanalizační přípojce musí mít kvůli PVK poklop s pražským znakem, všechny ostatní poklopy na šachtách v areálových rozvodech jsou bez znaku.		
Vyjádření projektant:			
Vyjádření TDI:			
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č.	20, 23	
	Zápis v deníku změn PD č.		
	Dotčený objekt	SO 05, SO 06	
Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV		
	Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		
Cenový dopad:	bez dopadu	ANO	
	s dopadem		
	Cenová kalkulace :		
	přípočty	400 025,82	
	odpočty	-161 402,78	
	Celkem	238 623,04 Kč	
Pro podpis:	Jméno	Datum	Podpis
Za objednatele:	Eva Navrátilová, Dis.		
Za TDI:			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ	
Stavba:	Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10
Objekt:	ZL016 - Areálové rozvody
Místo:	
Zadavatel:	Městská část Praha 10
Zhotovitel:	GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská
Datum:	
Projektant:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Zpracovatel:	VISTORIA CZ a.s.
Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	238 623,04
HSV - Práce a dodávky HSV	220 538,84
1 - Zemní práce	-106 419,28
8 - Trubní vedení	323 184,40
998 - Přesun hmot	3 773,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 084,20

SOUPIS PRACÍ									
Stavba:	Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10								
Objekt:	ZL016 - Areálové rozvody								
Místo:									
Zadavatel:	Městská část Praha 10					Projektant:	D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		
Zhotovitel:	GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská					Zpracovatel:	VISTORIA CZ a.s.		
Př. Tm	Kód	Popis	M ¹	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava		
Náklady soupisu celkem						238 623,04			
D	HSV	Práce a dodávky HSV				220 538,84			
D	1	Zemní práce				-106 419,28			
1	K	132251253	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	-55,000	648,30	-35 656,50	SOD	
2	K	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-80,000	62,68	-5 014,40	SOD	
	W	zemina na meziskládku a zpětný zásyp			-80,000				
	W	-40*2							
3	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-15,000	375,39	-5 630,85	SOD	
	W	přebytečná zemina na skládku			-15,000				
	W	-55*(-40)							
4	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-30,000	27,37	-821,10	SOD	
	W	-15*2 Přepočtené koeficientem množství			-30,000				
5	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-55,000	348,01	-19 140,55	SOD	
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-55,000	22,43	-1 233,65	SOD	
7	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-18,000	394,13	-7 094,34	SOD	
	W	přebytečná zemina na skládku			-15,000				
	W	-55*(-40)							
	W	-15*1,2 Přepočtené koeficientem množství			-18,000				
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	-40,000	165,84	-6 633,60	SOD	
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m	m3	-11,000	767,91	-8 447,01	SOD	
	W	-55*0,2			-11,000				
10	M	58331200	šterkopsek netříděný zásypový	t	-22,000	761,24	-16 747,28	SOD	
	W	-11*2 Přepočtené koeficientem množství			-22,000				

D	8	Trubní vedení					323 184,40	
11	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	-55,000	289,82	-15 940,10	SoD
12	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	-55,000	709,88	-39 043,40	SoD
	W		"změna trasy - areálový rozvod vody					
	W		"rozdlí trasy potrubí					
	W		-23,5-8,5-20-3		-55,000			
13	K	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	m	16,800	289,82	4 868,98	SoD
14	M	28611174	trubka kanalizační PVC DN 160x3000mm SN10	m	16,800	699,47	11 751,10	SoD
	W		"dešťová kanalizace					
	W		2,7+0,8+4,4+1,2+7,7		16,800			
15	K	871355231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 200	m	77,700	322,02	25 020,95	SoD
16	M	28611177	trubka kanalizační PVC DN 200x3000mm SN10	m	77,700	1 036,19	80 511,96	SoD
	W		"dešťová kanalizace					
	W		4,5+50+23,2		77,700			
17	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN přes 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	5,000	12 880,91	64 404,55	SoD
18	M	59224029	dno betonové šachtové DN 300 betonový žlab i nástupnice 100x78,5x15cm	kus	5,000	13 400,63	67 003,15	SoD
	W		"splašková kanalizace šachty" 7		7,000			
	W		"dešťová kanalizace šachty" 6		6,000			
	W		"odpočet - ve VV vykázáno" -1-7		-8,000			
	W		Součet		5,000			
19	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	14,000	1 610,11	22 541,54	SOD
20	M	28661935	poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	13,000	6 909,63	89 825,19	SoD
	W		"splašková kanalizace šachty" 7		7,000			
	W		"dešťová kanalizace šachty" 6		6,000			
	W		"lapol" 1		1,000			
	W		"na přípojce kanalizace - s pražským znakem" -1		-1,000			
	W		Součet		13,000			
21	M	28661935.01	POKLOP LITINOVÝ DN 600 D400 - s pražským znakem	kus	1,000	12 240,48	12 240,48	
	P		Poznámka k položce: POKLOP LITINOVÝ 600/40T D400					
D	998	Přesun hmot					3 773,72	
22	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	3,125	966,07	3 018,97	SoD
23	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	3,125	241,52	754,75	SoD
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					18 084,20	
24	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	2 205,39	18 084,20	SoD

Technický list změny (TLZ) č.:		26	
Datum předložení TLZ:		11.08.2022	
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:		Doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových kcí	
Žadatel změny:		GD	
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Změnový list obsahuje doplnění sádrokartonových konstrukcí o opláštění kotvení mobilních příček z důvodu akustického izolování dělených prostor, opláštění zámečnických kcí Z6, dále doplnění výkazu výměr o výřezy otvorů pro revizní dvířka a zápuštná svítidla a narovnání výkazu výměr s PD.		
Vyjádření projektant:			
Vyjádření TDI:			
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt:	SO 02, SO 03, S23	
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Orientační cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	Cenová kalkulace : připočty 467 324,90 Kč 467 324,90 Kč
Jméno		Datum	Razítko
Eva Navrátilová Dis			
Za objednavatele:			
Za TDI			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL026 - Doplnění výřezů otvorů a narovnání výkazu sádrokartonových kcí

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

26760312

DIČ:

CZ26760312

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

IČ:

25110977

DIČ:

CZ25110977

Poznámka:

Cena bez DPH

467 324,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	467 324,90	21,00%	98 138,23
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

565 463,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL026 - Doplnění výřezů otvorů a narovnění výkazu sádrokartonových kcí

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

467 324,90

HSV - Práce a dodávky HSV

7 400,64

997 - Přesun sutě

7 400,64

PSV - Práce a dodávky PSV

424 507,80

763 - Konstrukce suché výstavby

424 507,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

35 416,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL026 - Doplnění výřezů otvorů a narovnění výkazu sádrokartonových kcí

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

467 324,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

7 400,64

D 997

Přesun sutě

7 400,64

1	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace	t	1,898	728,04	1 381,82	SoD
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,898	242,60	460,45	SoD
3	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	26,572	10,61	281,93	SoD
VV					1,898*14*Přepočtené koeficientem množství	26,572		
4	K	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	1,898	2 780,00	5 276,44	CS ÚRS 2022 02

D PSV

Práce a dodávky PSV

424 507,80

D 763

Konstrukce suché výstavby

424 507,80

5	K	763101851	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění do 0,01 m2	kus	93,000	16,10	1 497,30	CS ÚRS 2022 02
VV			"SO 02.6; svítidlo NA + NB					
VV			18+8		26,000			
VV			"SO 03.6; svítidlo NA + NB					
VV			14+5		19,000			
VV			"SO 23.6; svítidlo NA + NB					
VV			32+16		48,000			
VV			Součet		93,000			
6	K	763101853	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,02 do 0,05 m2	kus	427,000	107,00	45 689,00	CS ÚRS 2022 02
VV			"SO 02.6; svítidlo 2 + 5					
VV			8+114		122,000			
VV			"SO 03.6; svítidlo 2 + 5					
VV			15+75		90,000			
VV			"SO 23.6; svítidlo 2 + 5					
VV			11+204		215,000			
VV			Součet		427,000			
7	K	763101854	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2	kus	13,000	161,00	2 093,00	CS ÚRS 2022 02
VV			"SO 02.6; revizní dvířka 300/300					
VV			6		6,000			
VV			"SO 03.6; revizní dvířka 300/300					
VV			2		2,000			
VV			"SO 23.6; revizní dvířka 300/300					
VV			5		5,000			
VV			Součet		13,000			
8	K	763101856	Výřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo podkroví jednoduché opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	73,000	338,00	24 674,00	CS ÚRS 2022 02
VV			"SO 02.6; svítidlo 4 + 4.1					
VV			7+6		13,000			
VV			"SO 03.6; svítidlo 4					
VV			26		26,000			
VV			"SO 23.6; svítidlo 4 + 4.1					
VV			13+12		25,000			
VV			"SO 02.6; revizní dvířka 600/600					
VV			4		4,000			
VV			"SO 23.6; revizní dvířka 600/600					
VV			5		5,000			
VV			Součet		73,000			
9	K	763121612.R	Montáž nosné konstrukce z profilů UA SDK stěna předsazená	m2	54,960	357,00	19 620,72	CS ÚRS 2022 02
10	M	59030617	profil výztužný UA 50	m	164,880	180,00	29 678,40	CS ÚRS 2022 02
VV			54,96*3 Přepočtené koeficientem množství		164,880			
11	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	9,400	715,35	6 724,29	SoD
VV			"SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14					
VV			66,5+59,4		125,900			
VV			"odpočet dle VV SOD					
VV			-116,5		-116,500			
VV			Součet		9,400			
12	K	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	24,200	730,30	17 673,26	SoD
VV			"SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14					
VV			6,245*2+1,6*2		15,690			
VV			"odpočet dle VV SOD					
VV			-12,49		-12,490			
VV			"SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14					
VV			10,5*2		21,000			
VV			Součet		24,200			
13	K	763131722	SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m	m	10,800	741,80	8 011,44	SoD
VV			"SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14					
VV			2,295*2+3,95*2		12,490			
VV			"odpočet dle VV SOD					
VV			-4,59		-4,590			
VV			"SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14					
VV			2,4*2+2,9		12,500			
VV			"odpočet dle VV SOD					
VV			-9,6		-9,600			
VV			Součet		10,800			
14	K	763131913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK podhledu a podkroví s vyztužením profily	kus	108,000	1 050,00	113 400,00	CS ÚRS 2022 02
VV			"SO 02.6; svítidlo 3					
VV			36		36,000			
VV			"SO 23.6; svítidlo 3					
VV			72		72,000			
VV			Součet		108,000			
15	K	763164531	SDK obklad kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5	m	84,000	706,00	59 304,00	CS ÚRS 2022 02
VV			"obklad kolejnic dle D.1.02.1.34 - T23 detail 1					
VV			6*7*2		84,000			
16	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	42,000	47,20	1 982,40	CS ÚRS 2022 02
VV			84*0,5		42,000			
17	M	63152097	pás tepelné izolační univerzální $\lambda=0,032-0,033$ tl 60mm	m2	42,840	186,00	7 968,24	CS ÚRS 2022 02
VV			42*1,02 Přepočtené koeficientem množství		42,840			
18	K	763164792	Montáž SDK obkladu kčí dvojité opláštění	m2	54,960	830,00	45 616,80	CS ÚRS 2022 02
VV			"obklad příčky zámečnický výrobek Z6 dle D.1.02.1.35					
VV			(3,1*1,2*2+1,2*0,4+0,4*3,1)*6		54,960			
19	M	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	115,416	136,00	15 696,58	CS ÚRS 2022 02
VV			54,96*2,1 Přepočtené koeficientem množství		115,416			

20	K	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 300x300 mm	kus	9,000	518,69	4 668,21	SoD
	W		"SO 02.1; dle D.1.02.1.13,14					
	W		2+4		6,000			
	W		*odpočet dle VV SOD					
	W		-2		-2,000			
	W		"SO 03.1; dle D.1.03.1.09,10					
	W		2		2,000			
	W		"SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14					
	W		5		5,000			
	W		*odpočet dle VV SOD					
	W		-2		-2,000			
	W		Součet		9,000			
21	M	59030711	dvířka revizní s automatickým zámkem 300x300mm	kus	9,000	713,05	6 417,45	SoD
22	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000	531,34	531,34	SoD
	W		"SO 23.1; dle D.1.23.1.13,14					
	W		5		5,000			
	W		*odpočet dle VV SOD					
	W		-4		-4,000			
	W		Součet		1,000			
23	M	59030714	dvířka revizní s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	897,06	897,06	SoD
24	K	998763402	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	%	4 121,435	3,00	12 364,31	CS ÚRS 2022 02
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							35 416,46	
25	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	4 319,08	35 416,46	SoD

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL 27																					
Datum předložení TLZ:		02.09.2022																					
Načítá se...	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV																					
Ze dne:																							
Projekt registrační číslo:																							
Stavba:	MŠ BAIKALSKÁ, Praha 10																						
Objekt:																							
Název změny:	Spojovací lávky A a B																						
Žadatel změny:																							
Popis změny a důvod - zhotovitel:	ZL řeší: uvedení VV do souladu s DPS Monolitická konstrukce lávek: scházející část svíjících stěn, odečet neprovedené konstrukce střešního věnce Svíjící konstrukce: provedení krahových otvorů Vodorovné konstrukce: chybně zatřídněná položka, dle DPS trapezový plech s výškou vlny 150mm, ve VV s výškou vlny 40mm Klenbořské konstrukce: chybně zatřídněná položka, dle DPS parapety oblé, ve VV parapety rovné																						
Vyjádření projektant:																							
Vyjádření TDI:																							
Vyjádření GI:																							
Odkazy :	Zápis z KO č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt	SO 02.1 - ASŘ SO 23.1 - ASŘ																					
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiné																						
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO																					
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	Cenová kalkulace : SO 02.1 přípočty 138 808,99 SO 02.1 odpočty -19 874,91 SO 23.1 přípočty 480 997,18 SO 23.1 odpočty -108 880,26 Celkem 491 071,00 Kč																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jméno</th> <th>Datum</th> <th>Podpis</th> <th>Pečeť</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Za objednatele:</td> <td>Eva Navrátilová, DiS</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za TDI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za projektanta:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za zhotovitele:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Jméno	Datum	Podpis	Pečeť	Za objednatele:	Eva Navrátilová, DiS			Za TDI:				Za projektanta:				Za zhotovitele:			
Jméno	Datum	Podpis	Pečeť																				
Za objednatele:	Eva Navrátilová, DiS																						
Za TDI:																							
Za projektanta:																							
Za zhotovitele:																							

ROZPOČET MĚNĚPRACÍ									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-19 874,91		
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-19 874,91		
D		4	Vodorovné konstrukce				-14 004,32		
50	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	-15,028	791,26	-11 891,06		SOD
	W		spojovací krček "A"						
	W		8,84*1,70		15,028				
	W		Součet		15,028				
59	K	417321616	Zlužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	-0,509	4 151,79	-2 113,26		SOD
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací krček A						
	W		8,49*0,40*0,20*2-8,49*0,10*0,50*2		0,509				
	W		Součet		0,509				
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-5 870,59		
D		764	Konstrukce klempířské				-5 870,59		
226	K	764216R2K	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL koncovky rš 390 mm	m	-8,300	707,30	-5 870,59		SOD
	W		příloha D.1.02.1.36						
	W		1,65*2 "4/K		3,300				
	W		1,29*4 "5/K		5,000				
	W		Součet		8,300				

ROZPOČET VÍCEPRACÍ									
Stavba:	Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část								
Objekt:	SO 02 - Pavilon A								
Soupis:	SO 02.1 - ASŘ								
Místo:									
Zadavatel:	ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38						Datum:		
Uchazeč:	GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník						Projektant:	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
							Zpracovatel:		
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							138 808,99		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				116 891,79		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 243,54		
18	K	311113142	Nosná zed' tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	4,807	1 242,09	5 970,73 SOD		
	W		spojovací lávka "A" - dopočet dozodnění otvorů						
	W		0,80*0,80*4+1,06*1,06*2		4,807				
	W		Součet		4,807				
NP 1	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m2	2,122	4 280,00	9 082,16 CS ÚRS 2022 02		
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací lávka "A" - betonové žebro						
	W		8,84*0,60*0,2*2		2,122				
	W		Součet		2,122				
NP 2	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	21,216	567,00	12 029,47 CS ÚRS 2022 02		
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací lávka "A" - betonové žebro						
	W		8,84*0,60*2*2		21,216				
	W		Součet		21,216				
NP 3	K	341351112	Odstranění oboustranného bednění nosných stěn	m2	21,216	149,00	3 161,18 CS ÚRS 2022 02		
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací lávka "A" - betonové žebro						
	W		8,84*0,60*2*2		21,216				
	W		Součet		21,216				
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				48 763,36		
135	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	16,000	3 047,71	48 763,36 SOD		
			O/09: 2*16*0,2		6,400				
			O/10: 4*12*0,2		9,600				
	D	997	Přesun sutě				2 355,93		
144	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,560	728,04	1 135,74 SOD		
145	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,560	242,60	378,46 SOD		
146	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,840	10,61	231,72 SOD		
	W		1,56*14 "Přepočtené koeficientem množství"		21,840				
147	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	1,560	391,03	610,01 SOD		
	D	4	Vodorovné konstrukce				33 630,76		
NP 4	M	15484353	plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm	m2	18,034	1 140,00	20 558,76 CS ÚRS 2022 02		
			15,028*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"		18,034				
NP 5		HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	16,000	434,00	6 944,00 CS ÚRS 2022 02		
NP 6	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	16,000	363,00	6 128,00 CS ÚRS 2022 02		
	D	998	Přesun hmot				1 898,20		
148	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,382	297,43	1 898,20 SOD		
			přesun hmot odečty		-1,371				
			přesun hmot připočty		7,752				
			Součet		6,382				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				12 903,84		
	D	764	Konstrukce klempířské				12 903,84		
NP 7	K	764217405	Oplechování parapetů obíhých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rs 400 mm	m	8,300	1 530,00	12 699,00 CS ÚRS 2022 02		
			příloha D.1.02.1.36						
			1,65*2 "4K"		3,300				
			1,25*4 "5K"		5,000				
			Součet		8,300				
230	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	68,28	204,84 SOD		
			Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním vč. AL koncovky rs 390 mm		-5 870,590				
			Oplechování parapetů obíhých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rs 400 mm		12 699,000				
			Součet		6 828,410				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 013,36		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	1 099,19	9 013,36		
			odečty		-19 874,910				
			připočty		129 793,630				
			Součet		109 918,720				

ROZPOČET MĚNĚPRACÍ									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4, 1537/7, 1538/1, 1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 23 - Pavilon B							
Soupis:		SO 23.1 - ASŘ							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-108 860,26		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-108 860,26		
	D	4	Vodorovné konstrukce				-84 466,99		
66	K	411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,75 mm	m2	-52,148	791,26	-41 262,63		SOD
	W		spojovací křížek "B"						
	W		30,675*1,70		52,148				
	W		Součet		52,148				
73	K	417321616	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 30/37	m3	-1,841	4 151,79	-7 643,45		SOD
	W		příloha D.01.23.1.9.10						
	W		spojovací lávka "B"						
	W		30,675*0,40*0,20*2-30,675*0,10*0,50*2		1,841				
	W		Součet		1,841				
74	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	-49,080	575,04	-28 222,96		SOD
	W		příloha D.01.23.1.9.10						
	W		spojovací lávka "B"						
	W		30,675*0,40*2*2		49,080				
	W		Součet		49,080				
75	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	-49,080	149,51	-7 337,95		SOD
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				-24 393,27		
	D	764	Konstrukce klempířské				-24 393,27		
234	K	764216605	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 400 mm	m	-35,350	690,05	-24 393,27		SOD
	W		příloha D.1.23.1.36						
	W		1,25*23 -76/K		28,750				
	W		1,65*4 -77/K		6,600				
	W		Součet		35,350				

ROZPOČET VÍCEPRACÍ									
Stavba:									
Objekt:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Soupis:		SO 23 - Pavilon B							
Místo:		SO 23.1 - ASŘ							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Datum:		
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ a.s.		
							Zpracovatel:		
PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							480 997,18		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				403 727,94		
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				105 701,98		
26	K	311113142	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25	m2	17,294	1 242,09	21 480,70 SOD		
	W		spojovací lávka "B" - počet dozdlání otvorů						
	W		0,80*0,80*20+1,06*1,06*4			17,294			
	W		Součet			17,294			
NP 1	K	341321410	Stěny nosné ze ŽB tř. C 25/30	m2	7,362	4 280,00	31 509,36 CS ÚRS 2022 02		
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací lávka "B" - betonové žebro						
	W		30,675*0,60*0,2*2			7,362			
	W		Součet			7,362			
NP 2	K	341351111	Zřízení oboustranného bednění nosných stěn	m2	73,620	567,00	41 742,54 CS ÚRS 2022 02		
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací lávka "B" - betonové žebro						
	W		30,675*0,60*2*2			73,620			
	W		Součet			73,620			
NP 3	K	341351112	Odstanění oboustranného bednění nosných stěn	m2	73,620	149,00	10 969,38 CS ÚRS 2022 02		
	W		příloha D.1.02.1.4.5						
	W		spojovací lávka "B" - betonové žebro						
	W		30,675*0,60*2*2			73,620			
	W		Součet			73,620			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				185 300,77		
146	K	977151125	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 200 mm do stavebních materiálů	m	60,800	3 047,71	185 300,77 SOD		
			O/15: 4*16*0,2			12,800			
			O/14: 20*12*0,2			48,000			
	D	997	Přesun sutě				8 698,81		
158	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,760	728,04	4 193,51 SOD		
159	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,760	242,60	1 397,38 SOD		
160	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	80,640	10,61	855,59 SOD		
	W		5,76*14 "Přepočtené koeficientem množství"			80,640			
161	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	5,760	391,03	2 252,33 SOD		
	D	4	Vodorovné konstrukce				97 482,92		
NP 4	M	15484353	plech trapézový 150/280 PES 25µm tl 0,75mm	m2	62,578	1 140,00	71 338,92 CS ÚRS 2022 02		
			52,148*1,2 "Přepočtené koeficientem množství"			62,578			
NP 5		HZS1441	Hodinová zúčtovací sazba svářeč	hod	32,000	434,00	13 888,00 CS ÚRS 2022 02		
NP 6	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	32,000	383,00	12 256,00 CS ÚRS 2022 02		
	D	998	Přesun hmot				6 543,46		
162	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	22,000	297,43	6 543,46 SOD		
			přesun hmot odečty			-5,195			
			přesun hmot přípočty			27,195			
			Součet			22,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				49 066,65		
	D	764	Konstrukce klempířské				49 066,65		
NP 7	K	764217405	Oplechování parapetů obých nebo ze segmentů mechanicky kotvené z Pz plechu rš 400 mm	m	31,600	1 530,00	48 348,00 CS ÚRS 2022 02		
	W		příloha D.1.23.1.36						
	W		1,25*20 "6/K			25,000			
	W		1,65*4 "7/K			6,600			
	W		Součet			31,600			
239	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	239,55	718,65 SOD		
			Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou poplastováním rš 400 mm			-24 393,270			
			Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m			48 348,000			
			Součet			23 954,730			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				28 202,59		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	3 439,34	28 202,59		
			odečty			-108 860,260			
			přípočty			452 794,590			
			Součet			343 934,330			

Dodatek č. 8

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/0933

ze dne 17. 6. 2021

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostou Ing. arch. Martinem Valovičem

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská**

zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské smlouvy

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Společník: VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČO: 251 10 977

DIČ: CZ25110977

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.

č. účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 9119032/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 8 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 1 807 185,96 Kč bez DPH

a zároveň se snižuje o částku -648 273,67 Kč bez DPH

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 1 158 912,29 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 138 976 814,99 Kč

(slovy: stotřicetosmmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetčtrnáct korun českých a 99 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

IV.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty méněprací a víceprací.

V Praze dne _____

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2023.06.08 15:33:17
+02'00'

Městská část Praha 10

Bc. Jakub Brzoň

vedoucí odboru majetkoprávního

Objednatel

V Praze dne _____



pověřená osoba na základě pověření a
společenské smlouvy
Zhotovitel

Projekt : Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Rekapitulace změn

Organizační í:				Cena dle zák. SOD:				§222 ZZVZ				Maximální procenta				Maximální hodnota Změny				Vyčerpano				Zbývá				Datum aktualizace :				M.J.		06.09.2022	
Název zakázky:				Cena vč. dodatku:				odst. 4				15%				19 338 970				16 125 635				3 213 335											
Číslo zakázky:				Cena všech ZL				odst. 5				50%				64 463 233				6 689 398				57 773 835											
VŘ:				Cena všech ZL				odst. 6				50%				64 463 233				3 337 452				61 125 781											
T. dok. dle SOD				Cena všech ZL				odst. 5 a 6				30%				38 677 940				8 993 939				29 684 001											
T. dok. dle ZL				Cena všech ZL				odst. 7				30%				38 677 940				8 993 939				29 684 001											
																				</															

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL 023	
Datum předložení TLZ:			
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAIKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:		Narovnání VV v množství výstuže	
Žadatel změny:			
Popis změny a důvod - zhotovitel:		Změnový list řeší narovnání smluvního množství výstuže na skutečnost	
Vyjádření projektant:		V kóci zhotovitel po tomto korigovat není provedena dodatek a vka bez vka. ZL narovnání výstuže.	
Vyjádření TDI:			
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KO č.		
	Zápis v deníku změn PD č.		
	Dotčený objekt	SO 02.1 - ASŘ SO 03.1 - ASŘ SO 23.1 - ASŘ	
Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV		
	Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenová kalkulace :			
SO 02.1	přípočty		140 244,70
SO 02.1	odpočty		-5 681,40
SO 03.1	přípočty		85 286,94
SO 23.1	přípočty		508 612,68
SO 23.1	odpočty		-3 962,03
Celkem			724 500,89 Kč
Jméno	Datum	Podpis	Řešitel
Za objednavatele:	Eva Navrátilová, DiS.		
	Ing. Jakub Brzoň		
Za TDI			
Za projektanta			
Za zhotovitele			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 023 - ODPOČTY										
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část								
Objekt:		SO 02 - Pavilon A								
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ								
Místo:						Datum:				
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společnosti				Zpracovatel:				
PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem									-5 681,40	
	o	HSV	Práce a dodávky HSV						-5 681,40	
64	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505			t	-0,152	37 377,63	-5 681,40	SOD
	W		množství výztuže 130kg/m3							
	W		6,82*0,130				0,887			
	W		Součet				0,887			
	W		skutečné množství výztuže - schodišťové konstrukce							
	W		D.1.02.2.7_PAV A_HLAVNÍ SCH-VÝZ				0,309			
	W		D.1.02.2.8_PAV A_VEDLEJŠÍ SCH-VÝZ				0,426			
	W		CELKEM				0,735			
	W		ROZDÍL				-0,152			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 023 - PŘÍPOČTY									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ							
Místo:		Datum:							
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.		
Uchazeč:		GEOŠAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							140 244,70		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				130 046,77		
D	2		Zakládání				38 461,58		
7	K	272361821	Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	37 377,63	0,00	SOD	
	VV		množství výztuže 130kg/m3						
	VV		1,06*0,130		6,138				
	VV		Součet		6,138				
16	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	37 377,63	0,00	SOD	
	VV		příloha D.1.02.1.03						
	VV		množství výztuže 20kg/m3						
	VV		((21,025+0,175+0,10+(2,255+0,50+0,475+4,83+0,50+0,70)*2+21,025+0,10+0,175)/0,80)*0,02		0,978				
	VV		((6,425+0,30+0,175)*2+16,05+0,075+0,175)/0,80)*0,02		0,482				
	VV		((5,83+0,175*5+12,35+0,30+0,075)*2)/0,80)*0,02		0,622				
	VV		stěny vřáhové šachty - množství výztuže 130kg/m3						
	VV		1,615*0,130		0,210				
	VV		Součet		2,292				
NP			Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 a Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,029	37 377,63	38 461,58		
	VV		MNOŽSTVÍ DLE SMLOUVNÍHO VV - SOUČET MNOŽSTVÍ POLOŽEK 7 a 16		2,430				
	VV		skutečné množství příloha D.1.02.2.XX. Pavilon A - pudorys základů - výztuž		3,459				
	VV		ROZDÍL		1,029				
D	3		Švislé a kompletní konstrukce				8 933,25		
24	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,239	37 377,63	8 933,25	SOD	
	VV		množství výztuže 20kg/m2 - prolévané těmice vřáhové šachty						
	VV		54,215*0,02		1,084				
	VV		množství výztuže 20kg/m2 - prolévané těmice u schodiště						
	VV		3,889*0,02		0,077				
	VV		množství výztuže 20kg/m2 - spojovací lávka "A"						
	VV		7,072*0,02		0,141				
	VV		28,785*0,02		0,576				
	VV		smíšené množství součet		1,878				
	VV		skutečné množství výztuže - prolévané těmice u schodiště						
	VV		D.1.02.2.XX. PAV A. PILIR 1NP-VYZ		0,070				
	VV		skutečné množství výztuže - prolévané těmice vřáhové šachty						
	VV		D.1.02.2.xx. PAV A. VYTAH-VYZ		1,285				
	VV		skutečné množství výztuže - - spojovací lávka "A"						
	VV		D.1.02.2.14. PAV A. SPOJ LÁVKA-VYZ (položka č. 7 - stěny)		0,762				
	VV		skutečné množství součet		2,117				
	VV		ROZDÍL		0,239				
D	4		Vodorovné konstrukce				81 670,12		
56	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	37 377,63	0,00	SOD	
	VV		množství výztuže 130kg/m3						
	VV		příloha D.1.02.1.11						
	VV		spojovací lávka "B"						
	VV		8,84*2,0*0,20*0,130		0,460				
	VV		S4						
	VV		2,05*2,40*0,15*0,130		0,096				
	VV		příloha D.1.02.2.03						
	VV		dobetonářská stropní konstrukce						
	VV		2.NP						
	VV		2,56*2,05*0,15*0,130		0,102				
	VV		Součet		0,658				
62	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	37 377,63	0,00	SOD	
	VV		množství výztuže 130kg/m3						
	VV		30,512*0,130		3,967				
	VV		Součet		3,967				
	VV		MNOŽSTVÍ DLE SMLOUVNÍHO VV - SOUČET MNOŽSTVÍ POLOŽEK 56+62		4,625				
NP			Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 a Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505		2,185	37 377,63	81 670,12		
	VV		MNOŽSTVÍ DLE SMLOUVNÍHO VV - SOUČET MNOŽSTVÍ POLOŽEK 56+62		4,625				
	VV		skutečné množství výztuže - spojovací lávka "A"						
	VV		D.1.02.2.14. PAV A. SPOJ LÁVKA-VYZ (kromě položka č. 7 - stěny)		1,183				
	VV		skutečné množství výztuže - ztužující věnce						
	VV		D.1.02.2.4. PAV A. VENCE 1NP-VYZ		2,059				
	VV		D.1.02.2.5. PAV A. VENCE 2NP-VYZ		3,568				
	VV		skutečné množství součet		6,810				
	VV		ROZDÍL		2,185				
D	998		Přesun hmot				981,82		
148	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	3,301	297,43	981,82	SOD	
			ODEČTY		-0,152				
			PŘÍPOČTY		3,453				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				10 197,93		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	1 243,65	10 197,93		
			ODEČTY		-5 681,400				
			PŘÍPOČTY		130 046,770				

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 023 - PŘÍPOČTY									
Stavba: Vystavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část									
Objekt: SO 03 - Hospodářský pavilon									
Soupis: SO 03.1 - ASŘ									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel: ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant: D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							85 286,94		
d	HSV		Práce a dodávky HSV				78 823,45		
d	2		Zakládání				45 077,42		
14	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	37 377,63	0,00	SOD	
	VV		množství výztuže 130kg/m3						
	VV		0,882*0,130			0,115			
	VV		Součet			0,115			
22	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	37 377,63	0,00	SOD	
	VV		2lb základová zeď - množství výztuže 130kg/m3						
	VV		1,305*0,130			0,196			
	VV		základová zeď z prolévaných trámů - množství výztuže 20kg/m2						
	VV		83,372*0,020			1,667			
	VV		Součet			1,863			
NP			Výztuž základových kleneb betonářskou ocelí 10 505 a Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,206	37 377,63	45 077,42		
			MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET MNOŽSTVÍ POLOŽEK 7 a 16			1,978			
	VV		příloha D.1.03.2.10 Hospodářský pavilon - půdorys základů - výztuž			3,184			
	VV		ROZDÍL			1,206			
d	3		Svislé a kompletní konstrukce				6 802,73		
28	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,182	37 377,63	6 802,73	SOD	
	VV		příloha D.1.03.1.4.5						
	VV		výťahové šachty						
	VV		49,785*0,020			0,996			
	VV		smluvní množství součet			0,996			
			skutečné množství výztuže - prolévané trávice výťahové šachty						
			D.1.03.2.13_HOSPODAR_PAV_VYTAH-VYZ			1,178			
			ROZDÍL			0,182			
d	4		Vodorovné konstrukce				26 285,45		
57	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t		37 377,63	0,00	SOD	
	VV		množství výztuže 130kg/m3						
	VV		příloha D.1.03.1.6						
	VV		S4						
	VV		2,05*2,40*0,15*0,130						
	VV		příloha D.1.03.2.3						
	VV		dobetonávka stropu 2.NP						
	VV		2,05*2,05*0,15*0,130			0,082			
	VV		Součet			0,178			
61	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t		37 377,63	0,00	SOD	
	VV		množství výztuže 130kg/m3						
	VV		27,66*0,130			3,596			
	VV		Součet			3,596			
			MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET MNOŽSTVÍ POLOŽEK 57 a 61			3,774			
NP			Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 a Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505		0,685	37 377,63	25 603,68	SOD	
			MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET MNOŽSTVÍ POLOŽEK 56+62			3,774			
			D.1.03.2.11_HOSPODAR_PAV_1NP-VEENCE-VYZ			1,971			
			D.1.03.2.12_HOSPODAR_PAV_2NP-VEENCE-VYZ			2,489			
	VV		skutečné množství součet			4,459			
			ROZDÍL			0,685			
63	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	0,019	35 882,52	681,77	SOD	
	VV		množství výztuže 130kg/m3						
	VV		3,212*0,130			0,418			
	VV		Součet			0,418			
	VV		skutečné množství výztuže - schodišťové konstrukce						
	VV		D.1.03.2.14_HOSP_PAV_SCHODISTE-VYZ			0,437			
	VV		ROZDÍL			0,019			
d	998		Přesun hmot				657,85		
147	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2,212	297,40	657,85	SOD	
d	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				6 463,49		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	788,23	6 463,49		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 023 - ODPOČTY									
Stavba:									
Objekt:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Soupis:		SO 23 - Pavilon B							
		SO 23.1 - ASŘ							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 962,03		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-3 962,03		
	D	4	Vodorovné konstrukce				-3 962,03		
78	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	-0,106	37 377,63	-3 962,03		SOD
	W		množství výztuže 130kg/m3			1,283			
	W		9,872*0,130			1,283			
	W		Součet						
	W		skutečné množství výztuže - schodišťové konstrukce						
	W		D.1.23.2.14. PAV B_HLAVNI SCHOD-VYZ			0,334			
	W		D.1.23.2.15. PAV B_SCHODISTE 1.05-VYZ			0,422			
	W		D.1.23.2.16. PAV B_SCHODISTE 1.15-VYZ			0,422			
	W		ROZDIL			-0,106			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZL 023 - PŘÍPOČTY									
Stavba:									
Objekt:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Soupis:		SO 23 - Pavilon B							
		SO 23.1 - ASŘ							
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							508 612,68		
D	✓	HSV	Práce a dodávky HSV				470 369,85		
D	✓	2	Zakládání				68 401,06		
12	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	37 377,63	0,00	SOD	
	WV		množství výztuže 130kg/m3			0,131			
	WV		1,005*0,130			0,131			
	WV		Součet						
24	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,000	37 377,63	0,00	SOD	
	WV		příloha D.1.02.1.03						
	WV		množství výztuže 20kg/m3						
	WV		158,764*0,020			3,175			
	WV		stěny výtahové šachty - množství výztuže 130kg/m3						
	WV		1,606*0,130			0,209			
	WV		Součet			3,384			
NP			Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 a Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	1,830	37 377,63	68 401,06		
	WV		MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET POLOŽEK 12 a 24			3,515			
	WV		SKUTEČNOST						
	WV		příloha D.1.23.1.XX Pavilon B - půdorys základů - výztuž			5,345			
	WV		ROZDÍL			1,830			
D	✓	3	Svislé a kompletní konstrukce				74 119,84		
32	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,983	37 377,63	74 119,84	SOD	
	WV		množství výztuže 20kg/m2 - prolévané těmice výtahové šachty						
	WV		54,215*0,020			1,084			
	WV		množství výztuže 20kg/m2 - spojovací lávka "B"						
	WV		82,014*0,02			1,640			
	WV		24,54*0,02			0,491			
	WV		Součet			3,291			
	WV		smluvní množství součet			1,878			
	WV		skutečné množství výztuže - prolévané těmice výtahové šachty						
	WV		D.1.23.2.13_PAV B_VYTAH-VYZ			1,286			
	WV		skutečné množství výztuže - - spojovací lávka "B"						
	WV		D.1.23.2.09_PAV B_SPOJ LAVKA-VYZ (290ks položky 10)			2,575			
	WV		skutečné množství součet			3,861			
	WV		ROZDÍL			1,983			
D	✓	4	Vodorovné konstrukce				324 138,81		
72	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,000		0,00	SOD	
	WV		množství výztuže 130kg/m3						
	WV		příloha D.1.2.3.1.6						
	WV		spojovací lávka "B"						
	WV		30,675*2,0*0,20*0,130			1,595			
	WV		S4						
	WV		2,05*2,40*0,15*0,130			0,096			
	WV		příloha D.1.23.2.02.03						
	WV		dobetonážka panelového stropu						
	WV		(0,495*5,16*0,25+0,435*9,40*0,25)*0,130 "D1			0,202			
	WV		(0,13*8,45*0,25+2,32*2,05*0,15)*0,130 "D2			0,128			
	WV		Součet			2,021			
76	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,000		0,00	SOD	
	WV		množství výztuže 130kg/m3				4,163		
	WV		32,026*0,130				4,163		
	WV		Součet						
NP			Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 a Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505		8,672	37 377,63	324 138,81	SOD	
			MNOŽSTVÍ DLE SMLUVNÍHO VV - SOUČET POLOŽEK 72+76			6,184			
	WV		skutečné množství výztuže - spojovací lávka "B"						
	WV		D.1.23.2.09_PAV B_SPOJ LAVKA-VYZ (kromě 290ks položky 10)			5,298			
	WV		skutečné množství výztuže - ztužující věnce						
	WV		D.1.23.2.11.1_PAV B_VENCE 1NP-VYZ			3,931			
	WV		D.1.23.2.12.1_PAV B_VENCE 2NP-VYZ			5,627			
	WV		skutečné množství součet			14,856			
	WV		ROZDÍL			8,672			
D	✓	998	Přesun hmot				3 710,14		
162	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	12,474	297,43	3 710,14	SOD	
			ODEČTY		-0,011				
			PŘÍPOČTY		12,485				
D	✓	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				38 242,83		
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	4 663,76	38 242,83		
			ODEČTY		-3 962,030				
			PŘÍPOČTY		470 369,850				

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL 30	
Datum předložení TLZ:			
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	fasády		
Žadatel změny:	inv		
Popis změny a důvod - zhotovitel:	ZL řeší: - změnu provedení podhledu lávek A a B z provětrávané fasády na kontaktní zateplení - doplnění schůzejících položek ve VV: - dodávka a montáž základací lišty na objektu SO 03 - příplatek k opravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě na objektu SO 23 - kontaktního zateplení podhledu ve vstupu do objektu SO 23 - povrchové úpravy stěn u vstupu do objektu SO 23		
Vyjádření projektant:			
Vyjádření TDI:			
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt	SO 02, SO 03, SO 23	
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	Cenová kalkulace : SO 02 odečty -111 458,64 SO 02 přípočty 8 344,32 SO 03 přípočty 59 686,01 SO 23 odečty -517 781,47 SO 23 přípočty 158 844,32 Celkem - 402 363,46 Kč
	Jméno	Datum	Podpis
	Eva Navrátilová, DiS		
Za objednavatele	Bc. Jakub Brzoň		
Za TDI			
Za projektanta			
Za zhotovitele			


ZL 30 - položkový rozpočet méněpráce									
Stavba:									
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část									
Objekt:									
SO 02 - Pavilon A									
Soupis:									
SO 02.1 - ASŘ									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:									
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant:									
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč:									
GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-111 456,64		
	o	HSV	Práce a dodávky HSV				-103 640,24		
	o	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-103 614,07		
89	K	6222730R1	D+M opláštění obou stěn a spodního líce pod podlahou spojovací lávky A z fasádních desek cementovláknitých nehořlavých (ref. výrobek Cembrit rady PLANK) - 25/7	m2	-16,960	6 109,32	-103 614,07	SOD	
	W		přiloha D1,02.1.11						
	W		spojovací krček "A"						
	W		obkladové lamely s dekorem dřeva š. 180 mm, tl. 8mm, osazené svisle na Al obousměrném roštu zvýšeném o tloušťku tepelné izolace minerální 180 mm						
	W		hliníkový rošt bude tvořen profily T a rozpěrnými kotvami a s distančními profily na vzdálenost 180 mm od betonové nosné konstrukce						
	W		horní i spodní líc opláštění tvoří vlnovku – je nutno počítat s vyššími prořezy a složitější montáží						
	W		opláštění bude ve třech barevných odstínech - např. CP 080c Basalt grey, CP370 Oxide red a CP 999 Přírodní šedá v poměru cca 20:20:60						
	W		cena opláštění včetně spojovacího materiálu, tlačených nýtů a nástru na řezné hrany, EPDM pásky, balného a dopravy						
	W		podhled						
	W		2*8,48			16,960			
	W		Součet			35,960			
	d	998	Přesun hmot				-26,17		
148	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	-0,088	297,43	-26,17	SOD	
	d	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-7 816,40		
9	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	-953,22	-7 816,40		
			ODEČTY			-103 666,410			
			PŘÍPOČTY			8 344,320			

ZL 30 - položkový rozpočet vícepráce									
Stavba:									
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část									
Objekt:									
SO 02 - Pavilon A									
Soupis:									
SO 02.1 - ASŘ									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:									
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant:									
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč:									
GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							8 344,32		
	d	HSV	Práce a dodávky HSV				8 344,32		
	d	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				8 344,32		
NP 1	K	6221531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších podhledů	m2	16,960	492,00	8 344,32	CS ÚRS 2023 01	
			2*8,48			16,960			
			Součet			16,960			

ZL 30 - položkový rozpočet vícepráce									
Stavba:									
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část									
Objekt:									
SO 03 - Hospodářský pavilon									
Soupis:									
SO 03.1 - ASŘ									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:									
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant:									
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč:									
GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							59 686,01		
	d	HSV	Práce a dodávky HSV				55 162,64		
	d	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				55 132,90		
NP 1	K	622252001	Montáž základních soklových lišt kontaktního zateplení	m	145,885	242,67	35 401,91	SOD (SO 02)	
	W		3,405+1,10+38,195+1,1+3,38+4,83+0,6+1,0+1,25+7,175+15,925+0,55+5,75*2+3,56*2+1,0*2+3,56*2+8,305+15,925+0,55+7,175+1,2			145,885			
	W		5+4,83+1,0+0,60			145,885			
	W		Součet			145,885			
NP 2	M	59051653	lišta soklová Al s okapnicovou základací U 16cm 0,95/200cm	m	153,179	128,81	19 730,99	SOD (SO 02)	
	W		145,885*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			153,179			
	d	998	Přesun hmot				29,74		
147	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,100	297,40	29,74	SOD	
	d	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 523,37		
9	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	551,63	4 523,37		

ZL 30 - položkový rozpočet méněpráce									
Stavba:									
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část									
Objekt:									
SO 23 - Pavilon B									
Soupis:									
SO 23.1 - ASŘ									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:									
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant:									
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč:									
GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							-517 781,47		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				-490 564,93		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-490 564,93		
102	K	6222730R1	D+M opláštění obou stěn a spodního lce pod podlahou spojovací lávky B z fasádních desek cementovláknitých nehořlavých (ref. výrobek Cembrit řady PLANK)- 33/T	m2	-79,810	6 146,66	-490 564,93	SOD	
	W		příloha D1.23.1.10						
	W		spojovací kotvek "B"						
	W		obkladové lamely s dekorem dřeva š. 180 mm, tl. 8mm, osazené svisle na Al obousměrném roštu zvýšeném o tloušťku tepelné izolace minerální 180 mm						
	W		hliníkový rošt bude tvořen profily T a rozpěrnými kotvami a s distančními profily na vzdálenost 180 mm od betonové nosné konstrukce						
	W		horní i spodní lic opláštění tvoří vinouku – je nutno počítat s vyššími prořezy a složitější montáží						
	W		oplaštění bude ve třech barevných odstínech - např. CP 080c Basalt grey, CP370 Oxide red a CP 999 Přírodní šedá v poměru cca 20:20:60						
	W		cena opláštění včetně spojovacího materiálu, trhacích nýtů a náletů na fezné hrany, EPDM pásky, balného a dopravy						
	W		podhled						
	W		část fasády u terénu						
	W		(14,3*1,2)/2+3*1,8		13,980				
	W		část fasády v úchodu do SO23						
	W		2,8*(1,5+2,1)/2		5,040				
	W		2*30,395		60,790				
	W		Součet		79,810				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-27 216,54		
9	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	-3 319,09	-27 216,54		
			ODEČTY		-490 564,930				
			PŘÍPOČTY		158 844,320				

ZL 30 - položkový rozpočet vícepráce									
Stavba:									
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část									
Objekt:									
SO 23 - Pavilon B									
Soupis:									
SO 23.1 - ASŘ									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:									
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant:									
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč:									
GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							158 844,32		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				158 844,32		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				158 656,05		
NP 1	K	621531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2.0 mm vnějších podhledů	m2	89,572	492,00	44 069,42	CS ÚRS 2023 01	
	W		podhled lávka						
	W		2*30,395		60,790				
	W		podhled vstup do objektu						
	W		8,2*3,51		28,782				
	W		Součet		89,572				
86	K	621221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	28,782	1 349,04	38 828,07	SOD	
	W		podhled vstup do objektu						
	W		8,2*3,51		28,782				
	W		Součet		28,782				
87	M	63151539	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036-0,037$ tl 180mm	m2	29,358	434,73	12 762,80	SOD	
	W		28,782*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		29,358				
NP 2	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	21,762	310,00	6 746,22	CS ÚRS 2023 01	
	W		boční stěny u vstupu do objektu						
	W		(3,335+0,175)*3,1*2		21,762				
	W		Součet		21,762				
NP 3	K	622142001	Potazení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	21,762	254,00	5 527,55	CS ÚRS 2023 01	
	W		boční stěny u vstupu do objektu						
	W		(3,335+0,175)*3,1*2		21,762				
	W		Součet		21,762				
103	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	4,002	656,70	2 628,11	SOD (SO 23)	
	W		boční stěny u vstupu do objektu						
	W		(3,335)*0,6*2		4,002				
	W		Součet		4,002				
104	K	622531021	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2.0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	15,341	430,13	6 598,62	SOD (SO 23)	
	W		boční stěny u vstupu do objektu						
	W		(3,335)*(2,9+0,6)*2		15,341				
	W		Součet		15,341				
NP 4	K	629999011	Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě	m	211,000	196,66	41 495,26	SOD (SO 02)	
	W		příloha D.1.23.1.11						
	W		pohled jižní						
	W		(0,7+2,8)*2*3		21,000				
	W		(0,9+0,9)*2*3		10,800				
	W		(0,7+0,7)*2*1		2,800				
	W		(1,9+1,0)*2*1		4,000				
	W		(1,6+0,8)*2*1		4,800				
	W		(0,7+1,9)*2*2		10,400				
	W		pohled východní						
	W		(0,7+2,8)*2*4		28,000				
	W		(0,9+0,9)*2*3		10,800				
	W		(0,7+1,9)*2*2		10,400				
	W		pohled západní						
	W		(0,7+2,8)*2*1		7,000				
	W		(0,7+1,9)*2*2		10,400				
	W		(0,9+0,9)*2*5		18,000				
	W		pohled severní						
	W		(0,7+2,8)*2*5		35,000				
	W		(0,9+0,9)*2*9		32,400				
	W		(0,7+1,9)*2*1		5,200				
	W		Součet		211,000				
	D	998	Přesun hmot				188,27		
162	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,633	297,43	188,27	SOD	

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL 31	
Datum předložení TLZ:		19.01.2023	
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	Altán - ELEKTRO		
Žadatel změny:	INV viz zápis KD bod 49/6		
Popis změny a důvod - zhotovitel:	ZL řeší: přivedení SP elektro do zahradního altánu		
Vyjádření projektant:			
Vyjádření TDI:			
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt		SO 19 - Altán
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	
		Cenová kalkulace :	
		SO 19 přípočty	60 364,18
		Celkem	60 364,18 Kč
	Jméno	Datum	Podpis
Za objednatele:	Eva Navrátilová, DiS		
Za TDI:			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

ZL 31 - položkový rozpočet vícepráce									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 19 - Altán - silnoproud							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							60 364,18		
0	M	034	1-CYKY-J 5x2,5mm ² Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	70,000	43,26	3 028,20		smluvní (SO 02.6)
0	M	032	1-CYKY-J 5x6mm ² Celoplastový vícežilový kabel, měděné jádro, PVC izolace žil a pláště, barva izolace jednotlivých žil hnědá, šedá, černá, modrá, zelenožlutá	m	70,000	87,66	6 136,20		smluvní (SO 02.6)
NP 01			v655 - ZSF40002000.1 /3952 Zás.skrín IP44 jistěná s chráničem 40/4/003 + Zámek 3900 pro Acqua, AcquaCOMBI, AcquaPLUS https://www.eshop.famatel.cz/v655-zsf40002000-1-3952-zas-skrin-ip44-jistena-s-chranicem-40-4-003 https://www.eshop.famatel.cz/zamek-3900-pro-acqua-a-acqua-combi	kpl	1,000	6 774,44	6 774,44		
0	M	009	OHEBNÁ DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ CHRÁNIČKA PRŮMĚRU 110 Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, vnější průměr 110mm, zaveden zatahovací drát nebo provázek, IP67, zatížení větší než 450N/20cm, -45 - +60°C	m	140,000	87,96	12 314,40		smluvní (SO 13)
NP 02			VÝKOP PRO KABELY ŠÍŘKY 40cm, HLOUBKY 60cm Výkop ve volném terénu šířky 400mm, hloubky 600mm, vč. pískového lože pro kabely, položení kabelů, zapiskování, uložení výstražné fólie, záhozu a hutnění terénu, komplet	m	50,000	380,00	19 000,00		
0	M	024	ZKOUŠKY A REVIZE Revize rozvaděčů, revize elektroinstalace, revize hromosvodu a uzemnění, protokoly o shodě, certifikáty, atd.	hod.	1,000	536,24	536,24		smluvní (SO 13)
NP 03			Úprava a doplnění rozvodnice v objektu SO 03	kpl	1,000	1 200,00	1 200,00		
NP 04			MONTÁŽ Montáž všech prvků na přístrojů	ks	1,000	6 800,00	6 800,00		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 574,70		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	557,89	4 574,70		

Technický list změny (TLZ) č.:		32																									
Datum předložení TLZ:		11.10.2022																									
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV																									
Ze dne:																											
Projekt registrační číslo:																											
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10																										
Objekt:																											
Název změny:		Změna vodovodní přípojky a vodoměr																									
Žadatel změny:		GD																									
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Změnový list obsahuje uvedení požadavků PVK na vodovodní přípojku do souladu s projektem. Bylo nutné realizovat přípojovací potrubí v materiálu litina místo PE. Místo projektovaného odmontování původního vodoměru a namontování zpět na novou vodovodní přípojku, bylo nutné vodoměr osadit nový s dálkovým odečtem a to v profilu DN40 místo původního DN50. Profilová změna vodoměru znamenala mimo jiné také úpravu vystrojení vodoměrné sestavy. Požadavek TSK na zvláštní plochu opravovaných/nových asfaltových povrchů (viz ZL 024) znamenal také navíc 3 zátěžové zkoušky nad původně standardně určenou úroveň.																										
Vyřádění projektant:																											
Vyřádění TDI:																											
Vyřádění GI:																											
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt	SO 07.3																									
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná																										
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO																									
Orientační cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	Cenová kalkulace : přípočty 139 773,17 odpočty -9 392,13 130 381,04 Kč																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jméno</th> <th>Datum</th> <th>Podepis</th> <th>Razítko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EVA NAVRATILLOVA</td> <td>15.12.2022</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za objednavatele:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za TDI:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za projektanta:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Za zhotovitele:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Jméno	Datum	Podepis	Razítko	EVA NAVRATILLOVA	15.12.2022			Za objednavatele:				Za TDI:				Za projektanta:				Za zhotovitele:			
Jméno	Datum	Podepis	Razítko																								
EVA NAVRATILLOVA	15.12.2022																										
Za objednavatele:																											
Za TDI:																											
Za projektanta:																											
Za zhotovitele:																											

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL032 - Změna vodovodní připojení a vodoměr

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Př.	Typ	Kód	Popis	M.	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 381,04

D	HSV	Práce a dodávky HSV					93 854,13	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	8	Trubní vedení					77 759,68	
---	---	---------------	--	--	--	--	-----------	--

1	K	851241131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 80	m	17,000	149,00	2 533,00	CS ÚRS 2022 01
2	M	55253015	trouba vodovodní litinová hrdlová dl 6m DN 80	m	18,000	3 350,00	60 300,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	857242122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	4,000	1 340,00	5 360,00	CS ÚRS 2022 01
4	M	55291029	kroužek těsnící gumový TYTON-SIT-PLUS DN 80 pro vodovodní potrubí	kus	3,000	3 040,00	9 120,00	CS ÚRS 2022 01
5	M	55253238.1	synoflex trouba přírubová litinová vodovodní PN10/16 DN 80 dl 350mm	kus	1,000	9 110,00	9 110,00	
6	K	871241211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 90 x 8,2 mm	m	-17,000	82,46	-1 401,82	SOD
7	M	28613530	potrubí třívrstvé PE100 RC SDR11 90x8,2 dl 12m	m	-17,000	359,40	-6 109,80	SOD
8	K	877241113	Montáž elektro T-kusů na vodovodním potrubí z PE trub d 90	kus	-3,000	161,93	-485,79	SOD
9	M	28615974	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 90mm	kus	-3,000	221,97	-665,91	SOD

D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					15 750,00	
---	---	-------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	91	Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch					15 750,00	
---	----	--	--	--	--	--	-----------	--

10	K	910.001	Statické zátěžové zkoušky	kpl	3,000	5 250,00	15 750,00	
----	---	---------	---------------------------	-----	-------	----------	-----------	--

D	997	Přesun sutě					54,69	
---	-----	-------------	--	--	--	--	-------	--

11	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	0,059	118,80	7,01	SOD
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,826	47,84	39,52	SoD
VV 0,059*14 "Přepočtené koeficientem množství"					0,826			
13	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	0,059	138,35	8,16	SOD

D	998	Přesun hmot					289,76	
---	-----	-------------	--	--	--	--	--------	--

14	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,338	617,71	208,79	SOD
15	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	0,338	239,56	80,97	SOD

D	PSV	Práce a dodávky PSV					26 645,91	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					26 645,91	
---	-----	----------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

16	K	722260902	Zpětná montáž vodoměrů přírubových do DN 50	kus	-1,000	728,81	-728,81	SOD
17	K	722260902.1	Oprava a úprava vstrojení vodoměrné sestavy pro osazení nového vodoměru z DN 50 na DN 40	kus	1,000	9 840,00	9 840,00	
18	K	722261902	Výměna přírubových vodoměrů DN do 50	kus	1,000	1 340,00	1 340,00	CS ÚRS 2022 01
19	M	55253682	příruba zaslepovací z tvárné litiny práškový epoxid tl 250µm XG DN do 65 závit 6/4"	kus	2,000	3 560,00	7 120,00	CS ÚRS 2022 01
20	M	31942626.1	prodloužení 6/4"	kus	1,000	845,00	845,00	
21	M	31940005	šroubení mosazné k vodoměrům 6/4"	sada	1,000	894,00	894,00	CS ÚRS 2022 01
22	K	722262151.1	D+M prvotní osazení vodoměr přírubový šroubový do 40°C DN do 50 s dálkovým ovládním, přednostní samostatný výjezd	kus	1,000	7 300,00	7 300,00	
23	K	998722103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,023	940,65	21,63	SOD
24	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,023	612,45	14,09	SOD

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					9 881,00	
---	-----	-----------------------------	--	--	--	--	----------	--

25	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	1 205,00	9 881,00	
----	---	-----	-------------------------------------	---	-------	----------	----------	--

Technický list změny (TLZ) č.:	33
Datum předložení TLZ:	20.10.2022

SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:		
Projekt registrační číslo:		
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10	
Objekt:		

Název změny:	Vnitřní omítky
---------------------	----------------

Žadatel změny:	GD
-----------------------	----

Popis změny a důvod - zhotovitel:	Změnový list obsahuje dopočítané plochy omítek na výšku 10 cm nad úroveň podhledů a v ploše styku s podlahou, které je nutné realizovat.
--	--

Vyjádření projektant:	V PD bylo počítáno s omítkami na výšku podhledu, Bohužel tyto práce nejsou součástí, vč. z tohoto důvodu, bylo nutné dopočítat omítky v CO keštemením kotlených želez.
------------------------------	--

Vyjádření TDI:	
-----------------------	--

Vyjádření GI:	
----------------------	--

Odkazy :	Zápis z KD č.	
	Zápis v deníku změn PD č.	
	Dotčený objekt	SO 02.1, 03.1, 23.1

Přílohy:	PD - schéma/podklady	
	ZL kalkulace - podrobná s VV	
	Jiná	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO
	s dopadem	

Orientační cenový dopad:	bez dopadu	ANO	Cenová kalkulace :	
	s dopadem		přípočty SO 02.1	54 257,89
			přípočty SO 03.1	39 129,35
			přípočty SO 23.1	132 964,64
			odpočty	0,00
				226 351,88 Kč

Jméno	Datum	Podpis	Razítka
Za objednavatele:			
Za TDI			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL033 - Vnitřní omítky

Soupis:

ZL033a - Vnitřní omítky SO 02.1

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

P.č.	Typ	Kód	Popis	Mj	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 257,89	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				50 145,92	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				49 245,60	
1	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	164,690	299,02	49 245,60	SOD
	WV		*objekt SO 02.1					
	WV		164,69		164,690			
D		998	Přesun hmot				900,32	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	3,027	297,43	900,32	SoD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 111,97	
3	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	501,46	4 111,97	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

ZL033 - Vnitřní omítky

Soupis:

ZL033b - Vnitřní omítky SO 03.1

Místo:

Datum:

#ODKAZI

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

P.č.	Typ	Kód	Popis	Mj.	Množství	J.cena [CZK ¹]	Cena celkem [CZK ¹]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								39 129,35
D		HSV	Práce a dodávky HSV				36 163,90	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				35 514,61	
1	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	118,770	299,02	35 514,61	SOD
	WV		*objekt SO 03.1					
	WV		118,77		118,770			
D		998	Přesun hmot				649,29	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	2,183	297,43	649,29	SoD
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 965,45	
3	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	361,64	2 965,45	SoD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: [#ODKAZ](#)

Objekt: ZL033 - Vnitřní omítky

Soupis: ZL033c - Vnitřní omítky SO 23.1

Místo:

Datum: [#ODKAZ](#)

Zadavatel: Městská část Praha 10

Projektant: D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel: VISTORIA CZ a.s.

Př.	Typ	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							132 964,64	
D HSV Práce a dodávky HSV							122 887,82	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							120 681,48	
1	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	403,590	299,02	120 681,48	SOD
		WV	*objekt SO 23.1					
		WV	403,59					
D 998 Přesun hmot							2 206,34	
2	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	7,418	297,43	2 206,34	SoD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 076,82	
3	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	1 228,88	10 076,82	SoD

Technický list změny (TLZ) č.:	34
Datum předložení TLZ:	18.01.2022

SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV
Ze dne:		
Projekt registrační číslo:		
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10	
Objekt:		

Název změny:	Povlakové podlahy
---------------------	-------------------

Žadatel změny:	GD
-----------------------	----

Popis změny a důvod - zhotovitel:	Změnový list obsahuje narovnání výměr položek smluvního výkazu a příplatek za výběr vsívaného koberce se stříženým vláskem.
--	---

Vyjádření projektant:	
------------------------------	--

Vyjádření TDI:	
-----------------------	--

Vyjádření GI:	
----------------------	--

Odkazy :	Zápis z KD č.	
	Zápis v deníku změn PD č.	
	Dotčený objekt	SO 02.1, 03.1, 23.1

Přílohy:	PD - schéma/podklady	
	ZL kalkulace - podrobná s VV	
	Jiná	

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	ANO
	s dopadem	

Orientační cenový dopad:	bez dopadu	ANO	Cenová kalkulace :	
	s dopadem		přípočty SO 02.1	73 065,95
			přípočty SO 03.1	10 165,69
			přípočty SO 23.1	156 871,97
			odpočty	0,00
				240 103,61 Kč

	Jméno	Datum	Podpis	Státní znak
Za objednavatele:	Eva Navrátilová, DiS			
Za TDI				
Za projektanta:				
Za zhotovitele:				

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 32107

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

IČ:

00063941

DIČ:

CZ00063941

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

IČ:

28169522

DIČ:

CZ28169522

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

IČ:

26760312

DIČ:

CZ26760312

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

IČ:

25110977

DIČ:

CZ25110977

Poznámka:

Cena bez DPH

240 103,61

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	240 103,61	50 421,76
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

290 525,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 32107

Stavba: Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Místo:

Datum:

2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		240 103,61	290 525,37
ZL034	Povlakové podlahy	240 103,61	290 525,37
ZL034a	Povlakové podlahy SO 02.1	73 065,95	88 409,80
ZL034b	Povlakové podlahy SO 03.1	10 165,69	12 300,48
ZL034c	Povlakové podlahy SO 23.1	156 871,97	189 815,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL034 - Povlakové podlahy

Soupis:

ZL034a - Povlakové podlahy SO 02.1

Místo:

Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Př.	Typ	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 065,95	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				67 528,57	
D	776		Podlahy povlakové				67 528,57	
1	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	0,000	184,82	0,00	SOD
	W		*realizace					
	W		56,10*2		112,200			
	W		*odpočet VV					
	W		112,2		-112,200			
	W		Součet		0,000			
2	M	69751060R	koberec zátěžový	m2	16,830	355,60	5 984,75	SOD
	W		*realizace					
	W		56,10*2*1,25		140,250			
	W		*odpočet VV					
	W		-123,42		-123,420			
	W		Součet		16,830			
3	M	697510.R	Příplatek za koberec v materiálovém a barevném provedení dle požadavku uživatele a investora	m2	140,250	285,00	39 971,25	
4	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	0,000	192,98	0,00	SOD
	W		*realizace					
	W		59,80+26,5+4,8+59,80+26,5+4,8+6,4+14,9		203,500			
	W		*odpočet VV					
	W		-203,5		-203,500			
	W		Součet		0,000			
5	M	2841211R	PVC vinylová akustická podlahovina s kročejovým útlumem 15dB tl. 34 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm	m2	30,525	570,21	17 405,66	SOD
	W		*realizace					
	W		(59,80+26,5+4,8+59,80+26,5+4,8+6,4+14,9)*1,25		254,375			
	W		*odpočet VV					
	W		-223,85		-223,850			
	W		Součet		30,525			
6	K	7764211R1	D+M soklová lišta vinyl h=57mm	m	15,260	127,54	1 946,26	SOD
	W		*realizace					
	W		22,98+18,69+7,62+22,98+18,69+7,62+9,38+18,3		126,260			
	W		*odpočet VV					
	W		-111		-111,000			
	W		Součet		15,260			
7	K	7764211R2	D+M soklová lišta koberec h=55mm	m	3,600	70,50	253,80	SOD
	W		*realizace					
	W		22,3*2		44,600			
	W		*odpočet VV					
	W		-41		-41,000			
	W		Součet		3,600			
8	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	655,617	3,00	1 966,85	SOD
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				5 537,38	
9	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	675,29	5 537,38	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL034 - Povlakové podlahy

Soupis:

ZL034b - Povlakové podlahy SO 03.1

Místo:

Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:

VISTORIA CZ a.s.

Př.	Typ	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 165,69	
D PSV Práce a dodávky PSV							9 395,30	
D 776 Podlahy povlakové							9 395,30	
1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	16,900	9,20	155,48	SOD
	W		*realizace					
	W		83,58		83,580			
	W		*odpočet VV					
	W		-66,68		-66,680			
	W		Součet		16,900			
2	K	776141112	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	16,900	71,77	1 212,91	SOD
	W		*realizace					
	W		83,58		83,580			
	W		*odpočet VV					
	W		-66,68		-66,680			
	W		Součet		16,900			
3	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	0,000	192,98	0,00	SOD
	W		*realizace					
	W		8,30+16,90+11,0+7,20+5,78+10,3+8,7+15,40		83,580			
	W		*odpočet VV					
	W		-83,58		-83,580			
	W		Součet		0,000			
4	M	2841211R	PVC vinylová akustická podlahovina s kročejovým útlumem 15dB tl. 34 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm	m2	12,537	570,21	7 148,72	SOD
	W		*realizace					
	W		83,58*1,25		104,475			
	W		*odpočet VV					
	W		-91,938		-91,938			
	W		Součet		12,537			
5	K	7764211R1	D+M soklová lišta vinyl h=57mm	m	4,740	127,54	604,54	SOD
	W		*realizace					
	W		10,74+9,17+8,98+12,14+10,44+14,2+16,1+12,47		94,240			
	W		*odpočet VV					
	W		-89,5		-89,500			
	W		Součet		4,740			
6	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	91,217	3,00	273,65	SOD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							770,39	
7	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	93,95	770,39	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10

Objekt:

ZL034 - Povlakové podlahy

Soupis:

ZL034c - Povlakové podlahy SO 23.1

Místo:

Datum: 2. 9. 2021

Zadavatel:

Městská část Praha 10

Projektant:

D-PLUS
PROJEKTOVÁ A
INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel:

GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská

Zpracovatel:


VISTORIA CZ a.s.

Př.	Typ	Kód	Popis	M	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							156 871,97	
D PSV Práce a dodávky PSV							144 983,36	
D 776 Podlahy povlakové							144 983,36	
1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	112,700	9,20	1 036,84	SOD
	VV		*realizace					
	VV		224,4+409,94		634,340			
	VV		*odpočet VV					
	VV		-521,64		-521,640			
	VV		Součet		112,700			
2	K	776141112	Vyrovnnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	112,700	71,77	8 088,48	SOD
	VV		*realizace					
	VV		224,4+409,94		634,340			
	VV		*odpočet VV					
	VV		-521,64		-521,640			
	VV		Součet		112,700			
3	K	776211111	Lepení textilních pásů	m2	0,000	184,82	0,00	SOD
	VV		*realizace					
	VV		56,1*4		224,400			
	VV		*odpočet VV					
	VV		-224,4		-224,400			
	VV		Součet		0,000			
4	M	69751060R	koberec zátěžový	m2	33,660	355,60	11 969,50	SOD
	VV		*realizace					
	VV		224,4*1,25		280,500			
	VV		*odpočet VV					
	VV		-246,84		-246,840			
	VV		Součet		33,660			
5	M	697510.R	Příplatek za koberec v materiálovém a barevném provedení dle požadavku uživatele a investora	m2	280,500	285,00	79 942,50	
6	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	0,000	192,98	0,00	SOD
	VV		*realizace					
	VV		59,60+22,30+5,40+22,30+59,60*2+22,30+5,40+22,30+59,60		409,940			
	VV		+16,77+5,59+49,18					
	VV		*odpočet VV					
	VV		-409,94		-409,940			
	VV		Součet		0,000			
7	M	2841211R	PVC vinylová akustická podlahovina s kročejovým útlumem 15dB tl. 34 mm, nášlapná vrstva 0,67 mm	m2	61,491	570,21	35 062,78	SOD
	VV		*realizace					
	VV		409,94*1,25		512,425			
	VV		*odpočet VV					
	VV		-450,934		-450,934			
	VV		Součet		61,491			
8	K	7764211R1	D+M soklová lišta vinyl h=57mm	m	32,340	127,54	4 124,64	SOD
	VV		*realizace					
	VV		7+65+16,7*4+22,88*4+18,5+8,66*2		266,140			
	VV		*odpočet VV					
	VV		-233,8		-233,800			
	VV		Součet		32,340			
9	K	7764211R2	D+M soklová lišta koberec h=55mm	m	7,600	70,50	535,80	SOD
	VV		*realizace					
	VV		22,4*4		89,600			
	VV		*odpočet VV					
	VV		-82		-82,000			
	VV		Součet		7,600			
10	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 407,605	3,00	4 222,82	SOD
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							11 888,61	
11	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	1 449,83	11 888,61	

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL 35	
Datum předložení TLZ:			
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	Spárování dlažby epoxidem		
Žadatel změny:	investor		
Popis změny a důvod - zhotovitel:	ZL řeší: příplatek za provedení spárování dlažby v m.č. 2.09 Kuchyní epoxidovou spárovací hmotou		
Vyjádření projektant:			
Vyjádření TDI:			
Vyjádření GI:			
Odkazy:	Zápis z KD č.	KD 57/1	
	Zápis v deníku změn PD č.		
	Dotčený objekt	SO 03	
Přílohy:	PD - schéma/podklady		
	ZL kalkulace - podrobná s VV		
	Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	
		Cenová kalkulace:	
		SO 03 přípočty	34 406,21
		Celkem	34 406,21 Kč
Jméno		Datum	
Eva Navrátilová, DiS.			
Za objednatele:			
Za TDI:			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			




POLOŽKOVÝ ROZPOČET - ZL 35									
Stavba:									
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část									
Objekt:									
SO 03 - Hospodářský pavilon									
Soupis:									
SO 03.1 - ASŘ									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:									
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant:									
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč:									
GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							34 406,21		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				31 798,69		
	D	771	Podlahy z dlaždic				31 798,69		
NP 1			Příplatek za spárování keramické dlažby do 12 ks/m2 epoxidovou spárovací hmotou	m2	58,250	530,00	30 872,50		
			m.č. 2.09 Kuchyň		58,250				
286	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	3,000	308,73	926,19		SOD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 607,52		
3	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	317,99	2 607,52		SoD

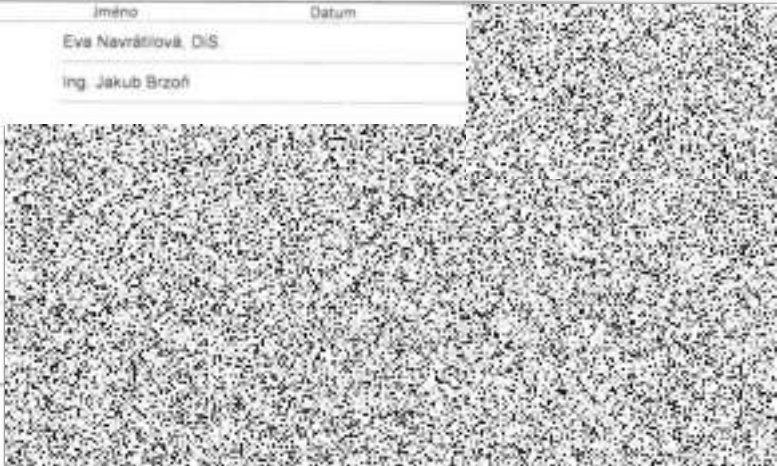Technický list změny (TLZ) č.:		ZL 41	
Datum předložení TLZ:			
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAJKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	HSV železobetonové monolitické konstrukce		
Žadatel změny:			
Popis změny a důvod - zhotovitel:	ZL řeší: - SO 23: doplnění scházejících položek VV: podkladní mazanina základových patek a monolitické sloupky vynášejících lavku B - SO 03: změna základových konstrukcí objektu - doplnění prohlubně ve výměňkové stanici - SO 03: řešení napojení stěny výtahové šachty na základový pás vlepením armatury - SO 02, SO 03, SO 23: řešení napojení podkladní mazaniny na stěny výtahové šachty přes vlepenou výztuž		
Vyjádření projektant:			
Vyjádření TDI:			
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt	SO02, SO 03, SO 23	
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	Cenová kalkulace : SO 02.1 přípočty 6 855,55 Kč SO 03.1 přípočty 42 550,36 Kč SO 23.1 přípočty 66 085,10 Kč Celkem 115 491,01 Kč
Jméno Datum Eva Navrátilová, DiS. Ing. Jakub Brzob			
Za objednatele:			
Za TDI:			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

ROZPOČET VÍCEPRACÍ									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 02 - Pavilon A							
Soupis:		SO 02.1 - ASŘ							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							6 855,55		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 336,00		
	D	2	Zakládání				6 336,00		
NP1	K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru (2,6+2+2,6)0,3*0,2	m	4,800	1 320,00	6 336,00		CS ÚRS 2022 01
					4,8				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				519,55		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	63,36	519,55		

ROZPOČET VÍCEPRACÍ									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část							
Objekt:		SO 03 - Hospodářský pavilon							
Soupis:		SO 03.1 - ASŘ							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENYRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							42 550,36		
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				39 325,63		
	D	2	Zakládání				37 386,86		
11	K	273321611	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	0,512	5 175,36	2 649,78		SOD
	W		příloha D.1.03.2.09						
	W		prohlubeň						
	W		1,6*1,6*0,20		0,512				
	W		Součet		0,512				
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,280	690,05	883,26		SOD
	W		příloha D.1.03.2.09						
	W		prohlubeň						
	W		(1,6+1,6)*2*0,20		1,280				
	W		Součet		1,280				
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,280	207,01	264,97		SOD
14	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,000	37 377,63	0,00		SOD
	W		řešeno v samostatném ZL						
19	K	279321347	Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,792	4 600,32	8 243,77		SOD
	W		příloha D.1.03.2.09						
	W		prohlubeň						
	W		(1,6+1,2)*2*1,6*0,2		1,792				
	W		Součet		1,792				
20	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m2	17,920	690,05	12 365,70		SOD
	W		příloha D.1.03.2.09						
	W		prohlubeň						
	W		(1,6+1,6+1,2+1,2)*2*1,6		17,920				
	W		Součet		17,920				
21	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m2	17,920	172,51	3 091,38		SOD
NP1	K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru (2+2+2+2,2)0,3*0,2	m	5,600	1 320,00	7 392,00		CS ÚRS 2022 01
					5,600				
NP2	K	985331115	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru 8*0,2	m	1,600	1 560,00	2 496,00		CS ÚRS 2022 01
					1,600				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 938,77		
87	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,384	3 507,75	1 346,98		SOD
	W		příloha D.1.03.2.09						
	W		podkladní beton						
	W		1,6*1,6*0,15		0,384				
	W		Součet		0,384				
90	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,384	103,51	39,75		SOD
91	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,015	36 802,59	552,04		SOD
	W		sít KARI 8/150 + 10% ztrátné						
	W		prohlubeň						
	W		1,6*1,6*0,005287*1,10		0,015				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				3 224,73		
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	393,26	3 224,73		

ROZPOČET VÍCEPRACÍ								
Stavba:	vystavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4, 1537/7, 1538/1, 1538/4, 1538/6, Praha 10 - 2. ét							
Objekt:	SO 23 - Pavilon B							
Soupis:	SO 23.1 - ASŘ							
Místo:						Datum:		
Zadavatel:	ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38					Projektant:	D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:	GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník					Zpracovatel:		
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 085,10	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				61 076,79	
	D	2	Zakládání				59 170,26	
107	K	631311134	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,798	3 507,75	2 799,18	SOD
	W		příloha D.1.23.1.03					
	W		podkladní mazanina tl. 150 mm					
	W		(1,9*2,8)*0,15		0,798			
	W		Součet		0,798			
110	K	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,798	103,51	82,60	SOD
NP1	K	330321611	Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 30/37 bez výztuže XC2, XF1, XA2	m3	1,848	5 750,40	10 626,74	SOD (SO 019 Altán)
	W		příloha D.1.23.1.10					
	W		žlb sloupy na betonových patkách					
	W		3, 14*0,15*0,15*4,36*6		1,848			
	W		Součet		1,848			
NP2	K	332351115	Zřízení bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m	m2	24,643	1 380,10	34 009,80	SOD (SO 019 Altán)
	W		příloha D.1.23.1.10					
	W		žlb sloupy na betonových patkách					
	W		3, 14*0,30*4,36*6		24,643			
	W		Součet		24,643			
NP3	K	332351116	Odstranění bednění kruhových sloupů v do 4 m D do 0,40 m	m2	24,643	230,02	5 668,38	SOD (SO 019 Altán)
NP4	K	985331113	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	4,533	1 320,00	5 983,56	CS ÚRS 2022 01
			(2,4+2,4+2)*0,3*0,2		4,533			
	D	998	Přesun hmot				1 906,53	
162	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	6,410	297,43	1 906,53	SOD
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 008,31	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	610,77	5 008,31	

Technický list změny (TLZ) č.:		ZL 44	
Datum předložení TLZ:			
SoD č.:	objednatel: 2021/OMP/0933	zhotovitel: AV.21028.1.130/001/INV	
Ze dne:			
Projekt registrační číslo:			
Stavba:	MŠ BAIKALSKÁ, Praha 10		
Objekt:			
Název změny:	Provedení průchodek pro budoucí instalaci FVE		
Žadatel změny:	investor		
Popis změny a důvod - zhotovitel:	Zl řeší: D+M průchodek středním pláštěm pro kabeláž FVE, stavební úpravy		
Vyjádření projektant:			
Vyjádření TDI:			
Vyjádření GI:			
Odkazy :	Zápis z KD č. Zápis v deníku změn PD č. Dotčený objekt		SO 02, SO 03, SO 23
Přílohy:	PD - schéma/podklady ZL kalkulace - podrobná s VV Jiná		
Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu s dopadem	ANO	
Cenový dopad:	bez dopadu s dopadem	ANO	Cenová kalkulace : SO 02 přípočty 9 892,31 SO 03 přípočty 9 892,31 SO 23 přípočty 9 892,31 Celkem 29 676,93 Kč
	Jméno	Datum	Razítko
Za objednatele:	Eva Navrátilová, DiS Ing. Jakub Brzoň		
Za TDI			
Za projektanta:			
Za zhotovitele:			

ROZPOČET ZL									
Stavba:									
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část									
Objekt:									
SO 02 - Pavilon A									
Soupis:									
SO 02.1 - ASŘ									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:									
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant:									
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč:									
GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							9 892,31		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				897,06		
NP 1	K	977151218	Jádrové vrtý dovrcní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,400	2 242,66	897,06	SOD (SO 23)	
	W		0,2*2		0,400				
	W		Součet		0,400				
	D	997	Přesun sutě				46,81		
144	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,031	728,04	22,57	SOD	
145	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,031	242,60	7,52	SOD	
146	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,434	10,61	4,60	SOD	
	W		0,031*14 "Přepočtené koeficientem množství		289,170				
147	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,031	391,03	12,12	SOD	
	D	764	Konstrukce klempířské				8 198,80		
NP 2			D+M prostup pro kabely DN 75, integrovaná manžeta výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm	kus	2,000	3 980,00	7 960,00		
230	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	79,60	238,80	SOD	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				749,64		
3	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	91,42	749,64	SoD	

ROZPOČET ZL									
Stavba:									
Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 1.část									
Objekt:									
SO 03 - Hospodářský pavilon									
Soupis:									
SO 03.1 - ASŘ									
Místo:									
Datum:									
Zadavatel:									
ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38									
Projektant:									
D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.									
Uchazeč:									
GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník									
Zpracovatel:									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							9 892,31		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				897,06		
NP 1	K	977151218	Jádrové vrtý dovrcní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,400	2 242,66	897,06	SOD (SO 23)	
	W		0,2*2		0,400				
	W		Součet		0,400				
	D	997	Přesun sutě				46,81		
143	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,031	728,04	22,57	SOD	
144	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,031	242,60	7,52	SOD	
145	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,434	10,61	4,60	SOD	
	W		0,031*14 "Přepočtené koeficientem množství		289,170				
146	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,031	391,03	12,12	SOD	
	D	764	Konstrukce klempířské				8 198,80		
NP 2			D+M prostup pro kabely DN 75, integrovaná manžeta výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm	kus	2,000	3 980,00	7 960,00		
206	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	79,60	238,80	SOD	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				749,64		
3	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	91,42	749,64	SoD	

ROZPOČET ZL									
Stavba:		Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, k.ú. Vršovice, p.č. 1536/4,1537/7,1538/1,1538/4, 1538/8, Praha 10 - 2.část							
Objekt:		SO 23 - Pavilon B							
Soupis:		SO 23.1 - ASŘ							
Místo:						Datum:			
Zadavatel:		ÚMČ Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38				Projektant:		D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.	
Uchazeč:		GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská - vedoucí společník				Zpracovatel:			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							9 892,31		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				897,06		
153	K	977151218	Jádrové vrtý dovrchní diamantovými korunkami do D 100 mm do stavebních materiálů	m	0,400	2 242,66	897,06	SOD	
	W		0,2*2		0,400				
	W		Součet		0,400				
	D	997	Přesun sutě				46,81		
158	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,031	728,04	22,57	SOD	
159	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,031	242,60	7,52	SOD	
160	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,434	10,61	4,60	SOD	
	W		0,031*14 *Přepočtené koeficientem množství		289,170				
161	K	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	0,031	391,03	12,12	SOD	
	D	764	Konstrukce klempířské				8 198,80		
NP 1			D+M prostup pro kabely DN 75, integrovaná manžeta výška nad izolací 30 cm, hloubka pod izolací 20 cm	kus	2,000	3 980,00	7 960,00		
239	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	3,000	79,60	238,80	SOD	
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				749,64		
3	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (8,20%)	%	8,200	91,42	749,64	SoD	

Dodatek č. 9

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/0933

ze dne 17. 6. 2021

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostou Ing. arch. Martinem Valovičem

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská**

zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské smlouvy

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Společník: VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČO: 251 10 977

DIČ: CZ25110977

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.

č. účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 9119032/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 9 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Čas plnění

Tímto Dodatkem č. 9 se mění znění čl. 5, doba plnění, odstavec 5. 1, bod 5. 1. 2. výše uvedené smlouvy – provedení díla. Termín provedení díla se prodlužuje do 31. 8. 2023.

III.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 9 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 5 864 385,57 Kč bez DPH

a zároveň se snižuje o částku -811 754,91 Kč bez DPH

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 5 052 630,66 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 144 029 445,65 Kč

(slovy: stočtyřicetčtyřimilionůdvacetdevěttisícčtyřistačtyřicetpět korun českých a 65 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

IV.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty méněprací a víceprací, č. 3, harmonogram prací.

V Praze dne _____

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2023.07.17 13:57:47
+02'00'

Městská část Praha 10

Bc. Jakub Brzoň

vedoucí odboru majetkoprávního

Objednatel

V Praze dne _____



pověřená osoba na základě pověření a
společenské smlouvy
Zhotovitel

Dodatek č. 10

ke Smlouvě o dílo

č. 2021/OMP/0933

ze dne 17. 6. 2021

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená starostou Ing. arch. Martinem Valovičem

Ke smluvnímu jednání oprávněn Bc. Jakub Brzoň, vedoucí OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: **GEOSAN + VISTORIA – MŠ Bajkalská**

zastoupený:  pověřenou osobou, na základě pověření a společenské smlouvy

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Společník: VISTORIA CZ a.s.

se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

IČO: 251 10 977

DIČ: CZ25110977

Adresa pro zasílání korespondence zhotoviteli:

U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.; ČSOB a.s.

č. účtu: 6446732/0800; 117830833/0300; 9119032/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/0933 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tímto Dodatkem se mění rozsah prací na akci „**Výstavba mateřské školy v ulici Bajkalská, Praha 10**“.

Přesný rozsah prací je dán přílohou č. 1 a 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 10 se mění znění čl. 6, odstavec 6.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

zvyšuje o částku 1 704 064, 59 Kč bez DPH

a zároveň se snižuje o částku -940 096, 28 Kč bez DPH

Celkem se tedy cena díla zvyšuje o částku: 763 968, 31 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 144 793 413, 96 Kč

(slovy: stočtyřicetčtyřmiliónůsedmsetdevadesáttřítisícčtyřistatřináct korun českých a 96 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/0933 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

IV.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.

Smluvní strany si Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy: č. 1, rekapitulace, č. 2, položkové rozpočty méněprací a víceprací.

V Praze dne _____

Jakub Brzoň

Digitálně podepsal Jakub Brzoň
Datum: 2023.08.29 08:07:53
+02'00'

Městská část Praha 10

Bc. Jakub Brzoň

vedoucí odboru majetkoprávního

Objednatel

V Praze dne _____



pověřená osoba na základě pověření a
společenské smlouvy
Zhotovitel

Zápis

z 11. schůze Rady městské části Praha 10 konané dne 13. 4. 2023 od 14:00 hodin

Přítomní členové RMČ:

Bc. Radek Lojda

MgA. David Kašpar

Olga Koumarová

Ing. Milan Maršálek

Ing. Tomáš Pek, S.E.

Mgr. Ondřej Počarovský

Mikuláš Pobuda

JUDr. Pavel Šutka

Ing. arch. Martin Valovič

Další přítomní:

Bc. Pavel Petřík – za tajemnici ÚMČ

Petra Kociánová - zapisovatelka RMČ

Ing. Lada Kubištová - zapisovatelka RMČ

Mgr. Tomáš Staněk – právní poradce RMČ

11. schůzi rady MČ řídil Ing. arch. Valovič.


Zápis z 10. schůze rady MČ dne 6. 4. 2023 byl ověřen, námitky od členů rady nebyly žádné, zápis lze považovat za schválený.

Jako ověřovatelé zápisu z 11. schůze rady MČ jsou určeni: Olga Koumarová

Bc. Radek Lojda

O účast na jednání 11. schůze rady požádal člen ZMČ Mgr. Michal Kočí.

Průběh hlasování o účasti Mgr. Kočího a návrhu programu jednání:



PROGRAM


I. Materiály k projednání

1. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10

Číslo návrhu: 0868/2023/OMP

2.



Číslo návrhu: 

3. Návrh na schválení 6. vydání Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ (QS 74-01)

Číslo návrhu: 0825/2023/OMP

II. Různé

X X X

I. Materiály k projednání

1. Návrh na uzavření smlouvy o nájmu náhradních prostor ÚMČ Praha 10

Číslo návrhu: 0868/2023/OMP


Předložil písemně Ing. Pek, S.E.

Prizvaní: -


Diskuse: p. Mgr. Počarovský, Ing. arch. Valovič, JUDr. Šutka, MgA. Kašpar.


Zveřejnění: Ano

Průběh hlasování:



Číslo usnesení: 0224/RMČ/2023

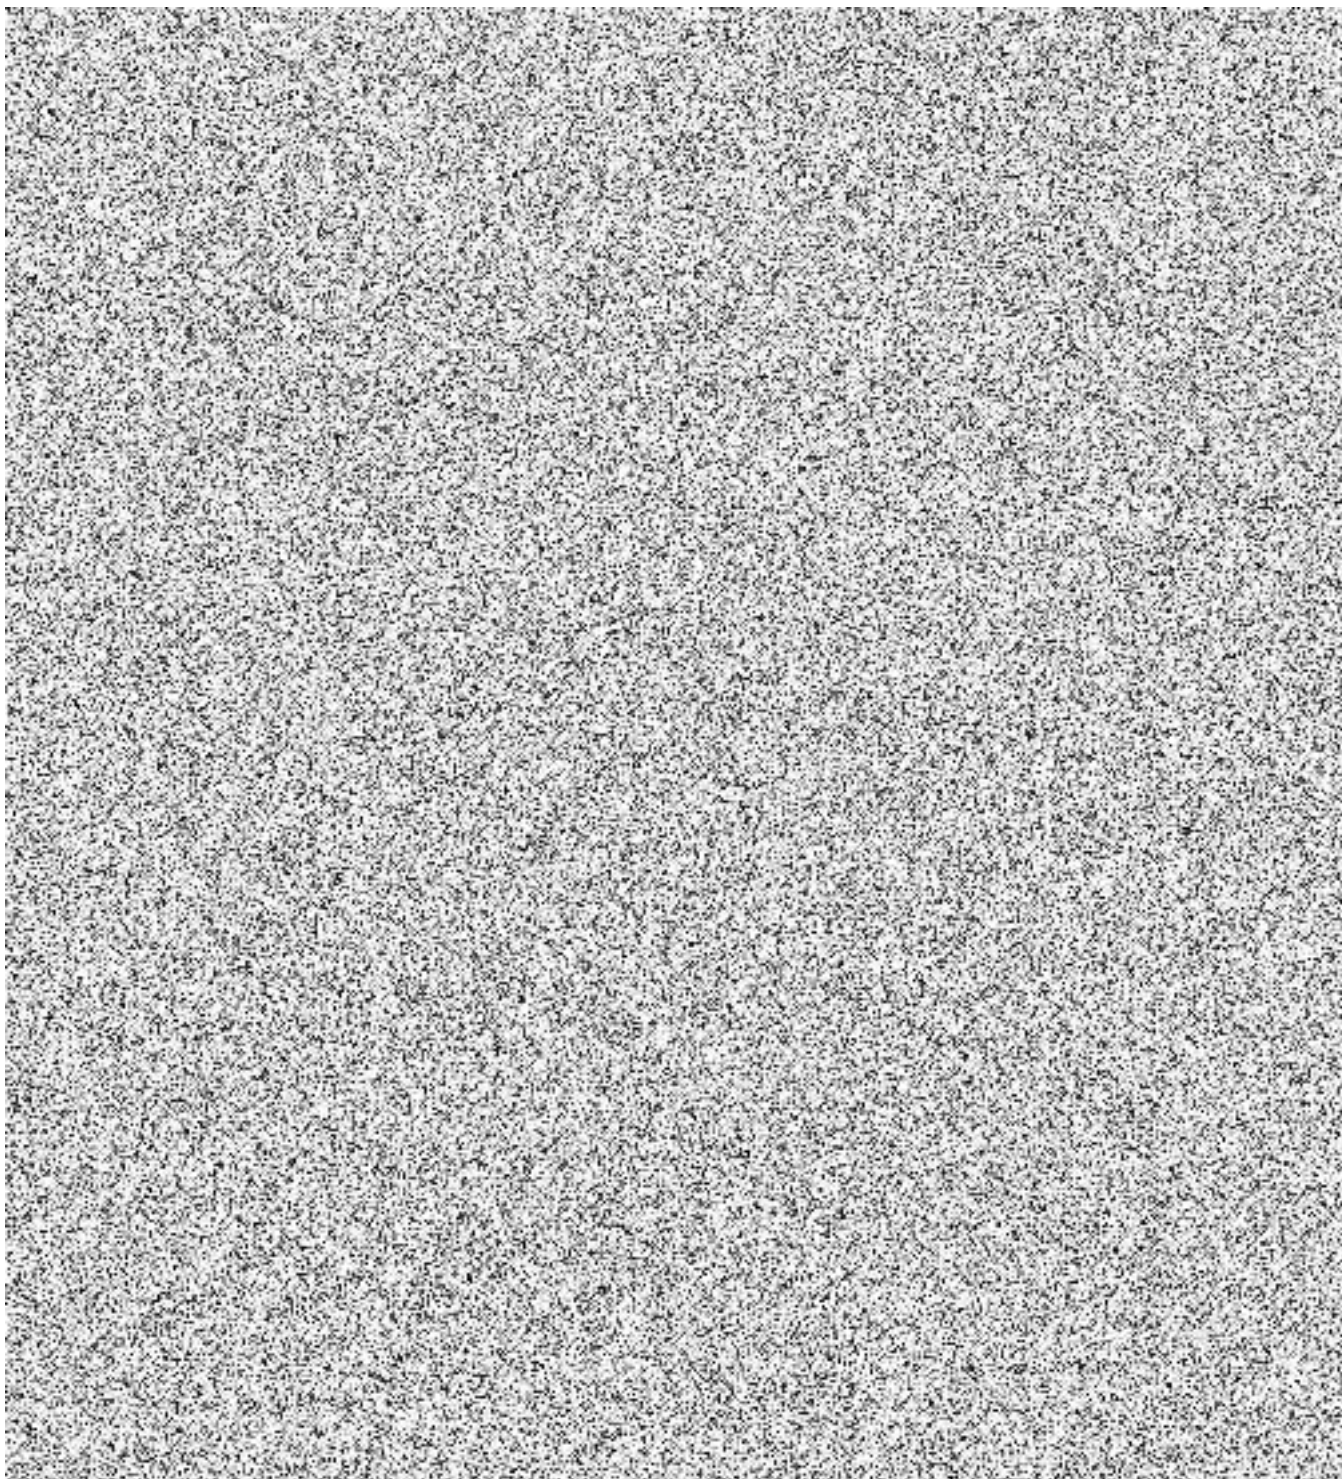

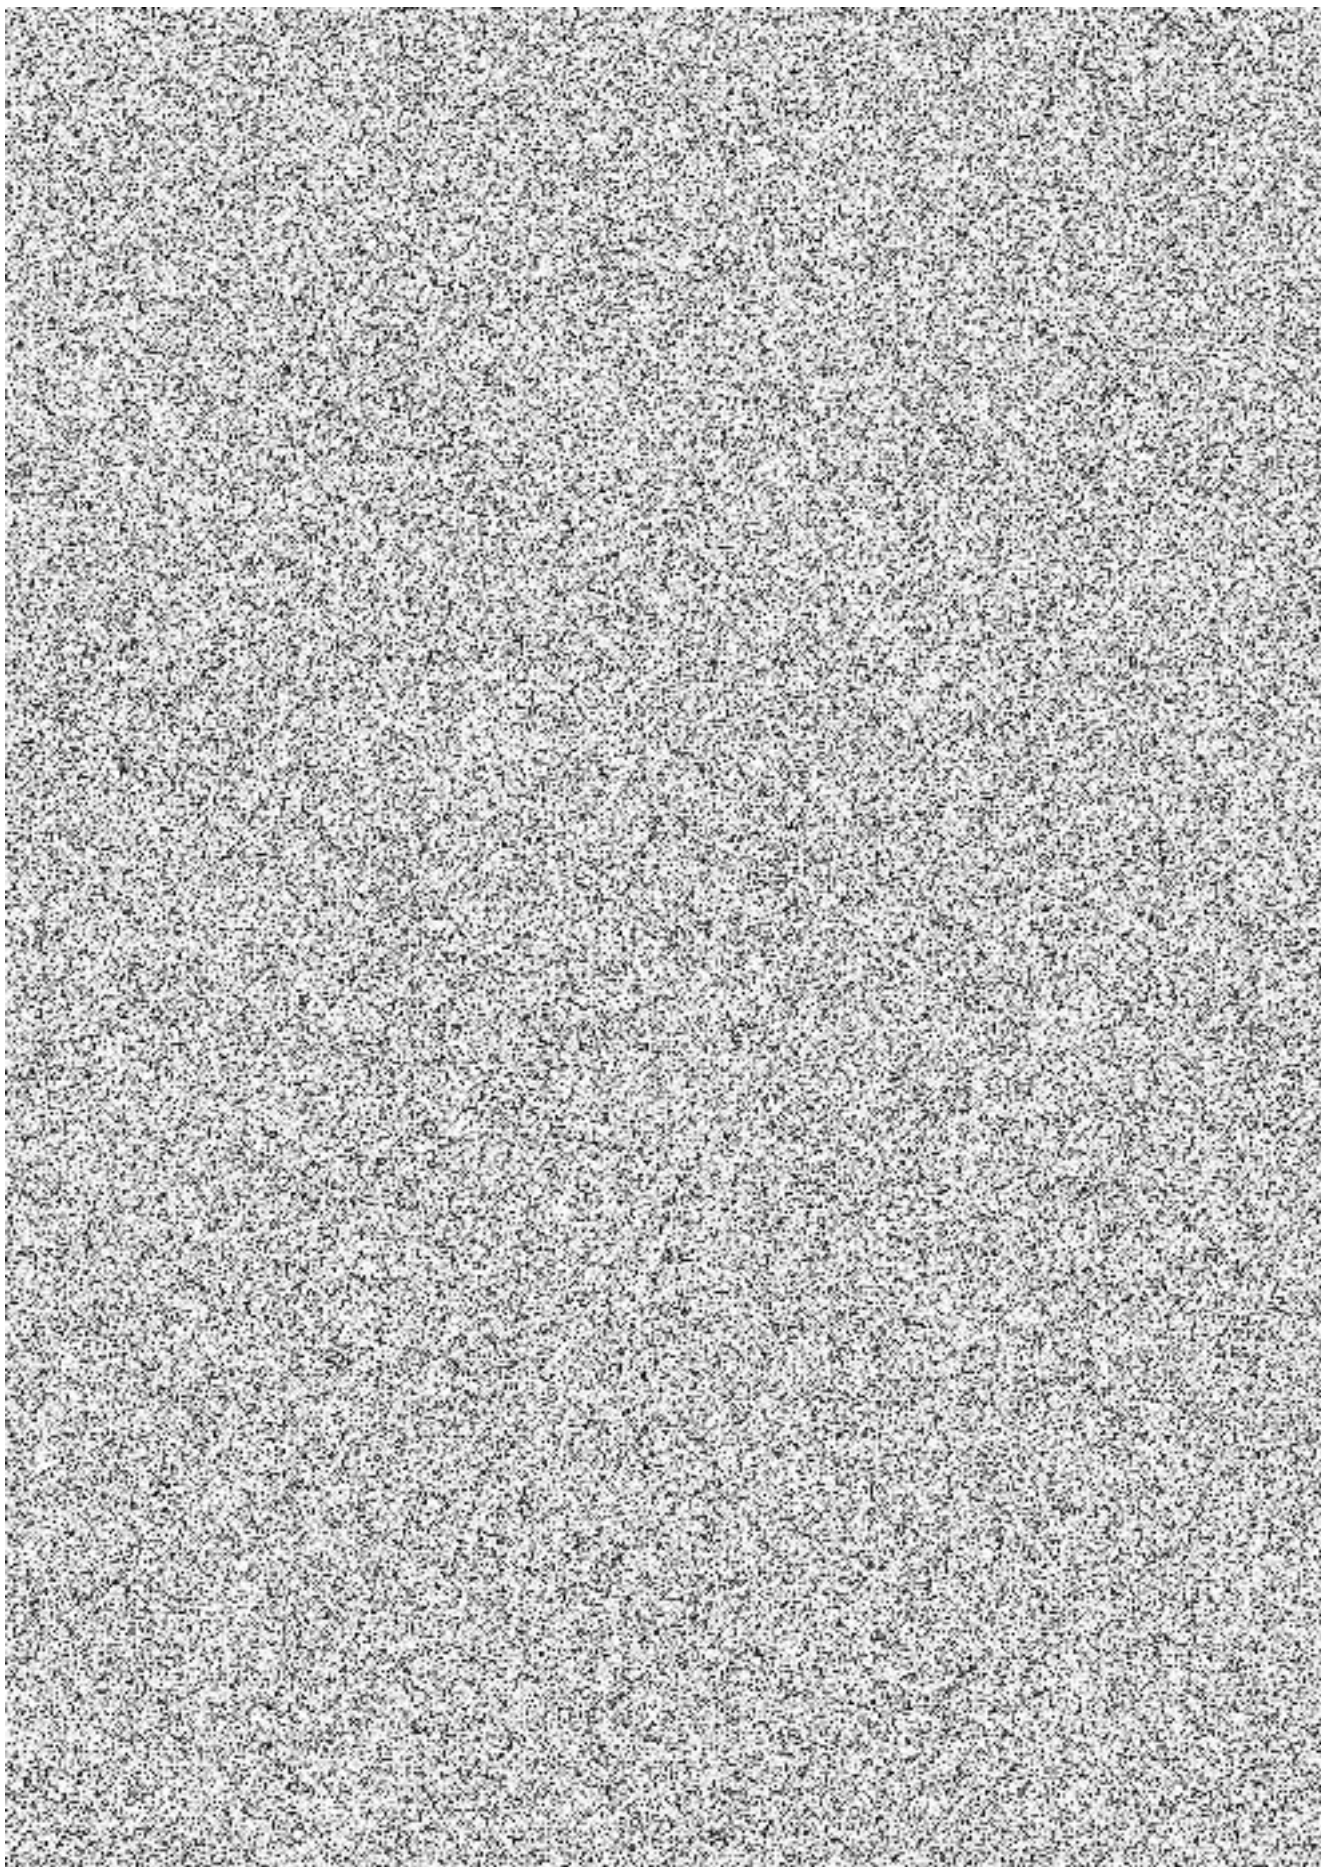

3. Návrh na schválení 6. vydání Směrnice „Zadávání veřejných zakázek“ (QS 74-01)

Číslo návrhu: 0825/2023/OMP

Předložila písemně JUDr. Hatalová. Uvedl Bc. Petřík.


Přizvaní: -

Diskuse: Ing. Pek, S.E., Ing. arch. Valovič, Bc. Petřík.

Závěr: Opravena administrativní chyba v bodě II. usnesení.

Zveřejnění: Ano

Průběh hlasování:



Číslo usnesení: 0225/RMČ/2023

II. Různé

--

11. schůzi rady MČ ukončil Ing. arch. Valovič ve 14:40 hodin.

Ing. arch. Martin V a l o v i č
starosta

Ing. Tomáš P e k, S.E.
1. místostarosta

Zapsala: Ing. Lada Kubištová, KS/RaZ

Ověřovatelé: Olga Koumarová

Bc. Radek Lojda

Součástí tohoto zápisu jsou přijatá usnesení rady MČ č. 0224/RMČ/2023 – 0225/RMČ/2023.

V Praze dne 14. 4. 2023

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 12459

Datum vzniku a zápisu:	15. října 2007
Spisová značka:	B 12459 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	GEOSAN GROUP a.s.
Sídlo:	U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín
Identifikační číslo:	281 69 522
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence Projektová činnost ve výstavbě Geologické práce Výkon zeměměřických činností Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v rozsahu těchto oborů činnosti: - Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, - Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna, - Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků, - Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, - Umělecko-řemeslné zpracování kovů, - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů, - Výroba strojů a zařízení, - Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti, - Zprostředkování obchodu a služeb, - Velkoobchod a maloobchod, - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, - Projektování pozemkových úprav, - Projektování elektrických zařízení, - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd, - Testování, měření, analýzy a kontroly, - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy, - Poskytování technických služeb, - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené. Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Statutární orgán - představenstvo:

Předseda

představenstva:

LUDEK KOSTKA, dat. nar. 

Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Den vzniku členství: 15. dubna 2020

Člen představenstva:

IVAN HAVEL, dat. nar. [REDACTED]
Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Den vzniku členství: 1. ledna 2023

Člen představenstva:

FRANTIŠEK VACULÍK, dat. nar. [REDACTED]
Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Den vzniku členství: 1. ledna 2023

Počet členů:

4

Způsob jednání:

Za společnost jednají společně dva členové představenstva, přičemž jeden z nich musí být předseda představenstva.

Dozorčí rada:**Předseda dozorčí rady:**

Ing. ROMANA VIDNEROVÁ, dat. nar. [REDACTED]
Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Den vzniku členství: 1. června 2020

Člen dozorčí rady:

JUDr. JIŘÍ SKUHRA, dat. nar. [REDACTED]
Den vzniku funkce: 1. ledna 2023
Den vzniku členství: 1. ledna 2023

Počet členů:

3

Jediný akcionář:

GEOSAN INVESTIČNÍ a.s., IČ: 041 04 838
U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Akcie:

20 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

Základní kapitál:

2 000 000,- Kč
Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na obchodní společnost GEOSAN GROUP a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, identifikační číslo 28169522, byla na základě smlouvy ze dne 23. 9. 2015 převedena část obchodního závodu obchodní společnosti GEOSAN STAVEBNÍ a.s., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, identifikační číslo 25671464, konkrétně části označené jako Vedení a správa, Projekty výrobního ředitele, Závod pozemních staveb a Závod ekologických a inženýrských staveb.

Na obchodní společnost GEOSAN GROUP a.s., v právním postavení nástupnické společnosti, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti G-NEMOVITOSTI s.r.o., se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, identifikační číslo 27434311.

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 4581

Datum vzniku a zápisu:	5. března 1997
Spisová značka:	B 4581 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	VISTORIA CZ a.s.
Sídlo:	Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo:	251 10 977
Právní forma:	Akciová společnost
Předmět podnikání:	Projektová činnost ve výstavbě Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami a nejvyšší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem a projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí činnosti prováděné hornickým způsobem Výkon zeměměřických činností Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán - představenstvo:	
předseda představenstva:	Ing. IVAN NĚMEC, dat. nar.   Den vzniku funkce: 8. ledna 2021 Den vzniku členství: 8. ledna 2021
Počet členů:	1
Způsob jednání:	Předseda představenstva zastupuje Společnost ve všech záležitostech samostatně.
Dozorčí rada:	
člen dozorčí rady:	Mgr. PAVEL PRAŽÁK, dat. nar.   Den vzniku členství: 8. ledna 2021
člen dozorčí rady:	Ing. ELIŠKA PEROUTKOVÁ, dat. nar.   Den vzniku členství: 8. ledna 2021
předseda dozorčí rady:	Ing. TOMÁŠ HRDLIČKA, MBA, dat. nar.   Den vzniku funkce: 8. ledna 2021 Den vzniku členství: 8. ledna 2021
Počet členů:	3

Jediný akcionář:

Kupiano Investments SE, IČ: 242 95 451
 Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1

Akcie:

2 106 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 19 000,- Kč

Základní kapitál:

40 014 000,- Kč
 Splaceno: 100%

Ostatní skutečnosti:

Na společnost PROMINECON GROUP a.s. přešlo v důsledku fúze sloučením jmění společnosti MIST a.s., IČ: 261 07 261, se sídlem Praha - Vršovice, Kazašská 1427/4, PSČ 100 00.

Dne 14. 12. 2010 rozhodl jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady o rozdělení společnosti PROMINECON GROUP a.s. ve formě kombinace rozdělení odštěpením se vznikem dvou nových nástupnických společností s ručením omezeným a rozdělení odštěpením sloučením. Části jmění rozdělované společnosti specifikované v Projektu rozdělení přechází v důsledku rozdělení (i) do dvou nově vzniklých nástupnických společností PMC NAD JEZEREM s.r.o. a PMC PODOLÍ s.r.o., a (ii) do jedenácti nástupnických společností, a to do společnosti Centrum Holešovice a.s., IČ: 27892646, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti MALVAZINKY PARK s.r.o., IČ: 274 25 207, se sídlem Praha 1, Staré Město, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti Majetková správa Praha a.s., IČ: 264 22 000, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti První společná a.s., IČ: 480 36 242, se sídlem Praha 10, Strašnice, V Předpolí 13/289, PSČ 100 00, společnosti Pražská servisní s.r.o., IČ: 276 50 596, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00, společnosti NAVABYT s.r.o., IČ: 271 68 891, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00, společnosti TOPA s.r.o., IČ: 604 67 916, se sídlem Praha 1, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti BYT plus s.r.o., IČ: 257 46 146, se sídlem Praha 1, Revoluční 767, PSČ 110 00, společnosti HOTELTYP a.s., IČ: 265 10 995, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, společnosti Zónapark a.s., IČ: 271 49 307, se sídlem Praha 1, Revoluční 767/25, PSČ 110 00, a do společnosti AUTOTYP Praha s.r.o., IČ: 630 73 838, se sídlem Praha 1, Revoluční 25/767, PSČ 110 00.

U společnosti PROMINECON CZ a.s. došlo k odštěpení části jmění, a to ve formě kombinace odštěpení sloučením se společností NVT Hotels & Resorts s.r.o., IČ: 24747092, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Koněvova 2660/141, PSČ 130 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 170959, a odštěpení se vznikem jedné nové společnosti Projekt Hotely s.r.o., IČ: 24275263, se sídlem Praha 1, Novomlýnská 1373/5, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce 200062.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Jediný akcionář Společnosti učinil při výkonu působnosti valné hromady Společnosti dle ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti: 1. Částka, o kterou má být základní kapitál zvýšen: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun českých), tj. z částky ve výši 81.075.000,- Kč (osmdesát jedna milionů sedmdesát pět tisíc korun českých) na částku ve výši 121.095.000,- Kč (sto dvacet jedna

milionů devadesát pět tisíc korun českých), peněžitým vkladem a upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští.

2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií: Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových 696 (šest set devadesát šest) kusů kmenových akcií, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Akcie budou vydány jako cenný papír. 3. Využití přednostního práva jediným akcionářem:

Veškeré nově upisované akcie budou upsány s využitím přednostního práva Jediného akcionáře Společnosti ve smyslu ustanovení § 484 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále i jen zákon o obchodních korporacích).

Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty Jedinému akcionáři, tj. obchodní společnosti VISTORIA, a.s., IČ 015 17 317, se sídlem Koněvova 2660/141, Praha 3 – Žižkov, PSČ 130 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19018, který upíše všech nových 696 (šest set devadesát šest) kusů kmenových akcií, které budou vydány jako cenný papír, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun českých). 4. Emisní kurs: Emisní kurs nově upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě, tj. u každé nově upsané akcie částce ve výši 57.500,- Kč (padesát sedm tisíc pět set korun českých) a lze jej splatit výhradně peněžitým vkladem. Emisní kurs nově upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem v souladu s tímto rozhodnutím, stanovami Společnosti a zákonem. Výši emisního kurzu Jediný akcionář výslovně schvaluje. 5. Lhůta pro upsání akcií Předem určeným zájemcem: Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 8 (osm) týdnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, která bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 479 zákona o obchodních korporacích, a návrh bude doručen Předem určenému zájemci do 4 (čtyř) týdnů ode dne sepsání tohoto notářského zápisu. Doručení návrhu na uzavření smlouvy o úpisu akcií Předem určenému zájemci se bere za počátek běhu shora uvedené lhůty pro úpis akcií. 6. Připuštění možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu . Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za Jediným akcionářem na splacení emisního kursu do celkové výše 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun českých) proti pohledávce Jediného akcionáře (ke dni 9.6.2014) ve výši 40.627.767,12,- Kč (čtyřicet milionů šest set dvacet sedm tisíc sedm set šedesát sedm korun českých dvanáct haléřů) za Společností z titulu Smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jediným akcionářem (jako věřitelem) a Společností (jako dlužníkem) dne 23.10.2013, ve znění pozdějších změn a dodatků.

Peněžitý vklad a způsob jeho splacení, pravidla postupu při splácení emisního kursu upsaných akcií:

Jediný akcionář jako upisovatel splatí emisní kurs nově upisovaných akcií, které upíše na základě tohoto rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 478 odst. 2 zákon o obchodních korporacích, takto: emisní kurs nově upisovaných akcií, tedy částku ve výši 40.020.000,- Kč (čtyřicet milionů dvacet tisíc korun českých) splatí Jediný akcionář jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře Smlouvu o započtení (dále i jen „Smlouva o započtení“), a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Návrh Smlouvy o započtení Jediný akcionář schvaluje a schválený návrh

Smlouvy o započtení tvoří přílohu notářského zápisu. Pravidla postupu pro uzavření Smlouvy o započtení: Stanovují se tato pravidla pro uzavření Smlouvy o započtení: Společnost zašle Jedinému akcionáři návrh Smlouvy o započtení nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne upsání nově upisovaných akcií, a Jediný akcionář je povinen Smlouvu o započtení uzavřít nejpozději do 4 (čtyř) týdnů ode dne doručení návrhu smlouvy tak, že v uvedené lhůtě doručí Společnosti podepsanou Smlouvu o započtení do sídla Společnosti.

Na společnost přešlo jmění zanikající (rozdělované) právnické osoby, společnosti Kupiano Investments SE, se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 24295451, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 624, které bylo uvedeno v projektu rozdělení odštěpením sloučením.

U společnosti VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25110977, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581, jako rozdělované společnosti, došlo k odštěpení části jejího jmění na nástupnickou společnost VISTORIA Facility a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 04163648, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20717

U společnosti VISTORIA CZ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 25110977, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581, jako rozdělované společnosti, došlo k odštěpení části jejího jmění na nově založenou nástupnickou společnost PROJEKT KRČ a.s., se sídlem Revoluční 767/25, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ: 09810196

Obvodní soud pro Prahu 10

28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10 - Vršovice

ke spis. zn.:



Žalobce 1: **GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Žalobce 2: **VISTORIA CZ a. s.**, IČO: 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město

oba právně zastoupeni advokátem, se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsaným v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č.

Žalovaná: **Městská část Praha 10**, IČO: 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 – Strašnice

právně zastoupena advokátem, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaným v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č.


Žaloba na změnu závazku**Replika žalobců****Doplnění tvrzení žalobců o nové skutečnosti****Přílohy:**

1. smlouva o dílo č. 2021/OMP/1351
2. dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351


D v a k r á t (podáno do datové schránky Obvodního soudu pro Prahu 10, ID DS: 8aiabyn)



I.
Shrnutí dosavadního průběhu řízení

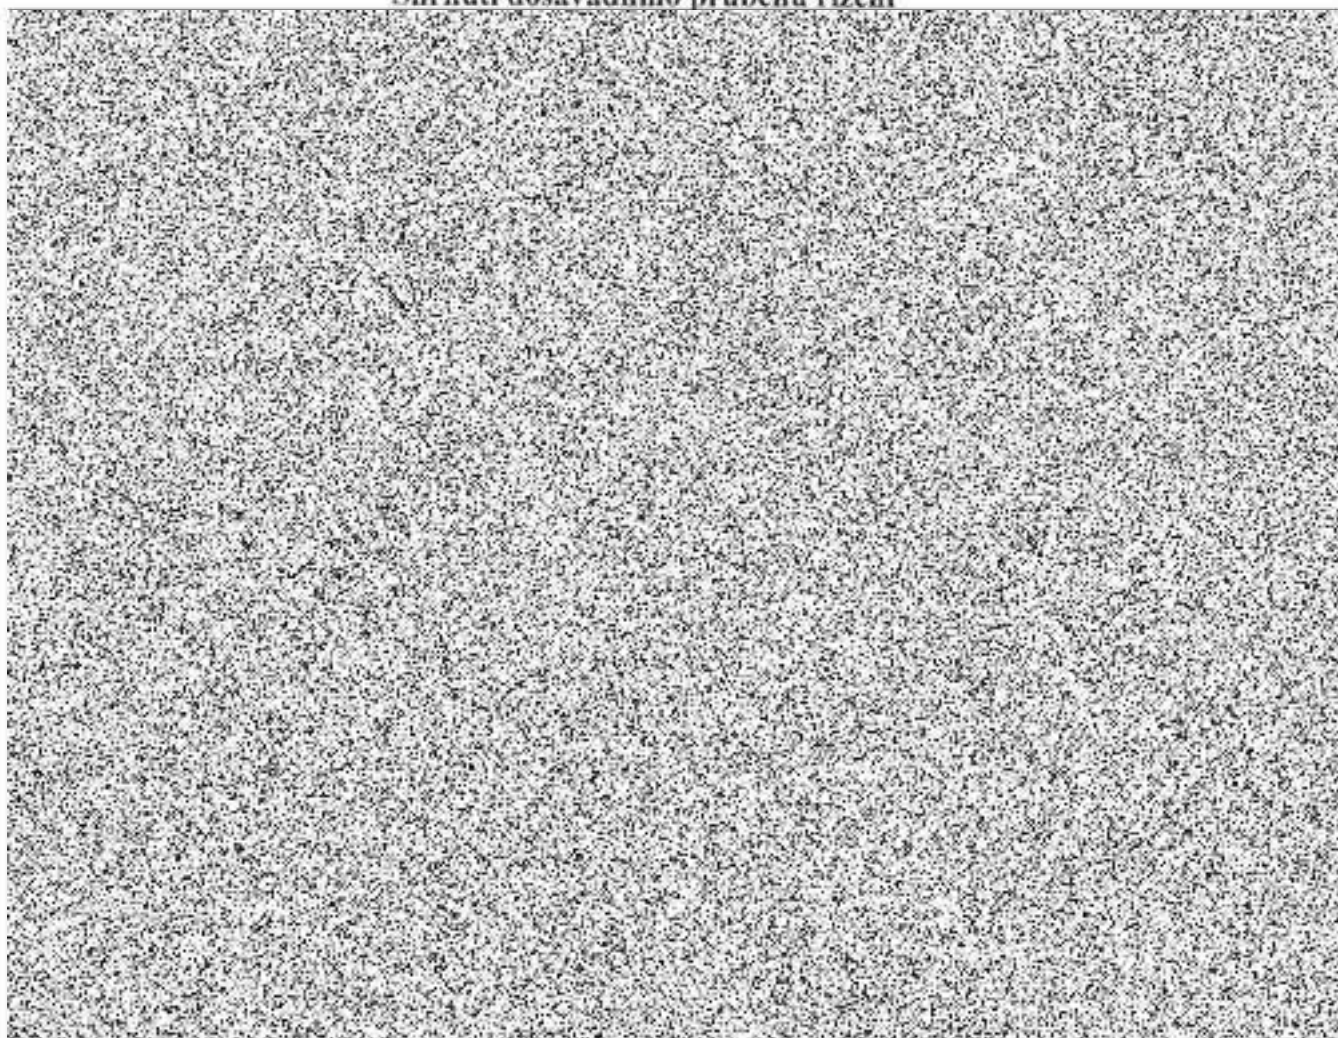

II.
Replika žalobců

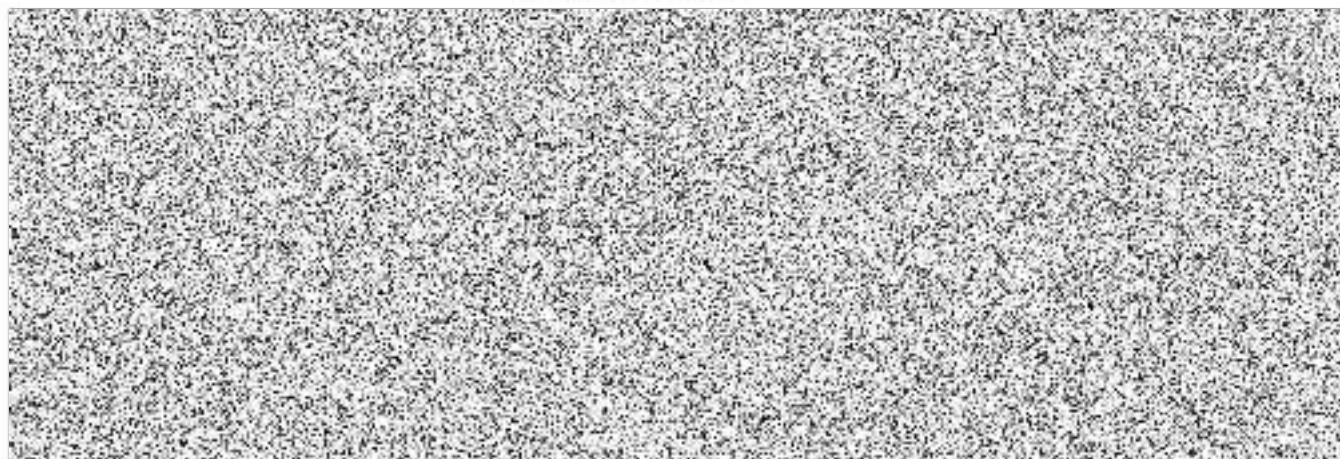

¹ Pojmy používané v tomto podání žalobců mají stejný význam jako pojmy používané v předchozích podáních žalobců.

² Včetně rozsáhlé důvodové zprávy odůvodňující potřeby uzavření dodatku č. 6




III.

⁴ PELIKÁNOVÁ, Irena; PELIKÁN, Robert. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. *Občanský zákoník: komentář k § 1798*. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Wolters Kluwer ČR [cit. 12. 6. 2024]. Dostupné z: www.aspi.cz.

⁵ GRULICH, Tomáš. *Zadávání veřejných zakázek jako forma adhezní kontraktace*. Právní rozhledy. 2016, č. 7, s. 249-255 [cit. 12. 6. 2024]. Dostupné z www.beck-online.cz.

⁶ JANOUŠEK, Michal. Komentář k § 1793. In: PETROV, Jan. VÝTISK, Michal. BERAN, Vladimír a kol. *Občanský zákoník: komentář k § 1798 o. z.*, 2. vydání (2. aktualizace). Praha: C. H. Beck, 2023. [cit. 12. 6. 2024]. Dostupné z www.beck-online.cz.

⁷ PELIKÁNOVÁ, Irena; PELIKÁN, Robert. Op. cit.

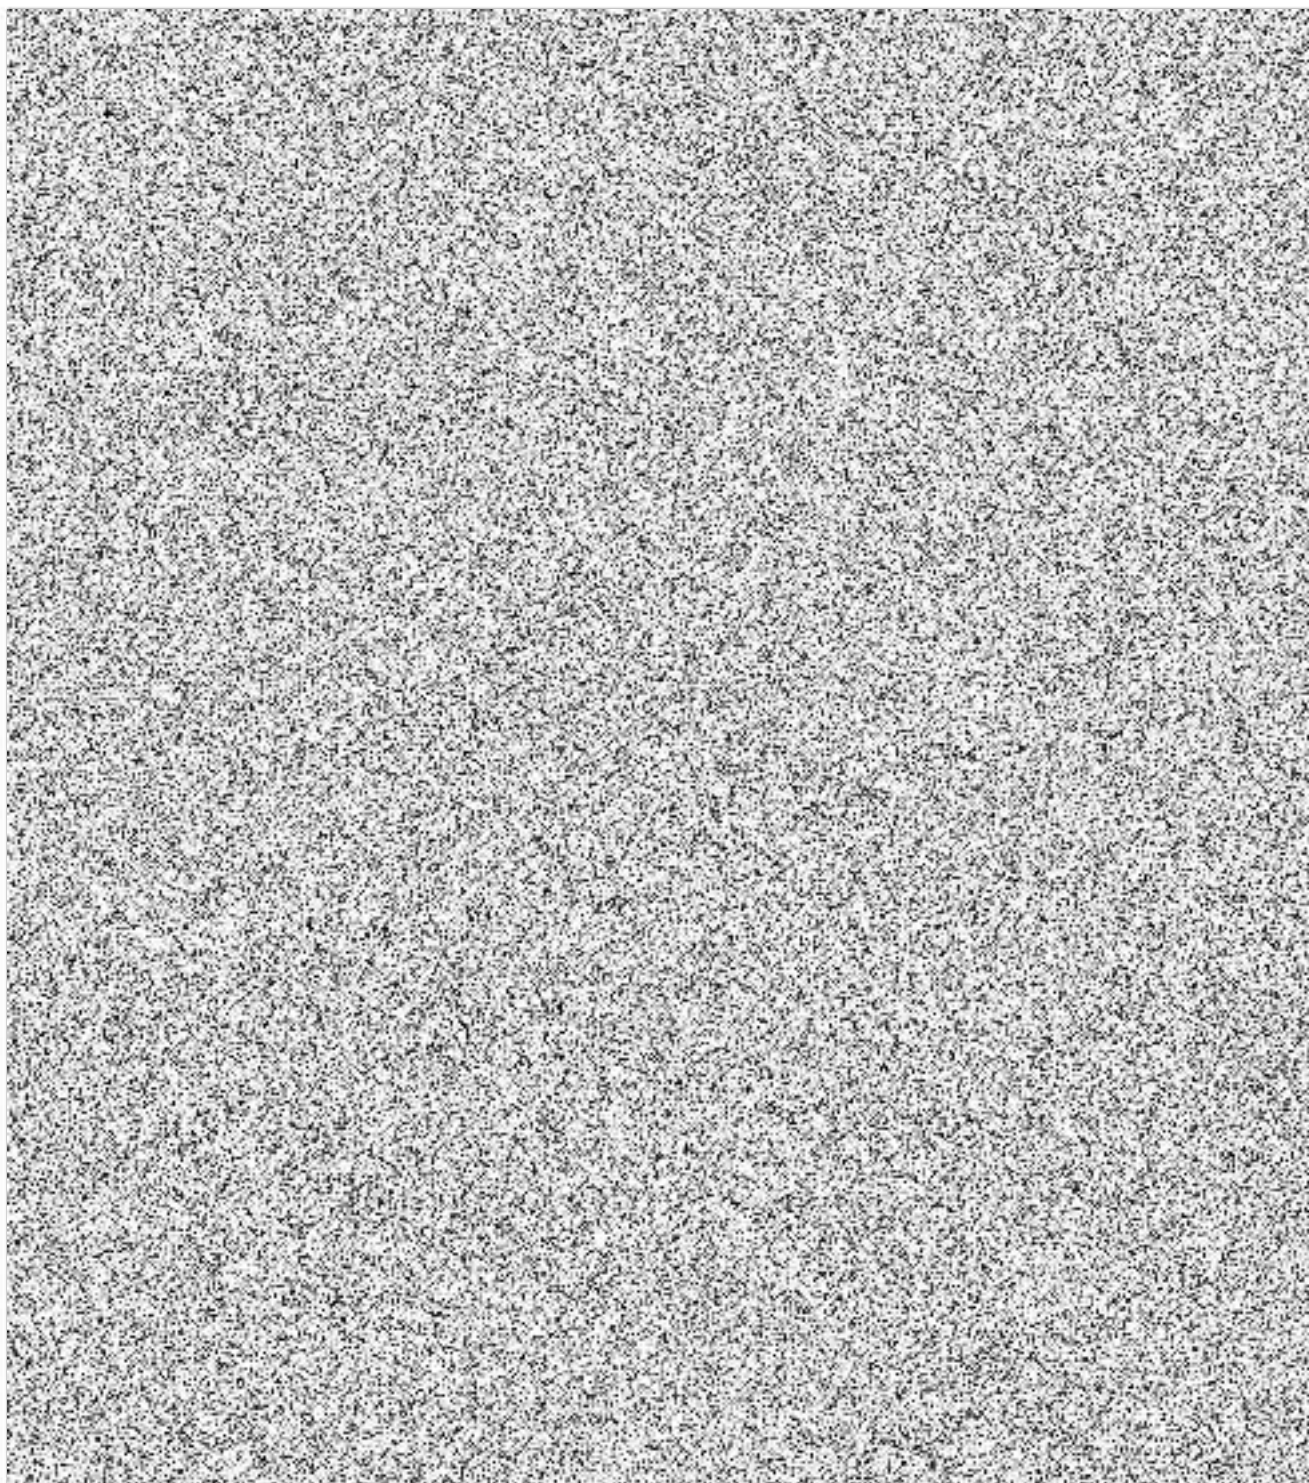

⁸ JANOUŠEK, Michal. Komentář k § 1793. In: PETROV, Jan. VÝTISK, Michal. BERAN, Vladimír a kol. *Občanský zákoník: komentář k § 1798 o. z. 2. vydání (2. aktualizace)*. Praha: C. H. Beck, 2023. [cit. 12. 6. 2024]. Dostupné z www.beck-online.cz.

⁹ <https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatele/detail/Z0000859>.


¹⁰ <https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/VerejneZakazky/00063941>.

¹¹ <https://www.hlidacstatu.cz/hledat?q=ico%3a28169522&qtl=12>, [hlidacstatu.cz/hledat?q=ico%3a25110977&qtl=12](https://www.hlidacstatu.cz/hledat?q=ico%3a25110977&qtl=12).


¹² https://cs.wikipedia.org/wiki/Praha_10.


¹³ <https://praha10.cz/urad-mc/odbory/odbor-majetkopravni/oddeleni-pripravy-verejnych-zakazek#851742-zamstnanci>.

¹⁴ <https://praha10.cz/urad-mc/odbory/odbor-bytu-a-nebytovych-prostor/oddeleni-pravnich-cinnosti-a-verejnych-zakazek#827042-zamstnanci>.

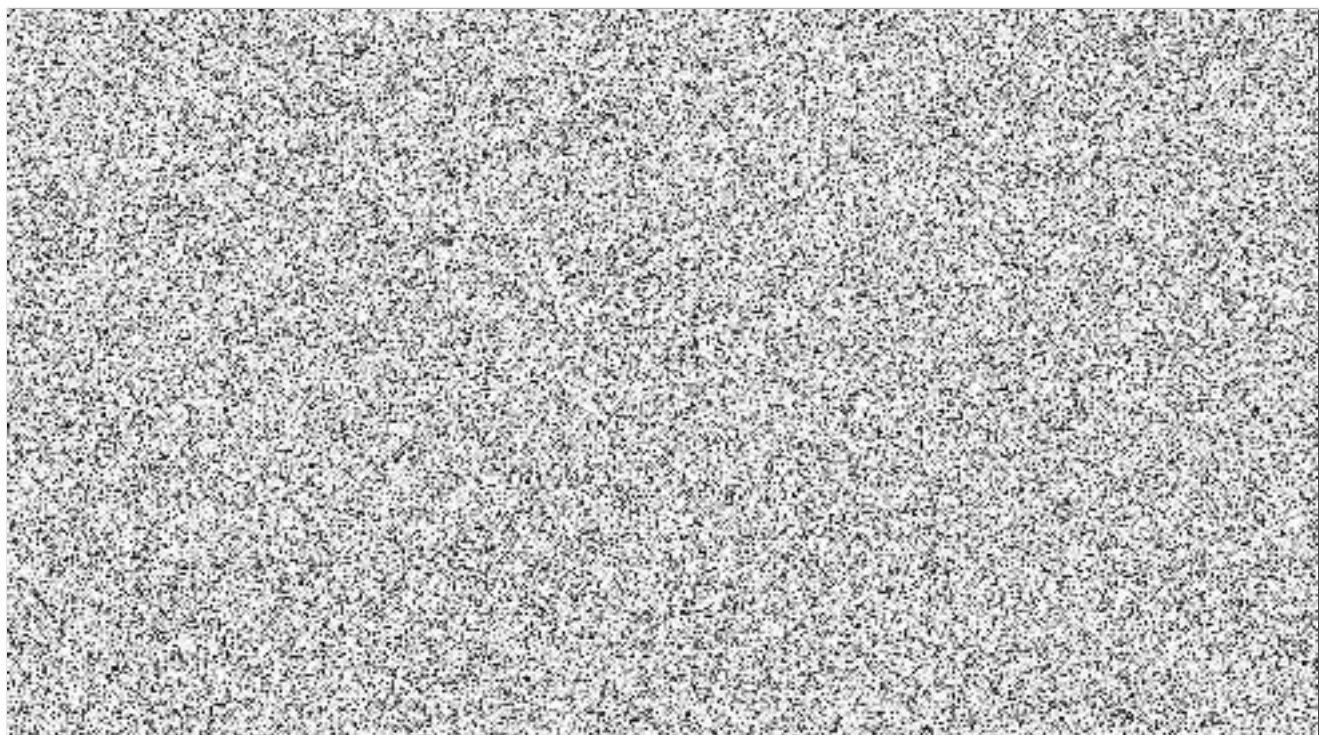

IV.

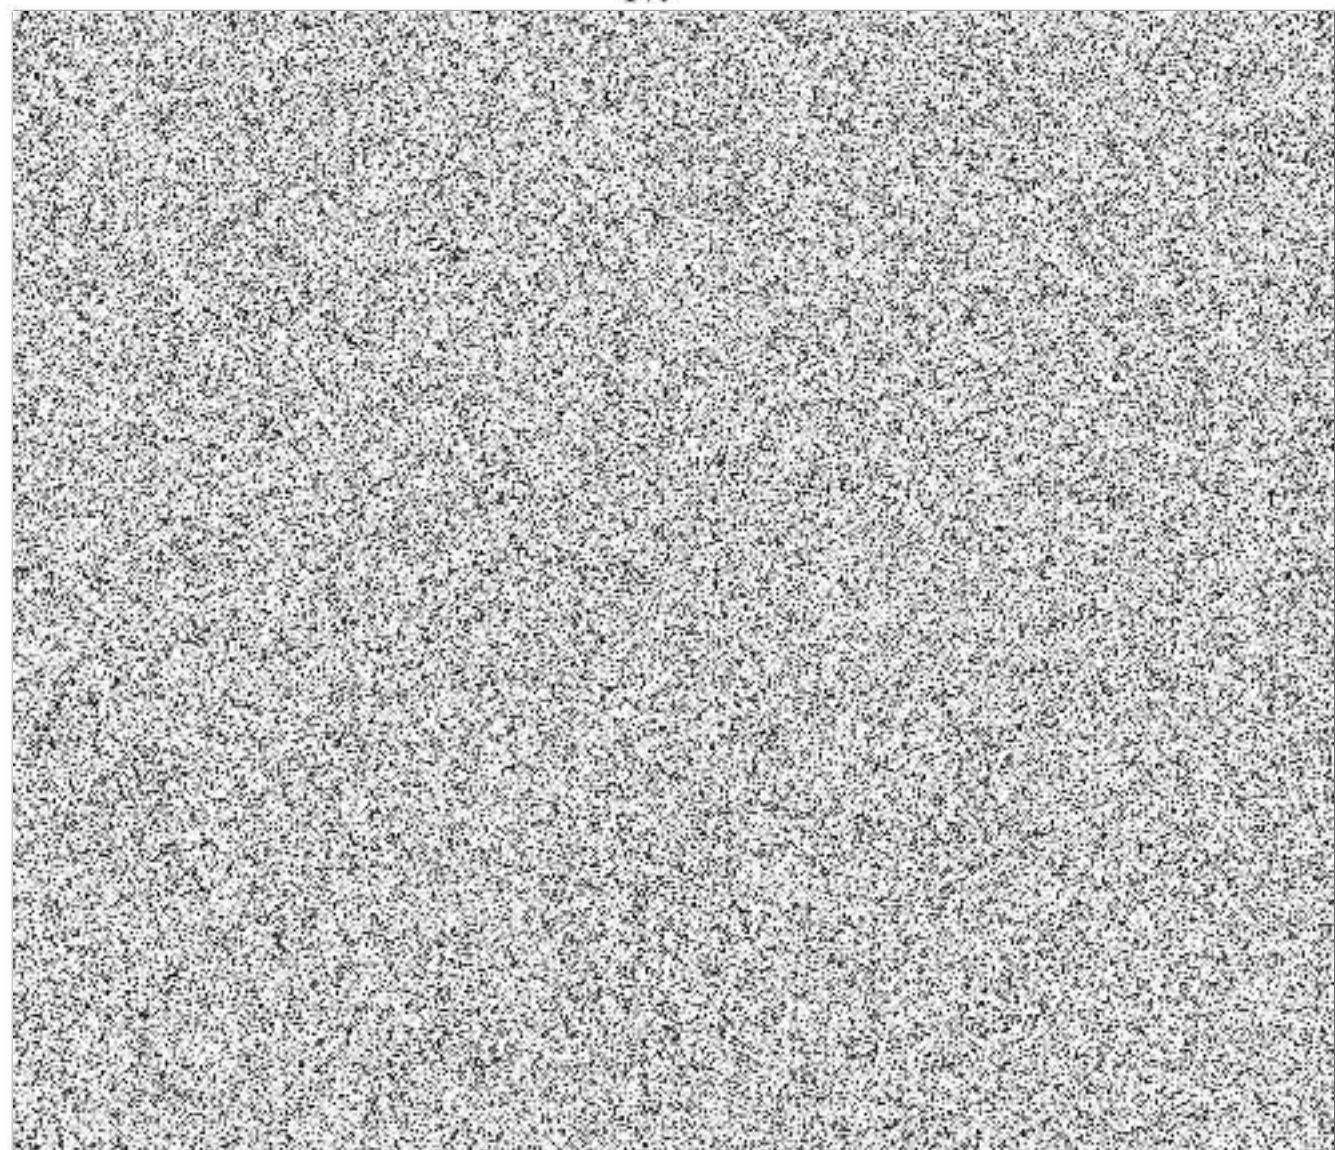

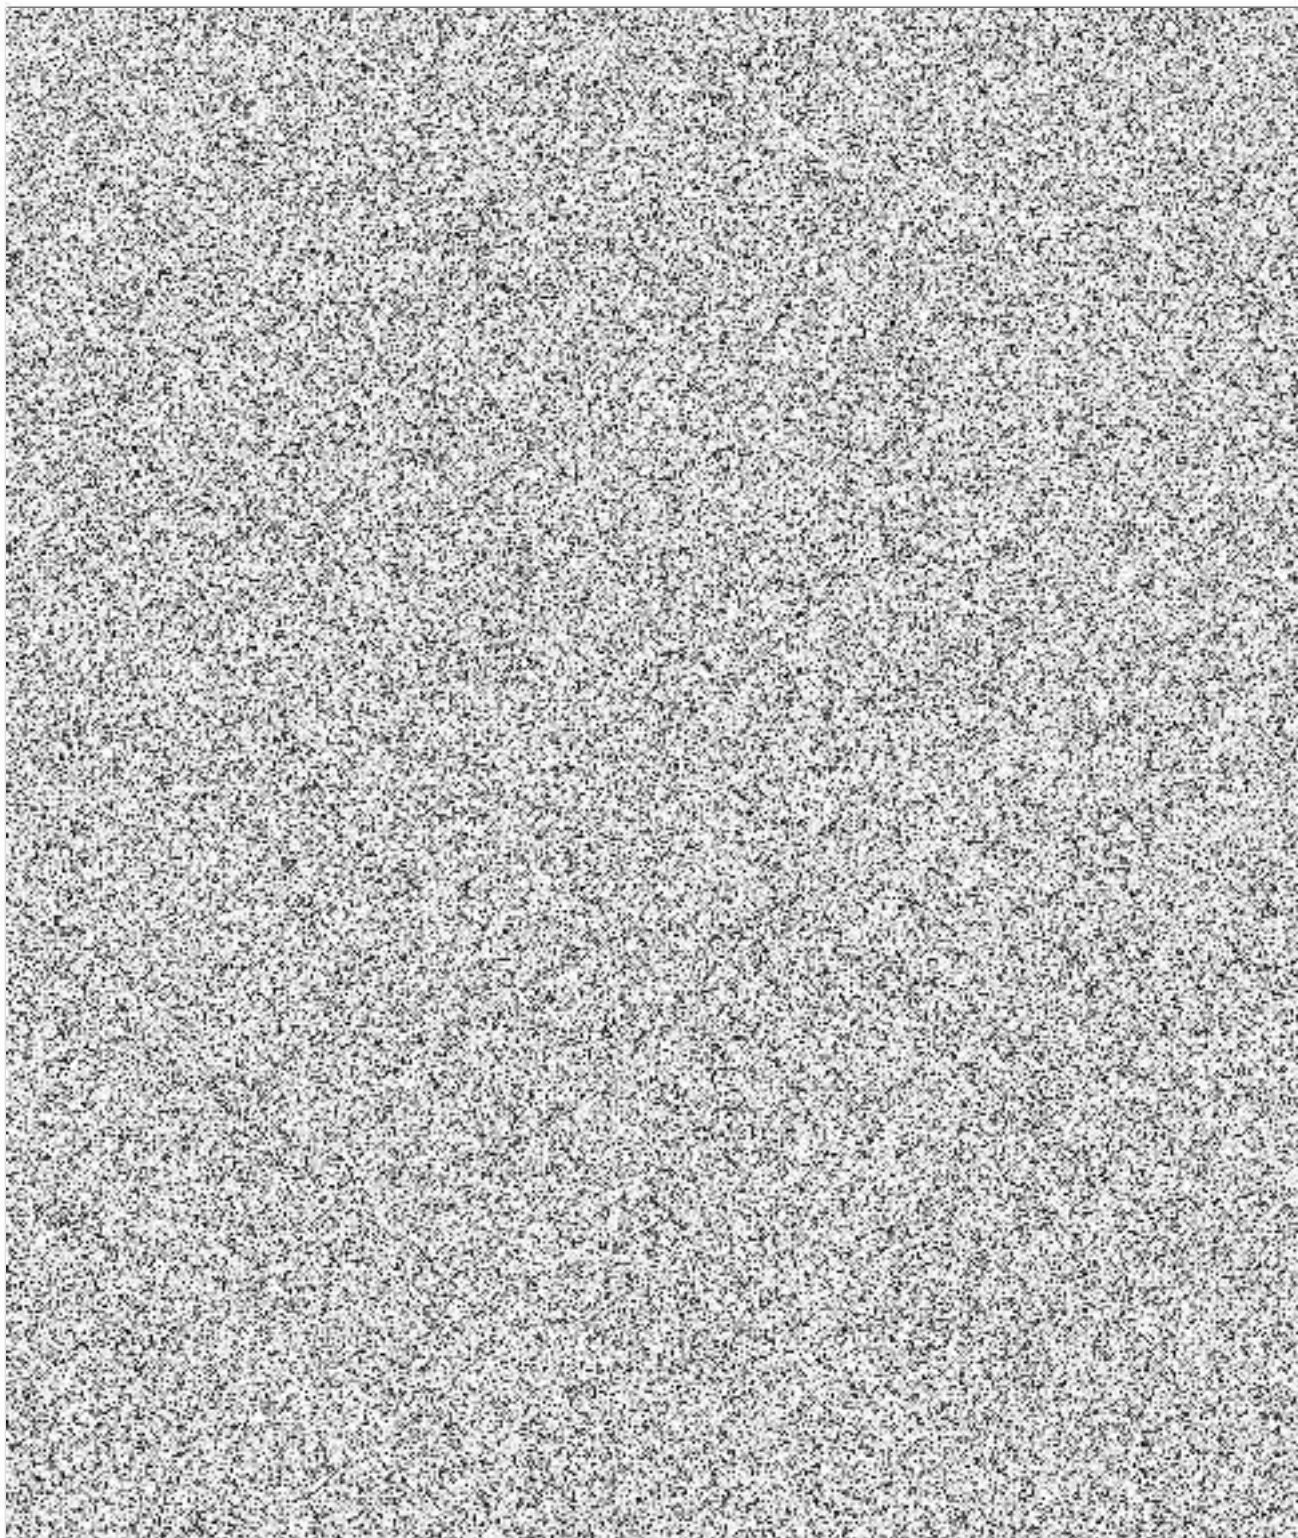

¹⁵ TALEB, Nassim, Nicholas. *Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí*. Praha: Paseka, 2011, s. 8 [cit. 13. 6. 2024].

¹⁶ Srov. LAVRUSHIN, Konstantin. *Změny obchodních smluvních závazkových vztahů v důsledku vnějších okolností* [online]. Brno, 2017, s. 154 a násl. [cit. 13. 6. 2024]. Dostupné z: <https://is.muni.cz/th/uhaoz/>.

¹⁷ Srov. JAMPÍLEK, František. *Clausula rebus sic stantibus v závazkovém právu*. [online]. Praha, 2022, s. 106 [cit. 13. 6. 2024]. Dostupné z: <https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/171724>

¹⁸ PAPUNEN, Annastiina. European Council Oversight Unit. Economic impact of Russia's war on Ukraine: European Council response, 23. 2. 2024 [cit. 13. 6. 2024]. Dostupné z: [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI\(2024\)757783](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2024)757783).


V.
Další okolnosti

¹⁹ https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A1_invaze_na_Ukrajinu.


²⁰ Tamtéž.


²¹ TALEB, Nassim, Nicholas. *Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí*. Op. cit.

²² Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 14. 11. 1923, spis. zn. Rv I 1178/23.

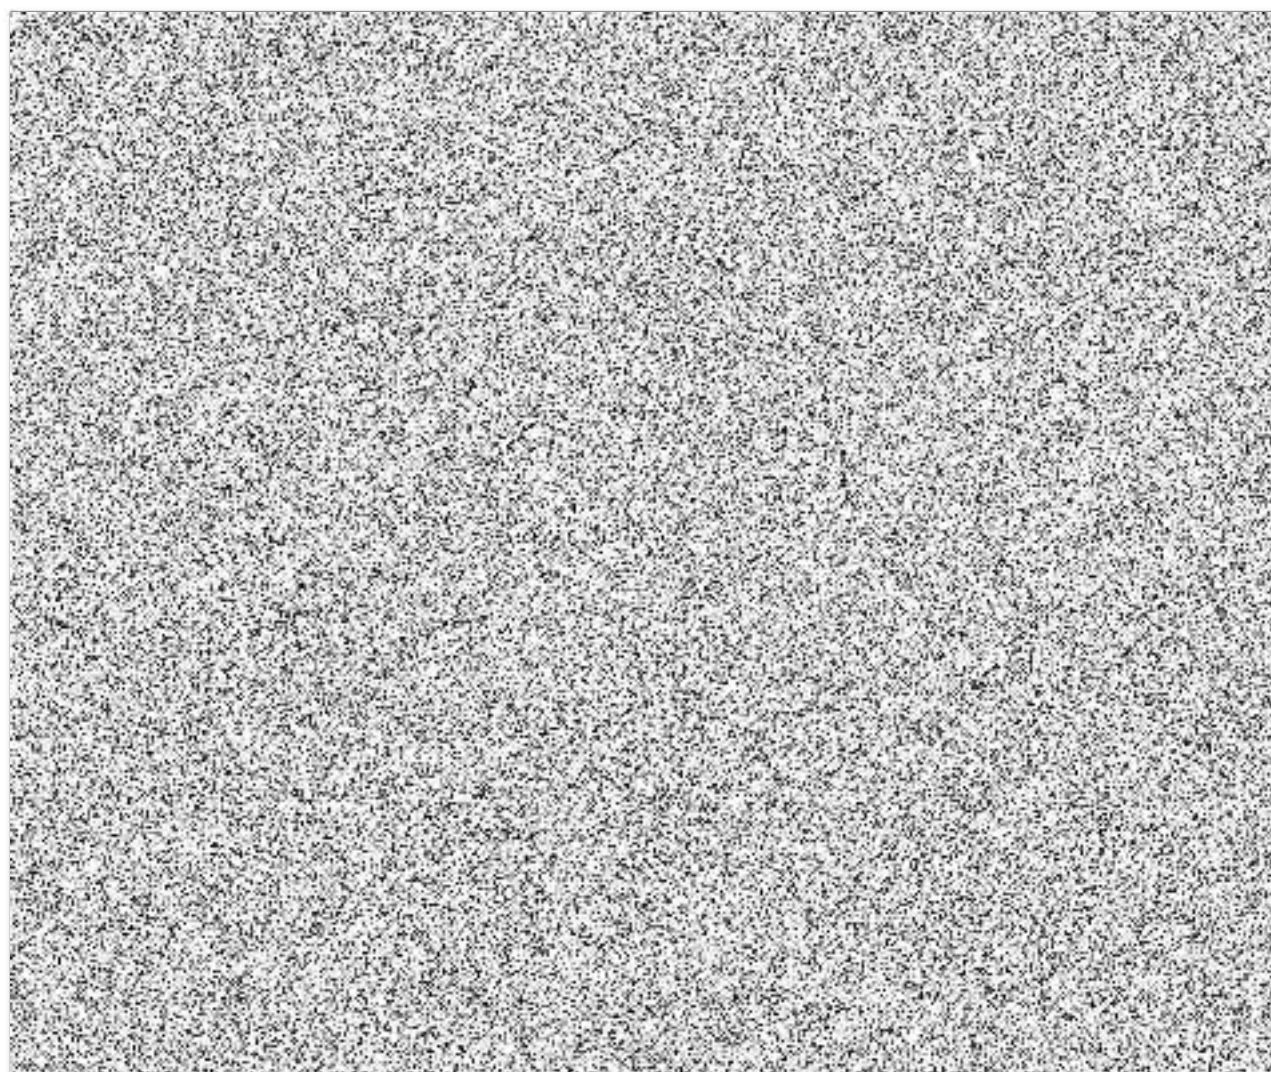

VI. Shruti

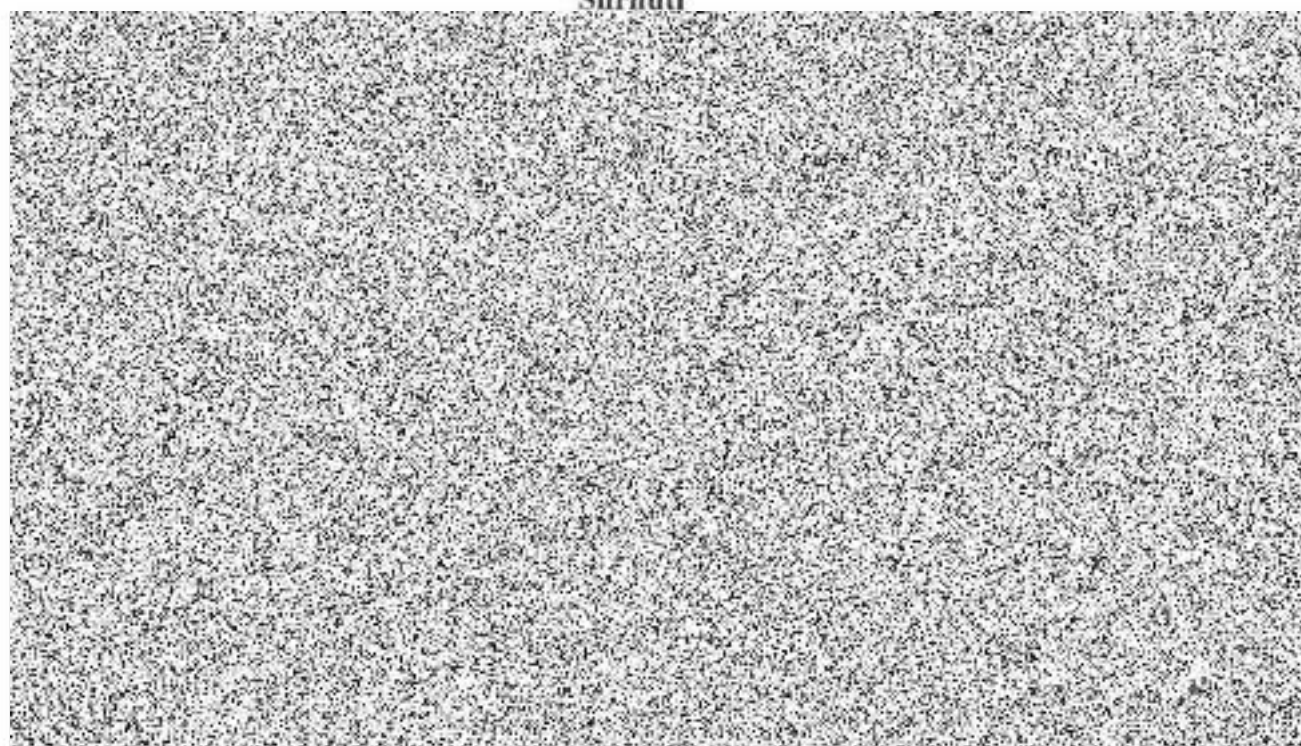




VII.
Návrh žalobců

(49) Žalobci z důvodů uvedených výše navrhuje, aby soud vydal následující

rozsudek:

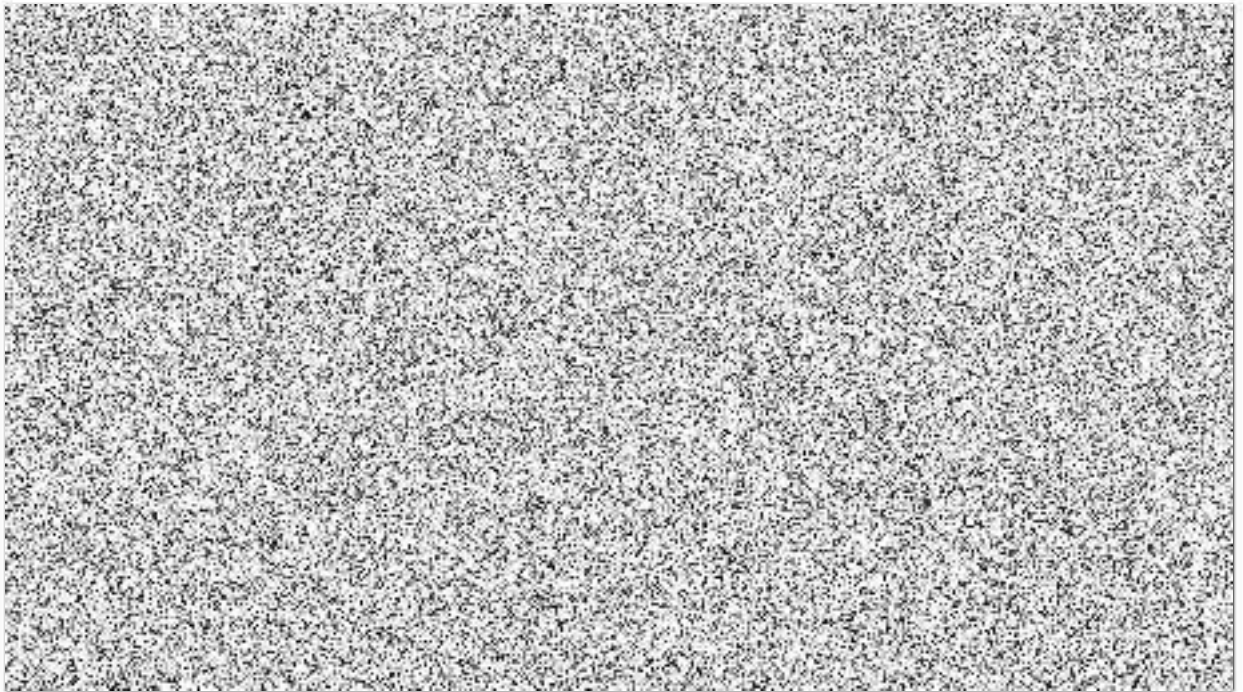

V Praze dne 19. 6. 2024

advokát

na základě plné moci za žalobce

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: [redacted] - vz.27+vz.341+ dopl. tvrz.čl.40 új. 25/9
ID zprávy: 1377396698
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 25.6.2024 v 13:37:20
Datum a čas doručení: 25.6.2024 v 14:34:35

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, CZ
ID schránky: 8aiabyn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: [redacted]
Naše spisová značka: [redacted]
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

O341009.PDF (113,71 kB)

N018010.PDF (194,26 kB)

20240619-GG-doplne_ni_tvrzeni_z_alobcu_onove_skutec_nosti.pdf (2,13 MB)

Doručenka datové zprávy

Předmět: [redacted] - vz.27+vz.341+ dopl. tvrz.čl.40 új. 25/9
ID zprávy: 1377396698
Datum a čas dodání: 25.06.2024 v 13:37:20
Datum a čas doručení: 25.06.2024 v 14:34:35

Adresát: [redacted] advokát, Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 11000 Praha 1, CZ
ID schránky: [redacted]

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: [redacted]
Naše spisová značka: [redacted]
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

25.06.2024 v 13:37:20 EV0: Datová zpráva byla podána.
25.06.2024 v 13:37:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
25.06.2024 v 14:34:35 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Spisová značka



Obvodní soud pro Prahu 10 se sídlem ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10-Vršovice

	Městská část Praha 10
(adresát)	(účastník)

PŘEDVOLÁNÍ

Ve věci účastníků

- a) **GEOSAN GROUP a.s.**, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupena: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
- b) **VISTORIA CZ a.s.**, Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
zastoupena: U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

proti

Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zastoupena: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

změnu závazku

se nařizuje jednání

na den 25.09.2024 v 13:00 hodin

**u podepsaného soudu v místnosti Obvodního soudu pro Prahu 10 č. dv. 1.302 I. patro
Justiční areál Na Míčáncích**

K uvedenému jednání jste předvolán jako **zástupce účastníka řízení** a předvolání současně platí pro Vámi zastupovaného účastníka řízení. Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání a nedostaví-li se a ani včas z důležitého důvodu nepožádá o odročení jednání Vámi zastupovaný účastník (o důvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje soud), může soud věc projednat a rozhodnout ve Vaší nepřítomnosti a v nepřítomnosti Vámi zastupovaného účastníka řízení.

V projednávané věci lze uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení tohoto jednání, v případě, že došlo k přistoupení dalšího účastníka nebo záměně účastníka, do skončení prvního jednání, které bylo nařízeno po přistoupení nebo záměně účastníka a které se ve věci konalo. Z důležitých důvodů Vám soud může na Vaši žádost poskytnout lhůtu k doplnění tvrzení o skutečnostech rozhodujících pro věc, k podání návrhů na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností. K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlídnout, jen jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností předsedou senátu v průběhu jednání podle § 118a odst. 1 až 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

K jednání s sebou přineste toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz totožnosti. Jste-li advokátem nebo notářem, jste povinen mít u sebe průkaz advokáta nebo notáře.

Soud Vám ukládá, abyste při jednání předložil tyto listiny:

Příloha: poučení osoby předvolané nebo vyrozuměné o soudním jednání či jiném soudním roku v občanskoprávním řízení

Praha 24. června 2024

Mgr. Eva Přívracká, v.r.
soudkyně

Za správnost vyhotovení: Haifa Yamaniová

(O.s.ř. č. 27 - předvolání zástupce účastníka k prvnímu jednání ve věcech, v nichž může být jednáno bez přítomnosti účastníků, platí-li předvolání též pro zastupovaného účastníka, pokud nebylo provedeno přípravné jednání dle § 114c o.s.ř.)



POUČENÍ

OSOBY PŘEDVOLANÉ NEBO VYROZUMĚNÉ O SOUDNÍM JEDNÁNÍ ČI JINÉM SOUDNÍM ROKU V OBČANSKOPRÁVNÍM ŘÍZENÍ

V předvolání, vyznamení nebo opatření, které Vám bylo doručeno spolu s tímto poučením, je uvedeno, zda Vás soud předvolává/vyrozumívá jako účastníka řízení (např. žalobce, žalovaného), jako svědka v řízení týkajícím se jiných účastníků řízení, či případně jako tlumočníka, znalce či podpůrce účastníka řízení.

Jste-li zaměstnan/a,

oznamte svému zaměstnavateli, že jste předvolán/a. Pokud se jednání soudu (provádění důkazu) nemůžete zúčastnit mimo pracovní dobu, máte právo, aby Vám zaměstnavatel poskytl na tuto dobu pracovní volno bez náhrady mzdy. Budete-li v rámci svědeckého nebo náhrady nákladů řízení žádat náhradu ušlého výdělku za dobu účasti u soudu, nechte si u svého zaměstnavatele potvrdit následující:

Potvrzení zaměstnavatele

Potvrzuji, že předvolaný/předvolaná
má průměrný hrubý hodinový výdělek ve výši Kč. Jeho pracovní doba v den předvolání trvá od do včetně neplacené přestávky na jídlo a oddech v trvání minut na pracovišti v

Bylo mu poskytnuto volno bez náhrady mzdy (platu).

Je pojištěncem zdravotní pojišťovny - kód název a
☐ bude / ☐ nebude za něj / ni odvedeno za den účasti u soudu zdravotní pojištění alespoň z minimálního vyměřovacího základu ve smyslu § 3 odst. 4 zák. č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. V dne

.....
razítko a podpis

Jste-li výdělečně činný jinak než v pracovním poměru

nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru a žádáte-li náhradu ušlého výdělku za dobu účasti u soudu, předložte poslední pravomocný platební výměr orgánu vykonávajícího správu daně, jenž předchází dni, za který budete náhradu ušlého výdělku požadovat. Pokud nelze výši ztráty na výdělu tímto způsobem prokázat, přísluší náhrada za ztrátu na výdělu za hodinu v částce odpovídající výši minimální mzdy za hodinu podle nařízení vlády o minimální mzdě, nejvýše však osminásobek této částky za jeden den.

Jestliže k cestě k soudu použijte hromadný dopravní prostředek (např. autobus)

a budete žádat náhradu jízdného, přineste s sebou všechny použité jízdenky. Pokud z vážných důvodů nemůžete pro cestu k soudu použít hromadného dopravního prostředku, sdělte to soudu. Soud může určit použití i jiného způsobu dopravy.

Použijete-li s předchozím souhlasem soudu silniční motorové vozidlo,

bude Vám poskytnuta náhrada jízdních výdajů ve výši odpovídající ceně jízdného za určený hromadný dopravní prostředek. V tomto případě je nutné soudu předložit (velký) technický průkaz tohoto vozidla, aktuální doklad o nákupu pohonných hmot a oznámit přesný počet ujetých kilometrů.

Jste-li osobou s omezenou schopností pohybu,

sdělte tuto skutečnost (např. telefonicky či emailem) nejlépe do 3 dnů ode dne doručení tohoto předvolání soudu, aby Vám mohl být zajištěn dostatečně komfortní přístup (např. bezbariérová jednací síň či informace o možnostech pohybu po budově soudu).

Jste-li předvoláván jako účastník řízení,

máte právo se vyjádřit k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Rozvrh práce každého soudu je veřejně přístupný.

Můžete požadovat náhradu nákladů, které Vám v řízení vzniknou, zejména hotové výdaje (včetně soudního poplatku), ušlý výdělek, náklady důkazů a odměnu za zastupování advokátem nebo notářem. O náhradě nákladů řízení rozhodne soud v rozhodnutí, kterým se u něj řízení končí.

Jste-li předvoláván jako svědek,

máte právo na náhradu hotových výdajů a ušlého výdělku (svědecké). Právo na svědecké je třeba uplatnit u soudu nejpozději do tří dnů od výslechu nebo ode dne, kdy Vám bude oznámeno, že k výslechu nedojde, jinak zaniká. O nároku na svědecké rozhodne soud. Přiznanou náhradu za ušlý výdělek osobám v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru a přiznanou náhradu hotových výdajů a přiznanou náhradu za ušlý výdělek osobám výdělečně činným jinak než v pracovním poměru nebo v poměru obdobném pracovnímu poměru vyplátí soud.

Určení výše svědeckého

Svědkoví/svědkyň vypláťte:

- ☐ na bankovní účet č. /
- ☐ na adresu
- ☐ v hotovosti
- ☐ jízdné Kč,
- ☐ stravné za hodin Kč,
- ☐ nocležné Kč,
- ☐ náhradu prokázaného ušlého výdělku podle potvrzení zaměstnance/OSVČ za hodin při
průměrném hrubém výdělku Kč za hodinu - celkem Kč.

.....

předseda senátu

Pro záznamy účtárny soudu:

odečtená sražená daň dle zák. č. 586/1992 Sb. Kč

sražené zdravotní pojištění dle zák. č. 592/1992 Sb. Kč

K výplatě Kč

Potvrzuji přijetí částky:

.....

svědek

Florentinum, recepce A
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika
Tel.: +420 255 000 111

Titanium Business Complex
Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 545 423 420

Centrum Zuckermandel
Žitkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900

Obvodnímu soudu pro Prahu 10

28. pluku 1553/29b

100 83 Praha 10

Ke sp. zn.:



V Praze dne 11. července 2024

Žalobce a): **GEOSAN GROUP a.s.**, IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Žalobce b): **VISTORIA CZ a.s.**, IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město

oba právně zastoupeni  advokátem, ev. č. ČAK 
společníkem TFP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

Žalovaná: **Městská část Praha 10**, IČO 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice

právně zastoupena  advokátem, ev. č. ČAK 
společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

o změnu závazku

**Žádost žalované o zaslání příloh k replice
žalobců ze dne 19. 6. 2024**

Doručeno prostřednictvím datové schránky

Bez příloh; Plná moc ve spise

1. Soud doručil žalované dne 25. 6. 2024 procesní podání žalobců ze dne 19. 6. 2024 nazvané jako Žaloba na změnu závazku; Replika žalobců; Doplnění tvrzení žalobců o nové skutečnosti (dále jen „**Replika žalobců**“).
2. Podle titulní strany Repliky žalobců byly současně do soudního spisu založeny následující přílohy:
 1. smlouva o dílo č. 2021/OMP/1351;
 2. dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351(společně dále jen „**Přílohy k Replice žalobců**“).
3. **Žalovaná tímto zdvořile žádá výše nadepsaný soud o zaslání Příloh k Replice žalobců,** a to elektronicky do datové schránky právního zástupce žalované.

Za Městskou část Praha 10



advokát

na základě plné moci

Číslo smlouvy Objednatele: 2021/OMP/1351

Číslo smlouvy Zhotovitele: 529



SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

1. Městská část Praha 10

Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou

Se sídlem: Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČO: 000 63 941

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí odboru majetkoprávního

Ve věcech technických je oprávněn jednat: JUDr. Ladislav Pokorný, 
OMP

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Auböck s.r.o.

Zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČO: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 13372

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.

Číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  výrobní ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Článek 1. Základní ustanovení a účel smlouvy

- 1.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**Občanský zákoník**“), práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
- 1.2. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanovili tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o DPH**“), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu Zákona o DPH.
- 1.3. Objednatel hodlá realizovat investiční akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, která bude spolufinancována z prostředků Hlavního města Prahy (dále jen „**Projekt**“). Současně je Projekt spolufinancován Ministerstvem životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 (OPŽP) (dále jen „**Poskytovatel dotace**“). Projekt je u Poskytovatele dotace veden pod dvěma registračními čísly CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011235 (dále jen „**Projekt 1**“) a CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011107 (dále jen „**Projekt 2**“).
- 1.4. V rámci Projektu má být snížena energetická náročnost objektu Základní školy Olešská, na adrese Olešská 2222/18, Praha 10 Strašnice, parc. č. 4314/1 k.ú. Strašnice, v takovém rozsahu a kvalitě, aby odpovídala Projektové dokumentaci dle čl. 2. odst. 2.2. písm. a) této smlouvy (dále jen „**Stavba**“).
- 1.5. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Energetická úspora objektu ZŠ Olešská II“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- 1.6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. 5 této smlouvy.
- 1.7. Zhotovitel bere na vědomí, že při zhotovení Stavby budou přítomni i jiní zhotovitelé či dodavatelé, kteří budou realizovat svá plnění (např. dodávky fotovoltaiky) a zavazuje se spolupracovat a koordinovat svou činnost s těmito zhotoviteli či dodavateli.

- 1.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
- a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a smlouvě;
 - b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije subsidiárně.
- 1.9. Objednatel uplatňuje zásady odpovědného zadávání veřejných zakázek v souladu se svým postavením vymezeným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Veřejné zakázky zadávané Objednatelům akcentují zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací, které jsou uplatňovány transparentně a přiměřeně při zohlednění zásad účelného, hospodárného a efektivního vynakládání finančních prostředků Objednatelům.

V rámci plnění této smlouvy Objednatel zohlednil zásady odpovědného veřejného zadávání, které se mimo jiné projevují v těchto ujednáních této smlouvy:

- *Sjednání požadavku na dodržování zásad BOZP dle čl. 7.25 této smlouvy,*
- *Sjednání možnosti přímé platby poddodavatelům dle čl. 6.16 této smlouvy,*
- *Sjednání požadavku na zajištění nezbytných opatření k ochraně životního prostředí ze strany Zhotovitele při realizaci Veřejné zakázky dle čl. 7.14 této smlouvy,*
- *Stanovení požadavku na využití ekologicky nezávadných materiálů, jak je uvedeno v čl. 8.3. zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a v čl. 7.26 této smlouvy.*

Zhotovitel je povinen zajistit výše uvedené požadavky Objednatelům zohledňující zásady odpovědného veřejného zadávání při plnění této smlouvy jak Zhotovitelem, tak také jeho poddodavateli.

S ohledem na povahu předmětu plnění Veřejné zakázky a postavení Objednatelům nejsou v této smlouvě uplatněny jiné aspekty odpovědného veřejného zadávání.

Článek 2

Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatelům na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas v dohodnutém termínu dle čl. 3 této smlouvy
- a) zhotovit Stavbu a vypracovat dílenskou a výrobní dokumentaci (dále jen „**DVD**“) a projektovou dokumentaci skutečného provedení Stavby (dále jen „**DSPS**“) dle

vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdější předpisů (dále jen „**Vyhláška**“), vyvstane-li nutnost jejich zpracování (dále jen „**Dílo**“) a

b) poskytovat záruční plnění k Dílu.

2.2. Zhotovením Stavby se rozumí

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby včetně dodávky, montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen „**Staveniště**“), zajištění bezpečnostních opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění Stavby ve stupni dle přílohy č. 13 Vyhlášky s názvem „**Základní škola Olešská**“, která byla zpracována společností OLAF studio, s.r.o., se sídlem Moravská 1687/34, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČO: 27878023 (dále jen „**Projektová dokumentace**“), oceněným výkazem výměr a pravomocným stavebním povolením; všechny posledně uvedené dokumenty tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (příloha č. 1a až 1c této smlouvy) jako její nedílná součást. Projektovou dokumentaci obdržel Zhotovitel ještě před uzavřením této smlouvy. Zhotovení Stavby zahrnuje stavební objekty uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.

b) geodetické zaměření Stavby.

2.3. Zhotovení Díla, resp. Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti Zhotovitele:

- a) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby;
- b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu třetích osob a majetku (tj. veřejnosti, zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou);
- c) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- d) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného; bude-li nezbytné v souvislosti se zahájením provádění Díla na Staveništi umístit nebo přemístit dopravní značení, provede tyto práce na vlastní náklady Zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí projednání změn a úprav dopravního značení s příslušnými orgány veřejné správy a dále zajistí průběžné udržování tohoto dopravního značení;
- e) zajištění označení Staveniště v souladu s obecně závaznými právními předpisy; Zhotovitel je dále povinen označit Stavbu v době jejího provádění informací, že Dílo

je spolufinancováno z prostředků Evropské unie a z vlastních prostředků Objednatele dle čl. 14 této smlouvy;

- f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému Dílu, včetně pořízení protokolů o průběhu zkoušek, předání protokolů o provedení zkoušek Objednateli, a to ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- h) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle relevantních ČSN, jejichž závaznost si smluvní strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- i) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět smlouvy vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči;
- j) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště;
- k) zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí, bude-li potřebné;
- l) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na Staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné;
- m) likvidace veškerého odpadu a nečistot vzniklých prováděním Díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen **„Zákon o odpadech“**);
- n) průběžné odstraňování veškerého znečištění a poškození komunikací (i veřejných), ke kterým dojde v souvislosti s prováděním Díla, a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy;
- o) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.); před zahájením stavebních prací je

Zhotovitel povinen provést pasport povrchů dotčených Stavbou vč. fotodokumentace a tento předat Objednateli v digitální podobě na CD nosiči;

- p) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných Objednatel Zhotoviteli vč. Projektové dokumentace;
- q) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD nosiči;
- r) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím plnění předmětu smlouvy Objednatel;
- s) ostatní činnosti nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla.

2.4. Pokud tato smlouva ukládá povinnost Zhotovitele předat určité doklady, údaje a informace na CD, zavazuje se Zhotovitel respektovat následující pravidla:

DVD bude provedena v částech předepsaných a potřebných Projektovou dokumentací a musí být zpracována v souladu se všemi povoleními Stavby a v souladu s Projektovou dokumentací. DVD bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.dgn, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel. Toto předání DVD však neznamena dílčí předání díla dle § 2606 Občanského zákoníku.

2.5. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad:

- a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby;
- b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou označeny nápisem „beze změn“;
- c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele;
- d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s Technickým dozorem stavby (dále jen „**TDS**“), osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**AD**“) a zástupcem Objednatele dle přílohy č. 2 této smlouvy a jejich souhlasné stanovisko;
- e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí;
- f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného Díla. DSPS musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně

druh stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav;

- g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí Díla, členěný dle kusů s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době dle Pokynu GFR č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů);
- h) součástí DSPS bude dále výkresová dokumentace a technické zprávy všech profesí pomocné (přidružené) stavební výroby (PSV) v podrobnostech provedení dokumentace pro provádění stavby;
- i) součástí DSPS bude podrobná fotodokumentace konstrukcí a prací, které byly v průběhu prací zakryty dalšími konstrukcemi (zejména rozvody TZB, hydroizolace, tepelné izolace apod), která bude roztržena dle časového harmonogramu stavby (po kalendářních měsících).

DSPS bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a *.dgn, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel. Toto předání DSPS však neznamená dílčí předání díla dle § 2606 Občanského zákoníku.

2.6. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje: geodetické zaměření, včetně zpracování geometrického plánu skutečného provedení Stavby, které bude provedeno a ověřeno oprávněnou osobou podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno Objednateli ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči s tím, že geometrický plán bude zpracován pro účely vkladu dokončené Stavby do katastru nemovitostí a bude potvrzen příslušným katastrálním úřadem; součástí tohoto zaměření jsou:

- a) geodetické zaměření skutečného provedení jednotlivých stavebních objektů, které jsou součástí Díla;
- b) doklady o vytýčení Stavby;
- c) pasport Stavby určený k zanesení do systému Objednatele (AMI) ve formátu *.dgn a *.dwg.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem (resp. autory) DVD a DSPS oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn DVD a DSPS jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami

této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím DVD či DSPS dle této smlouvy. Zhotovitel poskytuje licenci dle této smlouvy jako výhradní. Licence se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta v ceně za splnění plnění dle smlouvy.

- 2.8. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít pouze takové Dílo, které je provedeno bez vad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému užívání, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. 5. této smlouvy; tím není dotčena odpovědnost Zhotovitele za odstranění posledně uvedených vad. Vadami nebránícími řádnému užívání Díla se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji (dále jen „**Drobné vady**“).

Článek 3

Lhůta plnění. Harmonogram

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést plnění dle této smlouvy v souladu s časovým harmonogramem postupu provedení Díla, ve kterém jsou stanoveny časově i věcně veškeré významné termíny postupu provedení Díla (dále jen „**Harmonogram**“). Harmonogram obsažený v nabídce Zhotovitele a zpracovaný dle požadavků Objednatele uvedených v zadávací dokumentaci na Veřejnou zakázku tvoří přílohu č. 3 této smlouvy jako její nedílná součást. Zhotovitel je povinen v harmonogramu zohlednit skutečnost, že práce ve vnitřních prostorách ZŠ Olešská týkající se VZT, el. rozvodů, SDK konstrukcí, výmalby a úklidu vnitřních prostor, výměny meziokenních výplní na pavilonu „B“, úpravy vstupu do budovy (úprava fasády označená jako D. 2.1) (dále jen „**druhá etapa Díla**“) mohou probíhat výlučně o letních prázdninách, tedy v období mezi 1. 7. a 23. 8. 2022. Ostatní práce budou provedeny do 2 měsíců do účinnosti smlouvy (dále jen „**první etapa Díla**“).
- 3.2. Zhotovitel se dále zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto:
- a) Lhůta k zahájení provedení první etapy Díla
 - nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště; nejdříve však 20. 9. 2021, přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje v nich řádně pokračovat
 - b) Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí první etapy Díla

- nejpozději 30 kalendářních dnů před koncem Finální lhůty
- c) Lhůta k odstranění případných drobných vad
 - ve lhůtě stanovené Objednatelem
- d) Lhůta k úplnému vyklizení Staveniště
 - nejpozději 20 kalendářních dnů po předání a převzetí Díla (Finální lhůta první etapy)
- e) Lhůta k zahájení provedení druhé etapy Díla
 - nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště
- f) Lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí druhé etapy Díla
 - nejpozději 30 kalendářních dnů před koncem Finální lhůty
- g) Lhůta k odstranění případných drobných vad
 - ve lhůtě stanovené Objednatelem
- h) Lhůta k úplnému vyklizení Staveniště
 - nejpozději 20 kalendářních dnů po předání a převzetí Díla (Finální lhůta druhé etapy)

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt obou etap Díla.

3.4. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo změnit závazné termíny vyplývající z Harmonogramu dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy, a to v následujících případech:

- z důvodu zvláště nepříznivých anebo nevhodných klimatických podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) – stanice Praha-Karlov neodpovídají běžným klimatickým podmínkám (tj. vymykají se dlouhodobým denním teplotním průměrům a/nebo srážkám - ať už dešťovým či sněhovým - v období a místě provádění Díla, a to dle údajů o územních teplotách a/nebo územních srážkách dostupných na stránkách ČHMÚ <http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/uzemni-teploty>), a které zároveň Zhotoviteli prokazatelně brání provádění příslušné části Díla; omezení postupu prací vlivem uvedených zvláště nepříznivých anebo nevhodných klimatických podmínek bude ze strany Zhotovitele doloženo a Objednatelem posuzováno ve vztahu k možnosti provádění Díla dle technologických postupů, které jsou pro danou část Díla předepsány, ať už ze strany právních předpisů nebo

technických norem (zejm. ČSN), ať už tyto jsou ve smlouvě a jejích přílohách výslovně uvedeny či nikoliv.

- z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn Díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ a které mají prokazatelný vliv na provádění Díla, resp. termín provádění Díla, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení.
- z důvodu prodloužení na straně Objednatele při plnění povinností dle této smlouvy, a to o dobu jeho trvání, přičemž se jedná zejm. o povinnosti dle čl. 5.6. 7.6, 14.9, 14.10, 14.11 smlouvy, a to vždy o dobu tohoto prodloužení.
- z důvodu prodloužení délky zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, které by mělo nepřiměřený vliv na provedení první etapy prací v termínu dle čl. 3 odst. 3.1 a 3.2 této smlouvy, a to o dobu průtahů v zadávacím řízení oproti předpokládanému datu zahájení dne 20. 9. 2021.
- z důvodu změny termínu na provedení první etapy prací v případě, že by následně zasahovaly do druhé etapy během letních prázdnin v roce 2022 dle odst. 3.1 a 3.2 smlouvy, a to o dobu zásahu provedení první etapy prací do druhé etapy oproti předpokládanému datu zahájení dne 1. 7. 2022.

Začátek běhu doby, po kterou nebudou práce dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy z důvodů uvedených v odst. 3.4 tohoto článku smlouvy prováděny, bude potvrzena zápisem smluvních stran do stavebního deníku a následně (po odpadnutí zde specifikovaných překážek) ukončena výzvou Objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány smluvními stranami. Přerušeni doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

3.5. Harmonogram realizace Stavby

- a) Dospěje-li v průběhu provádění Díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací na Stavbě neodpovídá Harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil návrh aktualizovaného Harmonogramu tak, aby byly splněny závazné termíny postupu Stavby dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů) vyhovět. Závazné termíny dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy je však možné měnit pouze za podmínek stanovených touto smlouvou.
- b) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a Objednateli nebo TDS předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, a to vždy před zahájením příslušných prací dle Harmonogramu v rámci provádění Díla. Technologický postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. Příslušné práce je možné provést pouze po schválení daného technologického postupu či technické metody

Objednatelem.

- 3.6. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), TDS, Objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu uvedenou v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy.

Článek 4

Místo plnění

Místem realizace Stavby je areál Základní školy Olešská, na adrese Olešská 2222/18, Praha 10 Strašnice, parc. č. 4314/1 k.ú. Strašnice (dále jen „**ZŠ Olešská**“), přičemž podrobné vymezení místa zhotovení Stavby je obsaženo v Projektové dokumentaci.

Článek 5

Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 5.1. Celková cena za zhotovení Stavby (dále jen „**Cena za zhotovení Stavby**“) se sjednává takto:

Cena celkem **49 846 270,91 Kč bez DPH**

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e Zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

- 5.2. Pro obsah a rozsah sjednané Ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného výkazu výměr, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1b.
- 5.3. Cena za zhotovení Stavby, jakož i jednotkové ceny zpracované v oceněném výkazu výměr obsahují veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. Cena za zhotovení Stavby obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména (nikoliv však výlučně) i náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, ochranné pomůcky a prostředky, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnosti, náklady na bankovní záruky, náklady na provádění záručního plnění k Dílu včetně záručního servisu, náklady na publicitu, náklady na koordinační a kompletační činnost, poplatky spojené s likvidací odpadu, resp. s odvozem a uložením odpadu, jakékoli jiné poplatky související s realizací Díla, náklady na zajištění nezbytných dopravních opatření, popř. zábor veřejného prostranství či veřejné komunikace, náklady na zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a

zkušebního plánu Stavby, náklady Zhotovitele související s jeho účastí v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené Stavby nebo předčasné užívání Stavby, případně o vydání kolaudačního rozhodnutí se zajištěním právní moci, náklady na skladování, dovozní, balné, cla a zpětné odeslání obalů, náklady na veškeré údržbářské a opravárenské práce nutné pro provedení Díla, náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce Díla, náklady na zhotovení DVD, DSPS, jakož i další dodavatelské dokumentace (např. konstrukční, dílenské a montážní výkresy kovových konstrukcí, výrobků, PSV, lešení atd.). Cena za zhotovení Stavby obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k DVD a DSPS.

5.4. Cena za zhotovení Stavby je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit. Objednatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena a odvedena v souladu s platnými právními předpisy. DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, a to v příslušné sazbě dle Zákona o DPH. Ke dni podpisu této smlouvy činí výše sazby DPH za zhotovení Stavby 21 %.

5.5. Cena za zhotovení Stavby může být změněna pouze:

- a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a výkazu výměr (dále jen „**vícepráce**“), nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění (dále jen „**méněpráce**“); to však vždy pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;
- b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá z této smlouvy; to však vždy pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;
- c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na sjednané ceny nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace předané Objednatel; to však vždy pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;
- d) smluvní strany se dohodly, že v případě změny sjednané ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek;
- e) dohodou smluvních stran v případě, že se v průběhu provádění Díla přestanou některé materiály či technologie uvedené v Projektové dokumentaci vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít; to však vždy pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ;

5.6. Způsob sjednání změny ceny

- a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Ceny za zhotovení Stavby,

je Zhotovitel povinen provést výpočet změny cen a předložit písemný požadavek na změnu sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, vč. popisu jiných materiálů nebo technologií, je-li to v daném případě relevantní, popřípadě oznámit Objednateli změnu ceny v případě změny sazeb DPH. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací vyjádří nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předložení oznámení Zhotovitele. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Díla je oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup dle písmene a) tohoto odst. 5.6. smlouvy se uplatní obdobně.

- b) Písemný požadavek Zhotovitele dle písm. a) tohoto odst. 5.6. nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení ceny v ostatních případech je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a za podmínek vyplývajících ze ZZVZ.
- c) V případě změn u prací, které jsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v Položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1b této smlouvy. V případě cenových změn u prací, které nejsou obsaženy v Položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny v cenové soustavě ÚRS (<http://www.cs-urs.cz>) pro příslušné období, ve kterém budou práce poptávány. V případě změn u prací, které nejsou obsaženy ani v Položkovém rozpočtu ani v cenové soustavě ÚRS, bude změna ceny stanovena na základě individuální kalkulace. Z popisu požadované stavební práce, dodávky či služby stanovené individuální kalkulací musí jednoznačně vyplývat požadované technické parametry, nebo specifika provedení.
- d) Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení cen stanovených v tomto článku smlouvy budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Veškeré změny Díla musí být v souladu se ZZVZ. Zhotovitel se zavazuje provést činnosti, jež jsou předmětem takových dodatků, až po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.
- e) O jiných změnách při provádění Díla a s tím souvisejících změnách cen se obě strany zavazují vždy uzavřít dodatek k této smlouvě. K jiným změnám Díla a cen nelze přihlížet. Zhotovitel se zavazuje provést činnosti, jež jsou předmětem takových dodatků, až po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě.
- f) V případě změny rozsahu Stavby je Zhotovitel povinen vždy vytvořit tzv. Technický list změny, který bude obsahovat popis uvedené změny a její zdůvodnění, podrobné vyčíslení hodnoty takové změny (formát oceněného výkazu výměr) a zajistit písemné stanovisko AD a TDS; Zhotovitel je povinen případně předložit i částečnou Projektovou dokumentaci, ve které bude taková změna řádně vyznačena, bude-li to v daném případě relevantní. Technický list změny je Zhotovitel povinen jej

Objednateli předložit jak v listinné, tak v elektronické podobě ve formátu XML XC4 a *.xlsx. Technický list změny bude po odsouhlasení Objednatelem opatřen podpisy Zhotovitele, AD a TDS a zástupců Objednatele. Vzor Technického listu změny je uveden v příloze č. 5 této smlouvy.

Článek 6

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude poskytovat před ani v průběhu plnění předmětu smlouvy žádné zálohy. Smluvní strany tímto výslovně vylučují použití § 2611 Občanského zákoníku.
- 6.2. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena postupně dle rozsahu řádně provedených činností Zhotovitele, a to vždy za uplynulý kalendářní měsíc s datem uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v daném měsíci v průběhu celé doby provádění Díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „**Průběžná faktura**“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném kalendářním měsíci. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude zjišťovací protokol, jehož součástí je soupis skutečně provedených prací a dodávek v příslušném měsíci, včetně vedlejších rozpočtových nákladů (dále jen „**Zjišťovací protokol**“). Tento soupis provedených prací a dodávek musí být oceněn podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1b této smlouvy (dále jen „**Soupis**“). Zjišťovací protokol a Průběžná faktura bude Objednateli předána kromě listinné podoby rovněž v elektronické podobě ve formátu xlsx. V případě, že bude v průběhu provádění Díla vyhotoven Technický list změny, bude rovněž nedílnou součástí Průběžné faktury a poskytnut Objednateli jak v listinné, tak v elektronické podobě ve formátu XML XC4 a *.xlsx.
- 6.3. **Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti** dle Zákona o DPH. Zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury bez uvedení daně z přidané hodnoty.
- 6.4. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu, vč. Zjišťovacího protokolu k odsouhlasení TDS, a to vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od uplynutí příslušného kalendářního měsíce, za nějž se Průběžná faktura vystavuje. Průběžná faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH a požadavky dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to podle jejich znění účinného v době jejich vystavení. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v Zákoně o DPH, s náležitostmi dle § 92a odst. 2 Zákona o DPH, náležitosti dle § 435 Občanského zákoníku a dále je třeba na fakturu uvést též tyto údaje:
- a) název Projektu „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, registrační číslo Projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011235 nebo

CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011107);

- b) informaci, že se jedná o Projekt spolufinancovaný z prostředků Evropské unie;
- c) kód a název rozpočtové položky Projektu;
- d) příloha – Zjišťovací protokol vč. Soupisu oceněného podle dohodnutého způsobu a podepsaného TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména označení kalendářního měsíce, za nějž je Soupis vystavován; počet měrných jednotek realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném měsíci; počet měrných jednotek provedených od zahájení prací na zhotovení Stavby do konce posledního předcházejícího fakturovaného období; počet měrných jednotek, které zbývá realizovat k dokončení prací k provedení Díla; fakturovanou částku (částky v Soupisu provedených prací musí číselně korespondovat s rozpočtem podle oceněného výkazu výměr); pokud se v uplynulém měsíci prováděla i případná změna Stavby (Díla), bude přílohou Průběžné faktury i Technický list změny takové změny.

Splatnost jakýchkoliv faktur Zhotovitele dle této smlouvy činí 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury odsouhlasené smluvními stranami Objednateli.

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že bude vystavovat průběžné a následně finální faktury na každý projekt samostatně. Na Projekt 1 pod registračním číslem: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011235 bude Zhotovitel fakturovat položky spojené se zateplením obálky a instalaci venkovního stínění a na Projekt 2 pod registračním číslem: CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/0011107 bude Zhotovitel fakturovat položky spojené se systémem nuceného větrání s rekuperací (VZT). Objednatel dodá rozdělení požadovaných položek k oddělené fakturaci, které budou vycházet z položkového rozpočtu, Zhotoviteli do 1. fakturace. Kontaktní osobou Objednatele pro fakturaci je



- 6.5. TDS je povinen se k Průběžné faktuře, vč. jejích příloh vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky k rozsahu, druhu a kvalitě provedených prací, jakož i formálním náležitostem příloh. Po odsouhlasení Průběžné faktury a jejích příloh ze strany TDS předá Zhotovitel příslušnou fakturu Objednateli.
- 6.6. Pokud bude Průběžná faktura obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny a potvrzeny, je Objednatel oprávněn tuto fakturu vrátit zpět Zhotoviteli dle odst. 6.11. tohoto článku.
- 6.7. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných ve lhůtě splatnosti, a to do výše 90 % Ceny za zhotovení Stavby. Zbývajících část Ceny za zhotovení Stavby bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě (pro účely této smlouvy jen „**Finální faktura**“).

- 6.8. Finální fakturu za realizaci plnění dle této smlouvy je Zhotovitel povinen vystavit do 7 kalendářních dnů od odstranění Drobných vad a vyklizení Staveniště v rámci druhé etapy Díla a splnění dalších podmínek plynoucích z Předávacího protokolu dle čl. 9 této smlouvy; pokud však Drobné vady nebyly při předání a převzetí Díla zjištěny, je Zhotovitel povinen vystavit Finální fakturu do 7 kalendářních dnů od podpisu protokolu o předání a převzetí Díla (Předávací protokol) a vyklizení Staveniště, přičemž z obsahu Předávacího protokolu bude zjevné, že Dílo bylo řádně dokončeno a nevykazuje žádné vady. Součástí Finální faktury je finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek po jednotlivých měsících, a to celkem ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD nosiči. Tento finální rozpočet i Finální faktura bude Objednateli předána kromě listinné podoby i v elektronické podobě ve formátu *.xlsx.
- 6.9. Na základě Finální faktury za zhotovení Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur (zádržné).
- 6.10. Objednateli bude Finální faktura předána po jejím odsouhlasení, vč. finálního rozpočtu ze strany TDS. Objednatel se zavazuje Finální fakturu uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, a to ve lhůtě splatnosti.
- 6.11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Průběžnou fakturu i Finální fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množství nebo kvalitativní údaje v přílohách faktur nebo ve finálním rozpočtu odsouhlaseném ze strany TDS. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.
- 6.12. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky, přičemž Zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení úroku z prodlení.
- 6.13. Opožděné uvolnění finančních prostředků z rozpočtu Poskytovatele dotace se nepovažuje za prodlení splatnosti faktur a nebude předmětem sankcí či důvodem pozastavení plnění ze strany Zhotovitele. V takovém případě Zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení úroku z prodlení ani jiných sankcí či nárok na odstoupení od smlouvy.
- 6.14. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 Občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke Zhotoviteli nepoužije. Zhotovitel touto smlouvou rovněž

přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

- 6.15. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění Díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění Díla. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění Díla a provede nezbytné a zabezpečovací činnosti tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném Díle. O dobu přerušení provádění Díla se prodlužuje lhůta pro splnění Díla. Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném Díle neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů) po obdržení písemného pokynu Objednatele. Přerušením provádění Díla není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit i nadále ostrahu Staveniště.
- 6.16. Objednatel si ve smyslu § 106 ZZVZ vyhrazuje právo na žádost poddodavatele uvedeného v příloze č. 4 smlouvy převést tomuto poddodavateli splatnou část Celkové ceny za provedení Stavby, a to za podmínky, že ke dni podání žádosti byl na majetek Zhotovitele prohlášen konkurz, případně, že se Zhotovitel ke dni podání žádosti ocitl v prodlení s platbou poddodavateli delším než 40 dnů. Podmínkou pro přímou platbu poddodavateli je písemná žádost poddodavatele, v níž poddodavatel doloží:
- a) titul, na jehož základě se přímé platby domáhá (tj. konkurz na majetek Zhotovitele, případně prodlení Zhotovitele s platbou poddodavateli),
 - b) právní titul, na jehož základě se poddodavatel podílí na provádění Díla,
 - c) doklady prokazující nárok na zaplacení příslušné platby od Zhotovitele (zejména doklad o realizaci příslušného plnění, fakturu),
 - d) číslo účtu, na který má být přímá platba poskytnuta.

Platby uhrazené Objednatelem poddodavateli v souladu s tímto odstavcem je Objednatel oprávněn započíst na svůj splatný závazek k úhradě příslušné části Ceny za zhotovení Stavby. Nevyužije-li Objednatel práva započtení platby uhrazené poddodavateli, případně toto započtení již není možné, je oprávněn svůj nárok na zaplacení příslušné částky uspokojit z bankovní záruky.

Článek 7

Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

- 7.1. Vlastníkem prováděného i dokončeného Díla je Objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem Díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele dnem předání a převzetí Díla Objednatelem.

- 7.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním Díla.
- 7.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna podrobně přezkoumat a zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace, zejména pak Projektovou dokumentaci, a to nejpozději před zahájením stavebních prací dle čl. 3 této smlouvy, a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Zhotovitel je povinen opětovně přezkoumat a zkontrolovat příslušnou technickou část předané dokumentace, zejména pak Projektovou dokumentaci před zahájením prací na jednotlivých částech Díla. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu Díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu Objednateli. Změny předmětu Díla a sjednaných cen jsou možné pouze za podmínek uvedených v čl. 5 a 6 této smlouvy. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 věta první Občanského zákoníku na svůj právní poměr, a Zhotovitel tak nemá právo v těchto případech od smlouvy odstoupit.
- 7.6. Objednatel se zavazuje v době provedení Díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na provedení Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na provedení Díla) vstup na místo pro provádění Díla.
- 7.7. Objednatel se zavazuje ve lhůtě do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy předat Zhotoviteli Staveniště. O předání Staveniště Zhotoviteli sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.
- 7.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku v přiměřené lhůtě odstranit. V případě, že tak Zhotovitel neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného charakteru jako Dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu dle této smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel se tímto dále výslovně zavazuje provést Dílo dle této smlouvy v dohodnutém

rozsahu, kvalitě a termínech. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN a ČSN EN ISO, včetně norem doporučujících. Veškeré materiály, dodávky a technologie nezbytné k provedení Díla budou odpovídat platným českým technickým normám, podmínkám dohodnutým v této smlouvě a zejména Projektové dokumentaci. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele učinit jakékoliv změny oproti Projektové dokumentaci, a to zejména pokud jde o materiály a technologie. Objednatel si vyhrazuje právo neakceptovat materiály, dodávky nebo technologie nesplňující výše uvedené jakostní parametry.

- 7.11. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci Díla dodáváno zboží, toto bude dodáno v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí Díla.
- 7.12. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi a ve všech ostatních prostorech ZŠ Olešská a na komunikacích, které bude využívat k přístupu na Staveniště, a to tak, že bude provádět pravidelný úklid tak, aby svou činností a jejími důsledky na jím užívané prostory ZŠ Olešská a komunikace neohrožoval a/nebo nepoškozoval majetek a/nebo životy a zdraví ostatních osob. Zároveň bude Zhotovitel průběžně svým jménem a na svůj náklad, v souladu s právními předpisy o nakládání s odpady zajišťovat likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s provedením Díla (stavební suť, použité obaly apod.) a rovněž zajišťovat odstraňování nečistot. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými právními předpisy.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje udržovat veškeré komunikace i veřejné, které bude používat v rámci plnění této smlouvy v pořádku a čistotě. V případě jejich znečištění či poškození uvede tyto komunikace do původního stavu. Pokud Zhotovitel nebo jiné osoby podílející se na provádění Díla komunikace znečistí či poškodí, je Zhotovitel povinen neprodleně (nejpozději do 2 kalendářních dnů) zajistit na své náklady jejich úklid či opravu.
- 7.14. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů), a za to, že při provedení Díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech provedení Díla dotčených. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími ze zhotovované Stavby.
- 7.15. Zhotovitel se zavazuje počínat si při provádění Díla tak, aby nebyla ohrožena ochrana umělecky či historicky cenných prvků, a to i v případě, že během provedení Díla Zhotovitel na takové prvky neočekávaně narazí; v takovém případě je o této skutečnosti povinen bezodkladně písemně vyrozumět Objednatele.

- 7.16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na provedení Díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; tyto skutečnosti je Zhotovitel povinen řádně ověřovat a vyžadovat jejich dodržování. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provedení Díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provedení Díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.17. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni jeho zaměstnanci, kteří se budou podílet na provedení Díla, měli platná povolení k výkonu práce v místě zhotovování Stavby dle obecně závazných právních předpisů, resp. aby všichni jeho zaměstnanci byli oprávněni k výkonu práce v místě zhotovování Stavby dle obecně závazných právních předpisů, a dále, aby tato povolení byla platná minimálně po dobu, kdy se příslušný zaměstnanec bude podílet na provedení Díla. K tomuto je Zhotovitel povinen zavázat všechny své poddodavatele a příp. i pod-poddodavatele. Dále je Zhotovitel povinen Objednateli předložit na vyžádání pracovní povolení těchto zaměstnanců, a to bezodkladně. V případě, že zaměstnanec nebude mít platné povolení k výkonu práce, může Objednatel požadovat jeho nahrazení, a to bez zbytečného odkladu. Rovněž je Zhotovitel povinen zajistit, aby všichni jeho poddodavatelé a pod-poddodavatelé byli oprávněni k provedení Díla dle obecně závazných právních předpisů po celou dobu, kdy se budou podílet na plnění předmětu této smlouvy.
- 7.18. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením Díla jde vždy plně k tíži a na náklady Zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení Díla zavinila k postihu příčinu.
- 7.19. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění Díla.
- 7.20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů, nesmí za Objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka) při realizaci Díla.

7.21. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- a) Kontrolní dny se budou konat dle potřeby, minimálně jednou týdně, přičemž konkrétní termíny budou stanoveny dohodou obou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně tak, že kontrolní den musí být stanoven na termín ne déle než za 5 pracovních dnů po doručení písemné žádosti o jeho provedení, není-li v žádosti termín pozdější. Kontrolní den může být rovněž iniciován AD, TDS či orgánem veřejné správy. Žádá-li o provedení kontrolního dne Zhotovitel, musí žádost doručit též TDS. Zhotovitel rovněž zajistí jednací místnost pro kontrolní den v prostorách zařízení Staveniště. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu. Kontrolní den řídí Objednatel nebo jím pověřená osoba (TDS), který též distribuuje zápisy z kontrolního dne a pozvánky na kontrolní den Zhotoviteli. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen Objednatel prostřednictvím TDS. Zápis podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran a TDS, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opačném případě musejí být opatření schválena statutárními orgány smluvních stran formou změn smlouvy; bez schválení statutárními orgány nejsou opatření účinná;
- b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná a doručena Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Ke kontrole zakrývaných prací doloží Zhotovitel veškeré výsledky, tedy i negativní výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by po zakrytí prací došlo k znepřístupnění jiných částí Stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží Zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí Stavby. Souhlas k zakrytí prací vydá Objednatel nebo TDS zápisem ve stavebním deníku, nelze-li tak učinit ihned, zpravidla do 24 hodin po jejich prověření;
- c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 kalendářních dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou zahrnuty v ceně Díla (v Celkové ceně). Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídít jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

- 7.22. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že v ZŠ Olešská v době provádění Díla mohou probíhat jiné stavební práce, přičemž Zhotovitel se zavazuje koordinovat provádění Díla s těmito stavebními pracemi.
- 7.23. Zástupce Poskytovatele dotace je oprávněn k účasti na kontrolních dnech a Zhotovitel se zavazuje umožnit jeho zástupcům vstup do všech prostor souvisejících s prováděním Díla.
- 7.24. Zhotovitel tímto dává Objednateli výslovný souhlas s pořizováním audio a videozáznamů v souvislosti s plněním této smlouvy a dále svolení s jejich případným využitím. Zhotovitel je povinen zajistit výslovný souhlas s pořizováním těchto záznamů a svolení s jejich případným využitím rovněž ze strany všech osob, které se budou podílet na provádění Díla. Objednatel se zavazuje každý pořízený audio a videozáznam předat Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jeho žádosti, a to v digitální podobě na CD nosiči. O tomto předání bude mezi smluvními stranami sepsán písemný záznam.
- 7.25. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat pravidla BOZP. Při ukončení Díla dle čl. 9 smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli do 5 pracovních dnů předložit zprávu o dodržování BOZP ve vztahu k Dílu.
- 7.26. Zhotovitel tímto prohlašuje, že během plnění předmětu smlouvy nebudou využity zakázané látky dle seznamu Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 8

Vedení stavebního deníku

- 8.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„Stavební zákon“**) a Vyhlášky. Do stavebního deníku se zapisují všechny údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě.
- 8.2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Záписы v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho zástupcem.
- 8.3. Zhotovitel je povinen identifikovat okruh osob, které budou oprávněny provádět do stavebního deníku záznamy.

- 8.4. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale, po celou dobu provádění Díla dle této smlouvy, uložen na Staveništi a bude přístupný Objednateli a jím pověřeným osobám, TDS a Koordinátorovi BOZP, případně dalším osobám, o kterých tak Objednatel písemně rozhodne.
- 8.5. Objednatel a jím pověřené osoby, TDS a Koordinátor BOZP mají právo přístupu do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi.
- 8.6. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, TDS nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své vyjádření. V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- 8.7. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy.

Článek 9

Předávání a přejímání plnění

- 9.1. Dílo se považuje za řádně dokončené, je-li
- 9.1.1. vydán a Objednateli doručen kolaudační souhlas s užíváním Stavby a též doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě, a
- 9.1.2. Objednateli předána DSPS.
- 9.2. Objednatel převezme Dílo bez vad, maximálně s drobnými vadami. Převzetí Díla s drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit drobné vady bezodkladně, nejpozději ve lhůtě stanovené Objednatelem.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná. Předání a převzetí Díla musí předcházet dílčí přejímky, čímž se rozumí technické kontroly a funkční zkoušky dílčích částí Díla včetně elektrotechnických a elektronických zařízení. Podmínkou pro zahájení přejímacího řízení Díla nebo jeho dílčích částí je předložení úplné dokladové části pro předávané Dílo (nebo jeho část) vč. projektové dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) a dokladů o likvidaci všech odpadů vyprodukovaných Stavbou. V této souvislosti smluvní strany výslovně vylučují použití § 2610 odst. 2 Občanského zákoníku.

9.4. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran (dále jen „**Předávací protokol**“). Předávací protokol obsahuje zejména:

- a) označení předmětu Díla,
- b) označení Objednatele a Zhotovitele,
- c) termín zahájení a dokončení prací na prováděném Díle včetně termínu zahájení a dokončení prací v rámci první etapy Díla a druhé etapy Díla,
- d) popis předávaného Díla,
- e) zhodnocení jakosti Díla,
- f) seznam převzaté dokumentace,
- g) prohlášení Objednatele, že předávané Dílo přejímá,
- h) soupis příloh,
- i) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace,
- j) datum a místo sepsání protokolu,
- k) seznam případných drobných vad, s nimiž bylo Dílo převzato, způsob a lhůta k jejich odstranění,
- l) výsledek přejímacího řízení,
- m) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, Provozovatele a osoby vykonávajících TDS a Koordinátora BOZP.

9.5. Objednatel není oprávněn využít svého práva a nepřevzít Dílo s vadami bránícími užívání Díla, pokud jsou tyto vady způsobeny nevhodnými věcmi, které Objednatel Zhotoviteli k provádění Díla předal, nebo příkazy Objednatele, na nichž Objednatel přes výslovné upozornění Zhotovitele trval.

9.6. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud Zhotovitel nepředá Objednateli dokumentaci požadovanou dle této smlouvy.

9.7. V případě, že Objednatel odmítne Dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí Díla včetně způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí Díla v náhradním termínu sepíší strany Předávací protokol s náležitostmi podle odst. 9.4. tohoto článku smlouvy.

Článek 10

Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost

10.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené Dílo záruku za jakost (dále jen „**Záruka**“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce:

- a) **60 měsíců** ode dne převzetí Díla Objednatel, a to na stavební práce,
- b) **24 měsíců** ode dne převzetí Díla Objednatel, a to na ostatní provedené práce.

(dále též „**Záruční doba**“).

- 10.2. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatel. Záruční doba se stanoví po dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost Zhotovitel. Za dobu, po kterou nemůže Objednatel Dílo řádně užívat, se pro účely této smlouvy rozumí doba od uplatnění vady Díla (doručení oznámení Zhotoviteli) do doby řádného odstranění vady (podepsání písemného záznamu oběma smluvními stranami); doba bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně Objednatel se má za to, že za vadu odpovídá Zhotovitel, a Zhotovitel je povinen v této době zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady, jako kdyby za vadu odpovídal. V případě, že Zhotovitel prokáže, že za vadu neodpovídá, zavazuje se Objednatel uhradit Zhotoviteli oprávněné a řádně prokázané náklady spojené s odstraňováním vady. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky uvedené níže.
- 10.3. Vady Díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má Objednatel.
- 10.4. Veškeré vady Díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem či datovou schránkou), obsahujícího specifikaci zjištěné vady (popis vady a jak se vada projevuje či projevila). Volbu mezi nároky plynoucími z vady Díla sdělí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení dle věty předchozí, anebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení.
- 10.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
- 10.6. Nezapočne-li Zhotovitel s odstraněním vady ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci tohoto článku, neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci tohoto článku, anebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vadu neodstraní, může Objednatel po předchozím písemném vyrozumění Zhotovitele vadu odstranit sám anebo ji nechat odstranit jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva dle této smlouvy či Občanského zákoníku.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli náklady, které byly se vznikem a odstraněním vady spojeny. Pokud nedojde k odstranění vady Díla Zhotovitelem ve sjednané lhůtě, má Objednatel právo na čerpání bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek pro účely odstranění vady a pro zajištění úhrady nákladů, které budou se vznikem a odstraněním vady spojeny. Ostatní nároky Objednatele plynoucí z vady Díla tím nejsou dotčeny.

- 10.7. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam, který bude podepsán oběma smluvními stranami; návrh písemného záznamu připraví Zhotovitel. Součástí tohoto písemného záznamu bude uvedení prodloužení záruční doby. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce 24 měsíců počínaje dnem podepsání písemného záznamu oběma smluvními stranami. V případě poskytnutí náhradního plnění se Zhotovitel zavazuje Objednateli poskytnout záruku za jakost v délce dle odst. 10.1. tohoto článku smlouvy podle toho, o jakou část díla se bude jednat.
- 10.8. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, náhradu všech škod a využití bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek ve prospěch Objednatele. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na náhradu škody vzešlé z vady Díla.

Článek 11

Pojištění

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění Díla až do okamžiku řádného převzetí Díla bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění Díla proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše Ceny za zhotovení Stavby bez DPH sjednané v čl. 5 odst. 5.1. této smlouvy za jednu pojistnou událost ročně po započtení všech sublimitů a spoluúčastí. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen kdykoliv na požádání bezodkladně předložit Objednateli, nejpozději však do 3 pracovních dnů. Náklady na pojištění a jeho udržování v souladu s touto smlouvou nese výlučně Zhotovitel a jsou již zahrnuty v Ceně za zhotovení Stavby.
- 11.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. ve stejné výši, jako je Cena za zhotovení Stavby za jednu pojistnou událost ročně po započtení všech sublimitů a spoluúčastí. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel předloží Objednateli pojistnou smlouvu v originále nebo úředně ověřené kopii před uzavřením této smlouvy a poté kdykoliv do 3 pracovních dnů od požádání, a to i opakovaně, přičemž po uzavření smlouvy postačí předložení příslušného pojistného certifikátu. Náklady na pojištění a jeho udržování v souladu s touto smlouvou nese výlučně

Zhotovitel a jsou již zahrnuty v Ceně za zhotovení Stavby.

- 11.3. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

Článek 12

Sankční ujednání. Zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele

- 12.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 12.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
- a) ve výši 5000,- Kč za každé porušení Zhotovitele provést Dílo řádně a včas dle čl. 3 odst. 3.1. této smlouvy, a to za každý i jen započatý den prodlení,
 - b) ve výši 10000,- Kč za každé porušení Zhotovitele provést práce, které dle čl. 3 odst. 1 této smlouvy dle harmonogramu mohou probíhat výlučně v období letních prázdnin, tj. od 1. 7. do 23. 8. 2022,
 - c) ve výši 5000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele se zahájením prací na zhotovení Stavby v rámci první a/nebo druhé etapy Díla, a to za každý i jen započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání klimatické podmínky (v tomto případě bude postupováno obdobně dle čl. 3 odst. 3.4 smlouvy),
 - d) ve výši 1000,- Kč za každé porušení závazků Zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu zvlášť,
 - e) ve výši 1000,- Kč za každé porušení závazku Zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu zvlášť,
 - f) ve výši 10000,- Kč za každé porušení povinností Zhotovitele daných zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
 - g) ve výši 50000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad

o kterémkoliv pojištění podle čl. 11 této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť,

- h) ve výši 50000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele dle čl. 7 odst. 7.17. této smlouvy předložit Objednateli na jeho vyžádání platné pracovní povolení zaměstnanců, a to za každý jednotlivý případ porušení a každého zaměstnance zvlášť,
- i) ve výši 5000,-Kč za porušení povinnosti Zhotovitele udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, ve všech částech ZŠ Olešská či komunikacích dle čl. 7 odst. 7.12. této smlouvy, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,
- j) ve výši 5000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele zajistit úklid a/nebo opravu poškození komunikací dle čl. 7 odst. 7.13. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení se splněním této povinnosti,
- k) ve výši 5000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele nepoužívat zakázané látky ve dle čl. 7 odst. 7.26 této smlouvy, za každý jednotlivý případ porušení povinnosti,
- l) ve výši 10000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele změnit poddodavatele s jehož pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení dle čl. 14 odst. 14.9. této smlouvy, bez souhlasu Objednatele, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť,
- m) ve výši 10000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele změnit poddodavatele uvedeného v příloze č. 4 této smlouvy dle čl. 14 odst. 14.10. této smlouvy, bez souhlasu Objednatele, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť,
- n) ve výši 10000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele změnit osoby uvedené v čl. 14 odst. 14.11. této smlouvy bez souhlasu Objednatele, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť,
- o) ve výši 10000,-Kč v případě porušení povinnosti Zhotovitele nahradit osobu, která byla Objednatelem odvolána dle čl. 14 odst. 14.12. této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele zvlášť,

12.3. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

12.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

12.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení.

12.6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze

vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

12.7. Objednatel je oprávněn započítat svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty na jakoukoliv i nesplatnou pohledávku Zhotovitele.

12.8. K zajištění svého závazku řádného provedení a dokončení Díla ve sjednané lhůtě dle čl. 3 této smlouvy poskytuje Zhotovitel Objednateli finanční záruku za řádné provedení a dokončení Díla (dále jen „**Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení Díla**“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy.

- a) Zhotovitel je povinen mít nejpozději ke dni uzavření smlouvy po zbývající dobu provádění Díla, prodlouženou nejméně o 60 kalendářních dnů po dni řádného předání a převzetí Díla sjednanu platnou bankovní záruku za řádné provedení a dokončení Díla, poskytnutou bankou anebo jinou Objednatelem předem písemně schválenou finanční institucí (dále jen „**Banka**“), ve smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení Díla bude sjednána nejméně ve výši 2000000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých). Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení Díla slouží k zajištění řádného splnění všech závazků Zhotovitele ze smlouvy, včetně nároků Objednatele na smluvní pokuty, na úhradu nákladů, které Objednateli vzniknou dle této smlouvy, nebo nároků vzniklých jako důsledek odstoupení od smlouvy. Součástí těchto povinností Zhotovitele je i povinnost předložení bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle odst. 12.9. tohoto článku smlouvy.
- b) Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení Díla bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné provedení a dokončení Díla bude mít v držení po celou dobu provádění Díla Objednatel.
- c) Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení Díla musí být udržována v platnosti po celou dobu realizace Díla prodlouženou o dobu alespoň 60 kalendářních dnů po sjednané době pro předání a převzetí Díla. Bankovní záruka za řádné provedení a dokončení Díla bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po předložení protokolu o předání a převzetí Díla (Předávací protokol) podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad Díla ve sjednané lhůtě.
- d) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné provedení a dokončení Díla zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné provádění Díla bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- e) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- f) Náklady na bankovní záruku za řádné provedení a dokončení Díla jsou zahrnuty ve sjednané ceně dle čl. 5 této smlouvy.

12.9. K zajištění svého závazku řádného plnění povinností plynoucích z článku 10. této smlouvy a záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „**Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek**“), a to nejpozději při předání a převzetí Díla a za současného dodržení těchto podmínek:

- a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek poskytnutou bankou ve smyslu § 2029 a násl. Občanského zákoníku; bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude ve výši 5 % z Ceny za zhotovení Stavby bez DPH dle čl. 5, odst. 5.1. této smlouvy, a to po celou délku záruční doby. Záruční listina bude obsahovat písemné prohlášení banky, že tato uspokojí Objednatele, pokud Zhotovitel v průběhu trvání záruční doby poruší své povinnosti dle čl. 10 této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, náklady za provedení jakéhokoli servisního úkonu neprovedeného Zhotovitelem, náklady spojené se vznikem a odstraněním vady Díla, které neprovedl Zhotovitel apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše uvedených povinností Zhotovitele.
- b) Záruční listina nebude obsahovat další podmínky banky. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel Objednateli v originále.
- c) Platnost bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu záruční doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči Zhotoviteli. Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené lhůty.
- d) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou bankovní zárukou za řádné splnění záručních podmínek zajišťovány, částka uvedená v bankovní záruce za řádné splnění záručních podmínek, bude plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této smlouvy.
- e) Porušení povinností Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Článek 13

Ukončení smluvního vztahu

13.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně.

13.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění.

13.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků:

- a) prodlení Zhotovitele delší než 15 kalendářních dnů od konce lhůt a jednotlivých milníků sjednaných dle čl. 3 této smlouvy;
- b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
- c) opakované závady v provádění úklidu Staveniště Zhotovitelem, opakované závady v údržbě a opravách komunikací v případě jejich poškození, anebo opakované užívání jiných přístupových tras a cest na Staveniště a do skladovacích prostor Zhotovitelem (včetně zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění Díla, případně jiných osob, které se budou podílet na provádění Díla) než stanovených Objednatelem;
- d) neprokázání existence pojištění Díla, anebo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. 11 této smlouvy;
- e) porušení povinností Zhotovitele týkajících se bankovní záruky za řádné provedení a dokončení díla a bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. 12 této smlouvy;
- f) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatné porušení smlouvy.

13.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

- a) Zhotovitel postupuje při provádění Díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu a kvalitě Díla a sjednané lhůtě ukončení Díla a jeho předání Objednateli;
- b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
- c) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele;
- d) bylo-li poskytovatelem dotace uplatněno jeho právo upravit časový harmonogram a předpokládaný finanční plán dle možností státního rozpočtu a redukovat rozsah předmětu plnění této smlouvy;
- e) z důvodů uvedených v § 223 ZZVZ.

13.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

13.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, ujednání definovaná v odst. 13.7. tohoto článku, ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných částech této smlouvy.

Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část Díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části Díla ke dni odstoupení.

13.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:

- a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným výkazem výměř;
- b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným výkazem výměř a vystaví závěrečnou fakturu;
- c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby provedené části Díla a Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby provedené části Díla. Na dosud odvedené práce na provedení Díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby provedené části Díla a je oprávněn nařídit Zhotoviteli odstranění dosud provedené části Díla nebo těch částí Díla, na které není Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části Díla není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;
- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let.

Článek 14

Zvláštní ujednání

14.1. Objednatel si tímto v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění některé z podmínek pro odstoupení stanovené touto smlouvou změnu Zhotovitele v průběhu provádění Díla a jeho nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, pokud takový (nový) dodavatel souhlasí, že veškeré plnění bude poskytovat za totožných cenových podmínek obsažených v nabídce původně vybraného dodavatele a v souladu s touto smlouvou, přičemž Objednatel je

v takovém případě oprávněn tuto smlouvu upravit následujícím způsobem:

- upravit rozsah Díla tak, aby odpovídal nedokončené části Veřejné zakázky;
- doplnit smlouvu tak, aby nový dodavatel přejímal odpovědnost za celý rozsah Díla, tedy včetně nároků z vad, díla záruky za jakost apod. z části již provedené původním vybraným dodavatelem;
- upravit časový harmonogram a případná další smluvní ustanovení, která v důsledku předčasného ukončení původní smlouvy nejsou aktuální tak, aby v maximální možné míře odpovídaly původní smlouvě (tedy doba plnění jednotlivých milníků v kalendářních dnech může být maximálně tak dlouhá, jako v zadávacích podmínkách apod.);
- doplnit smlouvu o ustanovení týkající se předání a převzetí Díla od stávajícího dodavatele.

Pokud účastník zadávacího řízení, který se dle výsledku hodnocení umístil druhý v pořadí, odmítne poskytovat plnění namísto původně vybraného dodavatele za podmínek uvedených ve větě předchozí, je Objednatel oprávněn (za stejných podmínek a s možností stejné změny smlouvy, jak je uvedeno výše) obrátit se na účastníka zadávacího řízení, který se umístil jako třetí v pořadí. Pokud ani tento účastník zadávacího řízení nesouhlasí s poskytováním plnění, je Objednatel oprávněn obrátit se na poddodavatele, který byl uveden v seznamu poddodavatelů v nabídce původního dodavatele, příp. byl na tento seznam doplněn postupem dle čl. 14 odst. 14.10. této smlouvy před tím, než byl naplněn důvod pro odstoupení od smlouvy, a který se zároveň podílí na plnění největším procentním podílem ze všech poddodavatelů původního dodavatele. Nový poddodavatel vybraný postupem dle tohoto odstavce je povinen poskytovat plnění za podmínek uvedených ve větě první tohoto odstavce. V případě, že by tento poddodavatel odmítl poskytovat plnění namísto původně vybraného dodavatele za podmínek uvedených ve větě první tohoto odstavce, je Objednatel oprávněn obrátit se na dalšího poddodavatele s procentně dalším největším procentním podílem na plnění; Objednatel tímto způsobem může postupně oslovit všechny poddodavatele.

14.2. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.

14.3. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech podmínek výzvy č. 146 OPŽP (Poskytovatele dotace), v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to:

- a) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, Ministerstvu životního prostředí ČR, auditnímu orgánu, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, finančnímu úřadu, Národnímu fondu, a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené Projektem a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace Projektu,

jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s Projektem;

- b) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám oprávněným k provádění kontroly Projektu;
- c) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 veškeré originály účetních dokladů, smlouvu, včetně jejich dodatků, a další originály dokumentů, vztahujících se k Projektu;
- d) Zhotovitel je povinen ve všech svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a o investičním záměru, jehož je plnění této smlouvy součástí, a to v souladu s aktuálně platnou registrací akce a následně v souladu s rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli poskytnout bezprostředně po uzavření této smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto údajů.

14.4. Zhotovitel je povinen umístit nejpozději do 1 měsíce od zahájení realizace stavby v místě zhotovení Stavby dočasný velkoplošný informační panel (billboard) se všemi informacemi dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a v souladu s grafickým manuálem povinné publicity Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020. Informační panel (billboard) o min. velikosti 5 100 x 2 400 mm bude umístěný dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a se souhlasem umístění Objednatele. Tabule bude pevné a nerozebíratelné konstrukce určené k použití do exteriéru zabraňující odcizení nebo poškození při nepříznivých povětrnostních podmínkách. Dočasný velkoplošný informační panel (billboard) musí být zachován po celou dobu průběhu fyzické realizace. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 je možné umístit oba realizující projekty dle čl. 1, odstavec 1.3 na jeden dočasný billboard, ale pouze za předpokladu, že všechny povinné informace na tomto nástroji budou čitelné, jasné a uvedené odděleně.

14.5. Po ukončení realizace Stavby bezprostředně po odstranění Informačního panelu nejdéle do 3 měsíců od ukončení realizace bude v místě Stavby umístěna stálá vysvětlující tabulka (dále jen „**Pamětní deska**“). Pamětní deska bude vyrobena z materiálu trvalé hodnoty zajišťující dobrou čitelnost, nejlépe z kovu – např. z mosazi či jiné slitiny, minimalizace pravděpodobnosti poškození či odcizení. Pamětní deska bude mít

minimální rozměry formátu A3. Pamětní deska bude vyrobena a bude obsahovat veškeré informace dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a v souladu s grafickým manuálem povinné publicity Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020. V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 je možné umístit oba realizující projekty dle čl. 1, odstavec 1.3 na jednu pamětní desku, ale pouze za předpokladu, že všechny povinné informace na tomto nástroji budou čitelné, jasné a uvedené odděleně.

- 14.6. Obsah Informačního panelu a Pamětní desky bude Zhotovitelem zpracován dle Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020 a v souladu s grafickým manuálem povinné publicity Operační program Životní prostředí pro období 2014-2020. Konečný vzhled a umístění Informačního panelu a Pamětní desky bude před umístěním písemně schválen Objednatelem.
- 14.7. Zhotovitel se rovněž zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tuto povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.
- 14.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.
- 14.9. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit poddodavatele, s jehož / s jejichž pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Vážným objektivním důvodem pro odmítnutí nového poddodavatele je např. negativní zkušenosti Objednatele s tímto poddodavatelem. Změna však není možná v činnostech řízení Stavby, u kterých Objednatel v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky stanovil, že tyto činnosti musí být provedeny výhradně Zhotovitelem.
- 14.10. Zhotovitel předložil Objednateli před uzavřením této smlouvy seznam všech svých poddodavatelů s uvedením výše jejich podílu na zhotovení Stavby. Tento seznam tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit

poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez vážných objektivních důvodů odmítnout. Vážným objektivním důvodem pro odmítnutí nového poddodavatele je např. negativní zkušenosti Objednatele s tímto poddodavatelem.

14.11. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osoby uvedené v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba uvedená v příloze č. 2 této smlouvy musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel (v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 kalendářních dnů od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby uvedené v příloze č. 2 této smlouvy bez vážných objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Vážným objektivním důvodem pro odmítnutí nové osoby uvedené v příloze č. 2 této smlouvy je např. negativní zkušenosti Objednatele s touto osobou.

14.12. Objednatel má právo požadovat u Zhotovitele odvolání libovolné osoby Zhotovitele nebo poddodavatele, u které byla prokázána její nekompetentnost nebo nedbalost při plnění jejích povinností nebo jejíž účast na provádění Díla nebo přítomnost na Staveništi je jinak objektivně nežádoucí (např. z důvodu negativní zkušenosti Objednatele s touto osobou), přičemž takováto osoba Zhotovitele se nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele dále jakkoliv účastnit provádění Díla. Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí Objednatel Zhotoviteli písemně. Zhotovitel je povinen tomuto prokázanému požadavku bez zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být Zhotovitelem bez zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou.

14.13. Objednatel požaduje, aby osoba hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího byla přítomna na Staveništi 8 hodin denně každý pracovní den a zároveň tyto osoby musí být oprávněny jednat za Zhotovitele v těch věcech, o kterých těmito osobám z příslušných právních předpisů (zejm. se jedná o Stavební zákon) přísluší rozhodovat.

Článek 15

Ostatní ujednání

15.1. Smluvní strany se tímto ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že všechny spory vyplývající z této smlouvy a s touto smlouvou související bude řešit výlučně soud místně příslušný dle sídla Objednatele. Rozhodčí řízení je vyloučeno.

- 15.2. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 15.3. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 15.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 15.5. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoli své pohledávky za Objednatelem proti pohledávkám Objednatele za Zhotovitelem z této smlouvy a/nebo v souvislosti s ní výlučně na základě předchozí písemné dohody smluvních stran.
- 15.6. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
- 15.7. Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva představuje úplnou dohodu smluvních stran.
- 15.8. Pokud se jakékoliv ustanovení této smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo nevynutitelné ustanovení platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením.
- 15.9. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vyloučí aplikaci § 557 a § 1805 Občanského zákoníku.
- 15.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní § 1793 Občanského zákoníku.
- 15.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

15.12. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen **“Zákon o svobodném přístupu k informacím”**). Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností Objednatele dle Zákona o svobodném přístupu k informacím a dle ZZVZ.

15.13. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem Objednatel.

15.14. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:

Příloha č. 1a: Projektová dokumentace

Příloha č. 1b: Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 1c: Pravomocné stavební povolení

Příloha č. 2: Seznam osob

Příloha č. 3: Časový harmonogram

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5: Technický list změny

V Praze dne



Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí odboru
majetkoprávního

V Boršově nad Vltavou dne

.....

Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

DODATEK Č. 6
ke smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2021
číslo smlouvy objednatele: 2021/OMP/1351

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, 101 38 Praha 10

IČ: 00063941

DIČ: CZ00063941

Zastoupená 1. místostarostkou Ing. Janou Komrskovou

Ke smluvnímu jednání oprávněn Ing. Dušan Kodrta, pověřen zastupováním vedoucího OMP

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-2000733369/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Auböck s.r.o.

Zastoupený: Ing. Janem Vilánkem, jednatelem společnosti

Se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČO: 260 89 785

DIČ: CZ26089785

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, pod sp. zn. C 13372

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 1387359652/2700

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  výrobní ředitel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně označovaní jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 (dále jen „Dodatek“)

I.

Předmět Dodatku

Tento věcný Dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě smluvních stran. Důvodem změn jsou nepředvídatelné skutečnosti, které vznikly vlivem globálních celosvětových změn v souvislosti s válečnou situací na Ukrajině a skokovým zvýšením cen stavebního materiálu i práce. Tímto Dodatkem se mění cena díla v rámci akce „**Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská**“. Přesný rozsah zvýšených cen jednotlivých položek je dán přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

II.

Cena plnění

Tímto Dodatkem č. 6 se mění znění čl. 5 odstavec 5.1 výše uvedené smlouvy, ve kterém se cena díla:

Původní cena díla činila vč. všech Dodatků 63 376 226,69 Kč bez DPH

Cena díla se zvyšuje o částku 6 592 691,16 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto Dodatku

Cena bez DPH 69 968 917,85 Kč bez DPH

(slovy: šedesátdevětmilionůdevětsetšedesátosmtisícdevětsetšedmnáct korun českých a 85 haléřů)

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění smlouvy č. 2021/OMP/1351 vč. všech platných Dodatků spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění je aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. Objednatel.

IV.

Tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 6 před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek č. 6 uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: rekapitulace ZL

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Městská část Praha 10
Ing. Dušan Kodrla
pověřený vedením odboru majetkoprávního
Objednatel



Ing. Jan Vilánek
jednatel
Zhotovitel



Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ
P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. **0751/RMČ2022**
ze dne **5. 10. 2022**

Ověřovatel jméno a příjmení: Zuzana Kohoutková

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět:  Přílohy k podání čl.40, új.25/9
ID zprávy: 1389361250
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 23.7.2024 v 10:19:43
Datum a čas doručení: 23.7.2024 v 10:21:26

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, CZ
ID schránky: 8aiabyn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: 
Naše spisová značka: 
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne


Přílohy:

1-smlouvaodi_loc_.2021OMP1351.pdf (413,79 kB)
2-dodatekc_.6kesmlouve_odi_loc_.2021OMP1351.pdf (91,78 kB)

Doručenka datové zprávy

Předmět:  Přílohy k podání čl.40, új.25/9
ID zprávy: 1389361250
Datum a čas dodání: 23.07.2024 v 10:19:43
Datum a čas doručení: 23.07.2024 v 10:21:26

Adresát:  advokát, Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 11000 Praha 1, CZ
ID schránky: kktd9pu

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: 
Naše spisová značka: 
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

23.07.2024 v 10:19:43 EV0: Datová zpráva byla podána.
23.07.2024 v 10:19:43 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
23.07.2024 v 10:21:26 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Florentinum, recepce A
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika
Tel.: +420 255 000 111

Titanium Business Complex
Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 545 423 420

Centrum Zuckermandel
Žitkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900

Obvodnímu soudu pro Prahu 10

28. pluku 1553/29b

100 83 Praha 10

Ke sp. zn.:



V Praze dne 19. září 2024

Žalobce a): **GEOSAN GROUP a.s.**, IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Žalobce b): **VISTORIA CZ a.s.**, IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město

oba právně zastoupeni [redacted] advokátem, ev. č. ČAK [redacted]
společníkem TFP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Průhonu 1516/32,
170 00 Praha 7

Žalovaná: **Městská část Praha 10**, IČO 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice

právně zastoupena [redacted] advokátem, ev. č. ČAK [redacted]
společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na
Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1


o změnu závazku

Vyjádření žalované k replice žalobců ze dne 19. 6. 2024


Doručeno prostřednictvím datové schránky

Přílohy dle textu a seznamu na poslední straně vyjádření

I. Úvod

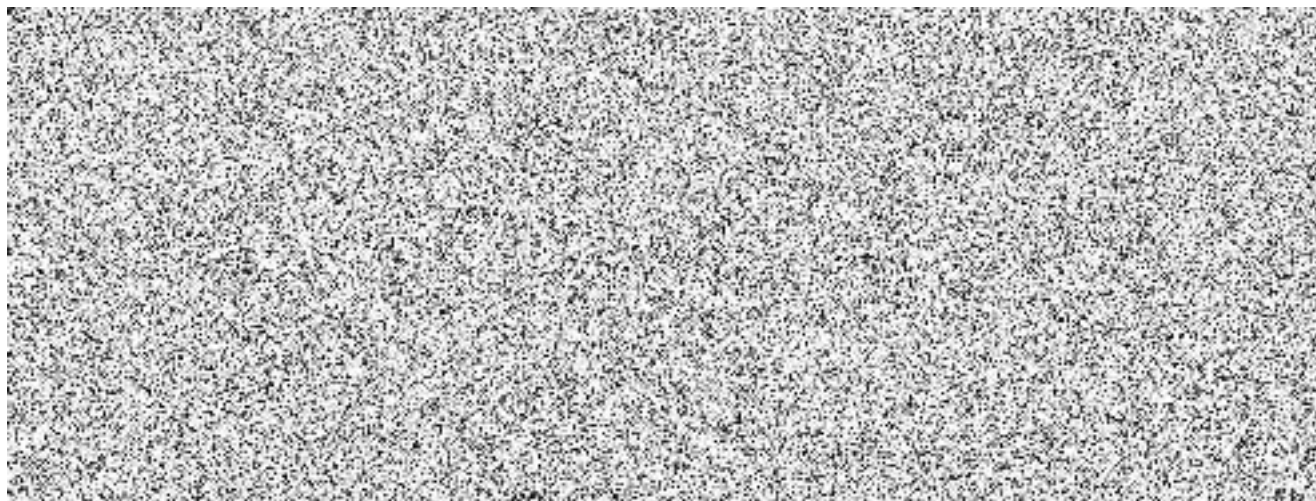


II. SHRnutí PODSTATY SPORU

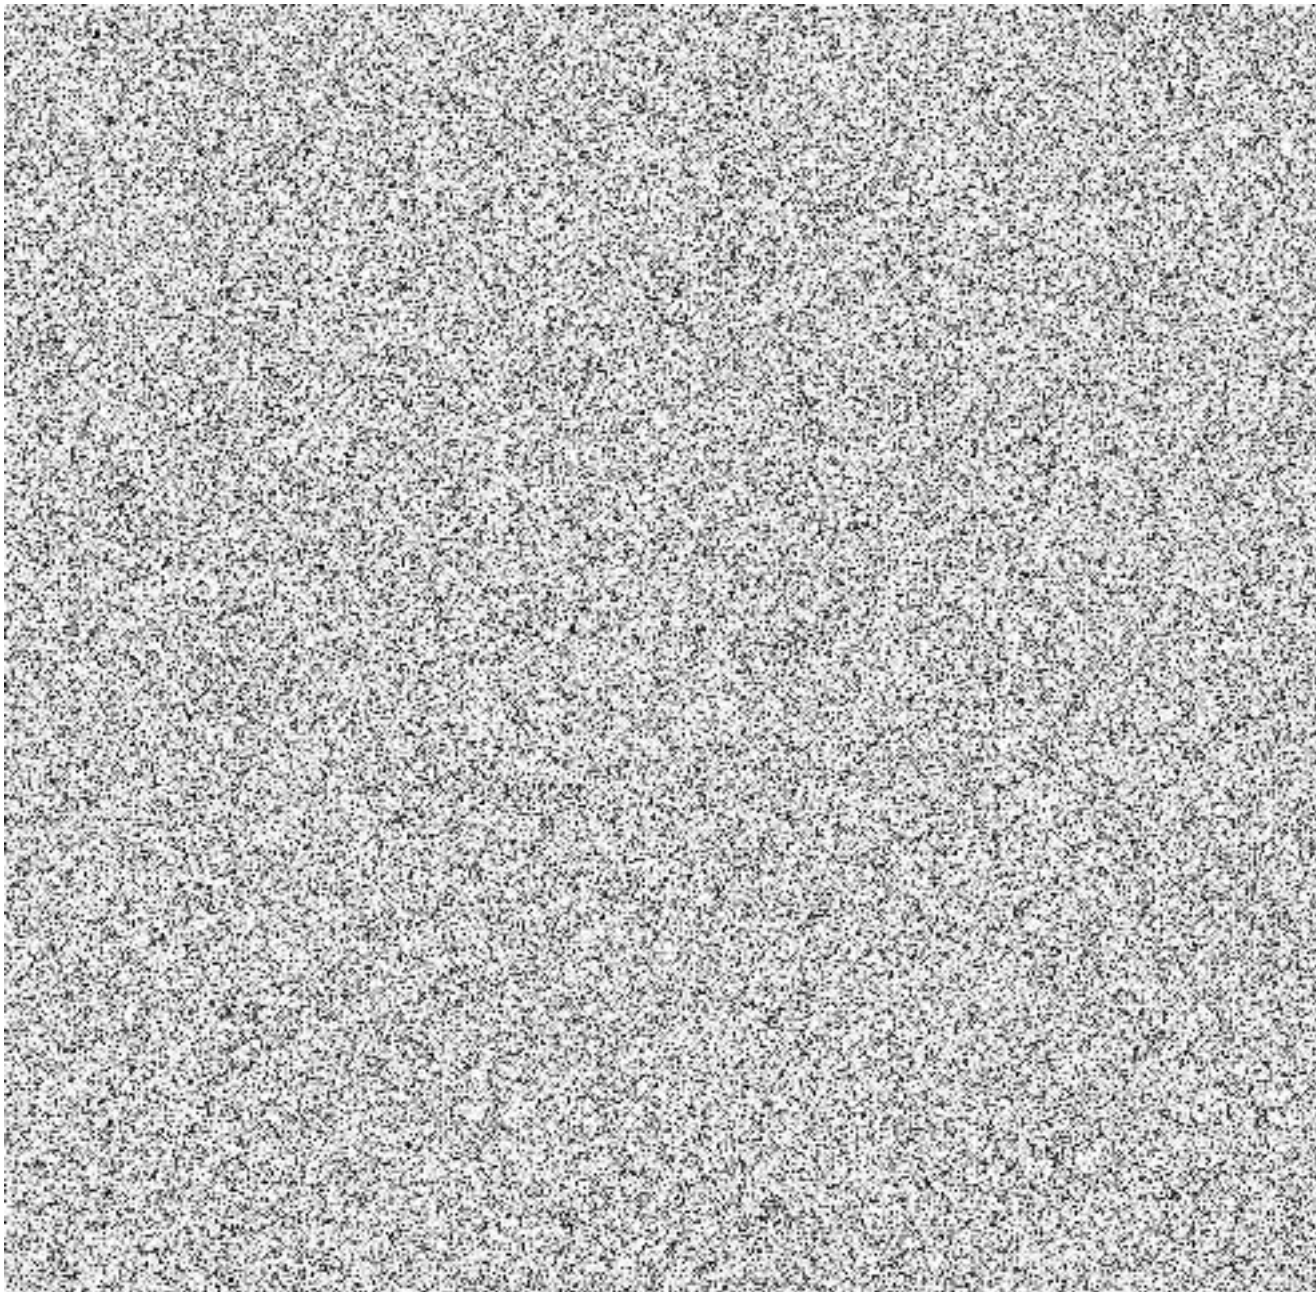

III.

Důkaz:

- Výřez z webových stránek žalobce a) (příloha č. 1)
 - Výřez z webových stránek žalobce b) (příloha č. 2)
 - Dokument MPO – Stavebnictví České republiky – výtah str. 1 až 2 a str. 28 (příloha č. 3)
- 


¹ Str. 28 dokumentu MPO nazvaného „Stavebnictví České republiky 2022“.

² Viz informace na webových stránkách žalobce a): <https://www.geosan-group.cz/o-nas>




Důkaz:

- Profil žalobce a) na jeho webových stránkách (příloha č. 4)
- Přehled rozpočtů žalované (příloha č. 5)

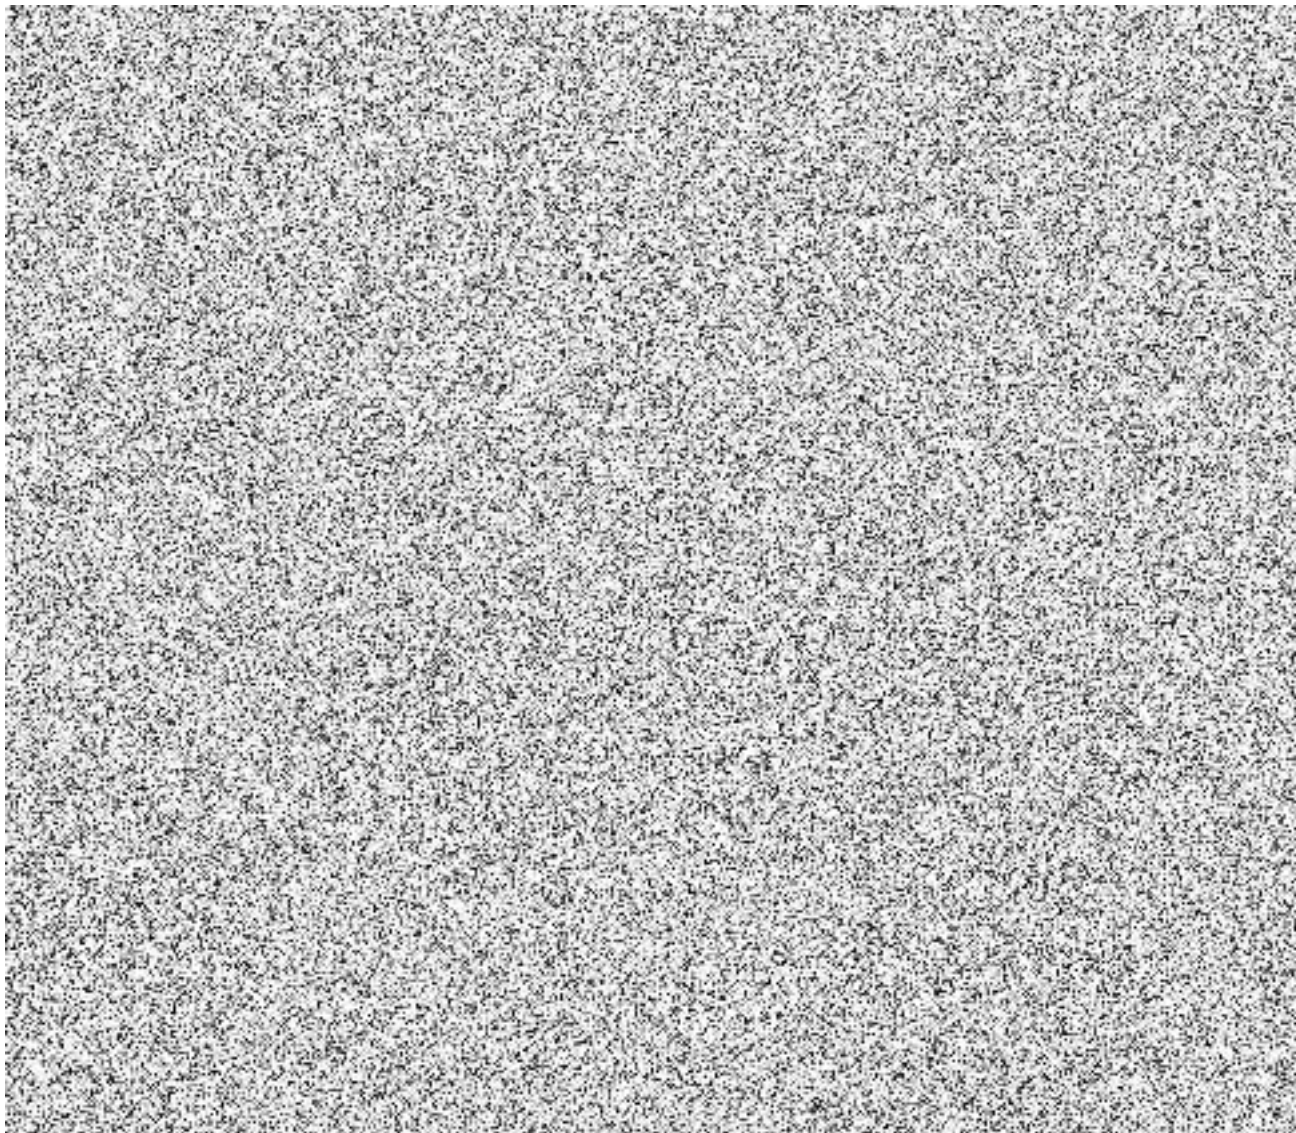


IV.




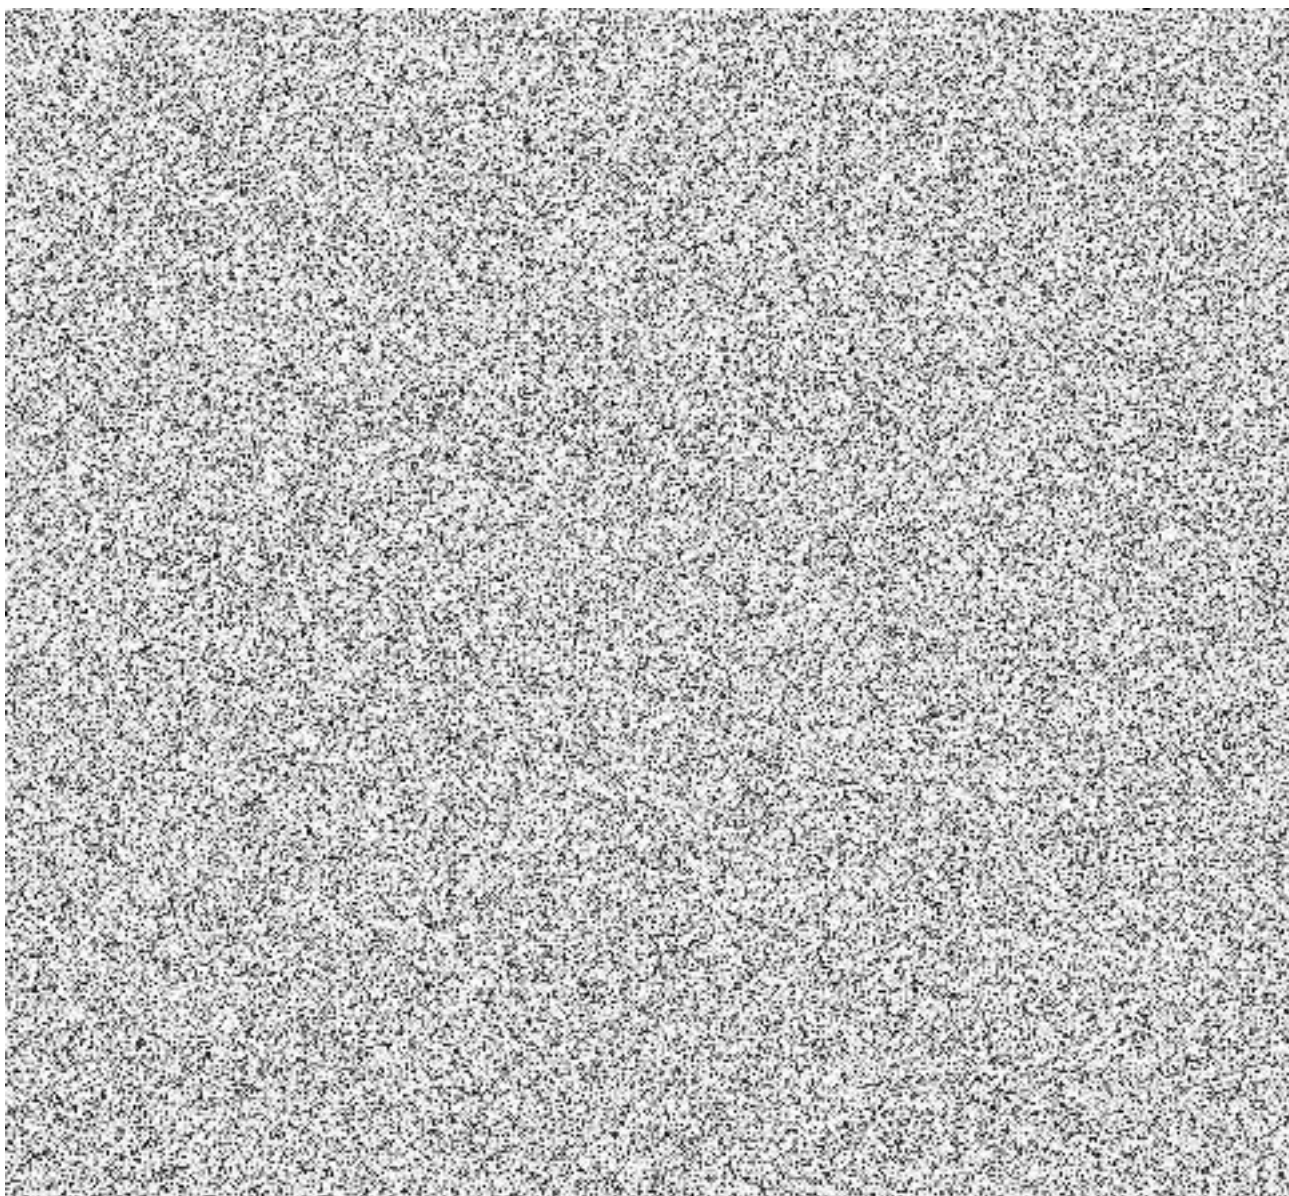

V.

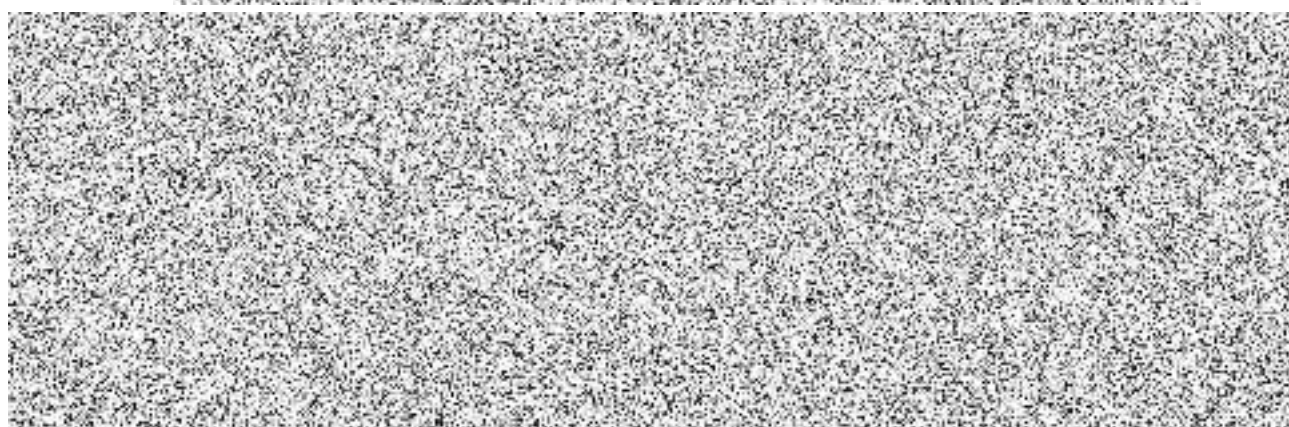

⁴ https://cs.wikipedia.org/wiki/Anexe_Krymu_Ruskou_federac%C3%AD

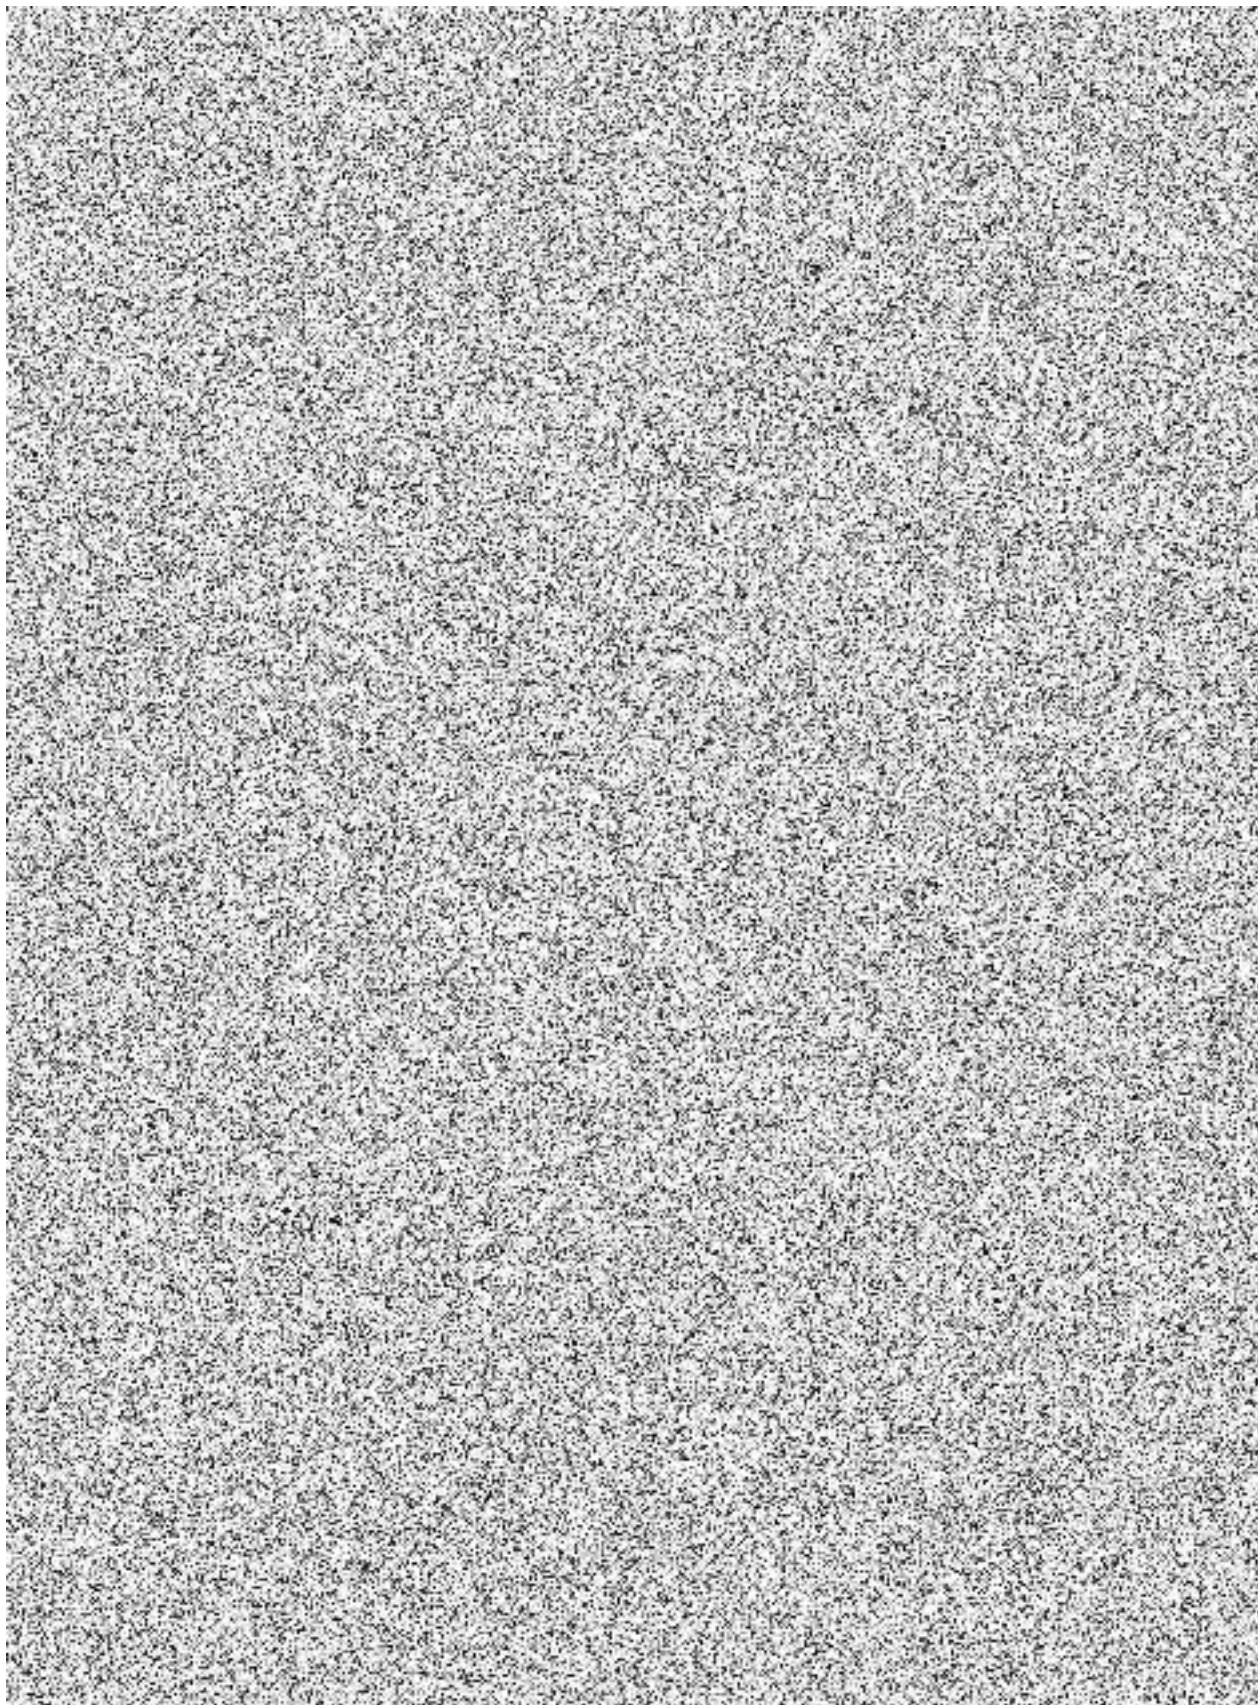

⁵ Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 11. 2015, č. j. 8 As 72/2015.

⁶ Tamtéž.

⁷ BLAŽEK, J. *Nakládání s obecním majetkem a jeho trestněprávní aspekty*. Dostupné z: <https://www.pravniprostor.cz/clanky/spravni-pravo/nakladani-s-obecnim-majetkem-a-jeho-trestnepravni-aspekty>

⁸ Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2012, sp. zn. 11 Tdo 454/2011.

VI. ZÁVĚREČNÝ NÁVRH ŽALOVANÉ



rozsudek :



 advokát

na základě plné moci za **Městská část Praha 10**

Seznam příloh

1. *Výřez z webových stránek žalobce a)*
2. *Výřez z webových stránek žalobce b)*
3. *Dokument MPO – Stavebnictví České republiky – výtah str. 1 až 2 a str. 28*
4. *Profil žalobce a) na jeho webových stránkách*
5. *Přehled rozpočtů žalované*



O SPOLEČNOSTI

GEOSAN GROUP

jsme zárukou na českém stavebním trhu

Dovolte nám ve zkratce představit akciovou společnost GEOSAN GROUP. Jsme stavební společností, která se už mnoho let řadí mezi významné subjekty na českém stavebním trhu.

Naše začátky se datují do raných 90. let a s trochou nadsázky lze říci, že jsme už stavěli asi opravdu všechno. Zažili jsme a úspěšně zvládli všechny fáze stavebního trhu. Byla to období obrovských růstů, období stagnací a také doba hospodářské krize, která byla pro spoustu subjektů ve stavebním odvětví fatální.

Dovolíme si tvrdit, že všechny fáze i období, které nás potkaly, jsme zvládli se ctí. Každá taková doba nás něco nového naučila, ve výsledku posílila a přinesla nemalou porci dalších zkušeností. I díky tomu můžeme s klidným svědomím prohlásit, že společnost GEOSAN GROUP má opravdu dobré a poctivé základy a je na čem dále stavět. A my stavět rozhodně chceme a to tak, jak říká náš slogan, **VŠEMI SMĚRY.**


Na následujících stránkách Vás necháme nahlédnout k nám, chceme Vám ukázat, jak pracujeme, jaké u nás ctíme hodnoty, jak se nám daří, a ukážeme Vám reference. Tedy to, co jsme postavili i co právě stavíme.

Pokud máte chvíli, pojdte dál a vítejte u nás. V GEOSANu.



**ZPRAVODAJ****2 / 2024**[VŠECHNA VYDÁNÍ >](#)**STÁHNOUT PDF**[STÁHNOUT PDF](#) **KDE NÁS NAJDETE?****Pokrýváme celé Česko**

Jsme společnost s celorepublikovou působností, což nám umožňuje na vše pružněji reagovat a být našim zákazníkům blíže. Při získávání nových zakázek a jejich následné realizaci je samozřejmě výhodou znalost lokálních poměrů. Momentálně nás proto najdete již v sedmi velkých městech, napříč Českou republikou. Naše závody a jejich pobočky najdete na těchto adresách:

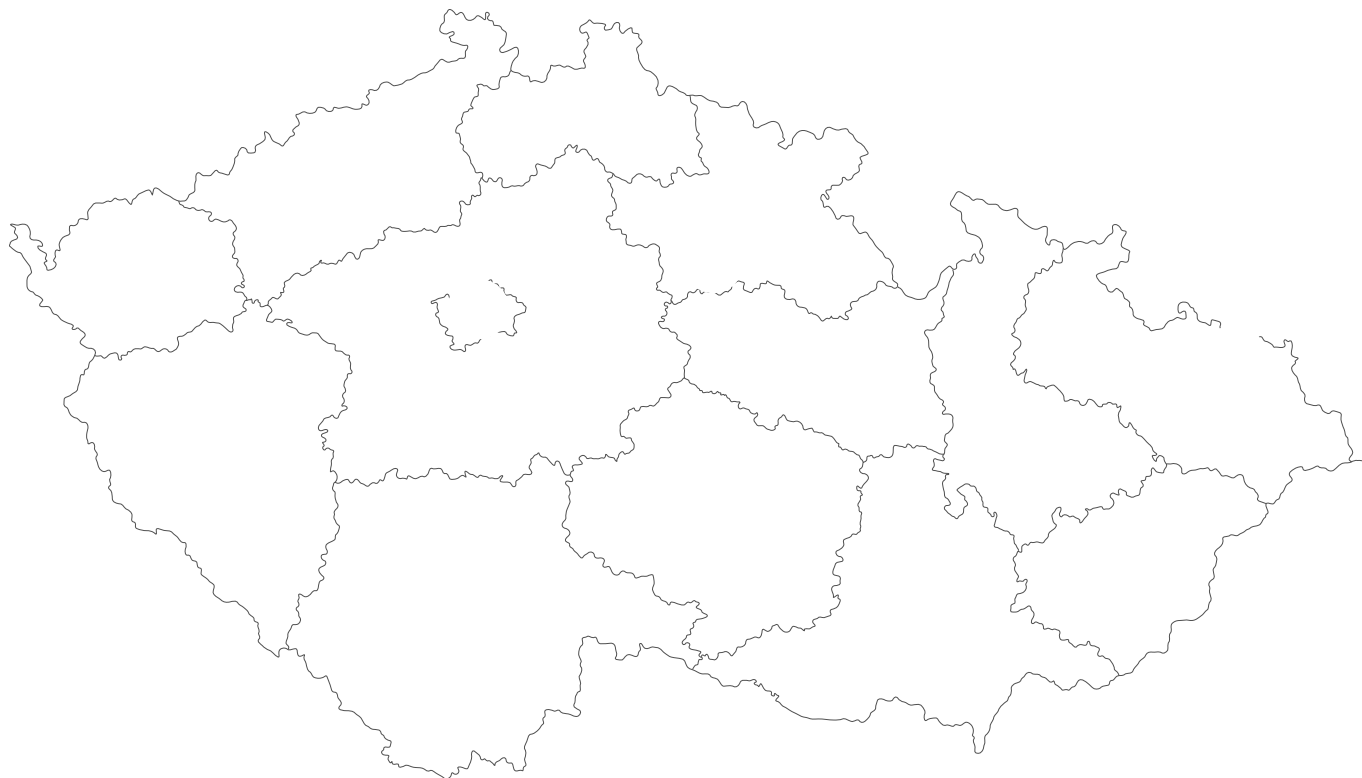

PRAHA

**ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB ČECHY
ZÁVOD EKOLOGICKÝCH A ENERGETICKÝCH STAVEB
ZÁVOD DOPRAVNÍCH STAVEB
PROJEKTY VÝROBNÍHO ŘEDITELE**

U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7

KOLÍN

SÍDLO SPOLEČNOSTI

U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

PLZEŇ

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB PLZEŇ

Šafaříkovy sady 2/3
301 00 Plzeň

HRADEC KRÁLOVÉ

**POBOČKA ZÁVODU POZEMNÍCH STAVEB ČECHY
REGION VÝCHOD**

Malé náměstí 110
500 03 Hradec Králové

JIHLAVA

POBOČKA ZÁVODU POZEMNÍCH STAVEB BRNO

Polenská 4382/2c
586 01 Jihlava

BRNO

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB BRNO

Tuřanka 1519/115a
627 00 Brno - Slatina

OSTRAVA

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB OSTRAVA

Dostojevského 3298/7
702 00 Ostrava

POHLED POD POKLIČKU

Ekonomické ukazatele

Graf ukazuje růst obratu a tržeb od roku 2017 do roku 2023. Nárůst je to více než trojnásobný.
Podrobnější ekonomické informace naleznete ve výročních zprávách.

Obrat v Kč

2019

2020

2021

2022

2023

Počet zaměstnanců

2019

2020

2021

2022

2023

CERTIFIKÁTY

Bezpečnost a kvalita

Mezi hodnoty, které v naší společnosti pečlivě sledujeme, patří bezpečnost a kvalita práce. Od počátku naší činnosti dbáme na dodržování všech pravidel a zlepšování procesů ve všech oblastech naší práce. Zde je přehled vybraných certifikátů a osvědčení, které naše společnost získala jak v oblasti bezpečnosti a kvality práce, tak ochrany životního prostředí nebo přístupu k citlivým informacím.

Certifikát QMS

Již od roku 1997 systematicky sledujeme a vyhodnocujeme kvalitu prováděných prací, kterou jsme si stanovili [politikou kvality](#). Certifikací si potvrzujeme svůj cílový záměr – zkvalitnit a rozvíjet systém řízení, doložit dosahovanou úroveň a stabilitu zabezpečování jakosti investorům a zvyšovat jejich spokojenost.



VÍCE INFORMACÍ



POLITIKA



ZOBRAZIT CERTIFIKÁT



Certifikát BOZP

Systém managementu BOZP podle ČSN ISO 45001:2018 vyžaduje bezpodmínečné dodržování legislativních požadavků BOZP a klade důraz zejména na zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek, na trvalé zlepšování pracovních podmínek, na eliminaci nebezpečí a ohrožení, vyhledávání a posuzování rizik a příležitostí v oblasti BOZP, a určování bezpečných pracovních postupů, s ohledem na velikost a kontext společnosti. To vše s aktivní spoluúčastí zaměstnanců společnosti.

Společnost GEOSAN GROUP a. s. má písemně zpracovanou a zveřejněnou [politiku BOZP](#), která navazuje na národní politiku BOZP a její postupy a srozumitelnou formou definuje závazky společnosti vůči bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Obsahuje také závazek k dodržování právních předpisů České republiky a současně závazek k neustálému zlepšování systému BOZP a prevenci rizik.



VÍCE INFORMACÍ



POLITIKA



ZOBRAZIT CERTIFIKÁT



Certifikát EMS

S budováním systému EMS podle normy ČSN EN ISO 14001 jsme začali v září 2003 na základě naší snahy o zlepšování životního prostředí a také proto, že chceme nabídnout zákazníkovi vyšší kvalitu.

[VÍCE INFORMACÍ](#)[POLITIKA](#)[ZOBRAZIT CERTIFIKÁT](#)

Osvědčení EMAS

Společnost GEOSAN GROUP a. s. si uvědomuje, že svojí činností (podnikáním ve stavebnictví) ovlivňuje ve větší nebo menší míře životní prostředí, a proto považuje ochranu životního prostředí za jednu ze základních priorit rozvoje v rámci udržitelného rozvoje celé společnosti.

[VÍCE INFORMACÍ](#)[POLITIKA](#)[ZOBRAZIT CERTIFIKÁT](#)

Osvědčení NBÚ

Osvědčení podnikatele číslo 002360 nám umožňuje od roku 2017 přístup k utajovaným informacím pro stupeň Důvěrné.

[ZOBRAZIT CERTIFIKÁT >](#)

O SPOLEČNOSTI

REFERENCE

PRO MÉDIA

KARIÉRA



ZPRAVODAJ
2 / 2024

[VŠECHNA VYDÁNÍ](#)

SÍDLO SPOLEČNOSTI

GEOSAN GROUP a. s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

KORESPONDENČNÍ ADRESA

GEOSAN GROUP a. s.
U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7

PROVOZ RECEPCE

(+420) **246 006 111**

Po-Pá: 07:00 - 19:00



Copyright © 2023 GEOSAN GROUP a. s., všechna práva vyhrazena, [Mapa webu](#), [Cookies](#)

Realizace webových stránek na míru - [Webovky123, s. r. o.](#)





STAVEBNÍ SPOLEČNOST VISTORIA

SPOLEHLIVÝ PARTNER NA
POVRCHU I V PODZEMÍ OD
ROKU 1992

KOMPLEXNÍ REALIZACE NEBO DÍLČÍ STAVEBNÍ DODÁVKY V OBČANSKÉ A BYTOVÉ
VÝSTAVBĚ, DOPRAVNÍM STAVITELSTVÍ A VODOHOSPODÁŘSKÝCH STAVBÁCH.



VISTORIA CZ a.s. patří k významným stavebním společnostem a na českém trhu působí od roku 1992. Je součástí holdingu Kupiano Investments SE.

Realizuje všechny druhy staveb v odvětvích dopravního, pozemního a inženýrského stavitelství.



(/img/fotky/jenstejn.jpg)

Během svého více než dvacetiletého působení společnost **zrealizovala mnoho významných stavebních projektů včetně výstavby a rekonstrukce tunelů a stanic pražského metra, energetických tunelů a kolektorů v Praze**, řady dopravních staveb a více než sto bytových a občanských staveb.

REFERENCE

Občanská a bytová výstavba

(/img/fotky/kc_pavilac.jpg)

Rekonstrukce tělocvičen ZŠ K Miličovu, Praha 4

Stavební úpravy objektu pro Azylový dům, Praha 4

Výstavba nového pavilonu a varny a jídelny u 2. ZŠ Dobříš

Výstavby rodinných domů, Jenštejn

Novostavba MŠ v areálu ZŠ Nad Vodovodem, Praha 10

Přestavba ZŠ Štěrboholy

Novostavba objektu tělocvičny ZŠ Bítovská, Praha 4

Dokončení rekonstrukce objektu „Bio Vzlet“, Praha 10

MŠ a přístavba tělocvičny, Hýskov

Mateřská škola Pyšely

Rekonstrukce objektu U Vršovického nádraží 30/30 na komunitní centrum Prahy 10

Přístavba školního pavilonu, ZŠ Vítězslava Háška, Odolena Voda

Dopravní stavby



Kabelové tunely, kolektory

KT Jih rekonstrukce OCK v úseku G10-Š5

Vybudování KT Bohdalec (úsek TR Jih)

Praha 8 – Karlín, KT Karlín, ražba

Výstavba KT Hlávkův most, podchod Negrelliho viaduktu

Oprava únikových cest a NN na kolektorech oblasti Západ

Sanační opravy kolektoru Řepy

Oprava nadzemních objektů kolektoru BX



Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce ČS Bruska, Praha 6 – 2. část

Rekonstrukce ul. prostoru a obnova vodovodního řadu – oblast Nová Hostivař

Rekonstrukce a intenzifikace ČOV Dolní Břežany

Rekonstrukce kanalizace, ul. Moskevská, Praha 10

Rekonstrukce kanalizace ul. Adamova, Praha 6

Kontakt

Předseda představenstva

Ing. Ivan Němec

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: Ing. Tomáš Hrdlička, MBA

Člen dozorčí rady: Mgr. Pavel Pražák

Člen dozorčí rady: Ing. Eliška Peroutková

Kontakty

VISTORIA CZ a.s.

Sídlo: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1

Pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5

IČ: 25110977, DIČ: CZ25110977

tel.: (+420) 221 425 102

e-mail: vistoria@vistoria.cz (<mailto:vistoria@vistoria.cz>)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4581

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č.ú.: 5250221028/2700

Sekretariát: **+420 221 425 102 (tel:221 425 102)**, e-mail: vistoria@vistoria.cz (<mailto:vistoria@vistoria.cz>)

Personální oddělení: **+420 221 425 308 (tel:+420221425308)**

Ekonomické oddělení: **+420 221 425 310 (tel:+420221425310)**

Kde nás najdete





[Úvod \(http://www.vistoria.cz/#uvod \)](http://www.vistoria.cz/#uvod) [O společnosti \(http://www.vistoria.cz/#o-spolecnosti \)](http://www.vistoria.cz/#o-spolecnosti) [Reference \(http://www.vistoria.cz/#reference \)](http://www.vistoria.cz/#reference)
[Kontakt \(http://www.vistoria.cz/#kontakt \)](http://www.vistoria.cz/#kontakt)

[Všeobecné obchodní podmínky \(https://www.vistoria.cz/vseobecne-obchodni-podminky/\)](https://www.vistoria.cz/vseobecne-obchodni-podminky/) [Certifikáty \(/certifikaty\)](#)
[Etický kodex \(/img/eticky_kodex.pdf\)](#) [Kodex prevence \(/img/kodex_prevence.pdf\)](#) [Politika ISŘ \(/img/VP01_P4_Politika_ISR_Z1_30112023.pdf\)](#)

© 2017 | Všechna práva vyhrazena Vistoria



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Stavebnictví České republiky 2022



Dokument: **STAVEBNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2022**

Autor: **Ministerstvo průmyslu a obchodu**

Odbor ekonomických analýz

Na Františku 32

110 15 Praha 1

tel.: +420 224 851 111

fax: +420 224 811 089

e-mail: posta@mpo.cz

datová schránka ID: bxtaaw4

Počet stran: 49

Největší stavební podniky podle objemu tržeb, přidané hodnoty a aktiv

Název firmy	Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb - tis. Kč	Přidaná hodnota - tis. Kč	Aktiva celkem - tis. Kč
Metrostav, a.s.	19 295 911,00	3 023 494,00	19 834 199,00
Eurovia CS, a.s.	16 346 044,00	3 010 700,00	13 351 800,00
AŽD Praha, s.r.o.	8 005 991,00	3 245 803,00	8 362 526,00
CTP Invest, s.r.o.	6 684 299,00	1 382 155,00	20 437 610,00
Imos Brno, a.s.	6 451 080,00	1 510 478,00	4 906 915,00
Colas CZ, a.s.	5 934 700,00	1 417 742,00	3 972 882,00
Elektrizace Železnic Praha, a.s.	4 886 018,00	1 336 975,00	2 780 576,00
Hochtief CZ, a.s.	4 134 944,00	1 055 943,00	3 440 558,00
Gemo, a.s.	4 121 795,00	918 383,00	1 695 957,00
Firesta - Fišer, rekonstrukce, Stavby,	3 629 391,00	645 484,00	1 735 722,00
M - Silnice, a.s.	3 566 708,00	790 849,00	2 564 317,00
Chládek a Tintěra, Pardubice, a.s.	3 215 205,00	996 562,00	1 336 834,00
Egem, s.r.o.	2 730 159,00	580 026,00	1 266 123,00
BAK Stavební společnost, a.s.	2 683 919,00	358 282,00	1 780 932,00
Geosan Group, a.s.	2 654 603,00	369 571,00	1 546 125,00
Chládek & Tintěra, a.s.	2 119 352,00	593 879,00	1 650 837,00
JTA - Holding, s.r.o.	1 699 814,00	539 394,00	775 904,00
Českomoravský beton, a.s.	1 637 075,00	238 588,00	984 460,00
Berger Bohemia, a.s.	1 630 110,00	252 781,00	2 667 728,00
Edikt, a.s.	1 606 280,00	271 955,00	706 496,00

Zdroj: Albertina, z veřejně dostupných dat, údaje k 23.11.2022 za rok 2021, příp. 2020



**PROFIL
SPOLEČNOSTI**

VÍTEJTE U NÁS

V rukou právě držíte naši vizitku – profil silné stavební společnosti, která brzy oslaví třicáté narozeniny.

Díky naší historii máme na čem stavět. Naše začátky se datují do raných devadesátých let a už tehdy jsme se účastnili velkých a zajímavých projektů.

Za dobu naší existence jsme se vyprofilovali na společnost se širokým záběrem stavebních činností s celorepublikovou působností. V současnosti se věnujeme převážně bytové, průmyslové, občanské, inženýrské, dopravní a ekologické výstavbě.


Jsme moderní evropskou společností, která vychází z dlouhodobých a bohatých zkušeností. Sledujeme technické a technologické novinky, které průběžně zavádíme a tím zefektivňujeme samotné stavební procesy, jejichž výsledkem je dokončená a úspěšně předaná stavba.

Na dalších stránkách naleznete informace o naší společnosti, našich cílech, zásadách a o tom, jak naše práce vypadá. Vybrali jsme pro Vás několik staveb z každé kategorie naší činnosti, které si můžete prohlédnout.

Již tři dekády měníme sny, nápady a vize našich investorů v realitu. Rádi proměníme i Váš projekt ve skutečnost.



2	RECEPCE VÍTEJTE U NÁS
4	KDE NÁS NAJDETE? ADRESY ZÁVODŮ
6	ROSTEME EKONOMICKÉ UKAZATELE
8	BEZPEČNOST A KVALITA CERTIFIKACE SPOLEČNOSTI
10	NAŠE PRÁCE REFERENČNÍ STAVBY
30	VZTAHY ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
32	

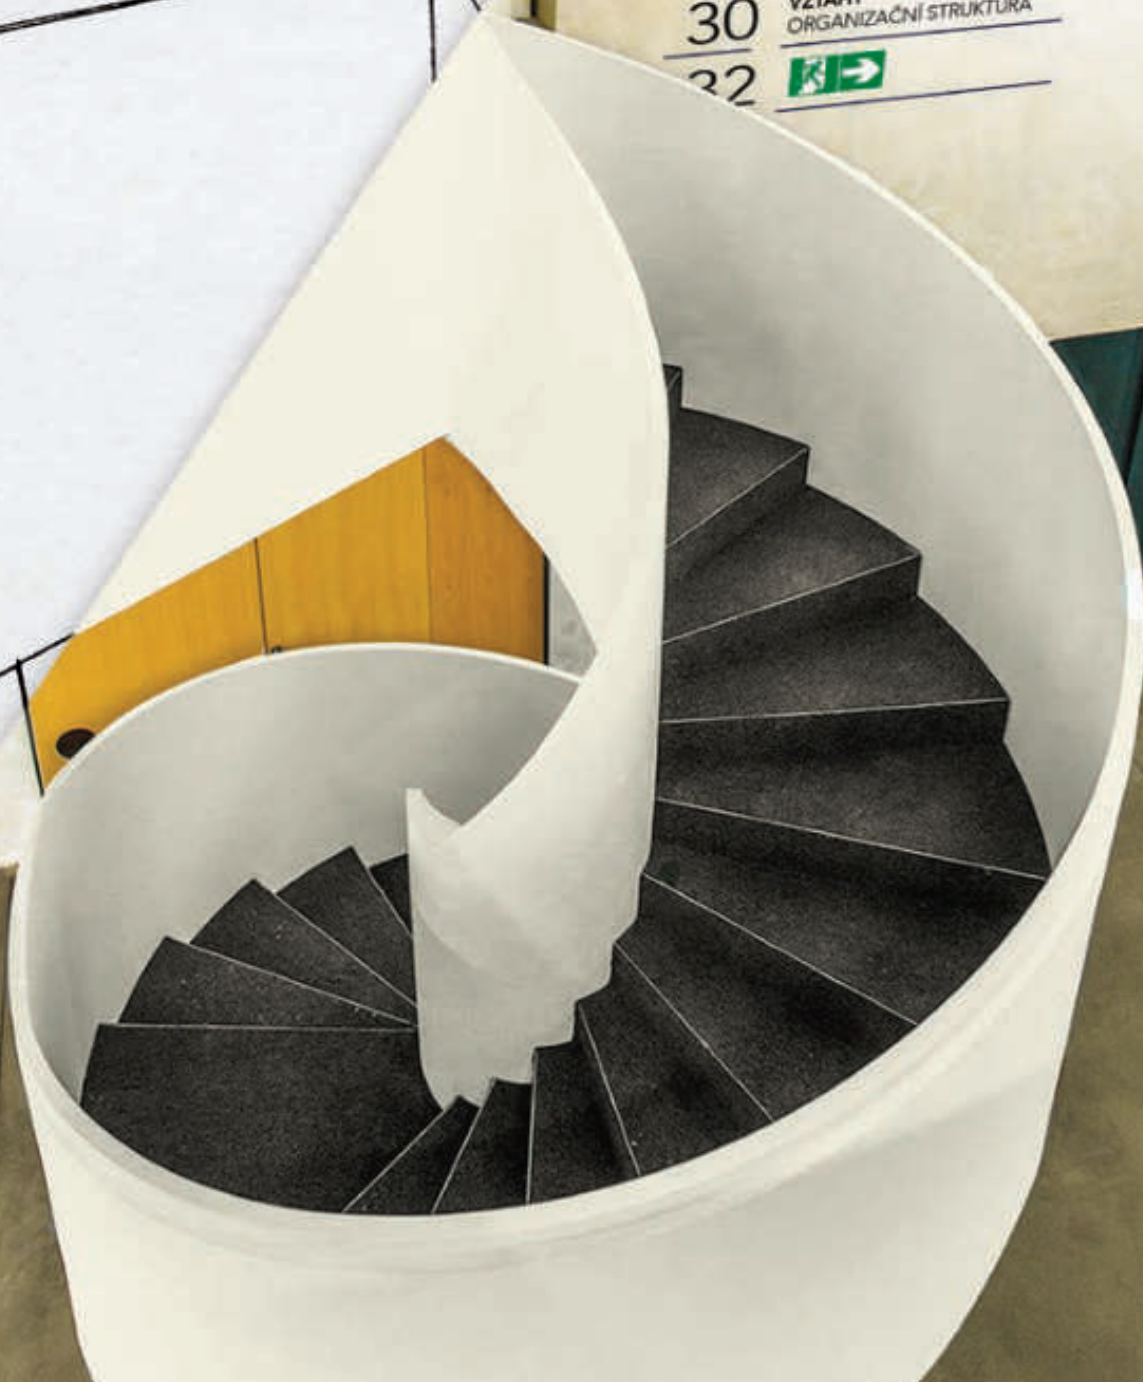

KDE NÁS NAJDETE

Najdete nás v sedmi velkých městech. Díky našemu celorepublikovému záběru můžeme pružně reagovat a být našim investorům vždy na blízku. Při získávání nových zakázek a jejich následné realizaci tím současně získáváme výhodu znalosti místních poměrů. U nás platí – ať se staví kdekoliv, my to máme blízko.

KOLÍN

SÍDLO SPOLEČNOSTI

U Nemocnice 430
280 02 Kolín III

BRNO

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB BRNO

Tuřanka 1519/115a
627 00 Brno - Slatina

PLZEŇ

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB PLZEŇ

Šafaříkovy sady 2/3
301 00 Plzeň

JIHLAVA

POBOČKA ZÁVODU POZEMNÍCH STAVEB BRNO

Divadelní 8
586 01 Jihlava

PRAHA

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB ČECHY ZÁVOD EKOLOGICKÝCH A ENERGETICKÝCH STAVEB ZÁVOD DOPRAVNÍCH STAVEB PROJEKTY VÝROBNÍHO ŘEDITELE

U Průhonu 1516/32
170 00 Praha 7

HRADEC KRÁLOVÉ

POBOČKA ZÁVODU POZEMNÍCH STAVEB ČECHY REGION VÝCHOD

Malé náměstí 110
500 03 Hradec Králové

OSTRAVA

ZÁVOD POZEMNÍCH STAVEB OSTRAVA

Dostojevského 3298/7
702 00 Ostrava




CENTRÁLNÍ URGENTNÍ PŘÍJEM
Pardubice



EKONOMICKÉ UKAZATELE

Graf ukazuje růst obratu a tržeb od roku 2017 do roku 2022. Nárůst je to více než trojnásobný. Podrobnější ekonomické informace naleznete ve výročních zprávách.

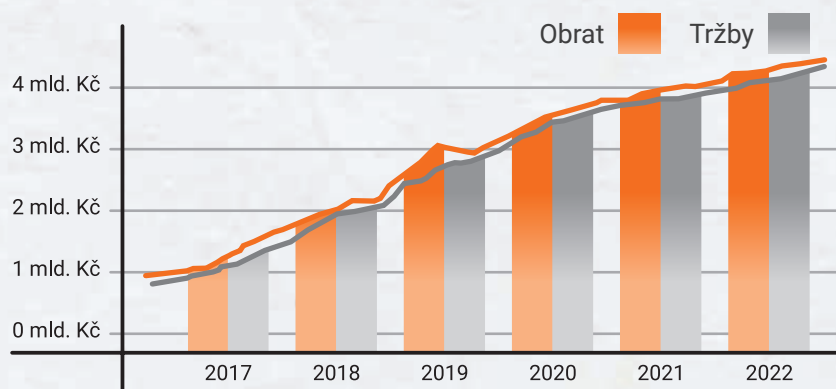

Ve stejném období kontinuálně roste i počet našich zaměstnanců. Graf znázorňuje jejich nárůst.



Praha 10

Přehled výdajů




Doprava

ROZPOČET

40 mil. Kč

SKUTEČNOST

19 mil. Kč




Školy

ROZPOČET

869 mil. Kč

SKUTEČNOST

423 mil. Kč




Sport

ROZPOČET

70 mil. Kč

SKUTEČNOST

34 mil. Kč

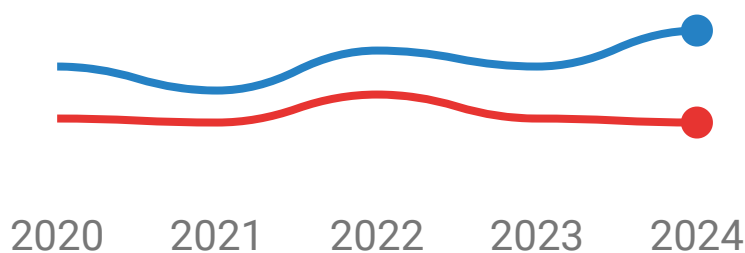




Územní rozvoj

ROZPOČET

100 mil. Kč

SKUTEČNOST

38 mil. Kč

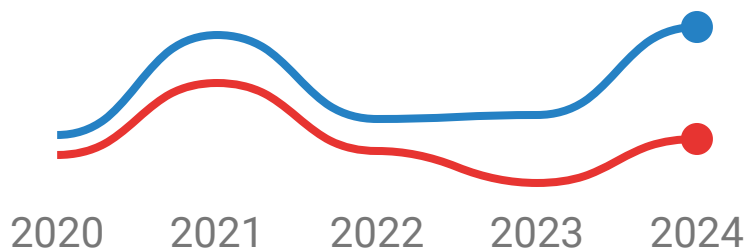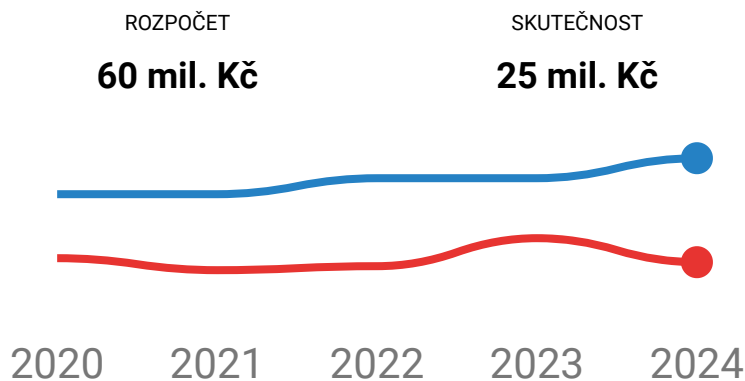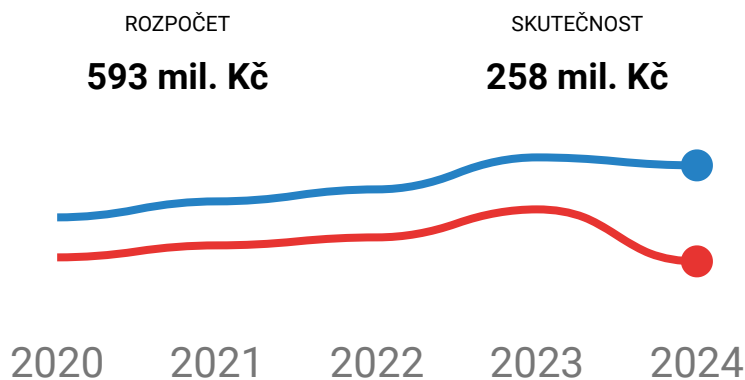**Kultura****Samospráva**

Poslední faktury

BTN Consulting s.r.o. [ARES] [Hlídač státu]

27. 8. 2024

Lásky čas - ohniště

21 716 Kč**OFFICEO s.r.o.** [ARES] [Hlídač státu]

27. 8. 2024

kancelářské potřeby-SKLAD MTZ

7 147 Kč**SYSTEM UAU** [ARES] [Hlídač státu]

27. 8. 2024

Deratizační zákroky - Bezručovy sady, vnitroblok Bělocerkevská x Ruská x
28.pluku, vnitroblok Bajkal**5 996 Kč****Ironex MB s.r.o.** [ARES] [Hlídač státu]

27. 8. 2024

4. seč údržba zeleně Vršovice 2024 - srpen 2024

313 408 Kč



[ARES] [Hlídač státu]

26. 8. 2024

Oprava dlažby směrem k ulici Malinová

4 874 Kč

[Zobrazit další](#)

Poslední smlouvy

BTN Consulting s.r.o. [Rejstřík smluv]

13. 9. 2024

TR2024: František Plánička: Fotbalový rytíř - občerstvení 12.9.

63 900 CZK



[Rejstřík smluv]

12. 9. 2024

Arboristické ošetření stromů ve stromořadí Ruská, etapa 1, fáze 1

102 505 CZK

ADVERTE s.r.o. [Rejstřík smluv]

12. 9. 2024

TR2024: František Plánička: Fotbalový rytíř - reprízy (20.9., 22.9., 6.10., 8.10., 15.10.)

296 450 CZK



[Rejstřík smluv]

12. 9. 2024

Technické a organizační zajištění Graffiti Workshop + graffiti dílna

70 000 CZK



[Rejstřík smluv]

12. 9. 2024

Oprava volného bytu č. 6, přesná specifikace místa díla č.p.1349, k.ú. Strašnice, ul. U Nových vil 27, Praha 10

624 998 CZK

[Zobrazit další](#)

Rozpočty

Rok 2024



Výdaje



Příjmy

Rozpočet

2 206 716 100 Kč

2 206 716 100 Kč

Skutečnost

1 120 923 733 Kč

896 178 246 Kč

Rok 2023



Výdaje



Příjmy

Rozpočet	2 346 313 800 Kč	2 346 313 800 Kč
Skutečnost	1 529 332 314 Kč	1 407 909 650 Kč

Rok 2022



Výdaje



Příjmy

Rozpočet	1 965 259 400 Kč	1 965 259 400 Kč
Skutečnost	1 178 677 131 Kč	1 204 695 008 Kč

Rok 2021



Výdaje



Příjmy

Rozpočet	1 696 556 200 Kč	991 932 700 Kč
Skutečnost	1 131 330 080 Kč	394 230 538 Kč

Rok 2020



Výdaje



Příjmy

Rozpočet	1 556 055 600 Kč	1 556 055 600 Kč
Skutečnost	1 138 349 853 Kč	1 396 334 683 Kč

Technická dokumentace

Přihlásit se

© Ministerstvo financí & Otevřená města

Obvodní soud pro Prahu 10 se sídlem ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10-Vršovice

Spisová značka:



(adresát)

VYROZUMĚNÍ

Ve věci

GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
obě zastoupeny: [redacted] U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

proti

Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 – Strašnice
zastoupena: [redacted] Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

o změnu závazku

se jednání nařízené na den **25.09.2024 v 13:00** hodin u podepsaného soudu v místnosti Obvodního soudu
pro Prahu 10 č. dv. 1.302 I. patro, Justiční areál Na Míčáncích

o d r o č u j e n a
den 06. 11. 2024 v 15:00 hod.

u podepsaného soudu v místnosti Obvodního soudu pro Prahu 10, do č. dv. 1.302 I. patro,
Justiční areál Na Míčáncích.

Důvodem odročení jednání jsou technické důvody na straně soudu.

V ostatním zůstává předvolání k jednání v platnosti.

Praha dne 20. září 2024

Mgr. Eva Přívracká, v.r.
soudkyně

Za správnost vyhotovení: Haifa Yamaniová
(O.s.ř. č. 048 - vyrozumění o odročení nebo odvolání jednání)

Doručenka datové zprávy

Předmět: [REDACTED] - vz.48 új. 6/11
ID zprávy: 1414925030
Datum a čas dodání: 20.09.2024 v 12:57:19
Datum a čas doručení: 20.09.2024 v 14:39:36

Adresát: [REDACTED] advokát, Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 11000 Praha 1, CZ

ID schránky: [REDACTED]

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: [REDACTED]
Naše spisová značka: [REDACTED]
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

20.09.2024 v 12:57:18 EV0: Datová zpráva byla podána.
20.09.2024 v 12:57:19 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
20.09.2024 v 14:39:36 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Spisová značka

Obvodní soud pro Prahu 10 se sídlem ul. 28. pluku 1533/29b, 100 83 Praha 10-Vršovice

advokát

(adresát)

PŘEDVOLÁNÍ

Ve věci účastníka

proti

Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38 Praha 10

zastoupena: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

s příslušensvím
se nařizuje jednání

na den 6.11.2024 v 13:00 hodin

u podepsaného soudu v místnosti Obvodního soudu pro Prahu 10 č.dv. 1.313 I.patro
Justiční areál Na Mičáncích

K uvedenému jednání jste předvolán jako **zástupce účastníka řízení**. Vámi zastupovaný účastník řízení je k jednání předvolán samostatným předvoláním.

Nedostavíte-li se a ani včas nepožádáte z důležitého důvodu o odročení jednání (o důvodnosti žádosti o odročení jednání rozhoduje soud), může soud věc projednat a rozhodnout ve Vaší nepřítomnosti.

V projednávané věci lze uvést rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání jen do skončení tohoto jednání, v případě, že došlo k přistoupení dalšího účastníka nebo změně účastníka, do skončení prvního jednání, které bylo nařízeno po přistoupení nebo změně účastníka a které se ve věci konalo. Z důležitých důvodů Vám soud může na Vaši žádost poskytnout lhůtu k doplnění tvrzení o skutečnostech rozhodujících pro věc, k podání návrhu na provedení důkazů nebo ke splnění dalších procesních povinností. K později uvedeným skutečnostem a označeným důkazům smí soud přihlídnout, jen jde-li o skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků, které nastaly po prvním jednání nebo které účastník nemohl bez své viny včas uvést, jakož i ke skutečnostem nebo důkazům, které účastníci uvedli poté, co byl některý z nich vyzván k doplnění rozhodujících skutečností předsedou senátu v průběhu jednání podle § 118a odst. 1 až 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.

K jednání s sebou přineste toto předvolání a svůj občanský průkaz, popřípadě jiný průkaz totožnosti. Jste-li advokátem nebo notářem, jste povinen mít u sebe průkaz advokáta nebo notáře.

Za správnost vyhotovení: Hana Blahová

(O.s.č. 24 - předvolání zástupce účastníka k prvnímu jednání, pokud nebylo provedeno přípravit jednání dle § 114e o.s.č.)

Příloha: Poučení osoby předvolané nebo vyzvaně o soudním jednání či jiném soudním aktu
v občanskoprávním řízení.

Praha 12. srpna 2024

JUDr. Bc. Martin Buláček v. r.
soudce

Za správnost vyhotovení: Hana Bláhová

(O.s.č. 24 - předvolání zástupce účastníka k pecunárnímu jednání, pokud nebylo provedeno přípravné jednání dle § 114e o.s.č.)

Florentinum, recepce A
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, Česká republika
Tel.: +420 255 000 111

Titanium Business Complex
Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 545 423 420

Centrum Zuckermandel
Žitkova 7803/9, 811 02 Bratislava, Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900

Obvodnímu soudu pro Prahu 10

28. pluku 1553/29b

100 83 Praha 10

Ke sp. zn.:



V Praze dne 23. září 2024

Žalobce a): **GEOSAN GROUP a.s.**, IČO 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

Žalobce b): **VISTORIA CZ a.s.**, IČO 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Město

oba právně zastoupeni [redacted] advokátem, ev. č. ČAK [redacted]
společníkem TFP Legal, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem U Průhonu 1516/32,
170 00 Praha 7

Žalovaná: **Městská část Praha 10**, IČO 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 - Strašnice

právně zastoupena [redacted] advokátem, ev. č. ČAK [redacted]
společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Na
Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

o změnu závazku

**Žádost žalované o odročení jednání
nařízeného na den 6. 11. 2024**

Doručeno prostřednictvím datové schránky

Příloha: Předvolání k jednání dne 6. 11. 2024 ve věci sp. zn.




1. Soud odročil jednání v nadepsané věci, původně nařízené na den 25. 9. 2024, na den **6. 11. 2024 od 15.00 hod.** Vyrozumění o odročení jednání bylo žalované doručeno dne 20. 9. 2024.
2. **Žalovaná tímto zdvořile žádá soud o odročení jednání nařízeného na den 6. 11. 2024 na jiný termín z důvodu kolize nařízeného jednání v této věci s jiným, dříve nařízeným jednáním ve věci vedené u výše nadepsaného soudu pod sp. zn. [REDACTED] ve kterém právní zástupce žalované vystupuje rovněž jako právní zástupce žalované.** Předvolání k jednání ve věci vedené pod sp. zn. [REDACTED] bylo právnímu zástupci žalované doručeno dne 13. 8. 2024, a tvoří přílohu této žádosti.
3. Žalovaná si je samozřejmě vědoma možnosti udělení substituční plné moci právním zástupcem žalované jinému zástupci, nicméně to nepovažuje za žádoucí ani účelné s ohledem na složitost projednávané věci.

[REDACTED]

advokát

na základě plné moci za **Městská část Praha 10**

Spisová značka: 



(adresát)

VYROZUMĚNÍ

Ve věci

1)GEOSAN GROUP a.s., U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
2)VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 - Staré Město
oba zastoupeni  advokát

proti
Městská část Praha 10, Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 – Strašnice
zastoupena  advokát

o změnu závazku

se jednání nařízené na den **08.11.2024 v 09:30** hodin u podepsaného soudu v místnosti Obvodního soudu
pro Prahu 10 č.dv. 1.302 I.patro, Justiční areál Na Míčáncích

o d r o č u j e n a
den 08.01.2025 v 9:30 hod.

u podepsaného soudu v místnosti Obvodního soudu pro Prahu 10 č.dv. 1.302 I.patro, Justiční areál Na
Míčáncích

Důvodem odročení jednání jsou technické důvody na straně soudu.

V ostatním zůstává předvolání k jednání v platnosti.

Praha dne 16. října 2024

Mgr. Eva Přívracká v.r.
soudkyně

Obvodní soud pro Prahu 10

28. pluku 1533/29b

100 83 Praha 10 - Vršovice

ke spis. zn.:


**Žalobce 1:****GEOSAN GROUP a. s.**, IČO: 28169522, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III**Žalobce 2:****VISTORIA CZ a. s.**, IČO: 25110977, se sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1 – Staré Městooba právně zastoupeni  advokátem, se sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice, zapsaným v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č. **Žalovaná:****Městská část Praha 10**, IČO: 00063941, se sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10 – Strašniceprávně zastoupena  advokátem, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město, zapsaným v seznamu advokátů vedeném ČAK pod č. **Žaloba na změnu závazku****Vyjádření žalobců k duplice žalované ze dne 19. 9. 2024**Přílohy:

1. rozhodčí smlouva ze dne 3. 7. 2023
2. žaloba na změnu závazku ze dne 5. 9. 2023
3. usnesení o zastavení rozhodčího řízení ze dne 30. 11. 2023
4. rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 2. 10. 2024

D v a k r á t (podáno do datové schránky Obvodního soudu pro Prahu 10, ID DS: 8aiabyn)

I.

Shrnutí dosavadního průběhu řízení

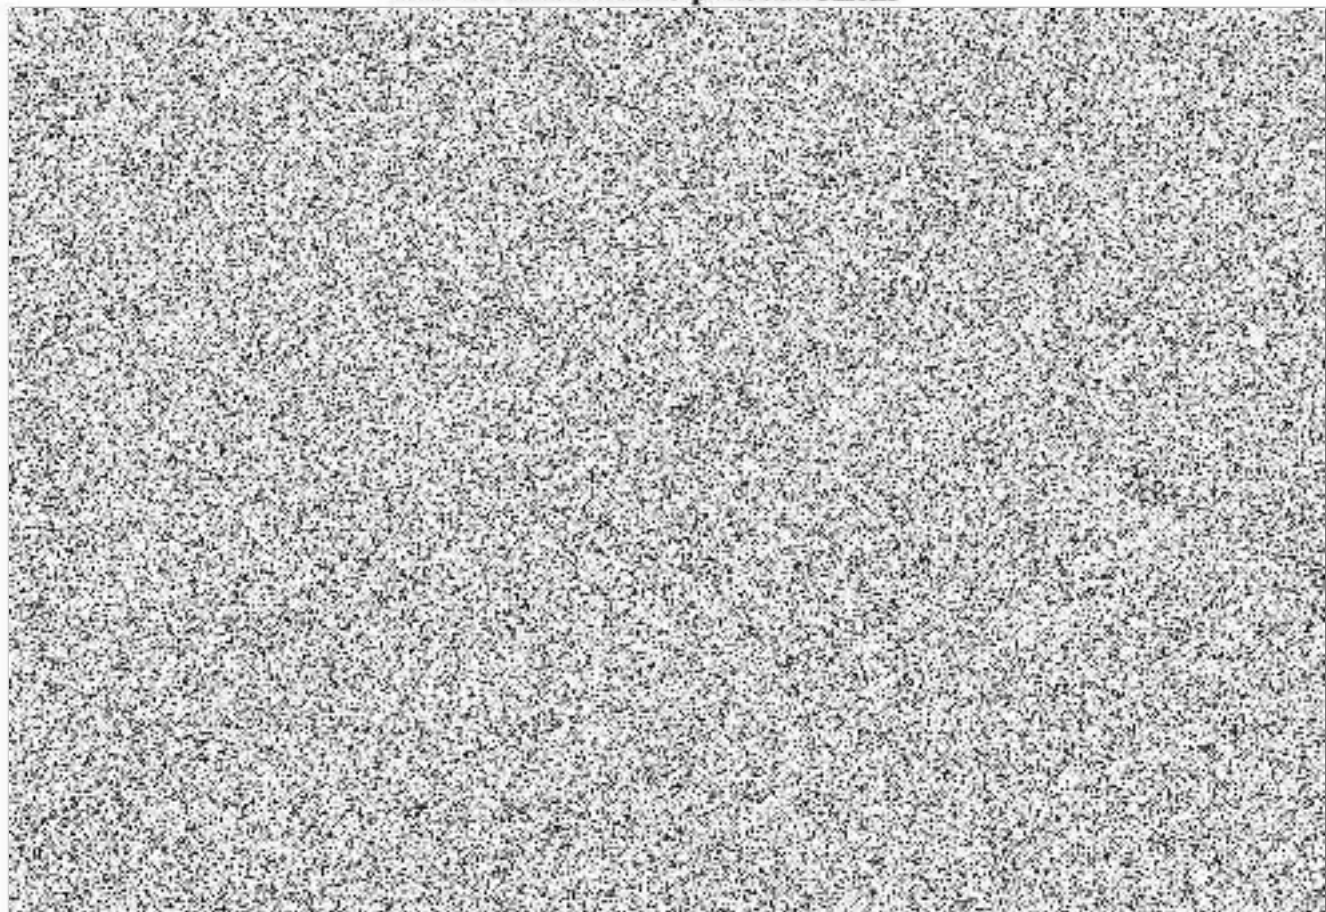


II.

Obsah vviádření žalobců




III.

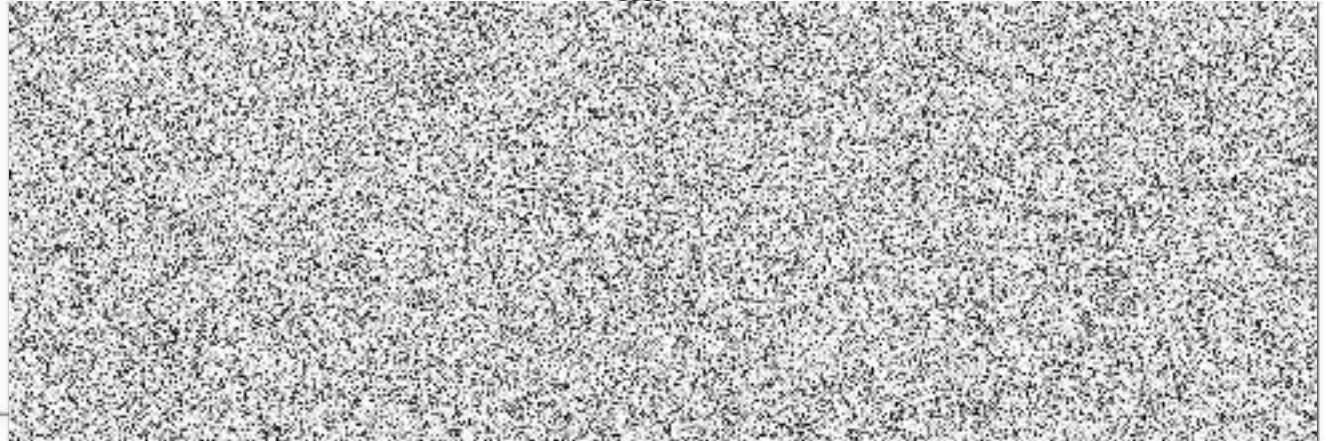

¹ Pojmy používané v tomto podání žalobců mají stejný význam jako pojmy používané v předchozích podáních žalobců.

² TALEB, Nassim, Nicholas. *Černá labuť: následky vysoce nepravděpodobných událostí*. Praha: Paseka, 2011, s. 8 [cit. 14. 12. 2024].

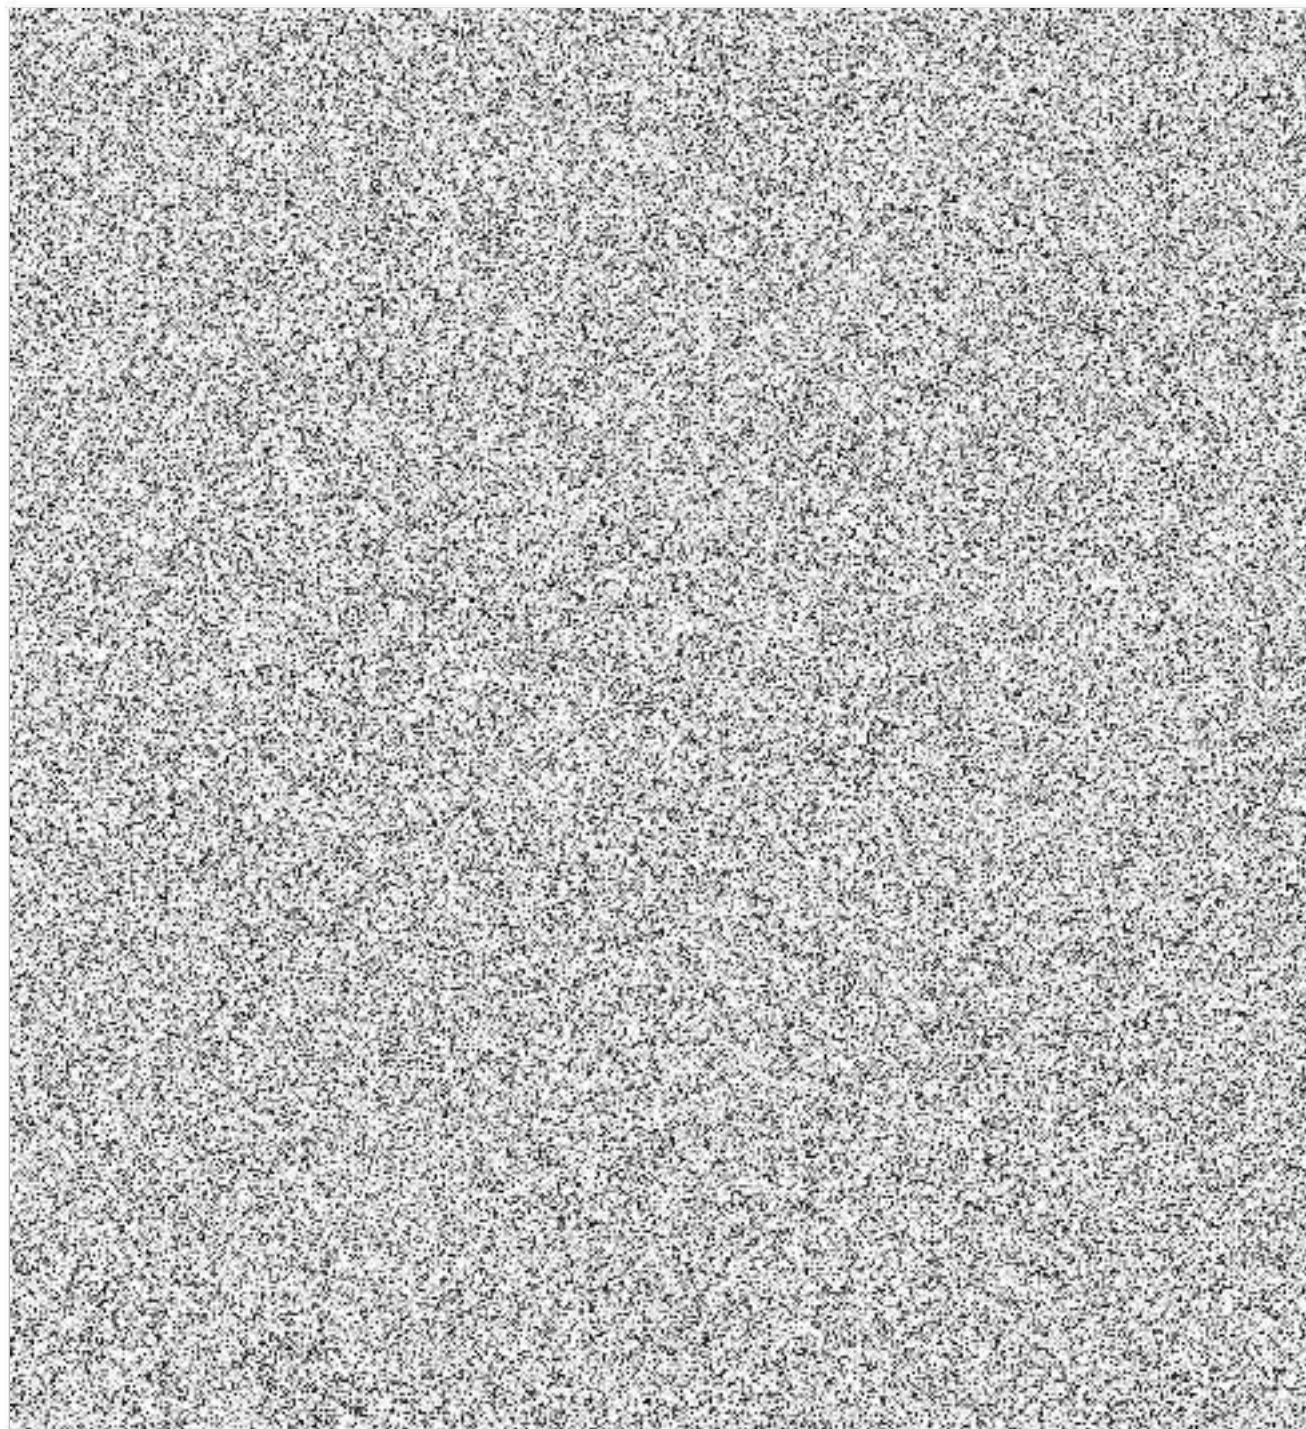


³ Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky ze dne 14. 11. 1923, spis. zn. Rv I 1178/23, viz bod 42 Žaloby.


⁴ K tomu viz Nález Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2011, spis. zn. I.ÚS 2920/09: „Toto pochybení odvolacího soudu pramení zřejmě z toho, že (...) neaplikoval ani žádnou jinou metodu výkladu práva než výklad jazykový. Ústavní soud však ve své judikatuře opakovaně zdůrazňuje, že „naprosto neudržitelným momentem používání práva je jeho aplikace, vycházející pouze z jeho jazykového výkladu. Jazykový výklad představuje pouze prvotní přiblížení se k aplikované právní normě. Je pouze východiskem pro objasnění a ujasnění si jejího smyslu a účelu (k čemuž slouží i řada dalších postupů, jako logický a systematický výklad, výklad *e ratione legis* atd.). Mechanická aplikace abstrahující, resp. neuvědomující si, a to buď úmyslně, nebo v důsledku nevzdělanosti, smysl a účel právní normy, činí z práva nástroj odcizení a absurdity.“

⁵ KOTÁSEK, Josef. Poznámky k okolnostem zakládajícím právo na obnovu jednání o smlouvě. Dostupné z https://www.researchgate.net/publication/303922377_Poznamky_k_okolnostem_zakladajicim_pravo_na_obnovu_jednani_o_smlouve.

⁶ MELZEROVÁ, Lucie. Vliv změny poměrů na trvání závazků. Olomouc, 2018. Disertační práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta. Dostupné z: https://theses.cz/id/zwbrdg/Melzerov_-_disertan_prce.pdf




IV.

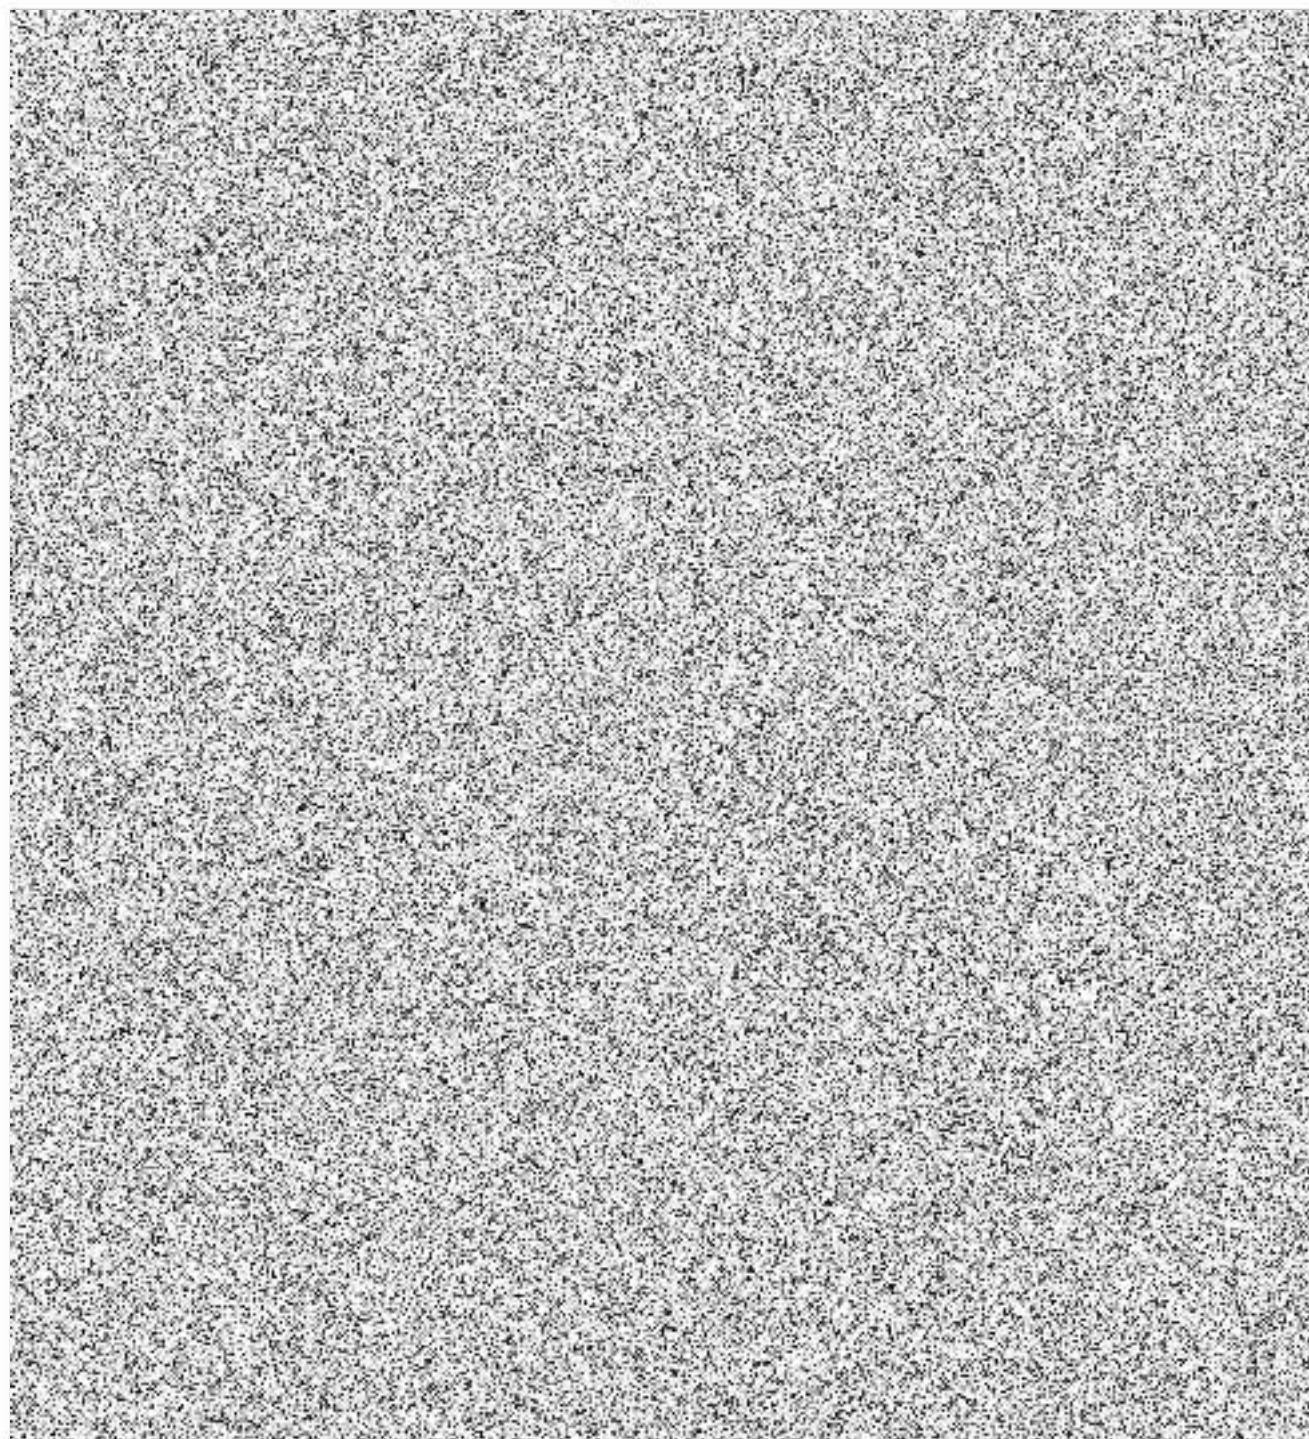

⁷ PELIKÁNOVÁ, Irena; PELIKÁN, Robert. In: ŠVESTKA, Jiří a kol. *Občanský zákoník: komentář k § 1798*. Svazek V, (§ 1721 až 2520). Wolters Kluwer ČR [cit. 14. 12. 2024]. Dostupné z: www.aspi.cz.

V.
Další okolnosti

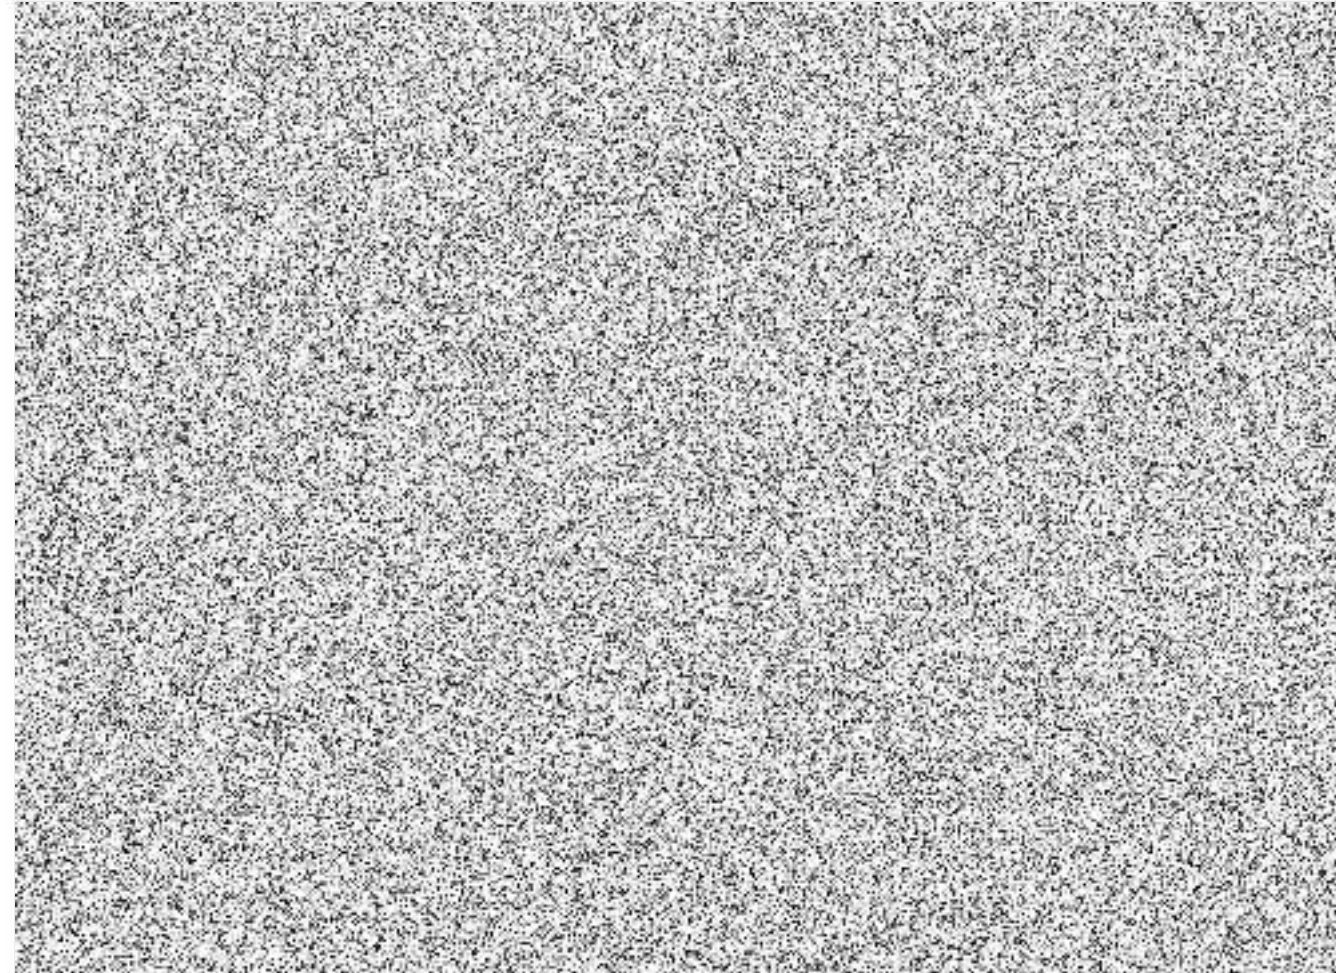


Důkazy: rozhodčí smlouva ze dne 3. 7. 2023 (příloha č. 1)
žaloba na změnu závazku ze dne 5. 9. 2023 (příloha č. 2)
usnesení o zastavení rozhodčího řízení ze dne 30. 11. 2023 (příloha č. 3)

rozhodnutí předsedy ÚOHS ze dne 2. 10. 2024 (příloha č. 4)

**VI.
Návrh žalobců**

(39) Žalobci z důvodů uvedených výše i nadále navrhuji, aby soud vydal následující

rozsudek:

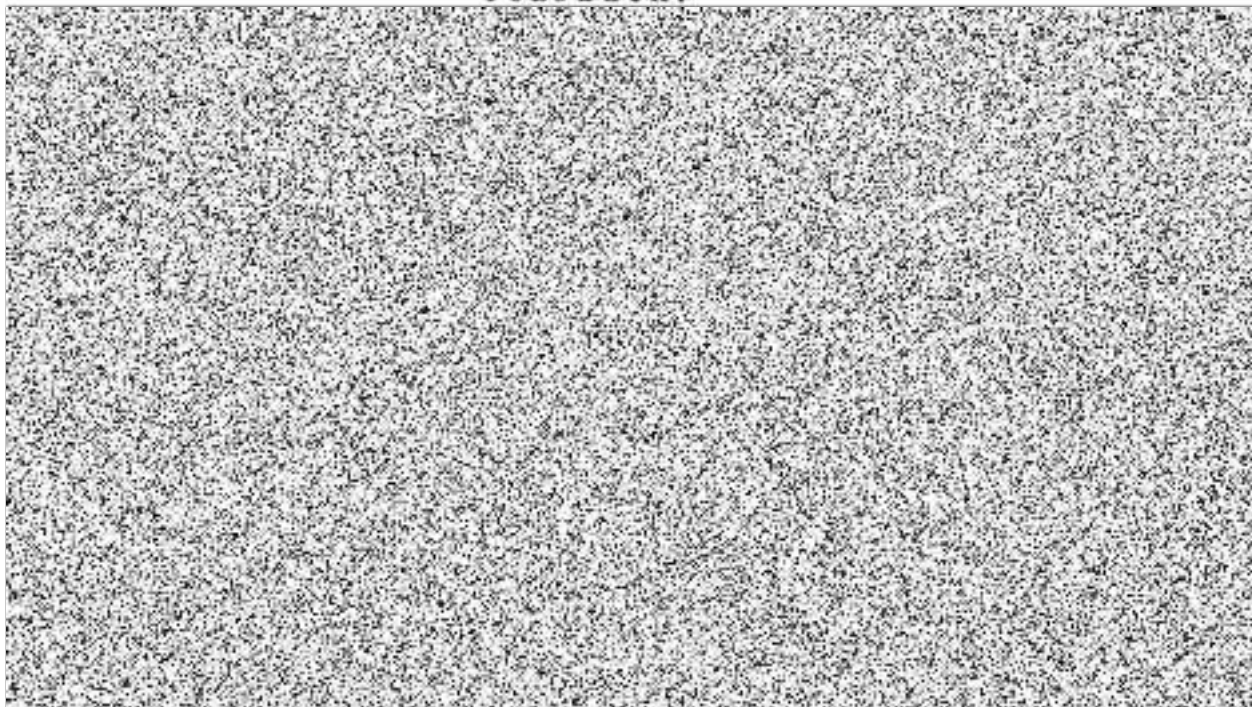

V Praze dne 20. 12. 2024



advokát

na základě plné moci za žalobce

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět:  vyjádření žalobců új 8/1/2025
ID zprávy: 1457162911
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 23.12.2024 v 11:49:58
Datum a čas doručení: 30.12.2024 v 9:39:50


Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, CZ
ID schránky: 8aiabyn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: 
Naše spisová značka: 
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

20241220-GG-vyja_dr_eni_z_alobcu_kduplicez_alovane_.pdf (1,59 MB)

Doručenka datové zprávy

Předmět:  vyjádření žalobců új 8/1/2025**ID zprávy:** 1457162911**Datum a čas dodání:** 23.12.2024 v 11:49:58**Datum a čas doručení:** 30.12.2024 v 09:39:50**Adresát:**  advokát, Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 11000 Praha 1, CZ**ID schránky:** **Zmocnění:** Nezádáno**Odstavec:** Nezádáno**Naše číslo jednací:** **Naše spisová značka:** **Vaše číslo jednací:** Nezádáno**Vaše spisová značka:** Nezádáno**K rukám:** Nezádáno**Do vlastních rukou:** Ne**Doručení fikcí zakázáno:** Ne

Události zprávy:

23.12.2024 v 11:49:58 EV0: Datová zpráva byla podána.**23.12.2024 v 11:49:58** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.**30.12.2024 v 09:39:50** EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud nadřízený rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Gabriely Kučerové a soudců Mgr. Jiřího Čurdy a JUDr. Vladislavy Riegrové, Ph.D., ve věci

žalobkyň: **a) GEOSAN GROUP a. s.**, IČO 28169522
sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
b) VISTORIA CZ a.s., IČO 25110977
sídlem Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
obě zastoupeny  advokátem
sídlem U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7

proti
žalované: **Městská část Praha 10**, IČO 00063941
sídlem Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
zastoupena  advokátem
sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

o změnu závazku, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 


o určení věcné příslušnosti,

takto:

K projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.

Odůvodnění:

1.

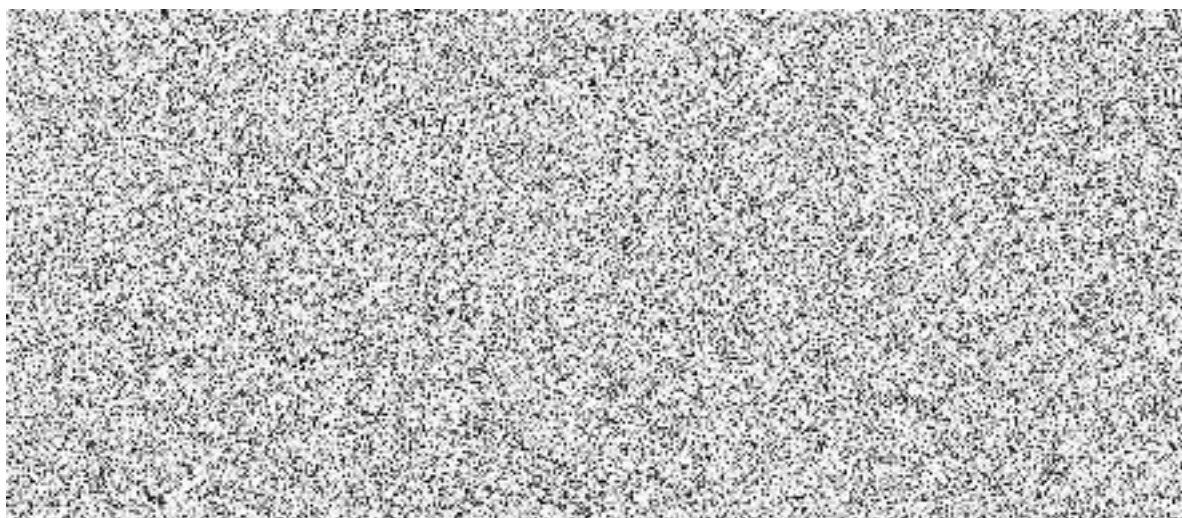

2. Předkládající soud postupoval podle § 104a odst. 2 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“) a předložil věc zdejšímu soudu jako soudu nadřízenému k rozhodnutí o věcné příslušnosti, když má za to, že jelikož cena díla podle smlouvy včetně uzavřených



dodatků činila 144 793 413,96 Kč, jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku, takže, ačkoliv původně se jednalo o zakázku podlimitní, jak byla také zadána do výběrového řízení, měl by v této věci rozhodovat soud krajský.

3. Účastnice se k věcné příslušnosti po výzvě soudu, dané na ústním jednání dne 8. 1. 2025 nevyjádřily, učinily pouze nesporným, že cena po uzavření dodatků činila 144 793 413,96 Kč.
4. Řízení se koná u toho soudu, který je věcně příslušný. Pro určení věcné příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení (§ 11 odst. 1 o. s. ř.). Věcnou příslušnost zkoumá soud kdykoli za řízení (§ 104a odst. 1 o. s. ř.).
5. Podle § 9 odst. 2 písm. o) o. s. ř. krajské soudy jako soudy prvního stupně rozhodují ve sporech ze smluv na stavební práce, které jsou nadlimitními veřejnými zakázkami, včetně dodávek nezbytných k provedení těchto smluv. Nadlimitní veřejná zakázka je definována v § 25 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) jako veřejná zakázka, jejíž *předpokládaná* hodnota je rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zpracovávajícím příslušné předpisy Evropské unie.
6. Tímto předpisem je nařízení vlády č. 172/2016 Sb. ze dne 11. 5. 2016, o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání zakázek, v jehož § 4 ve znění účinném ke dni *uzavření smlouvy o dílo* (17. 6. 2021) je finančním limitem pro určení nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce 137 366 000 Kč.
7. Z údajů uvedených v bodě 1. tohoto odůvodnění je zřejmé, že cena sjednaná předmětnou smlouvou o dílo (128 926 466,58 Kč) výše zmíněný nařízením vlády stanovený finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky nepřesahuje, takže *se nejedná* o spor ze smluv na stavební práce, které jsou nadlimitními veřejnými zakázkami. Pro úplnost nadřízený soud konstatuje, že skutečnost, že se jednalo (jedná) o podlimitní zakázku (§ 26 ZZVZ) potvrzuje i to, že byla zadána v podlimitním režimu a že na tomto jejím charakteru nemění nic ani to, že uzavřenými dodatky byla cena upravena (přičtením ceny víceprací a odečtením ceny méněprací) na částku, která výše zmíněný limit přesahuje, protože pro charakter veřejné zakázky (jež je určující pro volbu režimu zadávacího řízení) je rozhodující hodnota *předpokládaná* před zadáním zakázky do (toho či onoho režimu) zadávacího řízení.
8. S ohledem na vše shora konstatované, když pro nárok, který je předmětem tohoto řízení, není založena zákonná výjimka z obecné věcné příslušnosti okresních soudů ve sporném občanském soudním řízení, rozhodl nadřízený soud podle § 104a odst. 2 poslední věta o. s. ř. ve výroku tohoto usnesení, že k projednání a rozhodnutí věci jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.
9. Usnesením o věcné příslušnosti jsou účastníci a soudy vázáni (§ 104a odst. 7 o. s. ř.).

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání ani dovolání přípustné.

Praha 24. února 2025

JUDr. Gabriela Kučerová v. r.
předsedkyně senátu

Jana

Lipovčanová


Digitálně podepsal Jana
Lipovčanová
Datum: 2025.02.26
13:00:25 +01'00'

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Lipovčanová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět:  Usnesení VS čl.72 lh 30/3 2025
ID zprávy: 1490800916
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 7.3.2025 v 12:42:20
Datum a čas doručení: 7.3.2025 v 14:33:01

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 10, 28. pluku 1533/29b, Vršovice, 10000 Praha 10, CZ
ID schránky: 8aiabyn
Typ schránky: OVM

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: 
Naše spisová značka: 
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Ncp_33_2025_2.PDF (105,55 kB)

Doručenka datové zprávy

Předmět: [REDACTED] Usnesení VS čl.72 lh 30/3 2025
ID zprávy: 1490800916
Datum a čas dodání: 07.03.2025 v 12:42:20
Datum a čas doručení: 07.03.2025 v 14:33:01

Adresát: [REDACTED] advokát, Na Florenci 2116/15, Nové
Město, 11000 Praha 1, CZ
ID schránky: [REDACTED]

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: [REDACTED]
Naše spisová značka: [REDACTED]
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ano
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Události zprávy:

07.03.2025 v 12:42:20 EV0: Datová zpráva byla podána.
07.03.2025 v 12:42:20 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
07.03.2025 v 14:33:01 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.
